



نتالي مونتيل



حفر قناة السويس

المشروع والتنفيذ
دراسة في تاريخ ممارسات التقنية

ترجمة: دكتور عباس أبو غزالة

تليجرام : هنا سور الأزليكية
أكبر مكتبة رقمية

أشهر جرونيات علي تلجرام

الاشتهار

هنا سجد الازليكية

فوائد في بحر الكتب

قناة مصر الثقافية والفنية

نتالي مونتل

قناة السويس

المشروع والتنفيذ

(١٨٥٩-١٨٦٩)

دراسة في تاريخ الممارسات التقنية

ترجمة : دكتور عباس أبوغزالة

الطبعة الأولى

٢٠٠٥م

تليجرام مكتبة غوامر في بحر الكتب

عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية

ETN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES



صدر هذا الكتاب بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون (قسم الترجمة) التابع لسفارة فرنسا بالقاهرة

هذه ترجمة كاملة لكتاب

Le Chantier Du Canal De Suez

(1859-1869)

Une histoire des Pratiques techniques

Par : Nathalie Montel

©Éditions in Forma

Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées

المشرف العام : الدكتور قاسم عبده قاسم

المستشارون

د . أحمد إبراهيم الهواري

د . شوقي عبد القوى حبيب

د . قاسم عبده قاسم

المدير التنفيذي :

شريف قاسم

تصميم الغلاف : محمد أبو طالب

حقوق النشر محفوظة ©

الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية

ه شارع ترعة المربوطية - الهرم - ج.م.ع تليفون وفاكس ٢٨٧١٦٩٣

Publisher: EINH FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel : 3871693

E-mail : dar_Ein@hotmail.com

فهرس الكتاب

ترجمة موجز الكتاب الفرنسي*

صفحة		
٩	المقدمة
٢١	عملية جريئة ومعقدة	الفصل الأول
٢١	ديليبس يشرع بعزم في تأسيس في تأسيس الشركة	
٣٢	صعوبات البداية	
٥٠	إلغاء العقد علامة بإنهاء مرحلة	
٦٩	إقامة تنظيم حديث	الفصل الثاني
٦٩	تقاسم جديد للأدوار	
٨١	نموذج تنظيم فرض نفسه	
١٠٤	المراقبون : المحرك الأساسي للورشة	
١٢٥	مناهج إدارية فعالة:	الفصل الثالث
١٢٥	مبادئ ونماذج	
١٢٥	عناصر المنهج	
١٣٨	الإدارة : مصادر استلهمها والقواعد والآليات	
١٥٣	نظام المحاسبة : حجر الزاوية لآليات الإدارة	
١٦١	عناصر ومنتجات نظام المحاسبة	
١٧٧	دولة داخل الدولة	الفصل الرابع
١٧٨	المواصلات والاتصالات	
١٨٧	قائمة الخليج : المدن والمخيمات	
٢٠٥	الأشراف الصحي على الورشة	
٢١٣	عدالة مستحيلة	
٢٣٣	بداية عصر الميكنة	الفصل الخامس
٢٣٣	مختبر للتجارب	
٢٤٤	السكة الحديد والآلة البخارية تغزو ان الورشة	
٢٥٧	نجاح رجال ذوو الخبرة	
٢٦٥	عناصر تكوين الابتكارات	
٢٩١	التحديث التقني : عمل المقاولين	الفصل السادس
٢٩٢	سلوكيات وممارسات معرصة	
٣١٤	علوم نادرة التطبيق	
٣٤٣	الخاتمة	
٣٥٦	الملاحقات	
٣٦٨	الفنيون العاملين بالشركة	
٣٧٥	البيلوغرافيا	

أهم جزيئات علي تيجرام

المحتفون

هنا سجد الأزيكية

فوالكر في بحر الكتب

قناة مصر الثقافية والفنية

مقدمة المترجم

لقد اكتشفت القيمة العلمية والتاريخية لكتاب الباحثة الفرنسية نتالي مونتل وعنوانه : " ورشة حفر قناة السويس ١٨٥٩-١٨٦٩ ، دراسة في تاريخ ممارسات التقنية " ، حين قدمته خلال ندوة نظمته " جمعية ذكرى فردينان دليسبس وقناة السويس " التي حفظت وثائق ومحفوظات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية النادرة و التي أدرجتها منظمة اليونسكو في سجل ذاكرة العالم نظراً لأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والإنسانية عامة .

وقد استمدت المؤلفة هذا الكتاب من رسالة الدكتوراه التي أعدتها ونالت جائزة جان - إدوار جوبي (Jean-Edouard Goby) من الأكاديمية الفرنسية. وتناولت فيه بالدراسة حقبة العشر سنوات التي استغرقتها عمليات حفر قناة السويس أي منذ بداية أول ضربة فأس لفلاح مصري حتى إقامة حفل افتتاح القناة الذي دعا إليه الخديوي إسماعيل ملوك وحكام العالم لتتوجها لنجاح هذا الإنجاز العملاق، وتتجلى خصوصية هذا البحث في اعتماده أساساً على وثائق تاريخ حفر القناة ذات الدور الهام في الذاكرة المعاصرة .


ويجسد هذا الكتاب نجاح تجربة فريدة تغلبت على كل الغن التي تواجهها الشركات التي تسعى إلى تنفيذ عمل خارق على أرض أجنبية . لقد كان حفر قناة السويس عملية جريئة ومعقدة ولزم لنجاحها تطبيق تنظيم علمي للعمل وتفعيل مناهج إدارية متطورة وتحديث المكنة والابتكار في صحراء مصر.

ويقدم هذا الكتاب موضوع بحث جديد عن تاريخ تطبيق التقنيات في مجال الأشغال العامة : إذ يغوص بنا في صميم عمليات التحديث الناتجة عن ممارسات فعلية تتعرض للخطأ عند التجريب كما تصيب أيضاً ، مُخلفة وراءها أنواعاً من الكشف والابتكار التي لا تصمد إلا بقدر ما تتطور وفقاً لاحتياجات العمل. كما يقدم هذا الكتاب صورة حية لتنفيذ مشروع عالمي على أرض مصر بحيث ينفذ بنا إلى دقائق العلاقات الإنسانية وقضايا التنفيذ المعقدة على مستوى التنظيم الإداري واختيار المناهج العلمية في ضوء التجربة والخطأ النابعة من واقع تجربة حفر القناة . هذا بجانب إلقاء الضوء على الحياة اليومية للعاملين من حيث المعيشة والغذاء والسكن والصحة ، وكذلك العلاقات التي نشأت بين مختلف أجناس العاملين وعمليات الصراع والتنافس والتفرقة أحياناً في المعاملة خاصة في جو سيطرت فيه الجاليات الأجنبية على مصائر الوطن.

كما يبرز تحليل الكاتبة أهمية التكوين العلمي لخريجي المدارس العليا المتخصصة بفرنسا بجوار الجامعات التي يغلب عليها طابع التعليم النظري ، فقد جذب مشروع وصل البحرين الأحمر

والمتوسط عدد كبير من خريجي هذه المدارس فتركوا وظائفهم في أجهزة الدولة للعمل في مصر . ولم يقتصر الأمر على تطبيق ما تعلموه في مدارسهم ، فقد عرف تنفيذ حفر قناة السويس أقوى الآلات وأبرعها وكانت رائدة لجيل غني من آلات الحفر ، وكانت صحراء مصر بوتقة للتحديث والابتكارات التي نقلها العاملون من " مدرسة برزخ السويس العظيمة " إلى بلادهم. ولعل هذا يقدم لمصر نموذجاً رائعاً يجدر بها أن تحتذيه لتطوير مناهج التعليم وتحديثها بحيث لا تنفصل النظريات العلمية عن الجانب التطبيقي الذي يلي احتياجات المجتمع وضرورات التقدم التقني والصناعي.

ولقد سعت في ترجمة رسالة الدكتوراه هذه بعد أن شجعتني صديقي الدكتور محمد الكردي، استاذ الحضارة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ، وأفادي بملاحظاته القيمة ، وكذلك الأستاذ محمد علبة الذي تفضل شاكرًا بمراجعة النص العربي . وأتقدم بخالص شكري للعاملين بإدارة الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون الذين تفضلوا بمراجعة الترجمة بكل عناية . ولا يفوتني أن أعبر عن امتناني للأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم الذي رحب بهذه الترجمة ضمن إصدارات دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وأخص بكل عرفاني زوجتي التي ساندتني دوماً لإنجاز هذه الترجمة.

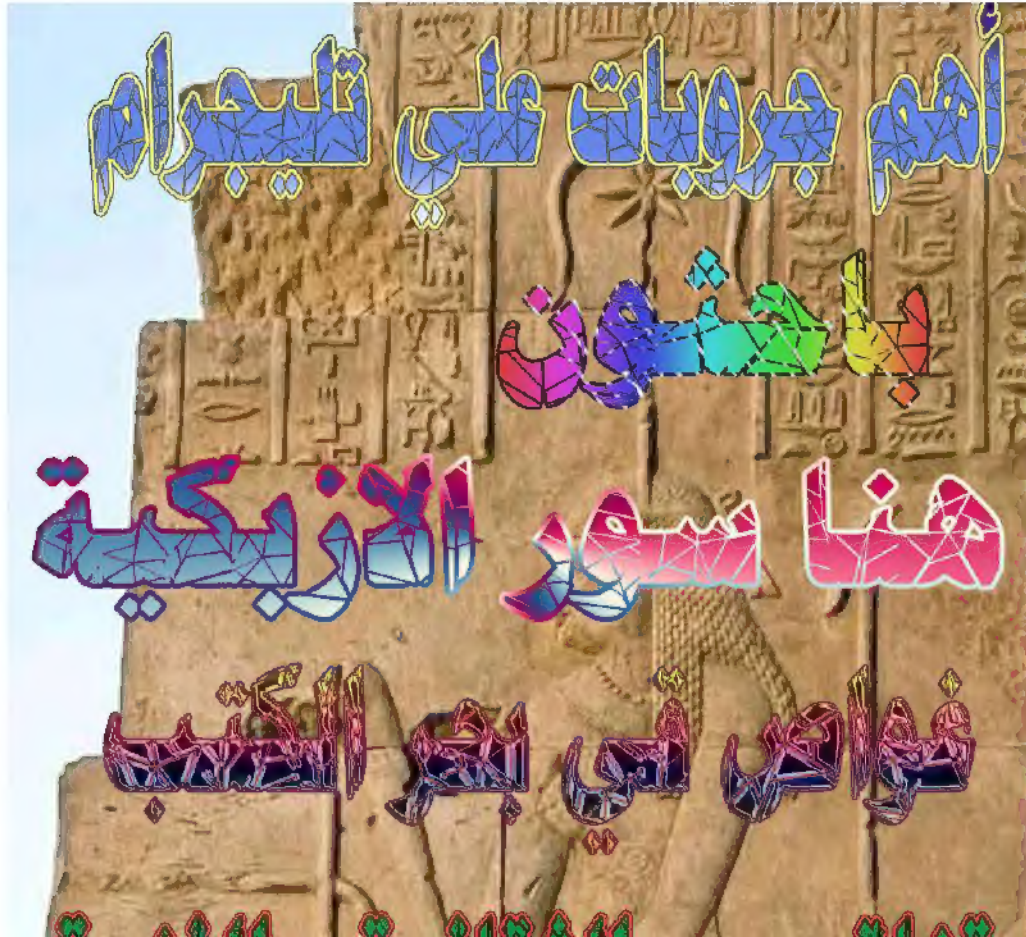

تقديم

للفريق أحمد علي فاضل

كانت عملية حفر قناة السويس تجربة فريدة في تاريخ تطبيق نظريات التقنية على أرض مصر . وقد قامت شركة خاصة فرنسية بشق القناة بسواعد وأموال مصرية. وأصبحت القناة دولة داخل الدولة . وبعد قرار التأميم الذي أعلنه عبد الناصر ليلة ٢٦ يوليو ١٩٥٦ استطاعت الإدارة المصرية ضمان الملاحة في قناة السويس وقد تحررت من الاستعمار وفجرت خبرات وطاقات اكتسبتها منذ افتتاح القناة في نوفمبر عام ١٨٦٩ .

لقد كان التأميم تحديا ... وكان لابد للإنسان المصري " إنسان القناة" من النجاح فلقد قامت هيئة قناة السويس بعدة مشروعات لتطوير المجرى الملاحي وذلك بتوسيعه وتعميقه ليواكب التطور العالمي في أحجام وحمولات السفن وناقلات البترول، وقد أثمرت عمليات التطوير في تحقيق معدلات إنجاز فاقت بكثير جداً ما حققته خلال تاريخها، وذلك بالرغم من المعوقات والحروب خاصة ظروف عدوان ١٩٦٧ التي أدت إلى إغلاق القناة لمدة ثماني سنوات تم فيها تهجير البنية الأساسية في معظمها .

ومنذ إعادة فتح القناة في ٥ يونيو ١٩٧٥ وحتى اليوم برز تطور هائل في ملامحها وذلك لتعويض فترة وقف الملاحة واللاحق بما حدث من تطور في الأساطيل العالمية وتقنية بناء السفن والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الرقابة ... وعند التفكير في إعادة الافتتاح وضعت الإدارة المصرية خطة طموحة وأجرت دراسات مستفيضة لكيفية وشكل التطور والأسلوب. وكان من أبرزها عمل التفريعات ودراسة أماكنها وهي ضرورة حتمية لزيادة الطاقة التصريفية للمجرى الملاحي وسرعة عبور السفن إلى البحر المتوسط ، بالإضافة إلى تقليل المنحنيات لسهولة عبور السفن الطويلة وذات الحمولة الكبيرة ، حتى أصبحت القناة قادرة على استقبال جميع سفن الأسطول العالمي ، معظمها بكامل حمولتها، وبعضها بحمولة مخفضة أو فارغا حسب الغاطس المسموح به. وكان يجب مع ذلك تطوير أسطول الكراكات بإضافة الأعداد والنوعيات اللازمة لتغطية المجرى المائي ذي الخصائص المتغيرة في نوعية التربة في قاع القناة من تربة خفيفة ومتوسطة إلى تربة شديدة الصلابة.

وبالتالي كان من الضروري بمكان أن توفر الإمكانيات المادية اللازمة لتطوير معدات الخدمات الملاحية وترسانات الهيئة والورش وذلك بالإضافة إلى رفع مستوى العاملين في قناة السويس في المجالات الثقافية والتعليمية والدينية والاجتماعية والرياضية وتوفير الرعاية الطبية لهم وأسراهم ، كما تم تطوير المدارس البحرية ومركز التدريب الفني واستخدام محاكي لتدريب المرشدين ورفع مستواهم ليصبح على المستوى اللائق في التعامل مع التقنية المتقدمة.

وبالنظر إلى ما جاء في هذا الكتاب القيم عن تاريخ ممارسات التقنية في ورشة حفر قناة السويس ... يمكن القول بأنه قد تم استيعاب التحديث من قبل المصريين وكذلك أساليب العمل التي ساهمت في لجاح هذا الطريق البحري المتميز منذ وصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

وتواصل هيئة قناة السويس خطة التطوير بواسطة معادها وكراكها بدون مقاول أجنبي أو قروض للوصول إلى المستهدف النهائي لغاطس ٧٢ قدماً بعد أن وصل إلى ٦٢ قدماً في عام ٢٠٠٣ ، ومساحة القطاع المائي إلى ٦٧٥٠ متراً مربعاً في عام ٢٠٠١ وبينما هو الآن ٤٨٠٠ متراً مربعاً لأن العالم الذي توقف عن بناء ناقلات البترول العملاقة التي تجاوزت حمولة الواحدة منها ٥٠٠ ألف طن من خام البترول منذ أواخر السبعينات لخطورتها البيئية وعدم جدواها ، قد اتجه فعلاً إلى بناء سفن ذات بدن مزدوج (صديقة للبيئة) سيصل الحد الأقصى لحمولة السفينة الواحدة إلى ٣٦٠ ألف طن .. وبذلك تستطيع استيعاب عبور ٩٢% من حجم وحمولة الأسطول العالمي بكامل حمولتها والباقي بحمولة جزئية.

وقد حققت قناة السويس إيرادات بلغت أكثر من ٤٠ مليار دولار خلال الفترة منذ إعادة افتتاحها عام ١٩٧٥ حتى الآن (٢٩ عاماً تحت الإدارة المصرية) وهو ما يعادل أكثر ١٥ مرة مما تحقق خلال ٨٧ عاماً تحت الإدارة الأجنبية قبل التأميم. كما تعتبر إيرادات السنة الميلادية الأخيرة والتي بلغت أكثر من ٢,٦ مليار دولار رقماً قياسياً غير مسبق في تاريخ القناة وبداية خير وفسر لأبناء مصر.

ويعتبر ذلك إنجازاً فاق بكثير ما حققته إيرادات القناة خلال تاريخها وستظل قناة السويس شريان الخير لمصر وللعالم على مر الأجيال ... وندعو كل الباحثين ليفتحوا في أروقة التاريخ أبوابها يطلون منها على صفحات خالدة ... خلود وتضحيات وعطاءات إنسان قناة السويس ... وضياء للأجيال فتتدي بنوره لجهاد الأبناء والأجداد .

مقدمة الكتاب

لقد تم بافتتاح قناة السويس للملاحة إنجاز مشروع وصل البحرين قديم العهد : البحر المتوسط والبحر الأحمر. وقد احتل يوم ٢٠ نوفمبر ١٨٦٩ وهو تاريخ هذا الحدث مكانة بارزة بين جميع الأحداث التاريخية العامة ، وشهدنا بعد حفر القناة نهاية " البحيرة المتوسطية " - حسب قول فرناند بروديل (Fernand Braudel) - كما شهدنا بداية تغير جغرافي كبير في حركة التجارة الدولية. فمنذ ذلك الحين لم تعد السفن التي كانت تربط الشرق بالغرب مضطرة للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وبعد إنجاز هذا العمل الضخم وبدء الملاحة بالقناة لحظة مهمة في تاريخ تلك الحقبة، فقد أثر تأثيراً عميقاً في نفس الوقت على تاريخ مصر الحديثة وتاريخ الدبلوماسية الدولية والتاريخ الاقتصادي والمالي وكذلك تاريخ التقنيات. ذلك أن ورشة حفر قناة السويس قامت بها شركة فرنسية خاصة وشاركت الحكومة المصرية بما يقرب من نصف التكلفة واضطرت للاستدانة التي كانت سبباً في إفلاس البلاد بعد سنوات قليلة مما أدى إلى احتلال الإنجليز لمصر عام ١٨٨٢ .

وقد شغلت هذه القضية في عصر الإمبراطورية الثانية صميم العلاقات الدبلوماسية الإنجليزية الفرنسية ونتج عن ذلك اجتماعات سرية ومؤامرات و اتصالات مكوكية قامت بها دواوين القناصل الفرنسية أيضاً ؛ والإنجليزية وخاصة الدواوين المصرية والتركية . فلم تكن تري إنجلترا في الواقع بعين الرضا استقرار الفرنسيين بمصر لاسيما وأهم على وشك فتح طريق مائي يختصر الطريق إلى الهند بشكل جوهري . و أخيراً يعتبر هذا المشروع مغامرة مالية فبعد أن كان رأس ماله في البداية ٢٠٠ مليون فرنك فرنسي تم جمعها بصعوبة بالغة من المساهمين وبعد أن كادت الشركة تعلن إفلاسها مرتين في عامي ١٨٦٤ و ١٨٧٢ أصبحت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية من أهم وأغنى شركات الشرق الأوسط. وسوف نتعرض لدراسة كافة جوانب تاريخ حفر خليج السويس ، ولكن فضلنا دراسته كحدث في تاريخ التقنيات ونفق مع لوسيان فابر (Lucien Fabvre) في أن : " كل عصر له تقنيته وإن هذه التقنية تعبر عن أسلوب العصر " ويوضح هذا الأسلوب مدى الترابط والتداخل في الأحداث الإنسانية وكيف - لو شئنا القول - تتأثر التقنية بما يمكن تسميته التاريخ بوجه عام وفي نفس الوقت كيف تؤثر على هذا التاريخ ^(١) . وسوف نتعرض

في دراسة حفر قناة السويس، قبل كل شيء ، للممارسات التقنية والفنية والدبلوماسية الإنجليزية والشئون المصرية وكذلك لأوساط المصاهير الفرنسيين.

الورشة : موضوع بحث جديد ، وجهة نظر جديدة ومستوى تحليلي جديد

ما معنى لفظ الورشة (chantier) الورشة اسم مشتق من اللغة اللاتينية كانتريوس (cantérius) ويقصد به الفسكول أي " الجواد الرديء " واليوم كلمة ورشة لها أكثر من مدلول حسب المعجم الفرنسي روبر (Robert) فهي : " سناد يوضع عليه البراميل " أو " عملية تكديس المواد (للبناء) " أو " المكان الذي تكديس فيه المواد " ، وفي اللغة الفرنسية الجارية لفظ ورشة يعني " الفوضى " ، وقد اخترنا واحدة من هذه التعريفات وسوف نقوم بتوضيحها ونقصد بالورشة المكان الذي توضع فيه المواد بهدف استخدامها وبشكل أكثر شمولاً تعني هذه الكلمة مساحة حدودها غالباً مبهمة توضع فيها المواد وتستخدم كسند مادي للأشغال. وسوف نستعمل أيضاً كلمة ورشة بمدلولها الواسع لنشير إلى الأعمال الجارية التي بدأت ولكن لم تنته بعد .

فالورشة هي عمل محدود بالزمان والمكان معاً أو بموقع الإنتاج ومدة إنجازها . وبناء عليه نقصد بورشة قناة السويس المكان الجغرافي الذي يحيط بالقناة المراد حفرها والذي يجري فيه العمل ونقصد بها أيضاً الفترة التي بدأت منذ أول ضربة فأس ضربت رسمياً في ٢٥ أبريل عام ١٨٥٩ حتى فتح القناة للملاحة بعد عشر سنوات. ولكن الورشة أيضاً طريقة إنتاج خاصة في قطاع الأشغال العامة وسنعمل جاهدين على كشف صورها المادية وأشكالها الملموسة وكذلك فهم كيف تم الوصول من الفكرة الأولى إلى المنتج النهائي.

ويقودنا تعريف الورشة إلى أن نتساءل عن الحدود اللغوية التي تميز الورشة عن مكان إنتاج آخر ألا وهو المصنع. ونلاحظ في بداية الفحص أن تفرّد الغاية المنتجة من قبل الورشة تتعارض مع تعددية وتجانس الإنتاج الصناعي . و تتميز الورشة أيضاً عن المصنع بطابعها المؤقت وبكونها في مكان مكشوف^(٢).

ومما يدعو للدهشة أن الفضول الذي دفعنا لدراسة الورشة لم يشاركنا أحد فيه بالفعل من قبل. وإذا ما كان اهتمام التاريخ ينصب في الواقع على دراسة المشروعات الكبرى من حيث نتائجها قبل كل شيء ، فنادرًا ما عني بالعمليات التقنية التي أتاحت إنجاز هذه المشروعات . وفي الحقيقة يبرز الفحص الدقيق لبيبلوغرافيا (bibliographie) هذه الدراسات أنه باستثناء الأعمال المتعلقة ببناء الكاتدرائيات^(٣) ، أن موضوع الورشة لم يدرس إلا قليلاً^(٤) ووجدنا أننا بصدد موضوع

يكاد لم يطرح من قبل^(٥). ونسأل : هل يمكن أن يعتبر الشخص العابر الذي يتوقف قرب ورشة في المدينة ليلقي نظرة يتخللها الفضول من بين الألواح الخيطة بها هو وحده الذي يهتم بموضوع الورشة ؟ ومن الممكن عرض عدة أسباب بشأن نقص هذا الاهتمام يرجع أولها إلى مصدر طبيعة المواقف المراد رصدها والتي هي في جوهرها مؤقتة . فمن النادر أن تترك الورشة لها أثراً سواء في موقع العمل أو في وثائق ورقية . فبمجرد انتهاء العمل تختفي بسرعة آثار العقبات التي تم التغلب عليها وكذلك الطاقات التي بذلت ويعاد شغل المكان وترتيب موقع العمل . وأخيراً نلمس هنا سمة هامة تخص قطاع البحث هو أن الأسلوب الشفهي المتبع تقليدياً في نقل المعلومات والمهارات وباختصار في نقل ثقافة الورشة ، لا يساعد - مما لا شك فيه - على كشف النقاب عن سر الغموض الذي يكتنفها. وفي هذه الظروف تبدو مهمة المؤرخ الذي يستند عمله أساساً إلى بقاء الأثر ، جد عسيرة. وقد تكون هذه الأدلة غير مرضية تماماً. ونسأل لماذا كان الاهتمام في أكثر الأحيان ينصب على دراسة المشروعات ونادراً ما ينصب على الورشة ؟ ويمكن أن نجد تفسير هذا الأمر فيما وصفته هيلين فيران (Vérin Hélène) " بالاحتقار الدائم للفنون والمهن^(٦) " الفكرة التي ترى أن تقنيات الأشغال العامة يمكن أن تولد في أحوال الورشة هي فكرة غير لائقة قطعاً، والأكثر منها طمأنينة وملاءمة هو ترويج صورة تقنية نقية تولدت عن الحسابات التفاضلية والتكاملية للصرح الذي ينتجه مباشرة الرسم المنجز .

و تمثل دراسة الورش بالإضافة إلى ضرورة تقديم صورة أكثر مطابقة لطبيعة التقنيات المستخدمة ، تحدياً للمعرفة الراهنة . ونظراً لصفاتها المميزة ولاسيما الجزء الكبير الذي تشكله مخاطر هذا المنتج وتفردده ، تبدو الورش في الواقع قادرة على " تشكيل تصور جديد للنشاط الاقتصادي يتناسب مع الأنشطة الحديثة " ^(٧).

وقد سعينا عند اهتمامنا بالورشة إلى تغيير زوايا تحليل التاريخ التي اقتصرنا حتى الآن على عالم الأشغال العامة الضيق وموضوعاته وتقنياته والفاعلين فيه. فقد تناولت الدراسات المعروفة بتاريخ الأعمال الهندسية بأساليب مختلفة بعضها يركز على دراسة شركات هذا القطاع ^(٨) أو على مدارس المهندسين وما توفر من معارف أو تقدمه من نماذج ^(٩) والبعض الآخر اهتم بإعادة تطوير نموذج إنشاءات معين ^(١٠) أو آلة ^(١١) أو بدراسة تاريخ إنجاز ما ^(١٢) أو حياة شخص ^(١٣) بل أيضاً تكنولوجيا خاصة وختاماً قام آخرون بتقديم تحليلات تستند إلى تصورات نظرية أو إلى مستوى من الدراسات أكثر حداثة مثل (تهيئة الأراضي والشبكات أو ظواهر التنظيمات الاجتماعية... الخ) ^(١٤). ووجدنا أنفسنا في مفترق هذه الدراسات عندما جعلنا الورشة موضوعاً تاريخياً للدراسة. وفي نفس الوقت دفعتنا هذه الدراسة فعلاً إلى التساؤل عن المواد والتقنيات والمهندسين والشركات

والتنظيمات والمعلومات والمهارات وكذلك إلى كشف العوامل التي تربط بينهم . بالإضافة إلى ذلك ولأنها تصف قطاع خاصاً للإنتاج هو قطاع الأشغال العامة ، فقد بدت لنا الورشة وكأنها نقطة سديدة لرصد أحوال هذا القطاع الفني والمهني .

ولا ندعي أننا عندما غيّرنا نظرتنا إلى الأمور سوف نقدم رؤية أفضل ، بل نظرة أخرى أو ربما شيئاً آخر . ومن وجهة نظرنا هذه نجد أن دراسة الورشة قد غيرت أيضاً درجة الملاحظة والرصد . فعلى عكس المناهج التي تفحص خلال فترة طويلة ثوابت وفواصل الظواهر الضخمة فإن الدراسة التي تجعل من الورشة موضوعاً تاريخياً تندرج في إطار تيار تأريخي يقترح دراسة مكثفة لموضوعات محددة . ويكمن الرهان على هذه الدراسة في أنه يتيح التحليل العميق لتعقيدات وديناميكيات المواقف دون أن يترك جانبا الهياكل والاتجاهات الأكثر ثقلًا.

إن إعادة صياغة العثرات والأخطاء استناداً إلى هذه التجربة بغض النظر عن الرجوع إلى الماضي بوهم بالتطور الخطي . إن وللتاريخ طريقته الخاصة في الصقل وبدراسنا لورشة معينة فنحن نرجح تحديد مستوى ملاحظة أكثر دقة على فترة أقصر من غيرها مقارنةً بالتحليلات التي تُقدم عادةً عن قطاع هذا النشاط . ومن ثم ، يمكننا إبراز الصعوبات والمعضلات التي اعترضت تاريخ مسار التقنيات والتي لا تظهر غالباً ، وإعطاء أهمية بالغة للضرورة للضغوط التي بدت والتسويات التي تم التوصل إليها . وهدفنا على وجه الخصوص هو إفساح المكان المناسب لما يمثلته الفشل والموانع والمحاولات العقيمة والبحوث المترددة و التجارب الأولية والعراقل والصعوبات التي رغم تعقيدها للرواية التاريخية تساعد على سرعة فهم الظواهر المدروسة.

تحليل الممارسات وإتاحة الفرصة اللازمة للفاعلين

يتوافق الاهتمام بالورشة مع اختيار ذي طبيعة منهجية . فهو يستجيب للاهتمامات الخاصة باللجوء إلى تاريخ ينبي على تحليل الممارسات ، كما يستجيب للرغبة في إفساح مكان عريض للفاعلين . ويرجع أساس هذا العمل في الواقع إلى الاقتناع العميق بأنه من الضروري لمن يريد أن يعي التقنيات أن يعتبرها نتاجاً لنشاط بشري . وسوف نتبع في هذا المضمار ما كتبه أندريه جورج هودريكور (André Georges Haudricourt) : " من الواضح أن أهم شيء في الإنتاج الصناعي هو وجهة نظر الإنسان في صنعه واستخدامه له وإذا كانت التقنية تعتبر علماً فذلك لأنها علمٌ نتج عن نشاط إنساني" ^(١٥) وعلى نفس المستوى نتبنى فكرة تعريف الفاعلين وفقاً لأعمالهم وممارساتهم . وهكذا نساهم بدراسة ما يقوم به الرجال من أعمال في الورشة لتتعرف عليهم ؛ بالإضافة إلى ذلك يعد هذا الأسلوب وحده هو الذي يتيح تجنب الوقوع في فخ الألفاظ

والتعريفات المتداولة. فقد نتخذنا الكلمات التي تجعلنا نعتقد في وجود أشياء وأهداف طبيعية^(١٦). وفي اعتقادنا أن لفظ مهندس من بين هذه الألفاظ . وقد سبق مرارا إيراد^(١٧) غموض هذا اللفظ فلقب مهندس يشير إلى شهادة علمية وإلى درجة من درجات السلم الوظيفي وإلى وظيفة مازالت غير محددة المعالم. ومع مرور الزمن ، برز بشكل واضح التطور النسي لحجم هذه المكونات وإن... ملابساتها ولعل ملاحظة الطابع المتأخر للحقائق التي يتضمنها اللفظ ، تساعد علي تحديد استعماله وعلي عدم اعتباره حقيقة "فوق تاريخية" . وسوف نقابل عند دراستنا لورشة قناة السويس أفراداً ممن يحملون لقب مهندس وآخرين لا يحملونه . وسوف نحاول جاهدين بصرف النظر عن وجود اللقب أو عدم وجوده أن نصف ما قام به كل منهم من عمل دون افتراض مسبق بما يجب عليه عمله ، وبصورة عامة ولكي لا نقع في أخطاء التمييز المسبق سوف نطلق لفظ فنيين علي العاملين في مهام لها طابع تقني ومرتبطة بالأشغال باستثناء العمال. وسوف نركز انتباهنا عند كتابة تاريخ ورشة قناة السويس علي ممارسات الفنيين ليكون تاريخ قناة السويس هو تاريخ فاعلي التقنيات ووجهة النظر هي وجهة نظرهم المميزة.

وعلاوة علي تحليل الممارسات لذاتها، فقد بدا لنا مثراً للاهتمام القيام بدراستها قياساً إلى أساليب الممارسة بل أيضا استناداً إلى النماذج والنظريات التي كانت في متناول الفنيين. وسنحاول بهذه الطريقة أن نظهر التفاوت والتشعب والاختلافات وأن نبرز التعديلات والتكيفات والتغيرات أو علي العكس التشابهات وعمليات النتائج ، كما يجب علينا أن نجتمع المعلومات عن قدرات الفنيين الثقافية والتقنية ومؤهلهم الأصلية ومسرقهم الوظيفية .

فليس الهدف هو كتابة تاريخ استناداً إلى خطابات رسمية أو تصريحات تعبر عن النوايا أو الخطط أو النظريات، ولكن الهدف هو التركيز قدر المستطاع على الأفعال والخبرات التي اكتسبت وأن نقترّب من الأفراد المنخرطين في عملهم اليومي بل أيضا من الشخصيات التي تتميز بمعتقداتها الراسخة وأحاسيسها وحتى بآرائها المسبقة أحياناً .

المصدر الرئيسي: وثائق الشركة العالمية لقناة السويس البحرية

لا يمكن الادعاء بأن حفر قناة السويس موضوع لم يدرس من قبل ، بل علي العكس من ذلك ، فقد ساهم عدد كبير من المؤرخين اعتماداً على آراء تتراوح بين التحيز والمهارة في الإطلاع على هذه المغامرة التي تتميز بكونها دبلوماسية سياسية ومالية واقتصادية وقانونية واجتماعية والفنية^(١٨) علي حد سواء.

ويتميز هذا الإنتاج الضخم بوفرة الأعمال التي تستند إلى كتابات غير أصلية وبندرة الدراسات المبكرة ويكاد يعتمد هذا الإنتاج الغزير على كتابات فردينان ديليسبس التي ظلت لمدة طويلة المصدر الوحيد المتوفر^(١٩). ولا جلوى من البحث عن شهادات أو عن تصريحات عامة أدلى بها العاملون بالورشة لأن دي ليسبس، في الواقع، احتفظ لنفسه بحق نشر المعلومات - أو مانقول عنه اليوم بالإعلام - وفرض الصمت على الجميع وأصدر تعليماته إلى جميع العاملين بالشركة من الأوروبيين وخاصة الفرنسيين، كما سنرى، بموجب أمر إداري ينص على "الفصل من العمل في حالة التصريح بمعلومات أو غواطر عن شئون الشركة إلى وكالات الأنباء والصحف التابعة لأي بلد كان أو إلى مجرد الأشخاص"^(٢٠).

وقد وجد الخطاب الرسمي - أي الدعاية؟ - صدى واسعاً في منشورات عديدة ومتنوعة؛ كما تحولت وارتقت الأحداث والمشاعر التي تضمنها هذا الخطاب إلى حقائق وأما ما تم السكوت عليه وكتيمانه عمداً أو بغير عمد فقد اعتبر وكأنه لم يكن. ولا توفر المستندات الخاصة بحياة الشركة - محاضر جلسات مجلس الإدارة أو تقارير الجمعية العامة للمساهمين - أية عناصر يمكن في الواقع الاعتماد عليها فالأمر يتعلق بأقوال مطمئنة لكسب ثقة حاملي الأسهم. كما يجب أن نتناول بحذر المصادر المطبوعة بشأن هذا الموضوع. وكان من الضروري في كل مرة البحث عن الصلة المحتملة بين الكاتب وما تم إنجازه كما عبر أحدهم بوضوح عن ذلك في قوله: "تتضارب مصالح من ضروب متنوعة حول مسألة خليج السويس فكل شخص له دور في هذه المسرحية المعقدة يتقدم على خشبة المسرح ليؤدي نصا يحتوي على حقائق غير مكتملة وإبانات مشبوهة وأكاذيب مقنعة". فقد كانت حتى الآن مسرحية اجتماعية هزلية [...] تقدم عرضاً لمقالات بعضها مؤيدة وأخرى معارضة لقناة السويس واستشارات وإعلانات محضرين ومآدب وأحكام صادرة عن المحكمة المدنية^(٢١).

و من أمثلة هذا النوع من الكتابة نجد الجريدة نصف الأسبوعية: خليج السويس، جريدة وصل البحرين، التي ظهرت من عام ١٨٥٦ حتى عام ١٨٧١. و تعتبر مصدراً هاماً عن أخبار الورشة ولكن يجب استخدامها بحذر وينبغي ألا ننسى أنها حقاً لسان حال الشركة الرسمي.

و خلاصة القول، يستند هذا البحث أساساً إلى تعقب آثار نشاط الورشة - من التقارير والمراسلات والرسومات والأوامر الوظيفية، الخ - التي حفظت في وثائق الشركة العالمية لقناة السويس البحرية^(٢٢). وقد قام فوزان مدير عام أعمال الورشة في ذلك الوقت باستخدام هذه الوثائق في بداية القرن ليكتب تاريخ قناة السويس ولم يتردد في نقل نصوص كثيرة من المذكرات التي كتبها بنفسه أثناء العمل^(٢٣). ورغم ذلك فإن المعلومات التي تركها جانباً لم تكن بالتأكيد

أقل أهمية كما أن ما ضرب صفحاً عنه قد يفتح أمامنا سبلاً. ويشغل جمع وثائق هذه الشركة الخاصة - بحجمها الضخم مساحة ١٦٠٠ متراً من الأرفف - وهي الوثائق التي لها علاقة بأعمال الشركة حتى عام ١٩٥٦، ومنذ أن وضعت في دار المحفوظات الوطنية لم تستغل إلا قليلاً^(٢٤) ونأمل أن تساهم دراستنا في الإطلاع على هذه الوثائق التي توضح أن دراسة آثار مؤسسة لا يخدم حتماً وبالضرورة منطق التسلسل التاريخي لنجاحات أو فشل الشركة المعنية.

لقد كان من الضروري البحث في دار المحفوظات ومكتبات مدارس المهندسين الرئيسية والمؤسسات العلمية والفنية بفرنسا^(٢٥) بل أيضاً البحث في مستندات إدارة الأشغال العامة^(٢٦)، وذلك لتحديد أهم الفنيين المؤثرين في الورشة ومعرفة تكوينهم ومسيرهم المهنية وإدراك السياق التقني في ذلك العصر. وأخيراً ساعدت المصادر المطبوعة والسجلات الوثيقة^(٢٧) باللغة الفرنسية على إلقاء الضوء على بعض مظاهر التاريخ المصري^(٢٨) التي تم هذه الدراسة.

الابتكار: إشكالية مركزية

قد اتضح من تحليل الشروط العملية والظروف المادية لإنجاز قناة السويس أن الانتهاء من مثل هذه الأعمال الضخمة أمكن تحقيقه بفضل التوفيق بين ابتكارات متعددة. فقد شغلت فترة إعداد وتنفيذ هذه الابتكارات بطبيعتها المختلفة لب موضوع هذا الكتاب وساعدت على تنسيق مادته.

وفي البداية سوف تبين دراسة سنوات العمل الأولى في الورشة مدى سوء تقدير صعوبة عملية حفر قناة السويس فقد تبين أن المهام المتعددة المراد القيام بها هائلة وأن تغييراً في تقييم المشاكل المراد حلها قد تم مع هذه الأشغال بأبعادها الضخمة والتي علاوة على ذلك تدور في قلب الصحراء. وبالإضافة إلى ذلك اختلطت المشاكل المرتبطة بالأشغال بأحداث غير متوقعة ولها صلة بالظروف الدبلوماسية والسياسية وأيضاً بشدة التوترات التي تنشأ بين مختلف الفاعلين. وقد أتاح الفشل في بداية الأمور إبراز طبيعة المشاكل العظمى المراد التغلب عليها وهي ترجع أساساً إلى أمرين الأول تنظيمي والثاني يحصر المعنى تقني. وقد وضح مدى قصور الاختيارات الأولية لمواجهة ما كان لابد من تصور حلول جديدة. وكان من الضروري تحليل هذه المرحلة الأولى الصعبة لفهم الابتكارات التي تم تطبيقها بنجاح فيما بعد. ولا يمكن فصل تاريخ البدايات الفاشلة وفهم العاملين تدريجياً لطبيعة الصعاب الحقيقية المراد التغلب عليها عن مراحل تكون عملية الابتكارات.

وسوف نتفحص بعد ذلك التنظيم الإداري الجديد الذي وضعته الشركة للتنسيق بين أنشطة الورشة المتعددة ولضمان إدارة فعالة بين جميع العمليات المشتركة . وسوف يكشف تحليل هياكل هذا التنظيم و العناصر المختلفة التي تشكله وأيضا أسلوب تشغيله وما تحتويه مناهجه من خصائص حديثة . وسوف تساعد الدراسة الدقيقة الخاصة بالكشف عن مصادر اختيار العاملين والمسيرات المهنية للفنيين الذين تم توظيفهم ، على التعرف على أصل النموذج الذي أخذ عنه هذا التنظيم وعلى إدراك أعماق لأسباب التوافق الذي حدث في نهاية الأمر بين مختلف أساليب العمل.

وسوف نولي بعد ذلك اهتمامنا لمناهج وآليات الإدارة وطبيعتها ومصادرها ونحاول تقدير فاعليتها في عدة قطاعات مثل قطاع التموين والاتصالات.

ومن ثم سوف نكتشف أن مناهج الممارسات التي كانت سائدة في مجال إدارة الأعمال كانت تطبق أيضا في قبة الموقع وفي تنظيم الحياة الاجتماعية في خليج السويس عن طريق الخدمات الخاصة بالصحة والشعائر الدينية والأمن.

وتبقي بعد حل مشاكل التنظيم الإداري والاجتماعي والمكاني ، عملية البحث بدقة عن أساليب فنية بحته تطبق في بناء الأرصفة ومنارة بور سعيد وتوصيل المياه العذبة إلى الجزء الشمالي من الخليج وبصفة خاصة إنجاز أعمال الحفر ورفع ملايين الأمتار المكعبة من القناة البحرية . وسوف تساعد عمليات متابعة تطوير الآليات والمناهج الحديثة بعد وضعها في سياق تقني أكثر شمولية ومتابعة مسيرات المقاولين الذين شاركوا في إعدادها على تحديد وكشف ديناميكيات الابتكار والتجديد .

وأخيرا سوف تساعد عملية فحص خصائص هذه المشروعات المبتكرة مع تحليل دور العاملين بها ودور العلم على تحسين فهمنا لكل هذه الآليات.

هوامش المقدمة

- 1) Lucien Febvre, « Réflexions sur l'histoire des techniques », History and Technology, vol.1, 1983, p. 19.

٢) أما الترسنة فيبدو أنها تقع بين الاثنين .

- 3) Jean Gimpel, Les bâtisseurs de cathédrales, Paris (noté P. dans ce qui suit), Le Seuil, 1980, 127 p. Pierre Du Colombier, Les chantiers des cathédrales, P., Picard, 1973, 189 p. Philippe Braunstein, « Les débuts d'un chantier : le dôme de Milan sort de terre en 1387 », in Odette Chapelot et Paul Benoît, Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Age P., EHESS, 1985, pp. 81-101. Les chantiers de la Renaissance, actes du colloque qui s'est tenu à Tours en 1983-1984. P., Picard, Coll. "De architectura", 1991, 288 p.
- 4) Une exception : Donatella Calabi et Paolo Morachiello, « Le pont du Rialto : un chantier public à Venise à la fin du XVIe siècle », Annales ESC, n° 2, mars-avril 1988, pp 453-476.

٥) رغم ذلك ، نذكر كتاب جان ميسكي. الذي يطرق عرضاً موضوع الورشة.

- Jean Mesqui, Le pont avant le temps des ingénieurs, P., Picard 1986, 303 p
- 6) Hélène Vérin, La gloire des ingénieurs. L'intelligence technique du XVIe au XVIIe siècle, P., Albin Michel, 1993, p. 23.
- 7) Claire Hocquard, « Le modèle du chantier », Gérer et comprendre, annales des mines, décembre 1989, p. 74
- 8) Dominique Barjot, La grande entreprise française de travaux publics (1883-1974) : contraintes et stratégies, thèse de doctorat d'Etat, université de Paris IV-Sorbonne. 1989.
- 9) Antoine Picon, L'invention de l'ingénieur moderne, P., Presses des Ponts et Chaussées, 1992, 768 p
- 10) Marcel Prade, Ponts et viaducs au XIXe siècle, Poitiers, Brissaud, 1988, 407 p. ; Georges Reverdy, Les routes de France au XIXe siècle, P., Presses des Ponts et Chaussées, 1993, 263 p. ; Bernard Marrey, Les ponts modernes. XVIIIe-XIXe siècles, P., Picard, 1990, 319 p. et Les ponts modernes . XX siècle ,P., Picard, 279p.
- 11) Bertrand Lemoine, L'architecture du fer, Champ Vallon, Coll. « Milieux », 1986, 321p. ; André Guillaume, Bâtir la ville. Révolutions industrielles dans les matériaux de construction. France- Grande-Bretagne (1760-1840), Champ Vallon, Coll « Milieux », 1995, 315 p.
- 12) Bertrand Lemoine, Le tunnel sous la Manche, P., Le Moniteur, 1991, 192 p.
- 13) Anne Coste, Antoine Picon et Francis Sidot, Un ingénieur des lumières. Emiland-Marie Gauthey, P., Presses des Ponts et Chaussées, 1993, 279 p.
- 14) André Guillaume, Corps à corps sur la route. Les routes, les chemins et l'organisation des services au XIXe siècle, P., Presses des Ponts, 1984, 172p. André Guillaume, Genèse du concept de réseau. Territoire et génie en Europe de l'Ouest 1760-1815, dact., rapport de recherche DRI. Laboratoire théorie des mutations urbaines en pays développés, université de Paris VIII, 1988. Bernard Le petit, Chemins de terre et voies d'eau Réseaux de transport. Organisation de l'espace, P., EHESS, 1984, 148 p.
- 15) André-Georges Haudricourt, La technologie science humaine - Recherches d'histoire et d'ethnologie des techniques, P., Editions de la MSH, 1987, p. 38.

16) Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, suivi de Foucault révolutionne l'histoire, P., Coll. « Point », Seuil, 1978, p. 215.

17) André Grêlon, « Les ingénieurs , encore », Culture technique, n° 12, 1984, pp. 11-12. Hélène Vérin, « Le mot : ingénieur », Culture technique, n° 12, 1984, pp. 19-27.

١٨) تعتبر مراجع جيل شارل رو أكثر المراجع الشاملة وهي " مراجع الخليج وقناة السويس "

L'isthme et le canal de Suez, P., Hachette, 1901, tome 2, pp. 466-540 . وتشمل ١٤٩٩ وثيقة

نشرت بين ١٧٦٦ و ١٩٠١ في ثلاث عشرة لغة . وقد قام جان إدوارد جوبي باستكمال هذه المراجع في حينه في كتاب نقد مراجع خليج السويس .

Jean-Edouard Goby : « Bibliographie critique de l'isthme de Suez », Bulletin de la SEHGIS, tome V, 1954, pp. 237-256.

١٩) فردينان دي ليسبس : حفر خليج السويس . محاضرة ووثائق رسمية صدر في ٦ أجزاء وبعد ذلك نشر رسائل ، جريدة ووثائق لمعرفة تاريخ قناة السويس في ٥ أجزاء .

Ferdinand de Lesseps, Percement de l'isthme de Suez. Exposé et documents officiels, P., Plon, 1855-1869, 6 vol., puis F. de Lesseps : Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire du C. de Suez . P. Didier, 1875-1881 5 tomes.

٢٠) AN 153AQ/TE142(أمر إداري رقم ٦٤ بتاريخ ٢٤ يناير ١٨٦٢ . تم تنفيذ التهديد: " تم طرد الموظف الذي كتب ما يسي إلى الشركة "

in Note de M. Bernard, 1866. CNAM/CDHT. Fonds Couvreur. Doc. 4375.

21) Stanislas Champein, Simple discours sur l'isthme de Suez, Chez l'auteur, 1864, pp. 1 et 8.

٢٢) اقدم الشكر لجمعية ذكرى فردينان دي ليسبس وقناة السويس التي أتاحت لي الإطلاع على الوثائق

الموجودة في دار المحفوظات الوطنية تحت رقم 153 AQ

٢٣) ترك فوازان بك مؤلفاً باسم : قناة السويس ١٩٠٢-١٩٠٦ من ٧ أجزاء وأطلس ويشمل الكل في ٢٦٨٠ صفحة. الكتاب غني بالتفاصيل المعقدة التي لا تسهل في أغلب الأحيان عملية القراءة ويحتوي على :

Atlas Voisin Bey, Le canal de Suez, P., Dunod, 1902-1906, 7 tomes Tome 1 :

1 - Historique administratif et actes constitutifs de la compagnie, première partie, période des études et de la construction, 1854-1869, 1902, 342p. ; tome 2 : I - Historique administratif et actes constitutifs de la compagnie, deuxième partie, période de l'exploitation 1^{re}) de 1870 à 1882, 1902, 318p. ; tome 3 : I - Historique administratif et actes constitutifs de la compagnie, deuxième partie, période de l'exploitation 1^{re}) de 1883 à 1902, 1902, 334p. ; tome 4 : II - Description des travaux de premier établissement, première partie, projets, dispositions adoptées en exécution, 1904, 412 p. ; tome 5 : II - Description des travaux de premier établissement, deuxième partie, exécution des travaux, 1906, 460p. ; tome 6.2 : II - Description des travaux de premier établissement, deuxième partie, exécution des travaux(suite), 1906, 294 p.

٢٤) بيان المخرودات غير سهل الاستعمال بل أحياناً اعتباطي لا يشجع على ذلك.

٢٥) في جزيرة فرنسا (باريس وضواحيها) : وثائق أكاديمية العلوم والمدرسة المتعددة التقنيات والمدرسة المركزية للفنون والصناعات وتاريخ هيئة البحرية والهندسة ومكتبات مدرسة الطرق والكباري (ENPC) والمدرسة الوطنية للفنون والحرف (CNAM)

26) A Paris : AN, série F¹⁴

(٢٧) في باريس : مكتبة أرمنال (الترسانة) (وثائق أنفانتان) و المكتبة الوطنية . ولي القاهرة : المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ودار الكتب (والوثائق القومية).

(٢٨) تجعلنا الدراسات التي تمت في هذا الصدد نعتقد أنه لا يوجد في مصر وثائق باللغة العربية لها صلة مباشرة بتاريخ الورشة . ومع ذلك فإن الموضوع الذي اخترناه ووجهة النظر التي قصدنا ترجيحها من غير المحتمل أن وجدت هذه الوثائق أن تفيد دراستنا.

الفصل الأول

عملية جريئة ومعقدة

بدأ حفر قناة السويس البحرية رسميا في أبريل عام ١٨٥٩ واستمر العمل أكثر من عشرة أعوام ، وقد واجهت هذه المغامرة التي قام بها فرنسيون على أرض مصر ، بدايات صعبة. فبجانب المناورات السياسية والدبلوماسية شكلت الظروف الجغرافية المعادية - خليج السويس عبارة عن صحراء - وصعوبة الحصول على الأيدي العاملة تحديات عديدة وسوف نقيس عبر تعدد وتنوع هذه التحديات مدى تعقيد وصعوبة العملية .

وتجاه الوضع الجديد، وتحت تأثير الضغوط السياسية والمالية ، تم اتخاذ بعض التدابير لإدارة الورشة وسوف تثبت التجربة عجزها .ومن الضروري لفهمها التغلغل في كواليس تنظيم الشركة الذي وضعه فردينان دي ليسبس والتعرف على مصدر السلطات الحقيقية وحصر أساليب اتخاذ القرارات وتحديد العلاقات بين الفاعلين بل أحيانا أيضاً معرفة شخصيتهم وإستراتيجيتهم الخاصة.

دي ليسبس يشرع بعزم في تأسيس الشركة

طلب فردينان دي ليسبس في ١٥ نوفمبر عام ١٨٥٤ من سعيد خديوي مصر الذي اعتلى العرش لتوه ، أن يمنحه حق امتياز تأسيس شركة حفر خليج السويس واستغلال " ممر صالح للملاحة الكبرى " وحصل على موافقة شفهية ، وكانت هذه البداية الحقيقية لتجسيد فكرة تراود الأذهان منذ أمد بعيد ^(١)


قناة : عربون الصداقة

تم تجسيد الموافقة الشفهية بتوقيع أول عقد تنازل في ١٩ مايو ١٨٥٥ ولم يكن الرجلان اللذان وضعاً توقيعهما أسفل العقد يجهل أحدهما الآخر، فقد عرف بعضهما منذ أكثر من عشرين عاما. إذ أن فردينان دي ليسبس قد شغل في الواقع منذ يونيو ١٨٣٣ منصب نائب القنصل في الإسكندرية ثم في القاهرة وذلك قبل أن يُكلف بمسؤوليات القنصلية العامة لفرنسا بمصر حتى أبريل ١٨٣٧ . وأثناء هذه الإقامة تعرف على سعيد، رابع أبناء محمد علي الذي ولد في عام ١٨٢٢ ، وأصبح صديقا له .وعندما علم فردينان دي ليسبس - الذي كان قد اعتزل عمله الدبلوماسي قبل المعاش على أثر عملية قام بها واستكرته الحكومة الفرنسية - بخبر تنصيب سعيد على عرش مصر، أسرع يطلب منه هذا الامتياز الذي حاول من قبله آخرون الحصول عليه لدى حكام مصر السابقين ،

وقد أتاحت له حينئذ العلاقة الشخصية التي تربطه بسعيد منذ سنوات مضت ، أن يوفق فيما فشل فيه من سبقوه .

وقبل أن يمنح الخديوي سعيد صديقه الموافقة وكي يقف بالتحديد على ما سيلتزم به من ارتباطات ، كلف اثنين من المهندسين الفرنسيين العاملين في خدمته وهما أوجين موجيل (Eugène Mougel) وأدولف لينان دي بيلفون (Adolphe Linant de Bellfond) بإعداد مشروع تمهيدي أعلن عنه رسميا في ٢٠ مارس ١٨٥٥ . ويقترح هذا المشروع حفر قناتين قناة بحرية ذات أهوسة وقناة ثانية صغيرة الحجم للري والمواصلات، كما يقترح إنشاء مينائين على طرقي القناة البحرية . ويسمى الاقتراح الذي اختير لمسار القناة البحرية إلى شطر الخليج لفصل البحرين بخط شبه مستقيم من الجنوب للشمال رابطا السويس على البحر الأحمر عند تل القراما (Péluse) بالبحر المتوسط . ويهدف التقرير ^(٦) الذي قدمه مهندسا الخديوي تحت عنوان مشروع أولي ، قبل كل شيء ، إلى إبراز الفائدة من إنشاء قناة عبر خليج السويس . وقد تم عرض أدلة تاريخية وسياسية وتجارية في ذات الوقت ، لمحاولة إقناع جمهور متشكك حيال ضرورة وإمكانية إنجاز المشروع . وبالمقابل فإن المشروع الأولي لم يتعرض لمسألة التقنيات المستعملة ولا للأساليب التي سوف تطبق ، ولم تخط الورشة سوى بتلميحات غير مباشرة واقتراحات مقتضبة وهو الأمر الذي لن يفل المهندسون في فرنسا ، فيما بعد عن الإشارة إليه ^(٧) . وتقدر المقايضة الملحقة بالمشروع الأولي مدة عمل الورشة بست سنوات و جملة تكاليف العملية بمائتي مليون فرنك .

ولم يكن توقيع سعيد باشا على أسفل نص تمت صياغته بناء على نتائج المشروع الأولي كافيا لحل وتجاوز كافة المعوقات السابقة لبدأ عملية حفر خليج السويس وكان لابد حينئذ الحصول على إنفاق في الإطار الدبلوماسي . إذ يجب عند حفر قناة ذات توجه عالمي بواسطة شركة خاصة و على أرض مصرية الحصول على إجماع دبلوماسي من جانب القوي الدولية العظمى . وقد عبرت إنجلترا فوراً عن عدايتها للمشروع ، إذ يخشى الإنجليز في الواقع حسب ما صرح به رئيس وزرائهم لورد بالميرسون (Lord Palmersson) : أن تكون القناة " خطة ميكافيليه ابتدعت لفصل مصر عن تركيا، وفي نفس الوقت قد تسهل وتمهد في الخفاء خطة اعتداء واستيلاء على الإمبراطورية الإنجليزية في الهند " ^(٨) . وبغية تحقيق أكبر قدر من الضمانات الفنية والدبلوماسية بل أيضا إبراز موقف إنجلترا كإقليمية ، اقترح فردينان دي ليسبس على خديوي مصر تشكيل لجنة دولية تقوم أثناء فترة محدودة بمحصر آراء المتخصصين الأوربيين في المشروع الأولي . و بينما كان موجيل ولينان مهندسا الخديوي ، يقومان بتحسين مشروعهما ، قام فردينان دي ليسبس ببعض الجولات في العواصم الأوربية ليحصل على موافقة خبراء من بلدان كثيرة على الاشتراك في اللجنة الدولية

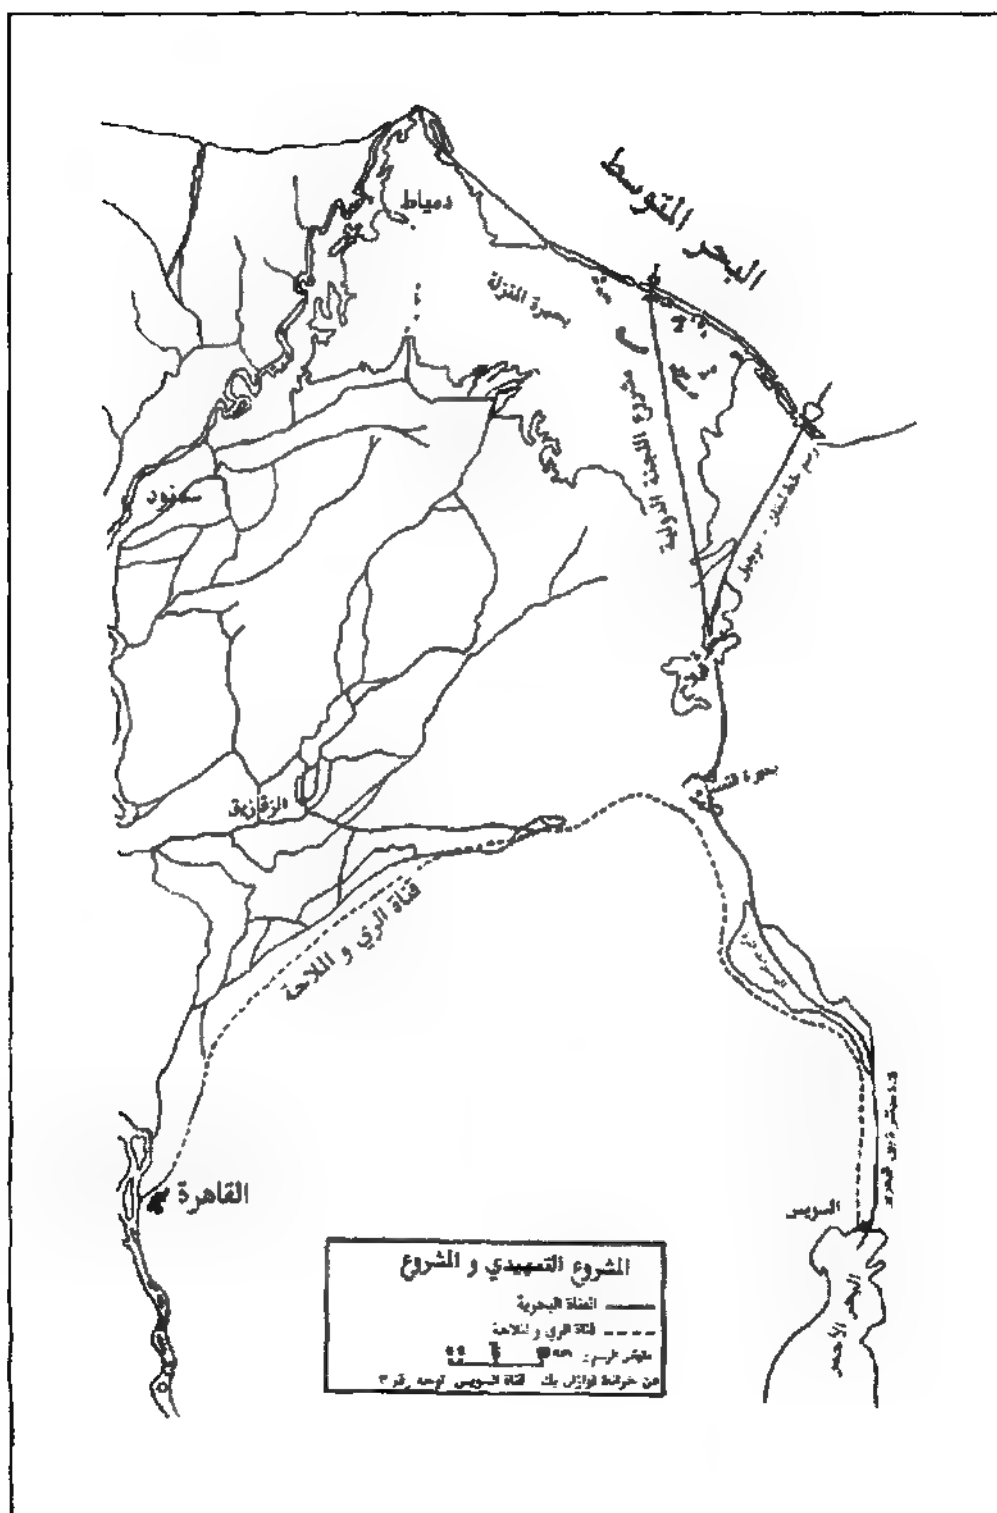


المشروع التمهيدي والمشروع

ولما كانت مهمة اللجنة الرسمية هي دراسة المشروع الأولي و من ثم إعداد مشروع نهائي بالإجماع ، تم تكوين اللجنة في النهاية من ثلاثة عشر عضوا يمثلون سبع جنسيات ^(٥) - عشرة من المتخصصين في أشغال المياه والبحرية وثلاثة من البحارين - وقد اجتمعت اللجنة في يومي ٣٠ و ٣١ أكتوبر عام ١٨٥٥ وقررت إرسال خمسة من أعضائها إلى مصر لاتخاذ موقف فاصل في المسألة الرئيسية المطروحة بشأن رسم مسار القناة البحرية.

ولقد طُرحت في الواقع مشروعات معارضة لاقتراح موجيل ولينان عبر عنها كل من بولان طلابو (Paulin Talabot) والأخوان أليكسي وإميل بارو (Alexis et Emile Barrault) ^(٦) وكلهم من أتباع مان سيمون . والقاسم المشترك بين هذه المشروعات المتعارضة أنها تقترح رسم مسار غير مباشر في القناة يربط الإسكندرية بالسويس . ويعود تاريخ اهتمام السان سيمونين بتنفيذ قناة تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط إلى زمن قديم حيث أن جماعة السان سيمونين قد قامت منذ عام ١٨٢٥ بإدراج هذا المشروع ضمن برنامجها . وقد أعيد طرح الفكرة بإلحاح عند مجيء بروسبير أنفنتان (Prosper Enfantin) إلى مصر في عام ١٨٣٣ بصحبة مجموعة من أتباعه ولكن محمد علي لم يكن في ذلك الوقت على استعداد لقبول الفكرة. وقد شهد فردينان دي ليسبس عن قرب هذه المبادرات لإنشاء طريق مواصلات يهدف إلى تسهيل التبادل بين الشرق والغرب ولقد واصل جماعة السان سيمونيون بعد عودتهم إلى فرنسا جهودهم إذ قاموا في نوفمبر ١٨٤٦ بتأسيس جمعية دراسات قناة السويس وكان لها الفضل الرئيسي تحت إشراف بول أدريان بوردالو (Paul Adrien Bourdaloue) في قياس مستوى خليج السويس ^(٧) . وقد ساعد هذا القياس الذي يعتبر عملية ضرورية أولية لإعداد مشروع حفر قناة على إثبات إنه لا يوجد اختلاف يذكر بين مستوى البحرين المراد وصلهما وعلى عكس الاعتقاد الذي ساد على أثر العمليات التي تمت أثناء الحملة الفرنسية على مصر .

وعند عودتهم من الإسكندرية في ٢ يناير ١٨٥٦ قدم أعضاء اللجنة الدولية الخمسة بعد جولة استكشاف في الخليج تقريراً موجزاً إلى الخديوي أرفقوا به النتائج الأولية ، وقد رجحوا رسم الطريق المباشر الذي اقترحه موجيل ولينان وصرحوا بأن العملية صالحة تماماً للتنفيذ وبتكلفة إجمالية لا تتعدى مائتي مليون فرنك . وكان من نتائج اختيار الخط المباشر استبعاد السان سيمونين نهائياً من مشروع تنفيذ قناة السويس وتخليد انتصار دي ليسبس في المعركة التي فصلت بينهما ^(٨) .

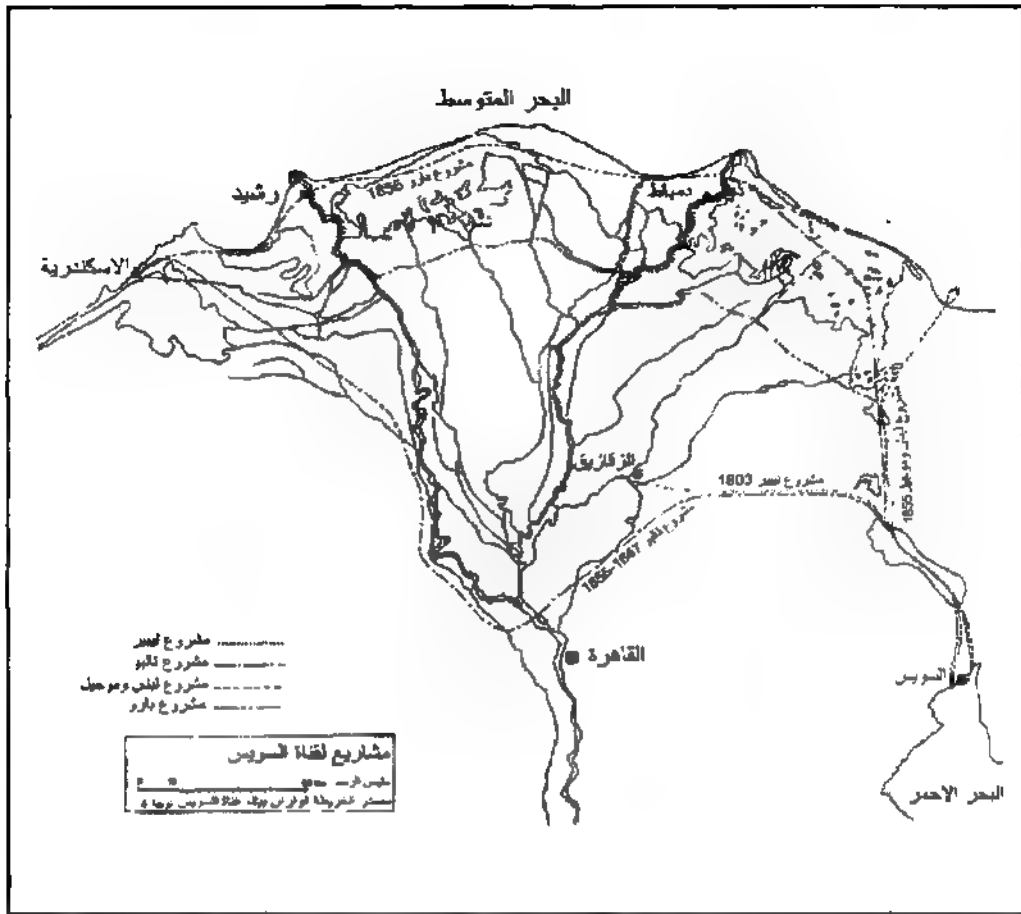


مشاريع لقناة السويس

وقد كان التقرير الموجز الذي أعدته اللجنة الدولية كافياً لكي يأخذ الخديوي قراره بمنح صديقه دي ليسبس حق الانتفاع النهائي وأكد الفرمان الجديد بتاريخ ٥ يناير ١٨٥٦ ما تم توقيعه في ١٨٥٥ ويوضح مهام ومزايا الشركة المساهمة المراد تشكيلها.

وقد تم إضافة لوائح الشركة إلى الفرمان ولم يتم نشر التقرير النهائي إلا بعد عام في ديسمبر ١٨٥٦ ، وقد أدخلت اللجنة تعديلين رئاسيين على المشروع الأولي ، من جهة نقل الموقع المخصص في البداية للميناء " المرتقب " عند مخرج البحر المتوسط ، ومن جهة أخرى، إلغاء الأهوسة التي كانت هناك النية لإقامتها أصلاً.

وقد خضع تقرير اللجنة الدولية النهائي لآراء بعض المجالس العلمية والتجارية الأوروبية وذلك حرصاً دائماً على الحصول على إجماع سياسي في أوروبا أكثر من الاستفادة من خبرة فنية حقيقية. وقد أعطت كل هذه المجالس موافقتها على هذه النتائج وفي مقدمتها الأكاديمية الإمبراطورية

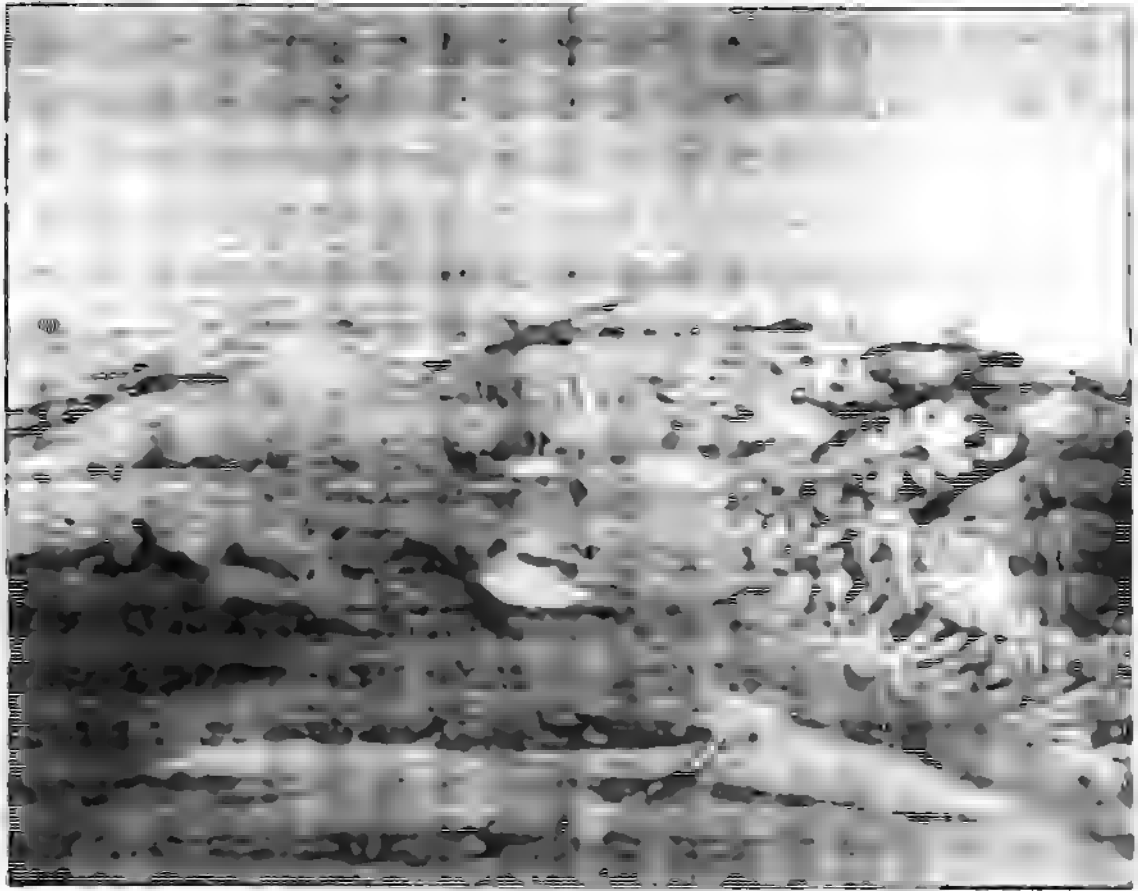

بأنوراخ خليج السويس والخط المباشر للقناة البحرين وفقا للمشروع التمهيدى

لبحار في صدى كثيرات (Henry Clerget) من رسم لدرى بلقون (مركز تاج البحار) للعلوم بباريس ^٩ وقد شد صوتان من نعمة التأييد هذه وهو صوت أوجى ثلاث (Eugene Flachet) رئيس جمعية المهندسين المدنيين الفرنسية الذي أعلن عن عدم رضاه وأعد قائمة حشد فيها أسئلة عديدة بالغة الأهمية قد تركت في معظمها معلقة دون إجابة في مقدمته مخطط المشروع لأرنى ^{١٠} وهذه كذلك صوت القسيس والمسؤولين الإنجليز الذين صرحوا بعدم إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية التقنية ومن المحتمل أن يكون عدم رضا وإدارة الخارجية وعداء لوردات الإنجليز الصريح تجاه الشركة . قد أثر على موقف رجال بلادها وراء بحر الدانوب وقد صرح على رئيس المعارض لورد بالميرستون (Lord Palmerston) في يونيو ١٨٥٩ . قائلا : " أعهد له بمكن وضع الشركة من جانب البحاري في مستوى استرواحات التي تصيد من حين لأخر السادحين ونصر ثقة الراسخين السطاء . وأعهد أن هذا المشروع من الصعب نطفه مادام أن في توفر موارد مالية ضخمة للعبية مع عدم ضمان تحقيق أي نوع من المكسب ^{١١}

وقد أثرت معارضة إنجلترا الشرسة بثقلها على موقف السلطان العثماني في إسطنبول الذي رفض أن يمنح دي ليسبس برغم طلباته المتكررة ، التصديق اللازم للانتفاع الذي قد منحه له خديوي مصر.^(١٢) وقد أجلت هذه العوائق الأولى ذات الطابع السياسي لبضعة شهور بداية تنفيذ المشروع.

اتخاذ نموذج تنظيم شركات السكة الحديد كمرجع


في نوفمبر عام ١٨٥٨ ، تفاضى دي ليسبس عن الصعوبات الدبلوماسية وعن المعارضة الشديدة التي أبدتها كبار المولين الفرنسيين وقام بالإعلان عن اكتاب عام لجمع مبلغ مالي (٢٠٠) مليون فرنك فرنسي اللازمة لتأسيس الشركة ، بالرغم من أن الامتياز لم يكن مشروعاً ونهائياً إلا بعد الحصول على موافقة السلطان^(١٣) وكان ذلك شرطاً واضحاً في عقود الامتياز التي حصل عليها دي ليسبس في عامي ١٨٥٦ - ١٨٥٧ ولكن دي ليسبس تعمد عن قصد عدم ذكرها للمساهمين الجدد . وفتح الاكتاب من ٥ إلى ٣٠ نوفمبر ١٨٥٨ ولم يلق إلا نصف النجاح حيث تم بيع ٥٦% من الأسهم للجمهور قيمة السهم خمسمائة فرنك ، وفي هذه الظروف لم يكن ممكناً إعلان بدء إنشاء الشركة قانونياً . ومهما كان الأمر ، استطاع دليسبس الحصول من صديقه الخديوي سعيد على تعهد باكتتاب مصر في كل الأسهم غير المباعة والتي وصلت قيمتها إلى ثمانين مليوناً من الفرنكات^(١٤) وهكذا تم جمع رأس المال اللازم لتأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية بعقد موثق بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٨٥٨ .

وتعتبر الشركة من الناحية القانونية شركة مصرية أسست وفق مبادئ القانون التجاري الفرنسي بشأن الشركات المساهمة ومقرها الاجتماعي حسب اللائحة في الإسكندرية ومركزها الإداري في باريس ، كما يقوم بإرادتها مجلس مكون من ٣٢ عضواً يمثلون الدول المختلفة المعنية بالشركة . ومن الناحية النظرية تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب الأعضاء لمدة ثمان سنوات . ولقد تم اختيارهم من بين من يمتلكون مائة سهم على الأقل . وبالفعل قام دي ليسبس بتعيين أول الإداريين من بين أكثر "المراسلين" اجتهدا ومهارة حرصاً على جذب المساهمين من بلاد مختلفة^(١٥) ، وحسب المؤلف ، تقوم الجمعية العامة بالمداولات^(١٦) حول مقترحات مجلس الإدارة وتبدي رأيها في المسائل ، خاصة فيما يتعلق بضم شركات أخرى ، وبإدخال تعديلات على لوائح الشركة أو بزيادة رأس مالها . وقد تم إختيار لجنة إدارية من بين مجلس الإدارة لتقوم على وجه الخصوص بإدارة الأعمال العادية للشركة .

وقد قام ثلاثة من المختصين بإعداد لوائح الشركة هم دينورماندي (Denormandie) محام ومدع عام في محكمة السين ، والموثق موكار (Mocquard) وهو موثق بالإضافة إلى أوجيست

شانصل (Auguste Chancel) مفتش عام بشركة سكة حديد أورليان . ومن ثم لن ندهش عندما نجد بأن الشكل الذي اتخذه التنظيم الداخلي للشركة العالمية لقناة السويس البحرية ، كان مماثلاً لما هو مطبق في بعض شركات السكك الحديدية الفرنسية^(١٧).

تنظيم الشركة

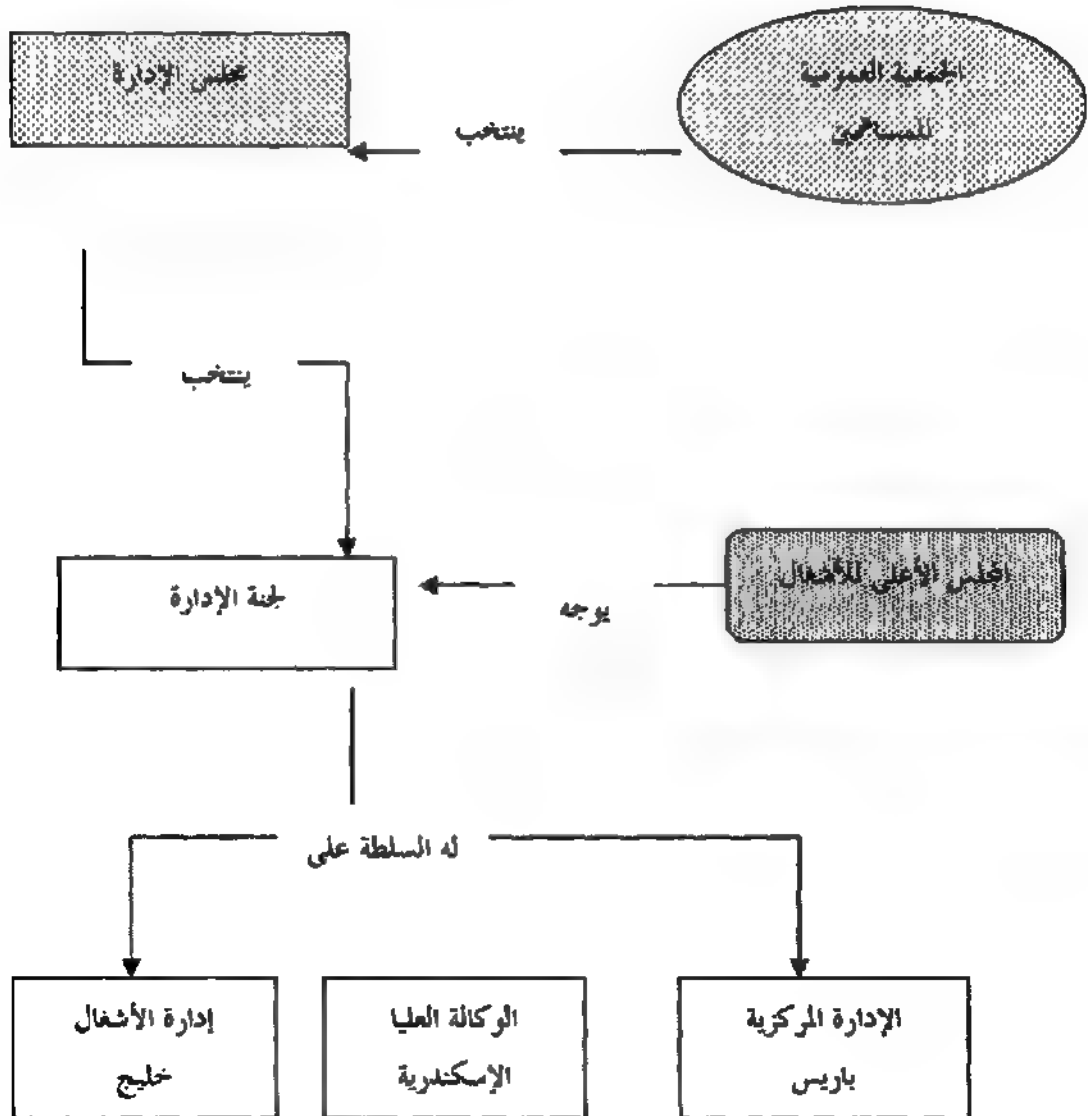

قام فردينان دي ليسبس برئاسة مجلس إدارة الشركة مستندا إلى حماية شخصية مسن الأمير جيروم نابليون (Jérôme Napoléon) ، ابن عم إمبراطور فرنسا. وقام المجلس بانتخاب أربعة إداريين يشكلون مع الرئيس ، اللجنة الإدارية وعند تأسيس الشركة اشترك في تشكيل مجلس الإدارة المهندس خريج المدرسة المتعددة التقنيات بيساريس والنائب نابليون سوشيه (Napoléon Suchet) دوق دالبوفيرا (duc d'Albuféra) وأوجيست دي شانصل (Auguste de Chancel) وبير بريفونتين (Pierre Préfontaine) مفتش أيضا بشركة أورليان وبول ميررويو (Paul Merruau) وهو صحفي قديم مقيم بمصر وسوف يعين سكرتيرا عاما. وتقوم هذه اللجنة باتخاذ القرارات بشأن تعيين أو فصل العاملين وتقييم الوظائف وتحديد المرتبات ، وعمل المكاتب واللوائح وأوامر الخدمة وترتيب وسداد المصروفات والترقيع على الاتفاقيات والصفقات والمناقصات.

وقد تم أيضا اختيار إداري آخر ليقوم بمهمة من الدرجة الأولى أطلق عليه "الوكيل الأعلى"، وهو يقيم بالإسكندرية ويمثل الشركة في اتصالاتها بالحكومة المصرية وغيرها وله كل السلطات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتحديد أوجه الاستثمار . والمقصود هنا بالتأكيد هو مواءمة الشركة للعمل في إطار خاص ألا وهو العمل على أرض مصر. وقد اختار دي ليسبس للقيام بهذه المهام صاموئل رويسنيرس (Samuel Ruysenaers) وهو صديقه منذ أمد بعيد وموضع ثقته وكان هذا الشخص البارز تاجرا هولنديا أقام بالإسكندرية في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر وشغل منصب القنصل العام لهولندا بمصر منذ ١٨٥١ ولم يتردد في التوسط لدى الخديوي سعيد ليحصل دي ليسبس على امتيازه .

وقد احتفظت الشركة جملةً أثناء مدة العمل بنفس البنية حيث كانت مكونة من ثلاثة عناصر هي الإدارة المركزية في باريس والوكالة العليا بالإسكندرية وإدارة الأعمال العامة القائمة في الخليج. وعلاوة على السكرتارية العامة ، تتكون الإدارة العامة من قسم المحاسبة العامة وإدارة المالية والسندات وكذلك قسم الأشغال الذي يشكل همزة الوصل بين الورشة والأنشطة التي تجري في فرنسا. وتقوم الوكالة العليا - علاوة على عمليات الاتصال بين الشركة والحكومة المصرية - بإدارة أموال الخزائن الموجودة في مراكز نشاط الشركة الرئيسية. ورغم أن عدد العاملين في أقسام الإدارة المركزية وفي الوكالة العليا ظل كما هو أثناء عمل الورشة إلا إن طاقم الإدارة العامة سوف ينمو مع تصاعد الأعمال بقوة .

و قبل تأسيس الشركة النهائي بأقل من شهر ، تم في ٢٢ نوفمبر ١٨٥٨ تشكيل المجلس الأعلى للأشغال الذي يشكل الجزء الأخير من البنية التنظيمية . وفي البداية وصل عدد أعضاء هذا المجلس إلى سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة عن اللجنة الدولية والثان من العاملين بالشركة - المهندس

الماني هوجين لاروس (Eugène Larousse) ورئيس القسم بوردون (Bourdon) -والنسان جدد وهما مهندسا الطرق والكباري الفرنسيين هيلاريون بسكال (Hilarion Pascal) وشارل ليفييور دي فورسي (Charles Lefébure de Forcy) فورلي الأول تخصص في أعمال مسواني مارسيليا، أما الثاني فهو مكترع قطاع المجلس العام للطرق والكباري و المستول عن شئون الملاحة . وبناءً على مشروع اللجنة الدولية كُلف هذا المجلس الجديد من الخبراء بمهمة إقامة أول برنامج عمل ، وهو ما قامت به في آخر عام سنة ١٨٥٨ عندما اقترحت تقسيم تنفيذ العمل إلى خمس مراحل وتحديد خطوطه العريضة ^(١٨) . وأثناء عمل الورشة كان المفروض أن يقوم هذا المجلس عند انعقاده بناءً على طلب لجنة الإدارة ، بمساعدة رئيس المهندسين والمدير العام في مختلف المسائل الناجمة عن تنفيذ الأشغال.

شركاء مختارون


لقد اتضح لضمان إدارة الورشة أن لينان وموجيل (Linant et Mougel) وموجيل اللذان حررا المشروع الأولي ، كالا بمثابة شريكين مكتملين وذلك بحكم الإمكانيات الذاتية لكل منهما وخبرائهما في ميادين الأشغال. فقد كان الأول عصامياً ^(١٩) يعيش في مصر منذ ١٨١٨ أما الثاني فهو مهندس فرنسي استقال من هيئة الطرق والكباري وصل إلى مصر في ١٨٣٨ . ومع ذلك رغم أن الرجلين كان يعرف كلاهما الآخر جيداً وخاصة أنهما تعاقبا على إدارة ورشة سد نهر النيل إلا أنه لم يكن بينهما إلا القليل من التوافق ولم يتم اشتراكهما في عملية صياغة المشروع التمهيدي عن طيب خاطر ودون ملاحظات لاذعة من الجانبين . علاوة على ذلك ، لم يكن يحترم لينان بتاتاً مؤلف دي ليسبس المتذبذب بين الرجلين وتكييف خطابه حسب الموقف والمخاطب فقد صرح قائلًا : " في أول مقابلة لنا وأثناء الحديث قال لي السيد دي ليسبس بصراحة واقتناع وهو يحسك بيدي : لن نحتاج لمهندسين من غربي المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس، أليس كذلك ! ويمكننا الاستغناء تماما عنهم ، أليس كذلك ؟ [...] ولم يبدو لي دي ليسبس دبلوماسياً ولا صادقاً البتة ، فبعد يومين ورغم ما قاله عن مهندسي المدرسة متعددة التقنيات جاء يسألني مباشرة إذا كان هناك أي اعتراض من جانبي على قبول موجيل بك زميلاً لي في موضوع القناة " ^(٢٠)

وقد تفاقم الصراع الحفي بين مهندسي الخديوي لا سيما أن لينان أستشعر بأنه قد يتزع منه مشروع القناة كما حدث له منذ سنوات من قبل في مشروع سد النيل ^(٢١) وقد أدى العداء الصريح ، الذي استفحل بينهما والذي صرح عنه موجيل لأحد مراسليه (" ليس لي عدو أكثر شراسة من هذا الرجل " يقصد بذلك لينان) ^(٢٢) ، إلى التخلي عن إدارة ثنائية الرأس . وقد انحاز دي ليسبس في بداية عام ١٨٥٩ نهائياً إلى جانب موجيل ، وعينه مستولاً عن إدارة أشغال خليج

السويس أما لبنان وهو الذي كان يفكر مليا منذ الأربعينات من القرن ١٩ في مشاريع حفر القناة فقد انسحب وهو شديد المرارة.

وتم تنظيم إدارة الأشغال حينئذ على النحو التالي :

تنظيم إدارة الأشغال في ١٨٥٩

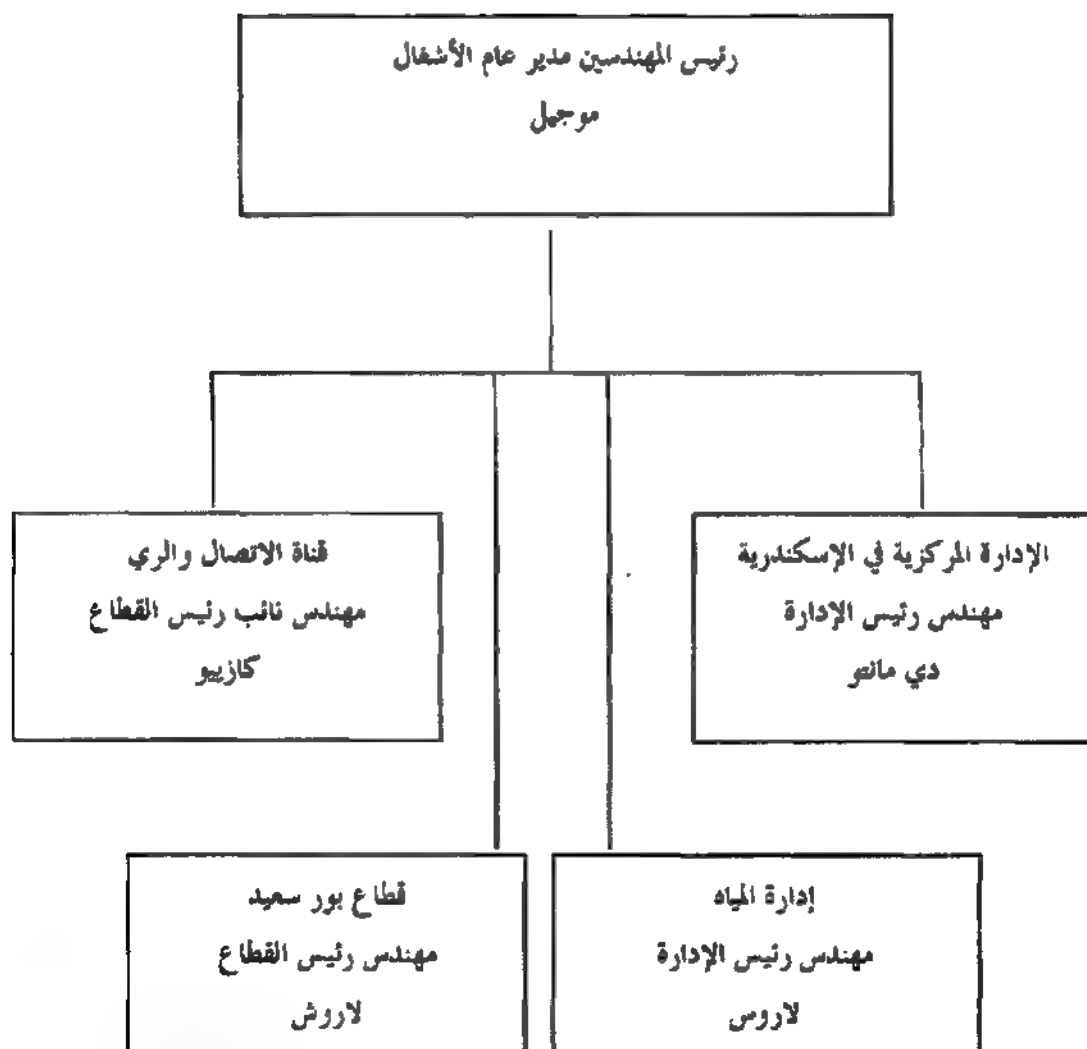

ويعتبر المقاتل هو آخر الأعضاء فاعلية وإن لم يكن أقلهم أهمية في الجهاز القائم . وقد وافق مجلس إدارة الشركة في ١٢ فبراير ١٨٥٩ على مشروع اتفاقية مع الفونس هاردون (Alphonse Hardon) مقاتل الأشغال العامة ، لتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال كما حددت في برنامج المجلس الأعلى . أما بالنسبة لشخصية ومسيرة أيلير - ألفونس هاردون فلا نملك عنها إلا

معلومات نادرة ، وما نعرفه بكل بساطة أنه كون نفسه في مكان العمل وعمل في البداية حداداً ثم اشتغل في نجارة العربات قبل أن يحتل وظيفة رئيس البنائين ويصبح مقاولاً^(٢٣) وهي المهنة التي اشتهر فيها بأعماله المختلفة المتعلقة بإنشاء خطوط السكة الحديد ولاسيما إقامة محطات القطارات^(٢٤).

ويبدو ، لو سلمنا برواية التاريخ الرسمي أنه لم يكن من ميسل أمام دي ليسيس سوي اختيار المقاول هاردون، حيث أنه الوحيد الذي قدم طلباً للقيام بهذه المهمة المخوفة بالمخاطر لتنفيذ أشغال في قلب الصحراء . ولكن قائمة الشركات المتعهددة التي سجلت في محفوظات الشركة تكذب هذه الرواية^(٢٥) فقد كانت استجابة هذه الشركات المتعهددة وفقاً لإعلان تم نشره بواسطة الشركة في الصحف في يناير ١٨٥٩^(٢٦) هذا إن لم تكن قد تقدمت بعروض تلقائية لتنفيذ أعمال القناة وقت الإعلان عن المشروع. وتقدم هذه العروض والتي تتعلق إما ببعض أو بكل الأعمال المراد تنفيذها، تنوعاً كبيراً في الحلول وخاصة بشأن صيغة التعاقد : نظام المنتفع ، الالتزام بالمقايضة أو تخفيض عرض الأسعار بنسبة قد تصل إلى ١٠% مقارنة بالمقايضة. وقد تم تفضيل "نظام المنتفع" في العقد الذي وقعه هاردون ، أي أن يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال التي أستاذرها بأسعار الوحدات التي حددتها اللجنة الدولية وتقدر أرباحه بنسبة ٤٠% من المكاسب التي يستطيع تحقيقها فوق التقديرات. وقد وقع هاردون العقد مع دي ليسيس قبل أن يصل إلى مصر.^(٢٧) والحقيقة أن رجلاً عمره ٤١ سنة^(٢٨) مثل هاردون ، له ثروة يستثمرها ظاهرياً في عملية حفر خليج السويس، لم يكن غريباً عن نجاح الاكتتاب الذي افتتحه دي ليسيس^(٢٩) وقد كان بيرنار دي مونتو (Bernard de Montaut) مقتنعا بذلك. و من جهة أخرى لن يتخلى رئيس الشركة عن ذكر هذه الخدمة التي قدمها له المقاول في هذه المناسبة.

صعوبات البداية

بدأ عمل الورشة عند (الليدو) بحيرة شاطئ بور سعيد في المكان الذي اختير ليكون مصباً للقناة في البحر المتوسط مع أول ضربة فاس رمزية جرت في يوم ٢٥ أبريل ١٨٥٩ .

ورشة في قلب الصحراء

كانت هناك عمليات تحضيرية تم إنجازها فيما سبق في الخليج عام ١٨٥٨ وتحمل الخديوي تكاليفها المالية وقد شملت التحقق من نتائج قياس الارتفاع في عام ١٨٤٧ و دراسة إمكانية استغلال المحاجر القريبة من الخليج وفحص الآبار وأيضاً بعض الاستكشافات الجيولوجية بهدف


وضع قائمة بمواد البناء المتوفرة وتحديد تكوين الأراضي التي يجتازها مجرى القناة المقبلة (٣١) . وقد واجه الرواد ، منذ العمليات الأولى ، حوادث محتملة الوقوع في وسط محلي و بيئة طبيعية واجتماعية كانت معادية في أغلب الأحيان.

وعلى شاكلة رجال مثل روبنسون الذين رسوا على جزيرة خالية ، اضطرت حفنة من الرجال المتواجدة على "ليدو" بحيرة بور سعيد في بداية عام ١٨٥٩ لمواجهة أكثر المواقف مفاجأة. فقد عاش رواد الورشة في ظروف مضنية للغاية، والدليل على ذلك اللقب الذي أطلق على بور سعيد حينذاك : " صحراء [معتقل] كيان (Cayenne)" (٣٢) . فمعظم الأراضي التي أقيم عليها المعسكر، ماعدا مجموعة الكشبان الصغيرة التي تشكل الخط الساحلي ، تغمرها مياه بحيرة المتزلة أثناء الفترة التي تسمى المياه العالية أي أثناء فيضان النيل (٣٣)

وقد جعل حجم أعمال الحفر المراد تنفيذها ، من هذه الورشة ، ورشة استثنائية ، فلم يكن لها مثيل من قبل وهو ما أتفق عليه رجال المهنة في أقوالهم: " إن عرض القناة يضع هذا العمل فوق كل الأبعاد مقارنة بالأعمال التي شاع تنفيذها في فرنسا ، فهذا العرض يساوي في الحقيقة حوالي اثني عشر رصيف مكة حديد مترابطين (٣٤) كما وضح ذلك أوجين فلاشا وليون مولينو (Eugène Flachet et Léon Molinos) أمام جمعية المهندسين المدنيين. وقد طرأ مع هذه الأعمال تغيرٌ سواء في مستوى الردم أو في المشاكل المراد حلها. وبعد عدة شهور فقط من بدء الورشة دعت لجنة الإدارة وكأنها تداركت الأمر، المجلس الأعلى للأشغال لإعادة النظر وتخفيض منسوب قياسات القناة البحرية . وحدث أول تغيير في المشروع الأول في أغسطس ١٨٥٩ بواسطة جمعية المتخصصين التي عدلت عرض القناة إلى ٦٥ متر بدلاً من ١٠٠ متر ، وقسمت بالنصف عرض العمق وأنقصته إلى ٢٢ متراً .

كان من نتائج ظروف الورشة الخاصة – البعد عن فرنسا والصحراء – أن ضاعفت من الصعوبات التي قوبلت إلى عشرة أمثالها. وكان أول شاغل للرجال الذين أقاموا في الخليج هو إيجاد حل لمشكلة المياه العذبة الضرورية للحياة . صحيح أن بعض الخزانات التي تحفظ مياه الأمطار موجودة في الصحراء كما أن هناك بعض الآبار التي يستعملها البدو ولكن ليس بالقدر الكافي لتوفير طعام منتظم لسكان في إزدیاد مطرد. فالآبار التي قامت بحصرها قافلة الدراسات (٣٥) لا تمون إلا بمياه شديدة الملوحة وغير وفيرة. ولإشباع حاجة معسكر بور سعيد من المياه طلب منذ ١٩ فبراير ١٨٥٩ من بول فان فليسینجن (Paul Van Vlissingen) و ديدوق فان هيل (Dudok Van Hell) وهم صناع من أمستردام ، تصنيع ثلاثة أجهزة لتقطير مياه البحر يسولر كل جهاز منها ٥ آلاف لتر ماء يوميا (٣٥) وقد وصل أول جهاز تقطير إلى الخليج في شهر يونيو

وقد كان علي فليكس لاروش (Felix Laroche)، رجل الطليعة، أن يواجه المشاكل التي تعرضت لها العملية في بدايتها. وسجل في تقرير موجه إلى الوكيل الأعلى تعليماته بشأن شروط تركيب الجهاز: "من يوم ١٩ إلى ٢١ تم تركيب ماكينة تبخير بفضل مهارة وعناية الميكانيكين العاملين في باخرة أسمها سعيد [التي جاءت لتزويد الورشة]، ولم يكن قد وصلنا أي رسم أو تعليمات، ورغم ذلك استطعنا التغلب على المصاعب الصغيرة التي ظهرت" (٣٦)

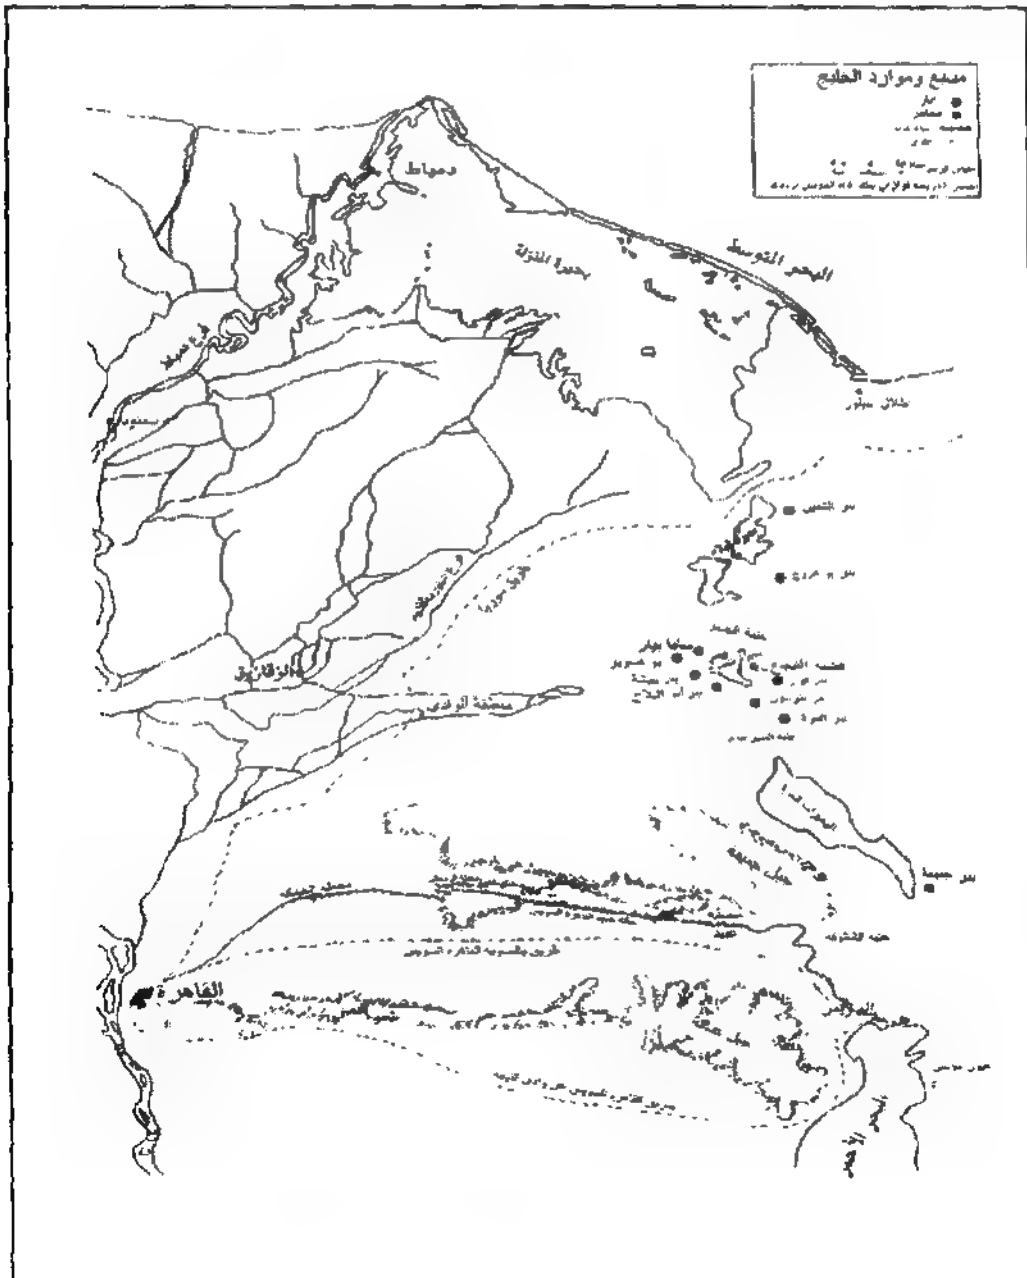

منايع الخليج

آبار * محاجر سكة حديد ++++ طرق

ولقد تمت إدارة الماكينات بواسطة آلات بخارية تحتاج لتشغيلها مياه عذبة ... وبناءً عليه تم وضع كل جهاز مباشرة بالقرب من بئر وبالرغم من التحسينات التي أدخلت على الماكينات فقد بقي إنتاجها ضعيفاً بالنسبة إلى كميات الفحم التي تستهلكها ولزم النظر في أسلوب آخر لتزويدها بالماء. وحينئذ تم التعاقد مع محمد الجيار، وهو مالك قوارب مشهور في بحيرة المزة، الذي تعهد بتوصيل ماء النيل إلى المعسكر على بحيرة الشاطئ^(٣٧) ويتم تخزين المياه بمجرد أن تصل بالقوارب من دمياط وفي نوفمبر ١٨٦١ وضعت مضخة بخارية رافعة لتغذي مستودع خزان ماء المعسكر. واتضح أن تزويد المياه عن طريق القوارب هي الوسيلة الأقل تكلفة بعد أن تم توفير كميات المياه الضرورية (كانت احتياجات الاستهلاك بين ١٦ و ١٧ ألف لتر يوميا)، وتوقفت^(٣٨) ماكينات تقطير المياه ولم تستخدم فيما بعد إلا في فترات قصيرة وبصفة استثنائية. ومع الوقت، استمر انخفاض السعر الذي طلبه الجيار من ١٦ فرنك إلى ١٠ فرنكات المتر المكعب في عام ١٨٦٢ ثم إلى ٥,٥ فرنك منذ عام ١٨٦٤^(٣٩) ويحمل كل زورق خزانين من الصفيح قدمتهما الشركة سعة كل منهما متر مكعب^(٤٠) ويتم توزيع المياه للمساكن في داخل المعسكر بواسطة السقاءين ويدفع الخاصة ١٢,٧٥ فرنك للمتر المكعب^(٤١) أما الورش في داخل الخليج فيتم تزويدها بالمياه بواسطة الجمال. وعند وصول المياه إلى المخيم تنقل في براميل وتفرغ في صناديق من الصفيح أعدت لهذا الغرض.

وتصل المياه أيضا من الإسكندرية بالسفن إلى بور سعيد ولكن غالباً ما تحول حالة البحر من رسو السفن على الشاطئ^(٤٢). وقد تم بناء رصيف عائم مؤقت في عرض البحر يتكون من جزيرة من حديد ويشمل أوتاداً لولبية ويصل إلى الشاطئ بواسطة حاجز من الطوب، يسهل تفريغ البضائع ويجنب المركبات عبور الحاجز الموازي للشاطئ. ومع ذلك فقد ظلت ظروف الإبحار شاقة حتى الانتهاء كاملاً من مرافئ الميناء التي لم تكتمل إلا في نهاية الورشة. ويمكن أن نتصور مشاق التفريغ في بور سعيد وضغط العمل الدائم الذي يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الورشة والذي يزداد مع سوء الجو، ويمكن أن نكون فكرة عن هذا من خلال الشهادة التي أدلى بها في يوليو ١٨٦٣ كليمان (Clément) مسئول التجميع في شركة المسابك والورش: " ترسو السفن على بعد أربعة كيلومترات تقريباً من الشاطئ، والبحر دائماً في حالة هياج. في الأسبوع الماضي تم حجز المرسى طوال يومين. ويصعب في أغلب الأحيان عبور الحاجز مما يجعل التفريغ أكثر صعوبة، وعندما يكون الجو جميلاً يمكن بصعوبة تفريغ صندل واحد في اليوم، إذ أن ذهاب وعودة السفن من وإلى المرسى تكاد تستغرق يوماً كاملاً، كما أن القباطنة لا يريدون الاقتراب من السبر ما لم يتوفر الضمان لسلامة سفنهم خاصة مع عدم وجود قاع ومع ارتفاع الموج على الدوام. والمصر

المائي بالموقع الذي أشغله لتكوين الجرافات دائما جاف ، و يوجد ماء قليل جدا لذلك يجب مرة أخرى نقل كل المعدات من سفينة لأخرى لتوصيلها إلى سفن أصغر حتى يمكن عبور المياه الضحلة [...] فكل شئ هنا صعب ، كما أن تفريغ السفن يحتاج وقتاً طويلاً، أضف أن العمل لا يتم هنا على شاكلة ما يجري في أوروبا نظراً لطبيعة السكان علاوة على نقص الإمكانيات^(٤٣) "

زيادة على ذلك أن كل السفن القادمة من فرنسا لا تبلغ مقصدها بلا حوادث إذ يجب في الحقيقة أيضا أن نأخذ في الاعتبار ظروف الملاحة السيئة في البحر المتوسط ، فقد غرقت سفن كثيرة أثناء عمل الورشة و عندما غرقت في ١٨٦٢ السفينة جازون (Jason) رثت الشركة لفرق اثنين وعشرين عاملاً متخصصين والمجموعة الأولى من المعدات الخاصة بعمليات الحفر وعلى الأخص أول نموذج من المنسوج الدائري (toile sans fin)^(٤٤) المخصصة لتجهيز معدات الحفر . وفي السنة التالية لاقت سفينة نوتر دام دي لا جرد (Notre dame de la grade) التي غادرت مارسيليا في ديسمبر ١٨٦٣ نفس مصير السفينة جازون إذ فقدت في عرض البحر عند رشيد و عليها خمس رافعات صنعتها شركة المسبك والورش بالبحر المتوسط^(٤٥) ولقد تم صنع خمس رافعات جدد لتحل محل الرافعات المفقودة وتم إبحارها في أكتوبر ١٨٦٤ على السفينة هيرييه (Heureux) أي " السعيدة " ورغم اسمها فلم تكن أكثر حظاً من سابقتها فقد اختفت غرقاً بدورها وتم إنشاء خمس رافعات جديدة وصلت سائلة على السفينة أنطوان وماري (Antoine et Maric) في يونيو ١٨٦٥^(٤٦) .

وقد عمل رواد الخليج في ظروف شاقة لا ترجع لظروف الصحراء التي تحيط بهم فحسب ، فهم في الحقيقة كانوا يعانون من النتائج المباشرة للانسائس الخفية التي تحيكتها إنجلترا والتي قدسدت عن طريق مناورات دبلوماسية عند السلطان العثماني إلى إيقاف الورشة . وعلى إثر ذلك دعا الخديوي في ٤ أكتوبر ١٨٥٩ السلك القنصلي إلى وزارة الخارجية وألقى عليهم رسالة وزارية يطلب منه السلطان فيها وقف كل الدراسات والأعمال والاستعدادات الجارية في خليج السويس، وعلى كل بلد عندئذ أن ينقل الأمر إلى مواطنيه ، وقد تم وضع إعلان في قنصلية النمسا لإخطار كل " الرعايا والمواطنين " في هذه الإمبراطورية أن كل من يعمل منهم في شركة قناة السويس حتى أول نوفمبر قد يتعرض للطرده بالقوة المسلحة. وقد أظهر لاروش اندهاشه تجاه تغير الموقف فحسب هذا الوقت كانت السلطات المصرية قد أبدت تفهماً للموقف وساعدت على إقامة الورشة وإعطائها بعض الامتيازات بغير حق . وهكذا تم إعفاء الآلات والمعدات والمؤن المرصودة لبور سعيد التي تصل إلى الإسكندرية من الضرائب الجمركية ، أما بالنسبة لسفينة الشركة جوزيف (Joseph) التي كانت تقوم دائما برحلات من الإسكندرية إلى بور سعيد فقد أعفيت مجاملة من

الرسو في ميناء دمياط وهو الأمر الذي كان يجب عليها الخضوع له بسبب قواعد الحجر الصحي المطبق في البلاد . ولكن لاروش أدرك بوضوح هذا التحول الطارئ على موقف الحكومة المصرية عندما شاهد على شاطئ بور سعيد فرقاطة تحمل عليها مبعوث السلطان الذي جاء يخطره بوقف الأشغال بأمره بإخلاء المواقع التي يشغلها العاملون. ^(٤٧)

وقد استعان دي ليسبس بأعوانه السياسيين للخروج من الأزمة وبفضل صلة القرابة بالإمبراطورة أوجيني (Eugénie) ^(٤٨) حصل على مقابلة مع نابليون الثالث وعلى أثر هذه المقابلة تم تغيير ساباتييه (Sabatier) القنصل العام لفرنسا الذي سارع وبالع في تنفيذ الأوامر التركية الصادرة ضد الشركة ^(٤٩) . وقد بررت تركيا تدخلها الذي أوحته إياها وبقدر كبير إنجلترا ، بررته بحجة أن أعمال حفر القناة لا يمكن أن تبدأ دون موافقتها . ولمواجهة ذلك، دافع دي ليسبس بأن المقصود في الحقيقة ليست أشغال حفر القناة ولكن ببساطة عمليات الإعداد. وسواء كانت تركيا قد اقتصت بالحجج التي عرضها رئيس الشركة وهو احتمال ضئيل أو أنها تأثرت بتدخل إمبراطور فرنسا في هذا الشأن أو أن المقصود بهذا كان القيام بإحدى المناورات الدبلوماسية دون نتيجة كالعادة ^(٥٠) فإن تركيا لم تواصل دعاوها ضد الشركة ولم تنفذ خطوات الطرد بالقوة التي هددت بها عمال الشركة . وبناءً على ذلك رجعت الأمور رويدا رويدا إلى مجاريها واستؤنف نشاط الورشة من جديد.

أيدي عاملة اختيارية بدلا من السخرة

ومع ذلك ، بقيت المعضلة الكبرى التي واجهها رجال الورشة منذ بداية العمل كاملة ألا وهي البحث عن الأيدي العاملة.

ومنذ ذلك الحين ، تم إخفاء وإنكار الأحداث المتعلقة بمسألة الأيدي العاملة التي استخدمت في ورشة القناة إلى درجة انتشار معلومات وهمية للغاية عن هذا الموضوع. ولم تكن إعادة تشكيل تاريخ تسلسل الوقائع التي أسى في أغلب الأحيان تفسرها والربط بينها ، سوى من خلال التوفيق بين العناصر المتناثرة والمندثرة في أعماق وثائق الشركة.

وقد حدد فرمان الامتياز الثاني والمؤرخ في ٦ يناير ١٨٥٥ ، بعض القواعد التي نص عليها في عقد الامتياز الأصلي. أما فيما يخص الأيدي العاملة فقد اشترط العقد الجديد أن يكون على الأقل أربعة أخماس العمال المستخدمين في الأعمال من المصريين. وقد كان هذا النص الفضل في إرضاء الأوساط الدبلوماسية لجميع البلاد المعنية بالأمر فهو يطمئن الذين يخشون وصول كثير من العمال الأوروبيين إلى خليج السويس ويتجنب الصعوبات المادية والسياسية التي قد تنجم لا محالة عن

توافد عدد ضخم من الأجانب إلى مصر. ونجد في البداية من بين من يزعمهم الأمر خاصة ، السلطات المصرية التي خشيت بواكير احتلال أراضيها ، ثم الحكومة العثمانية التي خافت أن تساعد قوى أجنبية مصر في حصولها على الاستقلال وأخيراً الخارجية الإنجليزية التي لن ترضى أن ترى فرنسا توطد علاقتها ونفوذها بهذه الطريقة في هذا القطر . ومع ذلك لم يذكر الفرمان الثاني شيئاً عن الترتيبات العملية لتنفيذ النسبة المحددة.

وقد صدر " قانون تشغيل العمال من السكان الأصليين " في تاريخ ٢٠ يوليو ١٨٥٦ لسد هذا الفراغ . واشترطت المادة الأولى على أن تقوم الحكومة بتوفير العمال الذين سيعملون في أشغال الشركة بطلب من المدير وحسب الحاجة . ومع ذلك فقد أدخل البند الثالث من نفس اللائحة حداً للتعين موضحاً أن عدد العمال المستخدمين يجب أن يأخذ في الاعتبار مواسم أعمال الدراعة ، ولكن قد لخطئ لو توقفنا عند هذه الوثيقة أو عند الكثير من التصريحات المبذوبة المتضمنة بشكل خاص توفير الرفاهية للعمال . فلم يلحق بالفعل إرسال الأهالي إلى الخليج الذين تم استدعاؤهم بعد أول ضربة فأس رسمية في الورشة بل على العكس . فمن جهة ، لم تكن الأعمال التمهيدية قد تقدمت بعد بما فيه الكفاية لقبول عدد كبير من العمال في الورش ، ومن جهة أخرى لم يكن الحديوي على عجل لإرسال الفلاحين إلى الخليج فقد كانوا يقومون كالعادة بتنظيف القنوات أو حسب ما صرح به بعض المعاصرين بالعمل في ممتلكاته الخاصة.

إن ممارسة السخرة قديمة ويصعب تحديد تاريخ بدايتها وترتكز في مصر على ضرورة عمل كل الفلاحين مجاناً في أعمال تتعلق بري الأراضي. وهكذا نجد في كل عام مجموعات هائلة من الفلاحين يتم استدعاؤهم بناء على أوامر الحديوي وكانوا يجتمعون لصيانة شبكة ضخمة من القنوات والسواقي والأحواض والجسور والخزانات والسدود التي تسمح بتغيير مسار ماء النيل أثناء الفيضانات وكذلك ري الحقول البعيدة عن النهر وتغطيتها بالقرين الثمين الذي تحمله . ولا تعتبر هذه الممارسة في الأصل كثيرة الاختلاف عما يحدث في فرنسا، فمنذ ١٨٣٦ يضطر كل فلاح أن يكرس ثلاثة أيام من العمل لصيانة الطرق بالقرى . ويُعتبر حفر قناة الحمودية في مصر ١٨١٨ تحولاً في هذه الممارسات. فقد كانت هذه القناة التي تهدف إلى ربط الإسكندرية بالقاهرة عن طريق تحويل ماء النيل ، أول عمل غير زراعي يتم تنفيذه بفضل استخدام الفلاحين القادمين من شتى أنحاء مصر والخاضعين للسخرة. و بعد ذلك تحولت السخرة عن هدفها الأصلي لتوفير الأيدي العاملة للقيام بالأشغال العامة الاستثنائية سواء حفر قنوات جديدة أو إنشاء التحصينات أو خطوط السكك الحديدية .

وقد كان أول العمال المستخدمين في ورشة قناة السويس من المستقلين وكان ذلك من صالح رئيس الشركة الذي أمتشعر أن الرأي العام الأوروبي قد يعارض استعمال عمال السخرة في أعمال شركة خاصة فرنسية فأنتهز الفرصة ليعلم في حملات الدعاية الكبيرة لشركة حفر الخليج إنه على الرغم من وجود قانون لتشغيل عمال من أهل البلد فقد اختارت الشركة لأسباب إنسانية استدعاء عمال مستقلين بأجر .

غير أن الحصول على أيدي عاملة مصرية لم يكن مهمة سهلة كما كان يعتقد رئيس الشركة وأن الاحتفاظ بها في ظروف الورش الأولى يكاد يكون معجزة من المعجزات. وبالفعل لم يلبث أن غادر أول العمال العرب الذين اشتغلوا في بور سعيد المواقع لأنها غير مضيافة. ولم يقبل بالاستمرار في العمل المطلوب سوى بعض البحارة الأوروبيين الذي اعتادوا الأعمال الشاقة بفضل حصة الخمر المنشطة التي كانت تقدم لهم. ^(٥١)

ولما كان العمال لا يتقدمون للتعين تلقائياً فقد تم تنظيم إدارة خاصة تساعد على جذب عمال الرصف المصريين للعمل في ورش الخليج ، وإرسال موظفين يتقنون اللغة العربية للبحث في أماكن رئيسية بالدلتا بهدف التعاقد وتوظيف العمال ^(٥٢) وتم وضع إعلان باللغة العربية على كل أبواب المساجد وفي محطات السكة الحديد وفي مداخل دواوين الشرطة وتم توزيعه في القرى الرئيسية ويعد بمزايا لرؤساء القرى الذين يقومون بإرسال العمال. ^(٥٣) وأمتد نشاط الشركة في التعيين ليشمل أربعة أقاليم هي القاهرة والمنصورة والزقازيق وطنطا ، بل ومناطق بعيدة كقنا وأسيوط في الصعيد وسوريا والعريش والقدس وغزة ويافا ^(٥٤) حيث كانت الصعوبات الاقتصادية المحلية تبشر بنتائج إيجابية ^(٥٥) كما تم اختيار عملاء متخصصين في القاهرة والسويس ودمياط والزقازيق لاستقبال العمال وتوجيههم إلى الورش المختلفة. ^(٥٦) وكلف المفاوض هاردون من جانبه ، كما هو مألوف بفرنسا، رؤساء عمال المقطوعة ليقدموا له عمالاً مقابل عمولة من ٥ إلى ١٠ "سنتيم" للفرد عن اليومية أي حوالي ٥ % من أجر العامل وتم التعاقد خصيصاً لنفس الغرض مع تاجر من من القاهرة هما كوستا (Costa) و باليدي (Palidi) ^(٥٧)

وقد فشلت بوجه عام محاولات التعيين من جانب الشركة ومؤسسة هاردون في مصر. ولم يكن العمال الأجانب على استعداد للسفر والذهاب للعمل في ورش الخليج ، ويمكن تفسير تحفظهم وترددهم لطول الرحلة وتكاليفها وأيضاً عدم التأكد من المرتبات التي سوف يحصلون عليها وظروف الإقامة. وفي أغسطس عام ١٨٥٩ ، تم التعاقد مع ٢٥ عاملاً من جزيرة مالطا وسدد لهم مرتب شهر كضمان قبل السفر من مالطا إلى الإسكندرية وقامت الشركة بتحمل تكاليف الغذاء

والميت بالإسكندرية ولكن عندما طلب منهم الإبحار على السفينة جوزيف (Joseph) إلى بورسعيد ثاروا وهربوا^(٥٨) وليس هذا إلا مثلاً واحداً من ضروب الفشل الذي عرفته الشركة في محاولاتها للبحث عن الأيدي العاملة .

وقد شكل الصيادون من بحيرة المتزلة أول مجموعة كبيرة حقاً من عمال الحفر الذين خدموا في ورش الشركة ، و قاموا طوال عام ١٨٦٠ بحفر مجرى مياه عبر البحيرة . وقد شكلت الكشبان الرملية ، في أماكن عديدة من هذا المسطح المائي ، جزراً طبيعية ، وعليها أقيمت قرى مبنية من القش والطين يعيش فيها سكان يقدر عددهم بخمسة آلاف صياد^(٥٩) ، ومن المحتمل أن القليل من الرجال كانوا قادرين على تحمل الظروف التي مارسوا فيها عمليات الحفر الأولى وسط هذا المستنقع الأسود الشاسع المكون من الطمي الموحل . فقد كانوا ينتحون للأمام ويفرسون الأقدام والأرجل حتى الركب في المياه ، ليأخذوا بأيديهم أكوام التراب من القاع بعد أن يقوموا بتقليبها بالفأس وتنتقل بعد ذلك هذه الأكوام من يد لأخرى حتى الشاطئ^(٦٠) . ولقد ضاعف من مشقة هذا العمل الذي ينفذ بأساليب بدائية روائح الهيدروجين المكثرت المنبعثة من الطين المتقلب تحت الشمس المحرقة^(٦١) . وقد تم استخراج أربعمائة ألف متر مكعب (٣م٤٠٠٠٠٠) من الطين بهذه الطريقة ولقد تم بعد ذلك بدءاً من بور سعيد حفر مجرى مائي عرضه بين ٤ أو ٥ أمتار وطوله يقرب من ٣٠ كيلو متراً . وبعد انتهاء عملهم يغادر العمال الصيادين الورش ليستأنفوا أعمالهم الأصلية .

و في ذلك الوقت وصلت إلى الشركة اقتراحات بإرسال صينيين إلى الخليج ليقوموا بأعمال الحفر . وقد تم تقديم أدلة في صالح هذا المشروع تمدح بمميزات العمال الصينيين مثل صلابتهم وطاعتهم وأسلوب التغذية التي يسهل إشباعها في مصر . كما تذكر هذه الاقتراحات إرسال هذا النموذج ج من الأيدي العاملة بشكل مكثف إلى جزيرة بوريون (Bourbon) وكوبا وأستراليا وكاليفورنيا والمستعمرات عامة^(٦٢) . ويشمل هذا العرض من ٥ آلاف إلى ٢٠٠٠٠ عاملاً يتعاقدون لمدة خمس سنوات ولكن لم تنل عروض الخدمة "الصينية" رضا وموافقة الشركة .

في نهاية الأمر ، كانت نتائج المساعي المختلفة من أجل توظيف الأيدي العاملة ضئيلة وبقيت أقل بكثير من الحاجة . ورغم استخدام كل أساليب التوظيف فإنه لم يتم جمع سوى ما يقرب من خمسة آلاف رجل . وقد لجأت الشركة أمام فشل جهودها إلى فكرة العودة إلى السخرة وتراجع دي ليسبس عن تصريحاته الأولى التي أعلنها وطلب من الخديوي إصدار الأوامر طبقاً لقرار يوليوس ١٨٥٦ لاستدعاء عشرة آلاف رجل كل شهر للعمل في الورش . و في نهاية عام ١٨٦١ أثناء

زيارة في الخليج أقتنع الخديوي سعيد بفكرة إعطاء دفعة جديدة للأشغال بإرسال مجموعات أكبر. وقد وصلت لأول مرة أوامر مكتوبة إلى حكام الأقاليم تطلب منهم إرسال ٢٥٠٠٠ رجلاً في الشهور التالية إلى ورش الشركة. ومنذ شهر يناير ١٨٦٢ بدأ تاريخ استخدام نظام السخرة الحقيقي بشكل منتظم، بالرغم من توقف إدارة التشغيل منذ عدة شهور من قبل، وقيام حكام الأقاليم المجاورة للخليج بتقديم مجموعات شهرية بناء على مجرد الطلب^(٦٣). وهكذا عمل في ورشة بحيرة البلاح من بين مجموعة من ٥٥٢ عاملاً نجد بينهم عشرة عمال باليومية، وأربعة وستين حسب رغبتهم و ٥٨ بالسخرة^(٦٤). أما بالنسبة لحفر ترعة الماء العذب فقد شارك فيها من قبل آلاف من الفلاحين الذين يعملون وفقاً لنظام السخرة، بجانب عملهم بالقناة البحرية الخاصة.

إعادة النظر في الاختيارات الأولى

توزيع الأدوار موضع معارضة واسعة

لم تظهر بوضوح حدود المهام التي تقع على عاتق كل من الطرفين وهما الشركة والمقاول، والذي يطلق عليهما اليوم رب العمل والقائم بالعمل، ولم تكن أيضاً هذه المهام موضوع اتفاق مباشر.

أقام رجال من العاملين بالشركة وعمال المقاول هاردون سوباً على شاطئ بورسعيد. وقد صدر أول أمر إداري بتاريخ ٣٠ يوليو ١٨٥٩ يحدد بمنتهى الدقة تنظيم العلاقات بين الشركة والمقاول العام، وينص هذا الأمر خاصة على أن الأعمال سوف يقوم بتنفيذها المقاول الذي يجب عليه أن يتلقى كل مساء أوامره من مسئول الشركة.^(٦٥) وينظم هذا المستند توزيع الأدوار مستعرضاً الوثائق الإدارية المختلفة التي يجب أن تحدد العلاقات بين ممثلي الشركة والمقاول. وتشمل هذه الوثائق المختلفة: "الدفتري"، "الجدول"، "مذكرة الجيب"، "الجريدة اليومية"، "الخطاب"، "الإيصال"، "الفاتورة"، "قائمة الجرد"^(٦٥) وهي تسهل "الإشعار" و"العرض" و"طلب الموافقة"، "الطلب" و"التصديق"، وقد أتضح منذ هذه اللائحة الأولى التي تحدد التزامات وواجبات كل من الشريكين، أن رقابة الشركة على عمل المقاول يجب أن تمارس بواسطة مستندات حسابية.

ولكن عند قراءة الملاحظات التي سجلها لاروش نرى أن التطبيق كان بعيداً عن احترام النص، إذ أظهرت هذه الملاحظات بوادر الارتجال في العمليات الأولى وعزلة وغياب ممثل الشركة في الورشة: "لقد أصبح الأمر كله في أيدي موظفي هاردون أما أنا فأجد نفسي وحيداً وأضطر أن أطلب من رئيس قسم المقاول إعطائي صوراً [...] ولا أجد أحداً يمثل الشركة في الأعمال التي من المفترض أن تكون متعارضة"^(٦٦)

وبعد انتهاء فترة الاختبار تم توقيع عقد نهائي مع هاردون في فبراير ١٨٦٠ ليصبح بذلك المقاول العام لجميع الأشغال. ويُبين العقد أنه على هاردون إعداد وتنفيذ الأشغال تحت إشراف ورقابة وكلاء الشركة، وتقوم الشركة بتوفير الأموال اللازمة لشراء الأدوات والمعدات والمؤن وسداد المصروفات بشقي أنواعها. ويجب على المقاول أن يقوم بدوره بإثبات المبالغ التي دفعها. أما فيما يخص الاختيارات الفنية التي تتخذ فقد تقرر أن اختيار الوسائل والأجهزة التي تستخدم يجب أن ينجم عن موافقة شركة المقاولات والإدارة العامة للأشغال بناء عن مبادرة المقاول.

علاوة على هذه النصوص المبدئية الجديدة، تعتبر شهادة برنار دي مانتو (Bernard de Montaut) مهندس الطرق والكباري الذي شغل في بادئ الأمر بالشركة وظيفة رئيس القسم المركزي للأعمال بالإسكندرية ثم مستول عن قطاع التمساح، تعتبر في غاية الأهمية لمعرفة نشاط الورشة في السنوات الأولى وطبيعة الصعوبات التي قابلتها الشركة في ذلك الوقت. فقد كتب مانتو، فعلاً لوزير التجارة والأشغال العامة في بداية عام ١٨٦٢، مذكرة سرية يشرح فيها الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى الاستقالة والعودة إلى فرنسا^(٦٧) وتعتبر هذه الشهادة التي أخذت شكل الاعتراف والاستنكار، في غاية الأهمية إذ تكشف العديد من خفايا الأمور. ولأنها كانت موجهة إلى عدد قليل من القراء فقد أغفلت الشهادة قواعد التقرير الإداري حينما لجأت إلى استخدام الأسلوب المباشر والصراحة المطلقة.

في البداية ظهرت بسرعة وفي وضوح النهار الخلافات بين موجيل مدير الأشغال ومانتو حول مسألة توزيع الأدوار بين الشركة والمقاول. ووقف الأول في الحقيقة بسرعة شديدة إلى جانب رئيس الشركة الذي كان قد ترك للمقاول هاردون الحرية الكاملة في أخذ المبادرات أثناء العمل ومن جانبه أعترض مانتو على هذا الأسلوب في العمل. فبينما كان يأمل احترام دفتر الشروط الذي وافق عليه المقاول كان موجيل يدافع عن موقف آخر ويرد عليه: "يجب علينا ألا نلتزم حرفياً بدفتر شروط مستحيل التحقيق وأن نقبل بكل بساطة المعدات التي تؤدي الغرض المقصود منها" (٦٨). وأنتهز المدير فرصة هذا الخلاف، الذي لم يكن الأول من نوعه، ليعرض على مرءوسه الطريقة المثلى التي يراها لتقاسم الأدوار بين ممثلي المقاول وعملاء الشركة. فحسب رأيه يجب إقامة مناخ ودي بين الجانبين من أجل تحقيق الهدف المشترك. بالإضافة إلى ذلك، لما كان المقاول لا يحقق أرباحاً إلا بالقدر الذي يوفره، فإنه من الطبيعي حسب موجيل، أن ترجع للمقاول المبادرة في اختيار وسائل التنفيذ. أما ممثلي الشركة فيجب عليهم مساعدته في البحث عن الوسائل الأقل تكلفة. وعلى أثر ذلك طلب الرئيس من مانتو عدم أخذ أي مبادرة قد تتعارض مع

قرارات المفاوض. ويتم تطبيق هذه التعليمات العامة خاصة بشأن المعدات: " ليس من اختصاصك توجيه أي تحذير إلى المفاوض بشأن عمل الجرافات فهو يراها تعمل مثلك تماماً وبهمه أكثر من أي شخص بان يكون العمل مجزياً. ويجب أن تقتصر على ملاحظة عمل الجرافات وتسليم المفاوض صورة من أسباب العيوب التي أشار إليها مهندس ميكانيكا الشركة ". وانتهت الرسالة التي وجهها موجيل إلى مانتو كما يلي: " لكي تؤدي بدكاء وفاعلية هذه الرقابة الودية ولكي نحصل على مساعدتك لجهود المفاوض دون تحفظ فقد طلبت من الإدارة أن تمنحك جزءاً من ما يتم توفيره أثناء إنجاز العمل "

بما يتعلق الأمر ؟ تم الاتفاق سراً عند التعاقد مع هاردون على أن يحصل موجيل على ٥ ٪ من الوفر الذي قد يتحقق ^(٦٩) . وقد تبدو هذه الممارسة التي تجعل من مدير عام الشركة يشارك في أرباح المفاوض المكلف برقابته غريبة . وبناء عليه أقترح موجيل على مانتو أن يمنحه امتيازات مماثلة. كيف نفسر كلام موجيل إن لم يكن محاولة رشوة مرعوسيه ؟ ألم يكن المقصود ببساطة شراء صمت وطاعة معاونه ؟

وكان رد موجيل على الصعوبات العديدة التي عرضها عليه معاونه أنه أشار عليه "بالدعاء ". وحينئذ فاض الكيل و تسأل مانتو: " هل من كرامة المهندس أن يبقى جامداً مثلنا وأن يكتفي بالدعاء لنجاح أعمال يجب علينا إدارتها ". لقد شعر مانتو بالمرارة وأصابه الغم نتيجة للدور الذي طلب منه القيام به ، فقدم استقالته في ٢٠ نوفمبر ١٨٦١ . وكان من قبل قد هدد بالإفصاح علناً عن حقيقة الوضع الذي ساد في الورشة: " كن متأكداً أن معظم الناس في باريس يعتقدون أن مهندسي الطرق والكباري في خدمة الشركة هم المديرون الحقيقيون للأعمال وإهم يرسومون خطط السير لها برقابتهم لأعمال المفاوض. ولكن ليس هذا صحيحاً على الإطلاق فلنسا في نهاية الأمر سوى حواجز واقية وهذا ما أنوي إعلانه على الملأ ، لأنني أرفض تحمل أي مسئولية مهما صغرت من الأخطاء الجسيمة والفوضى التي لا يبدو عليها أنها ستختفي ^(٧٠) " .

لم يكن يدري مجلس الإدارة في باريس بما يجري حقاً على أرض الموقع إذ أن بُعد الورشة سمح حينذاك للمدير العام ورئيس الشركة إخفاء حقيقة الوضع: " إن تقارير كثيرة تفصيلية كنت أخبر فيها الإدارة عن عمليات المفاوض المنكوبة لم تصل إلى المسؤولين ، كما أن دي ليسبس نفسه ، متجاهلاً الاحترام الواجب تجاه المهندس ، لم يتراجع أمام فكرة أئمة وهي تدمير الجواب المستفيض على الأسئلة التي كان قد وجهها لي المجلس مباشرة وقد أستولي عليه القلق ، كنت أشرح في هذا الجواب و بكل صراحة الحالة السيئة للعمليات التي كنا نقوم بها . فعند زمن طويل ، متبعاً نفس

السلوك ، فرض المدير العام في باريس الصمت العميق على إتصالي وجعل المجلس يتهمني بالإهمال. ولقد اضطررت للكتابة إلى المجلس ثلاث أو أربع مرات بناءً على أوامر صريحة من دي ليسبس مذكرات مدح ، الأمر الذي شكرني عليه دي ليسبس بحارة " لقد أرسلت تقريرك الأخير إلى باريس وهو ممتاز ويستجيب لرغبي (فردينان دي ليسبس نوفمبر ١٨٦٠) و أرد إليك التقرير الذي أرسلته لي بعد أن وضعت بين قوسين الجمل الموجهة للمدير العام فحسب وليس للإدارة " (موجيل بك في يناير ١٨٦١) وفقا لرواية مانتو.

إجبار مدير الأعمال على الاستقالة

مع بداية تسرب الشائعات اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للأشغال في شهر مايو ١٨٦٠ للمرة الثالثة والأخيرة . ولم تكن استقالة رئيس المجلس رينو (Renaud) ، في شهر فبراير عام ١٨٦١ ، غريبة عن توقف نشاط هذه الجمعية . فقد صرح مراقب عام الطرق والكباري بالسبب الحقيقي لقراره في رسالة شخصية وجهها فيما بعد إلى زميله كونرد (Conrad) : " في الواقع ، قدمت استقالتي لأسباب مختلفة من أهمها أن موجيل أصبح بشكل ما شريكا للمقاول هاردون ويحصل مثله على جزء من الأرباح التي تحققها الإدارة . وله مثله مصلحة في تنفيذ الأعمال بأقل التكاليف الممكنة أي بأسوأ ما يمكن . وإن كان دي ليسبس لا يعرف من هو هاردون لإكتفيت بالكلام عن عدم وجود أخلاقيات ولكنه يعرف جيدا এমন نتكلم . فهو لا يجهل أساليه في سكة حديد الغرب (Ouest) حيث أشتهر هناك بأنه مرتكب ثامن الموبقات السبع وهي الرشوة . لقد إرتبطت الرشوة مع هذا الرجل بشكل فطري و فاحت منه رائحة كريهة وأخشى يوما أن يتدخل القضاء ندعو الله ألا يأتي اليوم ينعدم دي ليسبس فيه على تأييده لشراكة من هذا النوع " (٧١) وقد أئفق كونرد في الرأي مع رينو : " أعتقد أنه لابد أن تتخلص الشركة مهما كان الثمن من موجيل وحبذا لو استطاعت الشركة إلغاء عقد هاردون والتخلص أيضا من هذا المقاول ، فإن هذا في ظني سيكون أفضل " (٧٢)

وقد تم حل المجلس الأعلى للأشغال في ٢٩ أغسطس ١٨٦١ لأول مرة عندما اجتمعت اللجنة الإستشارية للأشغال قبل رئاسة الجمعية الجديدة ولا شك أن هذه الموافقة كانت لها صلة وثيقة بالمشكلة الأولى التي ستقوم اللجنة بفحصها : وهي فصل موجيل . وكان السبب الذي عررض رسمياً هو ضرورة إقامة مدير عام الأشغال بمصر وأجاب موجيل بأنه لا يستطيع الالتزام بهذا الشرط لأسباب صحية (٧٣) . وبدأت المناقشات وراء الكواليس لتحديد مكافأة رحيله:

" وقد أبرز الكونت دي ليسبس العواقب التي قد تنجم عن اتخاذ قرارات تجعل من موجيل خصماً للشركة . وبعد أن شرح بالتفاصيل النتائج الوخيمة المترتبة على هذا العداء أضاف أن

الرئيس قد اتخذ تعهداً يجب الالتزام به ، ورد أحد الأعضاء بأن عداوة موجيل أقل ضرراً للشركة من الإبقاء عليه على رأس الأعمال" (٧٤) هذا هو مضمون نص الحوار الذي جرى في جلسة ١٢ نوفمبر ١٨٦١. أخيراً قبلت الشركة شراء مكوت المدير بإعطائه مبلغاً ضخماً ٧٢٠٠٠ فرنك وهو ما يعادل مرتب عامين على أن يتنازل بصراحة وكتابياً عن أية مطالبة من الشركة مستقبلاً لأي سبب أو في أي ظرف من الظروف . وفي نهاية الأمر حصل على مائة ألف فرنك وأضيف إلى هذا المبلغ ثلاثون ألف فرنك بجانب أسهم التأسيس التي استلمها موجيل في بداية الأعمال كمكافأة على الأتعاب والخدمات التي قام بها قبل تأسيس الشركة .

وفي نهاية عام ١٨٦٠ ، بحث موجيل - ربما بهدف إبعاد مانتو- عن رجل من بين صفوف مهندسي الطرق والكباري ليساعده ويمثله بشكل دائم في الورشة. وقد قبل هذه الوظيفة فرانسوا فيليب فوازان (François Philippe Voisin) وأصبح على أثر ذلك ، رئيس المهندسين ونائب المدير العام للأشغال بمصر. وقد كان يعمل مهندساً للطرق والكباري وهو القادم من مدينة بسو (Pau) حيث كان مسئولاً في إدارة الأشغال العامة عن مصلحة المياه التابعة لمنطقة جبال البيرينه المنخفضة (Pyrenées Basses) . ومنذ شهر أكتوبر عام ١٨٦١ شغل منصب موجيل بصفة مؤقتة قبل أن يتم تعيينه رسمياً مديراً للأشغال في ١٥ أبريل ١٨٦٢ .

دي ليسبس يتشبث برأيه ويعزل نفسه

في الحقيقة لم يحل رحيل موجيل مشكلة توزيع الأدوار الحساسة بين الشركة والمقاول. أما فكرة إلغاء عقد هاردون التي عرضها كوند فلم يكن ليسبس على استعداد بعد لقبولها بالرغم من الإجماع الذي تم من حوله.

لدى مغادرته الشركة لخص مانتو بداية المقاول العام بالطريقة التالية :

" لقد تم التعاقد مع (هاردون) بشكل يترك له حرية المبادرة المطلقة تقريباً في تنفيذ الأشغال وإدارة أموال الشركة [...] مقابل ما قدمه من خدمة بقبوله ظاهرياً أسعار المقايضة وإثباته بذلك سهولة تنفيذ القناة ، لقد تم تسليم هاردون مصير العمل [...] إلا أنه بقدر ما كان يستاء، كانت تستاء الشركة من التحقيقات في سلوكه أو سلوك معاونيه. [...] فمنذ ذلك الوقت (أغسطس ١٨٥٩) قام المقاول العام بعمل ما يريد وألقى ضمناً من التعاقد كل ما يمكن أن يسبب له أي إزعاج" و توقع ذلك مانتو : "مأنسحب مقتنعاً تماماً إن لم يتغير أسلوب المقاول العام تغيراً كاملاً ويتخلى دي ليسبس دون تأخير عن بعض الجشعين المرتبطين به، فإن هذا العمل سوف يتعرض

[...] بشدة للفشل [...] . لن تسمح لنا ضمائرنا البقاء متفرجين مكتوفي الأيدي ومتروعي السلاح نشاهد هذا العمل الرائع اليوم فريسة لثروة مقاول غير قدير بمقتضى عقد مستحيل" (٧٥)

وقد حاول فوزان منذ وصوله أن يضع بعض القواعد لتعاون ناجح بين مصالح الشركة والمقاول العام. وحددت نشرة دورية وقع عليها كل من الطرفين ، الأساليب التي يجب إتباعها وأكدت من جديد على ضرورة الموافقة المسبقة من جانب رؤساء القطاعات بالشركة قبل قيام المقاول العام بتنفيذ الأعمال. وقد نبهت النشرة أيضا لمضمون العمليات المتناقضة (أمام الخصمين) المفروض تنفيذها والمتعلقة خاصة بقوائم جرد المواد في المستودعات أو الورش (٧٦) .

وبقيت الأوامر العديدة للمدير العام للأشغال الجديد مثل سابقا حبرا على ورق ، واستمر المقاول يتصرف كما يحلو له ، وتضاعف عدد المستأجرين من الوضع بمقدار أكبر نظراً لتراكم أخطاء المقاول المهنية والتي أصبحت معروفة لدى الجميع. ومع ذلك أصر رئيس الشركة على مساندته بشكل مطلق . وفي نهاية عام ١٨٦١ ، أمام الشكوك التي أحس بأنها بدأت تراود مدير عام الأشغال الجديد ، شعر دي ليسبس بضرورة أن يؤكد له موقفه من جديد دون حساسية : "فيما يتعلق بالعقد المبرم كنت لا أشارك رأي الذين كانوا يريدون التخلص منه، واعتقد أن إسهام هاردون ثمين للغاية بفضل الموظفين الأكفاء الذين يعملون معه اليوم" (٧٧)

ومع مرور الشهور سوف يجد دي ليسبس نفسه أكثر انعزالاً برفضه الأخذ بنصيحة من حوله بإلغاء الاتفاقية التي تربطه بالمقاول هاردون ، وشرع المقربون منه في الابتعاد عنه تدريجياً. واستقال رويسينليز (Ruysenaers) صديقه القديم ، من منصب الوكيل الأعلى بالشركة ، عندما لم ير مخرجاً لمشاكل التي تفاقت يوما بعد يوم أمام إرادة دي ليسبس المنفردة للإبقاء على المقاول العام .

وقد عبر أيضا أعضاء اللجنة الاستشارية للأشغال عن رأيهم في ضرورة تغيير الوضع بطريقة أكثر حدة : " لقد تركت المبادرة للمقاول بصفة شبيهة مطلقة من قبل الإدارة العامة للأشغال التي ظننت أنها ستقتصر دورها على متابعة وتسجيل كل التغيرات المتعلقة بالتسيير والإدارة . في البداية ظهر ملائمة دون شك وعلى سبيل التجربة ، إعطاء هاردون أكبر قدر من الحرية في العمل ولكن اليوم أثبتت التجربة أنه قد تجاوز الحد، ويبدو من الضروري عدم الاستمرار في طريق يؤدي إلى التهلكة . ومن ثم يجب أن نعترف أنه حتى الآن لم يكن وكيلا الأعمال على مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقه وأن حرية المبادرة التي أمتثلها بشكل واسع تسيي باستمرارها إلى مصالح الشركة " (٧٨)

وقد هبطت عزيمية الموظفين بالورشة نفسها وأستكر جان ماري كازوه (Jean-Marie Cazeaux) غياب رقابة الشركة الحقيقية لأعمال المقاول العام وفي نفس الوقت الأسلوب الذي قبل به بعض زملائه الوضع . وقد وصل هبوط عزيمته للدرجة أنه لم ير حلاً سوي تقديم استقالته للمدير الجديد : " كنت أتمنى أن أكون مقيدا للشركة وأقوم بالقضاء على كثير من التجاوزات ولكفي متأكد الآن أن الشركة ليس لها أية قدرة على احتواء المقاول العام والزامه بالنظام اللازم والحفاظ على مصالحها، فلا يوجد رقابة بمعنى الكلمة على الأشغال ولا على الإدارة وإن وجدت فهي رقابة فيها مجاملة وشكالية بحجة . أمام هذه الإدارة لا أستطيع تقديم أية خدمة كالرقابة ، وسأقول لك بكل صراحة لو طلب مني اتباع أسلوب المراقبين الآخرين وبالتصديق على الوثائق بعد مراجعة الحسابات دون تقدير المضمون فسوف أرفض ذلك ولن أوقع على أية وثيقة إلا بشرط ذكر القيمة المالية الحقيقية والصحيحة وإلغاء عادة التخفيضات الجائرة والخرافية مر أجل الاستيلاء على أرباح غير المستحقة" (٧٩).

وكذلك تزايد عدد الساخطين مثل لاروس (Larousse) بسبب محاولة تحديد دورهم . ولكن ليسيس لم يكن على استعداد لسماع شكواهم التي قدمت ضد المقاول . وقد بدا ذلك واضحاً في إضافة حررها رئيس الشركة في منعطف خطابه الموجه إلى فوزان : " نحياي إلى لاروس [...] حاول أن تعلمه أفكارنا وحكمة سلوكك تجاه المقاول. فلا انفعال ولا معارضة مسبقه" (٨٠).

استنكار جماعي لتجاوزات المقاول العام

مع مرور الشهور ظهر أكثر فأكثر أن المقاول العام هاردون لم يكن على مستوى المهمة التي كلف بها، وظهر في وضوح النهار عجزه عن تنظيم أعمال بالغة المدى . وتراكمت الملاحظات بشأنه في نفس الوقت الذي أصبحت أخطاؤه صارخة.

وبدلاً من أن تتحسن العلاقة بين وكلاء الشركة وممثلي المقاول العام فقد استمرت في التدهور حيث أصر هؤلاء على مقاومة كل محاولة لرقابة نشاطهم . وفي أثناء ذلك الوقت تلازم تضاعف المتطلبات ضدهم . لاسيما وقد أخذ على هاردون خصوصاً طلب بعض المشتريات بدون تسروء وهكذا أكتشف فجأة أنه طلب آلة بخارية من شركة هولندية أعلنت إفلاسها (٨١). وقد وجد في ذلك الوقت قسم المنازعات بالشركة صعوبات جمة لاسترداد ثلث ثمن الآلة الذي دفع مقدماً لهذا الصانع. ولقد أدى غياب الدراسات الميدانية كلياً وبشكل عام الارتجال الذي غلب على قرارات المقاول العام حتى إلى استنفاد صبر اللجنة الاستشارية والمدير العام الجديد للأشغال وتم توبيخ إدارة المقاول ووصفها بأنها منفلتة ومستحقة .

بيد أن ما جعل الوضعية لا تطاق ولا تحتمل، هو كثرة وتعدد التجاوزات التي لم تلبث أن عرفت وإن لم تكن لدى العموم فعلى الأقل داخل الشركة . وفي عام ١٨٦٢ جاء إلى الخليج جيمس بوشيه (James Pouchet) الذي كان يعمل لحساب الشركة بباريس وشرح في رسالة وجهها لأحد زملائه الباريسيين الوضع على الأرض الطبيعية: " في باريس يمكن أن يحوم الشك حول ولاء العاملين عند المقاول العام أو عملياته ، فهنا نسمع من كل الأفواه كلمات عن السرقة والصوص . في باريس مثلاً كنا نعتقد أن مانتو يبالغ بعض الشيء وقد رأيت أن الجميع يكونون له كل محبة ويرونه بكل بساطة عادلاً ويفتقدونه كثيراً . لا أعرف إن كنت تتذكر هذه الجملة في أحد تقاريره والتي تقول بأنه لم نكن نعرف على من يقع اللوم أكثر على المقاول العام الذي يبدد الأموال أم على الشركة التي تفض الطرف عن إنفاقها بهذه الطريقة. هذه الكلمات وإن كانت بدت لي بباريس غريبة تجدها تجري هنا على السنة الجميع بصورة أكثر فظاعة وأرجو أن تسمح لي أن أعرض عليك حرفياً ما يقال : I . S (Isthme de Suez خليج السويس) (Imbécile et Sacripant) (أ.س أبله و سافل . [...] تكاد تكون النسبة العددية بيننا وبين موظفي المقاول العام ١ إلى ١٠ ، لا يمكن أن نكون في كل مكان في نفس الوقت. ويعرف كل شخص أنه عندما يلاحظ ويراقب يمينا تتم السرقة شمالاً [...] وتصبح الرقابة حسب التعاقد المنكوب الذي يترك المبادرة للمقاول العام مثيرة للسخرية طالما أنه علينا أن نسجل لمعجب الأخطاء التي يقع فيها المقاول العام دون أن نستطيع منعها" (٨٢)

وقد كشف أيضا مانتو بعد استقالته وقبل أن يرحل كيف كانت النوايا السيئة للمقاول العام واضحة ، فقد جاء إلى مصر بعمال أوروبيين مع أسرهم ووعدهم بشروط مميزة ثم دفع لهم أجوراً أقل بكثير مما صرح به وكانوا يتقاضون ما يكفي لأكلهم ، وكيف جاء بحرفيين سرحهم عندما لم تتوفر المواد اللازمة لعملهم (٨٣). وظهرت تعسفات وتجاوزات المقاول العام أكثر جلاء تجاه العمال من السكان الأصليين وتكشفت بوضوح الهوة بين الحقوق المكتسبة التي أعلنت على الملأ بواسطة الدعاية الضخمة وبين التصرفات الفعلية.

وأن كان الخديوي يحترم التعهدات باستدعاء آلاف الرجال من الريف من قرى مصر وإرسالهم إلى ورش قناة السويس ، فعلى العكس من ذلك لم يكن وكيل الأعمال ينفذ تعهداته. وكان مانتو يلاحظ ضعف الأجور التي تدفع للفلاحين إذ كانت أقل بكثير عما أعلن عنه. وقد رأى أيضا مانتو كيف أن مراقب المقاول في ورشة البلاح استخدم فلاحين في أراضي وعرة بالإضافة إلى عدم استطاعته تزويدهم بالمعدات المناسبة وقرر أن يدفع أربعين سنتياً عن كل متر مكعب تم استخراجة أكثر قليلاً عن الأجر المعتاد فوجه المقاول العام له اللوم على مبادرته . ويحكي أيضا أن العمال

كانوا ينتظرون أحياناً أجورهم طوال أسابيع كاملة وكانوا يضطرون للعودة إلى قراهم دون مال . بالإضافة إلى أن المقاتل العام يدفع للفلاحين فرنكات وستيمات لا يعرفون قيمتها بدلاً من أن يعطيهم قروشاً مصرية . أما العمال الذين اضطروا لأسباب عائلية أو صحية ترك العمل بالورشة قبل نهاية مهمتهم في أغلب الأحيان لم تكن تسدد لهم أجورهم .

ويري مانتو أنه يمكن تفسير العديد من حالات الهروب المسجلة في الورشة بسبب الإهانات وسوء المعاملة التي كان يتعرض لها العمال العرب من قبل المقاتل هاردون وكذلك نقص المياه في بعض الورش وتأخر المؤن عن البعض الآخر وبطء إيقاعات الإنتاج المفروض^(٨٤) ولكن خصوصاً ضعف المرتبات المدفوعة . وفي بعض الفترات على الخصوص وقت حفر حافة الجسر - العقبة الرئيسية في مسار القناة البحرية التي تصل إلى تسعة عشر متراً وطولها خمسة عشر كيلو متراً - كانت توزع حصص يومية من الطعام والشراب للعمال . وفيما يلي بيان تفاصيل قيمة الوجبة اليومية التي تحملها الشركة ومكوناتها :

تكلفة الوجبة اليومية للعامل العربي^(٨٥)

مكونات الوجبة الغذائية	الوزن	سعر الكيلو	سعر	التكلفة
الحصة اليومية	(بالكيلوجرام)	(بالفرنك)	يوم الأرز	يوم العدس
بسكويت	٠,٥	٠,٣٥	٠,٢١	٠,٢١
أرز	٠,٣	٠,٥	٠,١٥	
عدس	٠,٣٧٥	٠,٢١		٠,٧٨
سمن (دهن عربي)	٠,١٠٠	١,٦٦	٠,١٦٦	٠,١٦٦
بصل	٠,٠٤	٠,١١	٠,٠٠٤	٠,٠٠٤
سعر تكلفة الوجبة			٥٣ فرنك	٤٥ فرنك

ونحن نرى مانتو أنه إذا ما تركنا جانباً النسبة التي يحصل عليها المقاتل العام باستمرار في الخليج على بيع المواد الغذائية (٧ %) فقد كان المقاتل يحقق ربحاً على كل وجبة يومية تُقدم للفلاح

يقدر ١٧ ستيماً في حالة و ٢٤ ستيماً في حالة أخرى عندما يقدم للشركة فاتورة قيمتها ٧٠ ستيماً بكشف حساب . فضلاً عن ذلك ، قدم عمال ورش الجسر عدداً كبيراً من المتظلمات يشكون فيه من التفتير في توزيع الطعام المقدم لهم. وقد أدت زيادة السخط إلى حث مانتو على طلب التأكد من وزن المواد الغذائية المختلفة التي توزع فعلياً على العمال وقد أكدت نتائج المراقبة صحة هذه الشكاوي.

نتائج مراجعة الكميات الموزعة

المواد الغذائية	بسكويت	أرز	دهن عربي	بصل
الوزن (جم) المفروض	٥٠٠	٣٠٠	١٠٠	٤٠
الوزن (جم) المكتشف	٤٢٥	٢٩٥	٦٣	٢٥

وهكذا تم إثبات أن التجاوزات التي يمارسها المقاول العام لا حدود لها. ويؤدي مانتو ملاحظاته بأسلوب حقيقي ومجازي في نفس الوقت : " لم يكن من النادر قطع البصلة إلى أربع لتقليص نصيب هؤلاء البؤساء "

ولم تكن تعد عواقب نظام التسيير النفعي (الشركة المنتفعة) الذي يدفع المقاول إلى التوفير في كل شئ . وهناك مثال آخر أخذ في مجال مختلف جدير بالإقناع . وقد تم تخفيض المقاول على اقتراح متغيرات في مسار القناة لأنها بكل بساطة تقلل حجم أعمال الحفر . وبهدف تقليل كمية الردم استحدث منعطفان في مسار القناة البحرية في شمال حوض بحيرة التماسح.

إلغاء العقد علامة بانتهاء مرحلة


حصيلة سلبية

إن نفقات التسيير النفعي هائلة ، وليس ثمة تكافؤ بينها وبين الأعمال التي نفذها المقاول العام. كما لم تترجم الأوامر التي قلمتها الشركة إلى أفعال من أجل زيادة حجم الأعمال الفعلية على أوسع نطاق وتبسيط الأعمال الإدارية وتخفيض نفقات الموظفين بشكل ملحوظ . واشتدت حدة التوتر بين وكلاء الشركة والمقاول العام وتزايدت الصراعات للذرائع أكثر تفاهة. وبذلك تباطأت الأشغال كثيراً وتم تعبئة الطاقات من الجانبين في كتابة تفسير الشكاوى المرسلة و المتبادلة.


أما الظروف التي كان يعيش ويعمل فيها رجال الورشة فلم تتحسن تماماً ويبدو أن الوضع كان أكثر صعوبة في وسط الخليج . والصورة التي رسمها مانو تعطي فكرة عن ذلك فقد " كان تموين علف الماشية من التبن والبقول والشعير أيضا غير منتظم، وكان عدد الوفيات ضخماً بسبب المجاعة [...] لم تكن تُدفع الأجور. وهناك نقص في المؤن [...] نقص في الأوعية والملابس والأحذية الملائمة لطبيعة المكان . لم تصل ملابس صيفية طوال الصيف [...] كما كان يوجد داخل الخليج معتقل يُرسل إليه من يسيء السلوك وليس على المرء أن يشكو ما لم يمت جوعاً [...] إن المواد الغذائية الموجودة في مخزن دمياط لاتصل " (٨٦).

لم يكن يحالج أحد الشك في أنه قد تم اتخاذ قرارات مؤسفة ومضرة . إحداها تلك المتعلقة بترعة الماء العذب ، فقد جعل المشروع التمهيدي من حفر هذا الممر المائي الذي هو عبارة عن تحويل لماء النيل يبدأ من القاهرة ليتصل بالقناة مزوداً في طريقه مركز الخليج ثم السويس فيبورسعيد، عملاً ممهداً لكل الأشغال (٨٧). إلا أن صعوبات تطبيق مثل هذا المشروع ظهرت بسرعة و كان من الضروري لحفر الجزء الأول من القناة نزع الملكيات في ضواحي القاهرة. وبالرغم من أن الحكومة المصرية كانت تتمسك بتنفيذ القناة إلا أنها لم تستطع أن تتمادي في إعطاء شركة خاصة مثل هذه الحقوق . علاوة على ذلك ظهر أن عملية نزع الملكية باهظة الثمن نظراً لارتفاع قيمة الأراضي نسبياً قرب العاصمة المصرية (٨٨) عندئذ قررت الشركة التنازل عما كانت تعتبره حقاً لها، فقبلت أن يلحق فرع ترعة الماء العذب المنطلقة من ضواحي العاصمة بسهل الوادي وأن يُترك للحكومة المصرية القيام بتنفيذ الأعمال . والمفروض أن تتم هذه الأعمال بعقد اتفاقي حسب تقديرات المشروع التمهيدي (٨٩) ووفق المواصفات الفنية لبرنامج اللجنة الدولية . وعندما بدأت الورشة في العمل تم إيقاف إنجاز ترعة الماء العذب دون تحفظ أو شروط.

قرر المفاوض هاردون بالإتفاق مع رئيس الشركة ، على عكس الرأي الذي عبر عنه المجلس الأعلى للأشغال المجتمع في نوفمبر ١٨٥٨ ، أن يركز جهوده أكثر في حفر مجرى بين بورسعيد والتمساح، وهي البداية المقبلة للقناة البحرية المتخيلة هذا من جهة ، كما قرر من جهة أخرى أن يختار حلاً رآه بأنه الأسرع والأقل تكلفة لحفر ترعة الماء العذب ويتمثل في إعادة استخدام أجزاء من قناة قديمة موجودة . ويجب مع ذلك أن نذكر بوضوح ، منذ عام ١٨٦٠ ، أن معدل صرف المياه في القناة القديمة ضعيف جداً وغير منتظم كي يستطيع تزويد الورش بالماء وبكميات كافية حيث كان يخضع لتغيرات صرف فرع النيل الذي يقع عليه ، بل كان خاضعاً أيضاً إلى تنافس المزارعين الذين يستمدون الماء عند المنبع (٩٠) وعلاوة على ذلك وعلى النقيض من المشروع الأصلي لم تكن القناة القديمة تصلح للملاحة نظراً لصغرها .

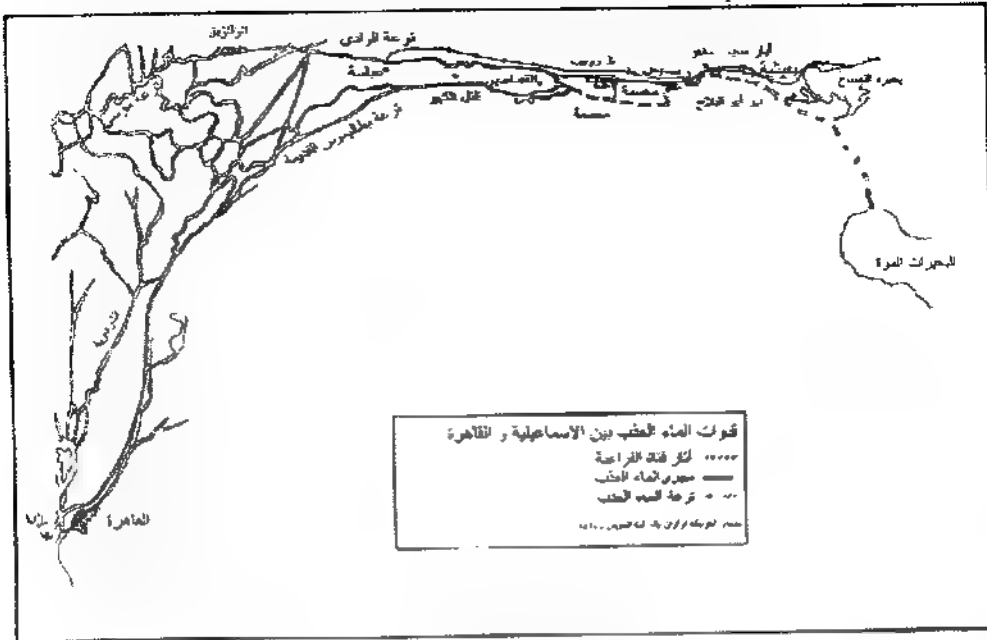

قنوات الماء العذب بين الاسماعيلية والقاهرة

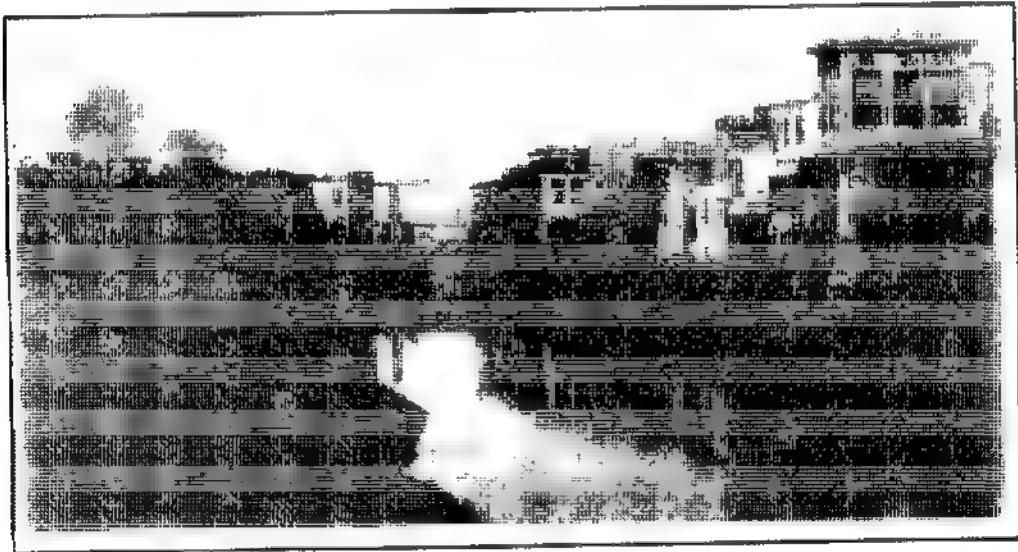


قناة الماء العذب في الزقازيق

(صورة أديرة - مقتنيات دييجورج الخاصة)

ويمكن التساؤل عن أسباب مثل هذا القرار الذي غير النظام البدائي للأشغال وعوقل جسدياً تنفيذ الأعمال المقبلة في الخليج. في الواقع لم يكن السبب الغالب طابع فني بل يرجع إلى قرار يهدف على الأكثر إلى وضع الثقة في شركة مقاولات حفر خليج السويس ، وإعطاء الأولوية لحفر خندق لتمثيل القناة بين بور سعيد وبحيرة التمساح، أراد رئيس الشركة القضاء على الاعتراضات المعادية للمشروع والتي كانت تمثل بالنسبة إليه انشغالاً حقيقياً^(١١) وعند تقديمه لأولى النتائج الملموسة كان يعتقد أنه سيفرض الصمت على المتشككين . وبالرغم من اقتناع المفاوض بهذا

الاختيار الذي يخفض بشكل هائل تكلفة أعمال ترعة الماء العذب إلا أن الأمر لم يكن في الحقيقة كذلك بالنسبة لرؤساء القطاعات بالشركة . وفي رأي مونتو من الواضح انه بالخضوع لثل هذه الاعتبارات وتجاهل حفر ترعة الماء العذب : " تم الشروع في أعمال القناة البحرية دون هذه التحضيرات اللازمة " (٩٢).

بالنسبة لعمليات الحفر ، في البداية ، خصت الأعمال المنفذة خلال السنتين ١٨٦١-١٨٦٢ ، ترعة الماء العذب الممتدة لقناة الوادي المتفرع من النيل والتي حفرت حتى بلغت وسط الخليج في ٢ فبراير ١٨٦٢ ، كما خصت إنجاز خندق عبر عتبة الجسر وأخيرا إقامة جدول بصور مسبقا القناة البحرية التي تربط بين بور سعيد وبحيرة التمساح . ووصلت مياه البحر المتوسط في ١٨ نوفمبر ١٨٦٢ إلى بحيرة التمساح بعرض ١٥ متر عند خط المياه وبعمق حوالي مترين بفضل هذا الجدول الذي حفر على الضفة الأسيوية للقناة المقبلة.

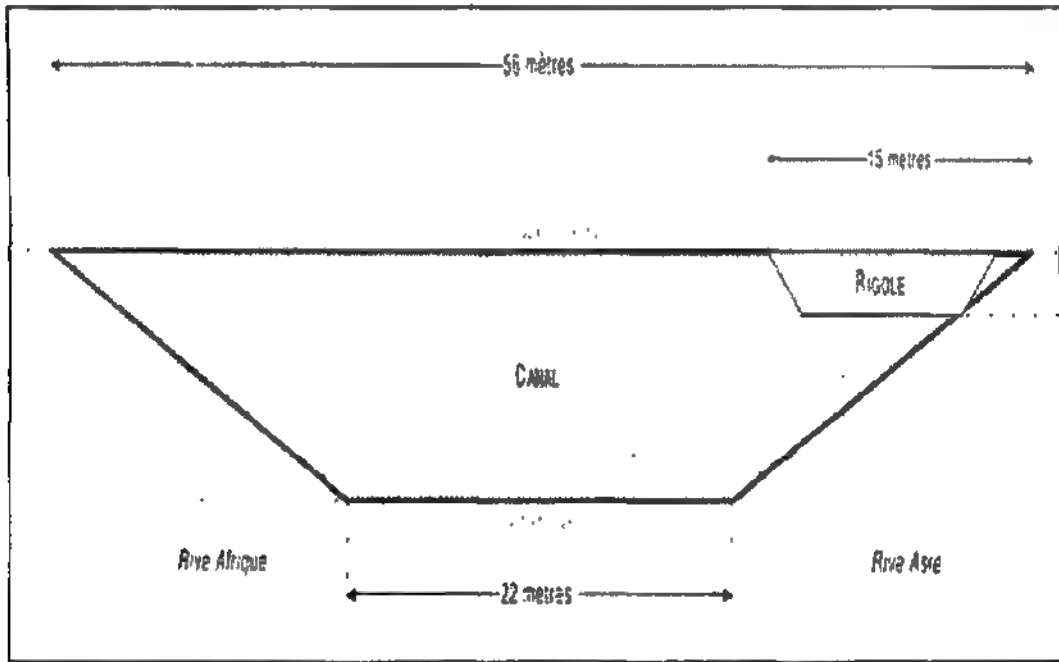

رسم مقطع جانبي للجدول الذي تم تنفيذه والقناة البحرية حسب مشروع اللجنة الدولية

وظلت هذه النتائج ضعيفة جدا بالنسبة لحجم الحفر اللازم لإنجازه .

وأدت التجاوزات التي حصرت وكذلك تدهور المناخ في موقع العمل وخاصة تواضع نتائج الأعمال بالنسبة للمبالغ الضخمة التي صرفت ، إلى إلغاء في أول يناير عام ١٨٦٣ ، العقد الذي يربط المقاول هاردون بالشركة . وإذا اعتقد دي ليسبس ، المهتم بالنتائج أكثر من الوسائل ، في وقت ما أن "التقدم في العمل يعرض الأخطاء الإدارية" (٩٣)، فقد لزم عليه في نهاية عام ١٨٦٢ أن يعترف ويسلم بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة واستدعاء كفاءات أخرى.

وإذا كان رئيس الشركة يكتفي في الواقع بإرسال كتاب الفلاحين الذين يمثلون أيدي عاملة رخيصة للغاية، فمن الخطأ الاعتقاد بانعدام الرغبة تماماً في استعمال الماكينات و عدم وجود محاولات لتصميمها.

مأزق أيضاً على صعيد التقنية


تكمل دراسة هذه المحاولات صورة الوضع السي الذي تركه هاردون عند رحيله. كما تصيح التعرف على حجم المشاكل الفنية الواجب حلها.

فمنذ بداية المشروع التمهيدي كانت الرغبة جلية في اللجوء إلى استعمال الحفارات البخارية وقد تم تقدير العدد الضروري لتنفيذ الحفر تحت الماء بثمان وثلاثين حفاراً وكذلك إلى آلات لرفع الأتربة^(٩٤). ولم يكن غريباً القرار الذي اتخذته موجيل بشأن استخدام الآلات فبعد عودته من رحلة قام بها إلى إنجلترا في بداية حياته العملية كمهندس الطرق والكباري اكتشف موجيل، أنه يوجد وراء بحر المانش كل ما تستطيع أن تقدمه المكنة والآلات البخارية لتنفيذ الأشغال العامة. وعند عودته نشر موجيل مجموعة من اللوحات والتوضيحات " عن الآلات التي تعمل في خارج حدود فرنسا والتي كان المهندسون الفرنسيون يجهلون وجودها رغبة منه في تقاسم ما توصل إليه من اكتشافات مع مواطنيه^(٩٥) ونجد بينها أيضاً ماكينة لنقل الأتربة حديثة الابتكار وتستعمل - ليس في إنجلترا وهذا شيء استثنائي - بل في إقليم البلاتينا (Palatinat) ، صممها كارتلمان (Kartemann) لأجل حفر قناة لويس وتتكون من عدد من الصناديق موصولة بواسطة سلسلة دائرية (دون نهاية) وتدار بالبخار ، ترفع محملة بالركام إلى قمة ضفة النهر . وقد عقد موجيل العزم على أن يستلهم الكثير من هذا النموذج لابتكار الماكينات اللازمة لنقل الأتربة التي استخرجتها الجرافات من قناة السويس. وقد كان أكسب من قبل بعض الخبرة عن الجرافات . فعند وصوله إلى مصر لبناء حوض الترميم (الترسانة) بميناء الإسكندرية بناء على طلب الحكومة المصرية طلب موجيل عشرة جرافات في عام ١٨٣٩ لسد احتياجات هذه الورشة^(٩٦). علاوة على ذلك، فقد وضعت ثمان جرافات بخارية تحت تصرفه أثناء عملية بناء سد نهر النيل الذي تولى إدارتها بين عام ١٨٤٦ وعام ١٨٥٣ .

وفي ديسمبر ١٨٥٨، أي خلال الفترة التي تم فيها تشكيل طاقم العاملين بالشركة، طلب موجيل من بورديون (Bordillon) رئيس مكتب بقسم باريس في ذلك الوقت وضع ثلاث آلات تحت الدراسة : جرافة عائمة وحفارة لرفع أجزاء الردم المراد تنفيذها في المناطق الواقعة فوق مستوى سطح الماء وآلة نقل مكونه من نسيج بلا نهاية (دائري) مركب بالضرورة مع الآلتين

السابقتين. وقد شهد موجيل استعمال حفارة قام فري (Frey) بتصميمها وشرح المكتب الشركة في باريس بعض أمس هذه الآلة التي من المستحسن - في رأيه تقليدها ^(٩٧) - وقد أنتقل عدد من الإداريين وأعضاء مجلس الأعمال لمشاهدة الماكينة الجديدة حاملة الأتربة التي صممها كلا باريد (Claparède) وكومرتان (Commartin) وهما يعملان في ورشة سان مرتان (Saint Martin) ^(٩٨) ولكنهم لم يقتنعوا بهذه الماكينة بعد أن لاحظوا صعوبة وزمن تركيبها وكثرة عطلها.

كما تتكون ناقلات النسيج الدوارة (Toiles sans fin) من قطعتين طويلتين من الخشب تشكل الإطار الذي يشد حولهما بساط من قماش متين. ويوجد في طرفي البساط أسطوانتان تحركهما قاطرة تزدي إلى انتقال البساط الوجه بواسطة لفافات وضعت على طول الإطار . وقد اتضح من التجارب الأولى سرعة تلف النسيج المستخدم وضعف القطع الخشبية. و في يوليو ١٨٥٩ تم اختبار نموذج جديد مكون من كمره معدنية قامت بصنعها مؤسسة كالايريد وكومرتان. ولإنجاز ذلك، استأجرت الشركة جرافة من مصنع كافيه (Cavé) وحصلت من مدينة باريس على حصة لتنظيف مجرى الماء بالجرف بين كوبري نيسي (Neuilly) وسيفر (Sèvres) كحقل تجارب. وظهر من جديد أن المشكلة الرئيسية هي تلف النسيج المستخدم بسرعة هائلة. وكان لابد من انتظار عام ١٨٦٠ حتى يتم القيام بدراسات جديدة خاصة لآلة نقل ، ووجدت الشركة هذه المرة في حي بيت - شومون (Buttes - Chaumont) بباريس، موقعاً يمكن فيه تركيب جهاز جديد ، طلبته من مصنع بيروت (Perotte) ، في حالات تكاد تكون مماثلة لظروف عملها في مصر. وظلت النتائج دون المستوى .

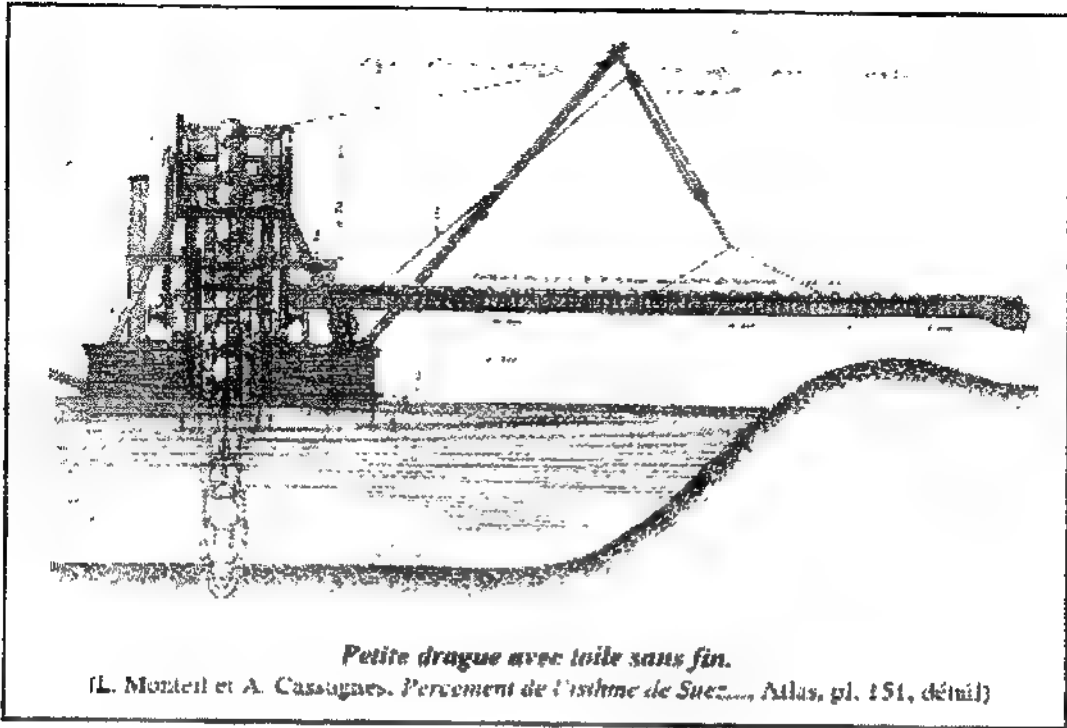

Petite drague avec toile sans fin.

(L. Montell et A. Casaguer. Percement de l'isthme de Suez, Atlas, pl. 151, détail)

حفارة صغيرة مزودة بنسيج دائري

(ل مونيل و أ كاساني حق قناة السويس أطلس لوحة ١٥١ تفاصيل)

في الوقت الذي كانت فيه الشركة تواظب على إجراء اختبارات على الناقلات الدوارة ، قام هاردون من جانبه بإعداد قائمة طلباته من المعدات التي لم تكن تأخذ بالاعتبار الدراسات التي قام بها المكتب الفني للشركة . وتم عقد عدة اتفاقات مع صناع مختلفين سواء من أجل شراء جرافات (كراكات) وأجهزة نسيج كما طلب من كل صانع أن يعرض جهازه وأفكاره . وقد طلب إجمالاً عدد أربعة وعشرين جرافة وواحدة وعشرين نقالة دوارة من صناع من مدينة ليون بفرنسا ومن بلجيكا .

لم تكن الجهود التي بذلها المقاول العام أكثر إقناعاً من جهود المكتب الفني بالشركة . وقد رأى بوشي (Pouchet) أن الأسلوب الذي أنتهجه المقاول العام لم تكن فرصه في النجاح كبيرة : " وتستكمل المشتريات بالضرورة بعضها البعض حتى يمكن التوصل لصنع جرافة ، إلا أن العقد أبرم بدون أية دراسة سابقة ، وتركت جزءاً من العمل ليقوم به المقاول العام في مصر وصممت في بداية العمل أربعة نماذج مختلفة طبقت على أربعة وعشرين جرافة وقد شكل كل هذا مجموعة من الأسباب الكافية لتؤدي إلى الفشل الذي عانوا منه عند بدء تشغيل الجرافات . ولم يكن على المورد في أي حال من الأحوال مسئولية اختبار جرافاته فقد كان يتعجل الصنع بفرنسا حتى يوفي بمواعيد

التصدير ويخلى بسهولة مسئوليته في حالة التأخير في التركيب أو سوء التشغيل في مصر . وقد زادت أسباب التأخير وسوء التشغيل بشكل واضح بسبب ضعف الأجهزة الناقلة أو النسيج الدائري (بلا نهاية) التي أضيفت للجرافات والتي اشتراها المقاول العام بنفس الأسلوب أي بدون القيام بدراسة جدوى مسبقة. " (٩٩)

ويسهل على الموردين في هذه الظروف إلقاء مسؤولية عدم تشغيل الآلات بعضهم على بعض . وتوالت الخلافات التي كان من الصعب حلها. وبدأ ذلك بجلاء في بيان جلسة اللجنة بتاريخ ١١ مارس ١٨٦٢ : " للتنسيق بين كل هذه العناصر المختلفة هل نرى على الأقل إرادة نشطة و يقظة دائمة ؟ تصل الماكينات إلى مصر والأخشاب غير جاهزة ، وأثناء التركيب يراد تغيير بعض الترتيبات التي قد وقع من قبل الاتفاق عليها. لا شئ ينجح أو ينتهي إلا بعد ضياع وقت طويل. كما يلوم مورد الماكينات المسئول عن تسليم الخشب ويشكو وكيل الأعمال [...] تُعتبر وتضيع قطع عدد كبير من الماكينات في وسط هذه الخلافات ، ولم يتحقق أي عمل جاد والشركة التي دفعت كل شئ لا ترى أية نتيجة مفيدة مكافأة لجهودها " (١٠٠) .

و يمكن أن تكون هذه الصورة المعروفة على هذا النحو، تحتوي على ما قد يدفع المساهمين بالشركة على اتخاذ قرار بالرحيل بسرعة بفرض أنهم تمكنوا من الاطلاع عليها .

رقد ذكر مدير عام الأشغال في تقريره المؤرخ في أول أغسطس ١٨٦١ أنه وفقاً لنص العقود التي تم التوقيع عليها مع الصناع كان من المفروض أن يتم تشغيل أربعة وعشرين جرافة بصورة كاملة لتستخرج ألف متر مكعب يومياً إلا أن خمس جرافات فقط كانت تعمل . علاوة على ذلك، لم يتم تشغيلها سوى بين ٤ و ٢١ يوماً إجمالاً (١٠١) . وهذا ما أكدته بوشي (Pouchet) عندما وصف دون محابة وبعض السخرية تشغيل آلات الحفر الميكانيكية المستعملة في الخليج بهذه الكلمات : " عندما تركنا بورسعيد رأينا أول جرافتين في التصليح. على الأولى كانوا يحارلون بإصرار وضع أنابيب شفافة من خشب البان مثل تلك التي تحطمت مرتين من قبل . وعلى الأخرى كانوا منشغلين بتغيير النسيج بلا نهاية (النقالة الدوارة) بسير من السيور التي تحرق بالضرورة نفس الكمية من الماء والرمال لسهولة جريان المواد التي كانت تسقط تقريباً كاملة في العمق لأنه لم يكن يحملها لمسافة كافية من هيكل السفينة. وكانت الملاحاة تتم في ظروف غريبة : سواحل مجرى الماء (الحفرة) ضيقة لدرجة يتعذر معها مرور قارب صغير بمجذافيه ، وفي حالة غياب الرياح الآتية من الخلف يضطر العمال العرب طول الوقت إلى جر الحبل . ونجد في القنطرة الجرافة التاسعة والأخيرة والتي أبرزت صورت مجلة (Illustration) بها النقل في الصحراء . وقد عملت هذه

الجرافة التي تم تركيبها في نهاية شهر مارس ١٨٦١ أربع مرات فقط. وتراوح مجموع مدة هذه المرات الأربع بين ساعة وخمسة وأربعين دقيقة وساعتين. (١٠٣)

وفي أثناء شهر يوليو ١٨٦٢ أي بعد عام لم يكن الوضع مرضياً أبداً ، فكانت تستخدم خمس عشرة جرافة فقط أما التسع فمازالت مجرد هياكل .

الخلاصة، لم تكن أي آلة تم إرسالها إلى الخليج على المستوى المطلوب فقد أتضح عند التشغيل كثرة العيوب الخطيرة للجرافات ، و لم يكن تركيب وصلابة الهياكل مرضياً تماماً، وكان استهلاك الوقود مرتفعاً للغاية، كما تعرضت الآلة المحركة باستمرار لسوء التشغيل وكانت السيور تتمدد أو ترتد ، وبدأت الهياكل الحديدية غير صلبة و الهياكل الخشبية مشوهة ، وظهر أن الذراع المتحرك الذي تدور حوله سلسلة الكراكة (les élindes) (١٠٣) طويل جداً كما أن أقسام السلسلة صغيرة بحيث تجعلها ضعيفة (١٠٤). أما بالنسبة لمختلف أساليب السيور الدائرية فقد أظهرت جميعها نفس العيوب مثل سرعة تلف الآلات وارتفاع تكلفة التشغيل ، والأعطال المتكررة . ولم يقتصر الأمر على الآلات التي كانت تعطل وتتوقف عن العمل لو صدق بوشي (Pouchet) بل ظهرت بعض أقسام العمل وكأنها ورش خالية ومهجورة : " تم تثبيت أوتاد على طول من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ متر لتشغيل عجلة النقل بالسير ولكن يبدو أنها لم تستعمل قط . أخيراً وعلى بعد ١٠٠٠ أو ١٢٠٠ متر من المخيم نجد الجسر البلجيكي المائل (le plan incliné belge) الذي طلبت اللجنة تركيبه بسرعة منذ ٦ أو ٨ شهور . وكان يجب استخدام الجهاز لإجراء تجارب مقارنة على محرك - حصان، جل أو قاطرة . وسأشير بكل بساطة ودون الدخول في تفاصيل التركيب إلى سلسلة المحرك التي تم تركيبها عكس الوضع الطبيعي . وكان يدار فارغاً عندما يمر شخص ما - وكانك تستخدم بغلة صغيرة تصبح بعد دقائق قليلة غير قادرة على القيام بأي مجهود . والخلاصة أن المظهر العام مؤلم بما فيه الكفاية ."

وكل هذا على الرغم من المبالغ الباهظة التي تكبدتها الشركة في عمليات شراء الآلات .

ضربة قاضية جديدة من إنجلترا

لقد تعرضت الورشة التي كانت مسرحاً للخلافات الداخلية الشائكة بشكل خاص إلى هجوم إنجليزي جديد. فقد عادت المعركة الدبلوماسية لوقف أعمال القناة من جديد أكثر شراسة بعد موت الحديوي سعيد صديق فردينان دي ليسبس والراعي الرئيسي للشركة في ١٨ يناير ١٨٦٣. وقد تركزت نحو السلطان العثماني كل الجهود التي ما لبثت أن أتت ثمارها. وقد هاجم الإنجليز الشركة في أحد نقاط ضعفها الأساسية وهو التصديق على فرمان الامتياز . ولم يكن إسماعيل الذي حل محل سعيد معارضاً للقناة ، ولكن لم يكن دي ليسبس على صلة وطيدة به كما كان مع سلفه وأيضاً بدا واضحاً أن الحديوي الجديد لا يتم التأثير عليه بنفس الدرجة من السهولة.

وتوضح مذكرة السلطان للشركة بتاريخ ١٦ أبريل من نفس العام الشروط اللازمة للتصديق على عقد الامتياز وهي ضمان حياد القناة المقبلة و إلغاء العمل الإجباري والتنازل عن البند في فرمان الخاص بقنوات المياه العذبة والتنازل عن الأراضي المجاورة .

ولقد كان إلغاء السخرة شرطاً ضرورياً للحصول على الامتياز . وقد كان ذلك نتيجة حملة اعتراض نظمها الصحافة الإنجليزية لتحقيق مصالحها الدبلوماسية التي لم تكن في هذه الظروف إلا وسيلة جديدة لوقف الأشغال وذلك في الوقت الذي كان فيه موضوع تحرير العبيد موضوع الساعة - ففي الواقع كان الرئيس أبراهام لنكولن قد أعلن توطأ تحرير العبيد السود وتم أيضاً رسمياً إلغاء السخرة في روسيا - وقام رجال السياسة الإنجليزي بإدانة اللجوء إلى استخدام الشركة للسخرة ووقف الرأي العام وراءهم . واستجاب السلطان لطلب الدبلوماسية الإنجليزية بسحب الفلاحين المصريين من الورشة .

على عكس ما كان يحدث منذ بدء الورشة لم تعد الأمور تتباطأ . ففي الأول من أغسطس التالي دعت رسالة وزارية الخديوي إلى أخذ التدابير اللازمة بالاتفاق على عجل مع ممثلي الشركة . ومع ذلك بدلاً من الامتثال على الفور لأوامر السلطان بهدف تخفيض حدة الشروط الموضوعية للتصديق على عقد الامتياز ، أرسل الخديوي أحد مساعديه ، الخاور الماهر نوبار باشا إلى القسطنطينية لكي يحصل على الموافقة للتفاوض مع الشركة ووافق الباب (العالي) على ذلك وعرض نوبار باشا متطلبات أكثر تساهلاً ، واقترح بأن يقلل عدد الفلاحين الذين يرسلون لورش الشركة من ٢٠ ألف إلى ٦ آلاف وأن يرفع أجرهم اليومي إلى فرنكين . ولما رفض مجلس إدارة الشركة هذه الاقتراحات ^(١٠٥) اضطر السلطان الحكومة المصرية ، بعد ذلك بقليل ، إلى إلغاء عملية إرسال عمال السخرة إلى خليج السويس كلياً وبصفة نهائية . ووصل الخلاف إلى ذروته أمام ناهليون الثالث الذي قبلت كل الأطراف المعنية قرار تحكيمه ^(١٠٦) . وعندما طُرح السؤال على الخامي إميل أوليفيه (Emile Ollivier) عن الأسس القانونية لهذا الموضوع كتب تقريراً قدمه إلى الدوق دي مورني (Le duc de Morny) رئيس القسم التشريعي ، ولخص فيه بدقة الوضع وأشار بطريقة غير مباشرة إلى فضل دي دي ليسبس في نجاح حفر قناة السويس قائلاً : " لما كان من الصعب في البداية الحصول على موافقة الباب العالي [سعى دي ليسبس] بمهارة حذرة إلى خلق واقع جديد في غاية الأهمية وذلك حتى لا تضطر فرنسا إلى طلب تسوية إجبارية ؛ فهو يبدو متواضعاً في الوثائق الرسمية وفي الحقيقة لا يهتم بتاتا بالمعارضة ؛ كان يتحدث عن دراسات تهديدية ويقوم بتنفيذ الأعمال النهائية ؛ ويحاول التأكيد بكل الأساليب من مشاركة الخديوي وإذا لزم الأمر يذكر اسم الإمبراطور للتغلب على تردده . وأخيراً لا يهتم بصرامة القانون ولا يهدف سوى

الاحتماء خلف ميامة الأمر الواقع ؛ تلك كانت خطة دي ليسبس ولا أقول أنه كان ممكناً بلوغ الهدف بنهج أسلوب غير هذا ، فعلى الأقل ، فليُسمح لفقهاء القانون دون انتقاد هذه الدبلوماسية ، بالأيستلوا عليها مبادئ القانون الصارمة " (١٠٦) .

كان رأي إميل أوليفيه أن رئيس الشركة لم يكن مصيباً على الإطلاق : " كان خطأ دي ليسبس الدائم في هذه المناقشات اعتباره أن كل حدث فردي من جانبه يصبح ملزماً للطرفين (synallagmatiques) ما لم يواجه معارضة . و قد يكون أسلوب إبرام العقود ملائماً للغاية [...] ولن يكون إعتبار الصمت وحده معناه الموافقة " (١٠٧) . لذلك كان رأيه أن الشركة فيما وصلت إليه لا تستطيع غير الامتثال للأوامر التي فرضت عليها .

وأدلى نابليون الثالث بالحكم في ٦ يوليو ١٨٦٤ و على النقيض من رأي الدوق دي مورني (de Morny) الذي اقترح تصفية الشركة دون تحفظ ودون شروط ، طلب نابليون إعادة الشركة للأراضي وترعة الماء العذب وكذلك إلغاء إرسال الفلاحين إلى الورش . مقابل ذلك تسدد الحكومة المصرية للمقاوول العام مبلغ أربعة وثمانين مليون فرنك (١٠٨) وهو ما يوازي تقدير الخسائر التي تحملتها . وقد فرح الإنجليز عند إعلان هذا القرار معتقدين أن ضربة قاضية قد أصابت الأشغال في القناة .

انتهت السخرة في الأعمال التي تقوم بها الشركات الأجنبية فعلياً في نهاية عام ١٨٦٤ ، ولكنها استمرت مع ذلك تستدعى للقيام بالأشغال العمومية التي تقوم بها مباشرة المصالح المحلية وبالأخص في عام ١٨٦٧ في بناء خط سكة حديد القاهرة - الخرطوم ، بل أيضاً في عام ١٨٦٦ من أجل إنجاز ترعة الماء العذب (١٠٩) التي وقع تنفيذها منذ ذلك التاريخ على عاتق الحكومة المصرية ، بناء على إنفاق جديد ، بالرغم من إنها تم الشركة في المقام الأول .

أما بالنسبة لمجموع عدد الفلاحين الذين استخدموا فعلاً في أعمال السخرة في ورش قناة السويس منذ بداية الأعمال ، فمن الصعب تقديره بدقة كاملة . إذ لم تحفظ بشكل عام الوثائق المتعلقة بالسخرة في أرشيف الشركة إلا قليلاً ، ولكن ترجع صعوبة جمع المعلومات المترابطة والمنهجية عن عدد الفلاحين الذين أمتدعوا ، إلى أن المداوولات بشأن هذا الموضوع بين الخديوي ورئيس الشركة كانت تتم بأكبر قدر من السرية (١١٠) . و انطلاقاً من حقائق جزئية ومتناثرة تم جمعها والمقارنة (١١١) بينها يمكن أن نقدر العدد بعشرين ألف متوسط الدفق الشهري للفلاحين الذين أتوا لتنفيذ أشغال الردم في الخليج و حوالي أربعمئة ألف هي إجمالي مساهمة سكان القرى المصرية في أشغال قناة السويس .

بعد إلغاء التعاقد مع المقاول وعلى أثر تجارب السنوات الأولى بقيت مسألة تنظيم أعمال هذه الورشة الضخمة مطروحة . ويتعلق الأمر بمواجهة حالة الفوضى العامة التي سادت ، وإيجاد الحلول المناسبة وإنهاء هذا الوضع الذي تراكمت فيه الصعوبات وتشابكت بعضها ببعض لدرجة توقف حركة العمل . علاوة على ذلك ، فَرَضَ سحب الأيدي العاملة إيجاد حلول ميكانيكية لمسألة الحفر . وهذا هو التحدي المزدوج الذي يجب رفعه .

هوامش الفصل الأول

عملية جريئة ومعقدة

(١) مريد من التفاصيل عن مصطلح فكرة وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط والمشروعات الأولى، الإطلاع خاصة

على J. Charles-Roux, op. cit., tome 1, 516 p.

وقد عادت الفكرة من جديد إلى الظهور أثناء حملة بوناپرت على مصر . ويرجع إلى ذلك الوقت تاريخ مشروع

Jacques-Marie Lepère : Mémoires sur la communication de la mer des Indes à la Méditerranée par la mer Rouge et l'isthme de Suez, P., Impr. Royale, 1815, 168 p.

2) « Avant-projet du percement de l'isthme », in de Lesseps, Percement..., op. cit., tome 1, pp. 67-214

3) Charles Alfred Oppermann, 300 projets et propositions utiles, P., Imprimerie Thunot, 1866, p. 79

4) J. Charles-Roux, « Le canal de Suez : 1854-1899 », Revue de Paris, 1899, p. 23.

(٥) مع أن أعضاء اللجنة الدولية لم تكن بلادهم قد كلفتهم رسمياً فقد قاموا بتمثيلها بصفة شبه رسمية . فكان يمثل إنجلترا قبطان البحرية البريطانية في الهند هاريس والمهندسون ماك لين وريثالد ومانبي ويمثل النمسا مفتش عام السكك الحديدية للنمسا نيجري في وإسبانيا مدير عام الأشغال مونترينر ويمثل إيطاليا وزير الأشغال العامة لمدينة ساردينيا باليوكاها ولذلك كان رئيس المهندسين وتر سات كونرد ويمثل بروسيا رئيس مهندسي أشغال فيستل لير . أما فرنسا فقد كان يمثلها قبطان السفينة جويس ومهندس المياه البحرية ليسو واللواء البحري ريجودي جيئوي ومفتش الطرق والكباري رينر . (عن كتاب

Voisin Bey, Le canal de Suez, P., Dunod, tome I, 1902, p. 53.

6) Alexis et Emile Barrault, Le canal de Suez et la question du tracé, P., J. Claye, 1856, 40 p

7) P.A. Bourdaloue, Notice sur le nivellement de l'isthme de Suez, Bourges, 1856, 25 p.

(٨) تم سرد تفاصيل العلاقة بين فردينان دي ليسبس والسان سيمونيون في عدة دراسات من أهمها وأقلها تحيزاً :

Henri-René d'Allemagne, Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIXe siècle, P., Gründ 1935, pp. 105-116,

Georges-Edgar-Bonnet, « Ferdinand de Lesseps et les saint-simoniens », Le monde français, n° 15 et n° 16 de décembre 1946 et janvier 1947 et de Georges Taboulet « Aux origines du canal de suez. Le conflit entre Ferdinand de Lesseps et les saint-simoniens », Revue historique, 1968, n° 487, pp. 89-114, et n° 488, pp. 361-392.

(٩) وقد حصل على موافقة الجمعيات الآتية : المؤتمر العلمي الفرنسي وجمعية برشلونة الاقتصادية ، أكاديمية الزراعة في تورينر بإيطاليا والجمعية الجغرافية بالنمسا ومعهد المهندسين بهولندا وجمعية علوم هارلم والجمعية الجغرافية

باريس و أكاديمية العلوم الإنسانية والسياسية بفرنسا والمؤتمر الذراعى في فروغرا (ييمون شمال إيطاليا)
وأكاديمية العلوم بنابولي وجمعية الاقتصاد السياسى في مدريد والجمعية الجغرافية في روسيا عن

In Voisin Bey, op. cit., pp. 110-111.

وقد سمعت أكاديمية الإمبراطورية والملكية للعلوم بفيينا وأكاديمية العلوم ببولندا مداخلات خلال جلساتها عن هذا
المشروع

10) Eugène Flachet et Léon Molinos, « Note sur le rapport de la commission internationale pour le percement de l'isthme de Suez », BSIC, 1857, p. 46.

11) Edmond Morant, Le canal de Suez et l'histoire extérieure du second Empire, P., E.Figuères, 1936, p.24.

(١٢) باسم حاني شريف في ٢٥ مايو ١٨٤١ القائم بإدارة أحوال كل من الباشا وخديوي مصر والباب العالي
حكومة الإمبراطورية العثمانية ، لا يحق لحكام مصر العموميين إلا ميراث الإدارة أما ملكية البلد والسلطان .

13) Odilon Barrot, Dufaure et Jules Favre, Nouvelle consultation pour son altesse Ismail Pacha, vice-roi d'Egypte, s.l., 1863, p.

(١٤) للولاء بوعدده يجب على البلد اكتتاب قرض نتائج وخيمة للحالة المالية في المستقبل . انظر لهذا الموضوع
الأخير :

David S. Landes, Banquiers et Pachas. Finance internationale et impérialisme en Egypte, P., Albin Michel, coll. « L'évolution de l'humanité », 1993, 404 p

(١٥) بند رقم ٢٤ من لوائح الشركة المضافة إلى فرمان الامتياز بتاريخ ٢٥ يناير عام ١٨٥٦ .

(١٦) يشارك فقط في المداولات من يمتلكون على الأقل خمسة وعشرين سهماً أي الذين استثمروا على الأقل
١٢٥٠٠ فرنك وهو ما يعادل أعلى مرتب سنوي يتقاضاه مهندس .

(١٧) خاصة شركات السكك الحديدية الشمال والشرق، من باريس إلى ليون ومن نهر الرون ونهر الوار ومن
باريس - روان - الهافر وديب.

Georges Ribeill, « Gestion et organisation du travail dans les compagnies de chemin de fer, des origines à 1860 », Annales ESC, septembre-octobre 1987, n° 5, p.1001.

١٨) AN 153AQ/INJ72 . محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للأشغال .

(١٩) عن حياة هذا الرجل العصامي الذي سوف يصبح وزير الأشغال العمومية في مصر انظر خاصة :

J.-E Goby, « Réalisateur français en Egypte. Un ingénieur, Linant -Pacha de Bellefonds », Revue des conférences françaises en Orient, n° 12, décembre 1945, pp. 705-718

20) Louis -Adolphe linant de Belle fonds, Mémoire sur les travaux d'utilité publique exécutés en Egypte, P., Arthus Bertrand éditeur, 1872-1873, p. 235.

21) Ibid , p. 239.

22) AN 153AQ/1608A.

- 23) Discours du frère Roger, L'isthme de Suez, journal de l'union des deux mers, n° 138, p.93. Le titre de ce périodique sera noté dans la suite : L'isthme de Suez...

فيما بعد سوف يصبح العنوان خليج السويس

- 24) Olivier Ritt, Histoire de l'isthme de Suez, P., Hachette, 1869, p. 152.

٢٥) AN 153AQ/TE131 بين ١٢ أبريل ١٨٥٦ و ١٠ يناير ١٨٥٩ تم حصر عدد واحد وعشرين عرساً صدر بعضها عن مقاولين جادين للغاية مثل الإنجليزي توماس براسي الذي أقام بعض خطوط سكك حديد بفرنسا .

- 26) AN 153AQ/TE140.

٢٧) AN F¹⁴ 2285/2 معمر جلسة عقدت هيئة تحكيم في ٥ أغسطس ١٨٦٢

- 28) Commune de Courquetaine (Seine-et-Marne). Archives d'état-civil Acte de naissance d'Eugénie Alphonsine Hardon, 5 octobre 1877, présentée par son père et son grand-père, Illert-Alphonse Hardon. Eugénie Hardon est l'épouse du Maréchal Pétain.

٢٩) ملف برنار مانتو . تقرير مانتو عن أسباب تركه الشركة عمداً وجهه إلى وزير الزراعة والتجارة والأشغال العمومية حرره من الإسكندرية في فبراير ١٨٦٢ .

- 30) AN 153AQ/1610A..

- 31) AN 153AQ/N279. .

٣٢) بفضل أتربة حفر القناة البحرية سوف يتم تنفيذ ردم هام سوف يغير شكل المخاضية للشاطئ .

- 33) E. Flachet et L. Molinos, op cit., p 45.

٣٤) AN 153AQ/TE143. المقصود بير شيتان وبير أبو العروج وبير فوار وصبا-بيار وبير فيش وبير أبو السلاح وبير طوسوم وبير جنيه . انظر خريطة منابع الخليج ص ١٧ وأتاحت لنا خريطة الدلتا التي رسمها لبنان دي بيلفون و الخريطة التي عقيت عليها اللجنة الدولية أن نحدد أماكن الآثار المختلفة التي ذكرت في يوميات الورش عام ١٨٥٩

- 35) AN 153AQ/INJ121.

٣٦) AN 153AQ/TE143 . تقرير رقم ٨ قدمه لاروش من الإسكندرية في ٢٤ يونيو ١٨٥٩ .

٣٧) AN 153AQ/1610A. . تقرير مدير عام الأشغال

٣٨) AN 153AQ/TE130 . حالة الأشغال في أول أكتوبر ١٨٦١ .

٣٩) AN 153AQ/1610A .. تقرير مدير عام الأشغال ١٨٦٢-١٨٦٤

- 40) Léon Monteil et Armand Cassagnes, Percement de l'isthme de Suez, Description des travaux et des ouvrages d'art définitifs, P., Bureau des Annales industrielles, 1872-1880, p. 87.

- 41) Voisin Bey, op. cit., tome 6.1, p. 219.

42) L. Monteil, op. cit., p. 85.

٤٣) AN 153AQ/INJ72 . رسالة من كليمان بتاريخ ١٥ يوليو ١٨٦٣ استخدمه ، شركة المصاهر وورش البحر المتوسط

44) L'isthme de Suez..., 1862, p. 100.

45) AN 153AQ/TE149.

46) Id.

47) AN 153AQ/N411. ١٨٥٩ رسالة من لاروش ٧ أكتوبر

٤٨) والدته هي خالة كونيسة مونتيغيو والدة أوجيني .

49) J. Charles-Roux, L'isthme..., op. cit., tome I, pp. 300-304

٥٠) كتب عنه دافيد لاند سيناريو تقليدي : " كانت المضايقات الإنجليزية تثير دائما شجاعة المسؤولين المصريين بالقاهرة والقنصلية الذين وعدوا باتخاذ موقف حازم . وكانت هذه الإرادة تلين أمام استنكار فرنسا ووجد جميع الأشخاص المعنيين أن هذه التصرفات التي كانت ملائمة للغاية في الماضي ، تسوية مجرد مناورات للتهرب " op. cit., p. 166

51) AN 153AQ/1610A. تقرير رئيس مهندسي الأشغال يوليو ١٨٥٩

52) 153AQ/1610A. AN . تقرير مدير عام الأشغال ، ديسمبر ١٨٦٠

53) AN 153AQ/1611A.

54) Voisin Bey, op. cit., tome 6.1, p. 231.

55) L'isthme de Suez..., 1861, p. 229.

٥٦) AN 153AQ/1610A. تقرير رئيس مهندسي الأشغال، مارس ١٨٦١ .

57) F. de Lesseps, Lettres...op. cit., tome 4, p. 215.

٥٨) AN 153AQ/1611A . مراسلات رويسيناير، أغسطس ١٨٥٩

59) F.de Lesseps, Conférences sur le canal de Suez et le sort des ouvriers, P., Bureau de l'isthme de Suez, 1862, p. 13 et Marius Fontane, Voyage pittoresque dans l'isthme de Suez, P., Lachaud, 1870, p. 85.

60) O. Ritt, op. cit , p. 180

61) M. Fontane, loc. cit.

62) AN 153AQ/TEP22.

63) F. de Lesseps, Lettres...op. cit., tome 4, p. 234.

64) AN 153AQ/TE130.

65) AN 153AQ/1413.

66) AN 153AQ/TE143.

- 67) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو . تقرير
- 68) AN 153AQ/1608A . رسالة من موجيل إلى مانتو ، مارس ١٨٦٠ .
- 69) AN 153AQ/1606A . اللجنة الاستشارية للأشغال ، ١٨٦٢ .
- 70) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو . تقرير
- 71) AN 153AQ/1600A . أوراق لويس أجيسست رينو الشخصية .
- 72) AN 153AQ/1600A . رسالة رد كونراد إلى رينو ، ٢٣ نوفمبر ١٨٦١ .
- 73) AN 153AQ/1636 .
- 74) AN 153AQ/1606B .
- 75) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو : تقرير
- 76) AN 153AQ/TE140 . تعليمات عامة رقم ٣ ، فبراير ١٨٦١ .
- 77) Ferdinand de Lesseps, « Lettres à Voisin- Bey, 1861-1869 », Bulletin de la SEHGIS, tome 5, 1954. Lettre du 26 décembre 1861.
- 78) AN 153AQ/1606A . محاضر اللجنة الاستشارية للأشغال . جلسة ١٢ نوفمبر ١٨٦١
- 79) AN 153AQ/TEP44 . رسالة كازيو إلى فوازان ، ١٢ أغسطس ١٨٦١
- 80) Ferdinand de Lesseps, « Lettres à .. », op. cit. Lettre du 25 janvier 1862
- 81) AN 153AQ/1606 . لجنة الأشغال ، جلسة يوم ٣٠ نوفمبر ١٨٦٢ .
- 82) AN 153AQ/1609A . ملف بوشيه
- 83) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو : تقرير .
- 84) وقت عمل الفلاح في اليوم ١٧ ساعة هو
- 85) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو : تقرير .
- 86) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو : تقرير .

(٨٧) " مخطط المشروع . . " , op. cit., p. 192 .

88) David S. Landes, op. cit., p. 376, note 15.

(٨٩) قدرت جملة المصاريف شاملة حفر مجرى السويس والقنوات إلى بور سعيد بما يقرب من تسعة ملايين من الفرنكات ويمكن استرداد هذا المبلغ بقيمة الأراضي المجاورة

90) AN 153AQ/TEP43.

91) Eugène Mougel, Rapport du directeur général des travaux, P., Chaix, 1860, p. 4.

- 92) AN F¹⁴ 2285/2 . ملف مانتو : تقرير
- 93) AN 153AQ/1611A. . رسالة رويساير إلى فوازان ، يونيو ١٨٦١
- 94) « Avant-projet... » in Ferdinand de Lesseps, Percement..., op. cit. pp.124-125.
- 95) Eugène Mougel et Adolphe Mouchelet, Mécanique des travaux publics ou application de la vapeur et des machines les plus modernes à la construction des édifices, chemins de fer, ports, canaux, etc., P., Carilian et Mathias, 1841, préface
- 96) AN F¹⁴ 2287/2 . ملف موجيل الإداري
- 97) AN 153AQ/TEP18 . ملف حفارة فريسي وابنه
- 98) AN 153AQ/TEP17
- 99) AN 153AQ/1618B. J. Pouchet, Notes sur les premières études de matériel.
- 100) AN 153AQ/1606A . . اللجنة الاستشارية للأشغال . جلسة ١١ مارس ١٨٦٢
- 101) 153AQ/1610A. AN . تقرير رئيس مهندسي الأشغال، أول أغسطس ١٨٦٢
- 102) AN 153AQ/1618B.. . > بوشيه ، مذكرات..
- ١٠٣) معنى كلمة Elinde ذراع متحركة تنتقل على طول سلسلة دائرية للحفارة أو جرافة بقواديس
- 104) Id .
- 105) AN 153AQ/INJ72. . جلسة ٢٩ أكتوبر ١٨٦٣
- 106) AN 153AQ/1615B ٣٧ ص. ١٨٦٤ يناير ١٦ . تقرير أميل أولفيه إلى الدوق دي مورني ،
- 107) Ibid p.56
- ١٠٨) AN 153AQ/TE159 . ينقسم هذا المبلغ كما يلي : ٣٨ مليون تعريضاً عن عدم توفير عمال السخرة ، ٣٠ مليون للتنازل عن الأراضي الممنوحة ، ٦ ملايين لسداد التعويضات التي كانت ستحصل عليها الشركة عن ترعة الماء العذب وعشرة ملايين لسداد أشغال ترعة الماء العذب
- ١٠٩) القاهرة . محفوظات دار الكتب . حافظة السويس رقم ١٦ رسالة من أوتري سفير في قنستنتين إلى وزير الخارجية الفرنسي ، الإسكندرية في ٢٧ يناير ١٨٦٦
- 110) Ferdinand de Lesseps, « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 13 décembre 1861.
- ١١١) المصادر: تقارير مدير عام الأشغال (153AQ/1610A AN) وفاق ترعة الماء العذب
- (AN 153AQ/TEP 44) . تقارير دكتور أوبار- روش الطبية المنشورة في مجلة L'isthme de Suez.

الفصل الثاني

وضع تنظيم حديث

كان من رأى فوازن مدير عام الأشغال الجديد أن التنظيم هو الشرط الضروري لنجاح الورشة . ويتحقق هذا النجاح بإعادة تحديد تقاسم الأدوار بين مختلف الفاعلين ويستلزم ذلك وضع بنية تراتبية مركزية . ومن خلال الإجراءات التي اتخذت، بدأت تظهر سمات ثقافة ذات طابع خاص .

إن تحليل هذه البنية التنظيمية يجعل من شركة القناة مؤسسة حديثة حسبما يعرفها مؤرخ الاقتصاد الأمريكي ؛ ألفريد شاندلر (Alfred Chandler) ؛ أي أنها تمتلك صفتين خاصتين : فهي من جهة ، تشتمل على وحدات عمل كثيرة متباينة ، ومن جهة أخرى ، فهي تدار بواسطة نظام تراتبي متكون من موظفين مسؤولين ^(١) ولكن بينما دافع شاندلر عن قضية النشأة العفوية لهذا النوع من الشركات في السنوات ١٨٤٠ في الولايات المتحدة ، إلا أننا نجد أن تطبيق فكرة العفوية ، في حالة قناة السويس ، لا تقاوم عند التعرف على النموذج الذي أخذت عنه .

تقاسم جديد للأدوار

استلام فوازن لمقالييد الورشة

عندما اجتهد فوازن في إعادة تحديد العلاقة بين مختلف الفاعلين في الورشة قد كان هدفه بصراحة هو التمويع في مركز جهاز اتخاذ القرار . لذلك سوف يتم إعادة النظر . في نفس الوقت وبصورة ملحوظة في دور رئيس الشركة ودور لجنة الأعمال وكذلك دور الإدارة في باريس .

ولنتعرف على أولى انطباعات فوازن عند وصوله إلى الخليج ^(٢) عبر الرسائل التي وجهها إلى زوجته التي بقيت في أول الأمر في مدينة بُوو (Pau) : " استلمت عملي الجديد واقتنعت من الدراسة الأولية التي قمت بها بشأن المسائل التي اعتبرت حتى الآن الأكثر تعقيداً ، أنه يكفي حلها بمجرد حسن الإدراك ، وبعض الخبرة في ممارسة الأعمال وعقل متحرر من الأحكام المسبقة " ^(٣) .

وعلياً أن نتساءل : ما هي الأوراق الراجعة التي بحوزة الرجل الذي سوف يصبح سريعاً مديراً عاماً جديداً للأشغال خلاف نظرتة الجديدة إلى الورشة ؟ ونجد الإجابة على هذا السؤال عند فوازن نفسه : " لا أنخدع بقدراتي فأنا أتمتع بتفكير سليم وأحب العمل وأشعر بالمسئولية

ولاشخصي ، وهذه قيم هي بالفعل جد ضئيلة لو أخذت بمفردها، ولكن لو تم جمعها لشكلت مجموعة قيم تؤتي نتائج طيبة ^(٤). هذا ما كتبه لزوجته. لقد قام هنا برسم بورتريه شخصي غاية في الدقة والوضوح سنضيف إليه ما أظهره دائماً من تواضع ونزاهة .

إن ما سماه ب "اللاشخصية " هو ما سوف يتيح له التفاهم مع دي ليسبس . فقد جسد المهندس الجديد الذي اختير لمساعدة موجيهل ، الأمل في تحسين الحالة بالنسبة لرئيس الشركة ، الذي كان في حاجة إلى رجل شريف ، قادر على إعطاء دفعة جديدة للعمل . ووجد ضالته في شخص فوازن وسارع بمنحه ثقته واعتمد عليه ، كما تشهد على ذلك مقتطفات من المراسلات التي وجهها له إذ يقول : " سوف أبحر إلى فرنسا، وقبل أن أغادر مصر، اشعر برغبة في أن أكرر ما قلته لك من إن وثقتي بك كاملة وأن صلاتي الأخيرة و الحميمة بك من الممكن أن تعزز هذه الثقة التي قد أهتمني إياها . وأنت تعرف الآن كل أفكارتي ، فسر بعزيمة في هذا الاتجاه ، وكن واثقاً من مساندتي إياك ورضائي عن كل ما تقترح أو تعمل " ^(٥).

وقد جدد الاعتراف بهذه الثقة عدة مرات : " كتبت إلى إدارة باريس أنك أثبتت في شتى النواحي أنك أهل للثقة وكتبت أخشى الآن تدخل أي عنصر أعلى جديد في الإدارة العامة للأعمال. أما بالنسبة لي فقد قمت بحل مشكلتي وليس لي أمل آخر سوى أن أراك ترتقي مع نجاح عملنا" ^(٦). وكتب في يونيو عام ١٨٦٣ : " تأكد تماماً من ثقتنا المطلقة فيك . وكن مطمئناً تماماً من جانب هذا الموضوع. ولا تخشى أبداً لما قد يعترض طريقك من نفاذ الصبر مهما كان نوعه أمام النتيجة التي نعتمد عليك فيها. فحن ندرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقك ، وليس بيننا من يجهل الجهود التي تبذلها دون كلل " ^(٧) .

و تضاعفت مع مضي الشهور الاستقلالية التي تركها دي ليسبس لفوازن. ولكن السؤال: هل كان عند دي ليسبس بالفعل اختيار آخر غير الإعتماد كلياً على هذا المدير الجديد؟ يبدو بجلاء أن الجواب لا. في مقابل ذلك ، كان الاتفاق ضمناً ألا يحجب مدير عام الأشغال العام حركة رئيس الشركة قط . وقد ترك له بالفعل حرية القيام بالتصريحات العلنية وبصفة مستمرة حتى فيما يتعلق بالمسائل الفنية وفي هذه الحالات يكفي الرئيس بقراءة التقارير التي أعدها فوازن له ، كما لم يتم أبداً بمخطف الأضواء عنه . ومن الممكن أن يكون هذا الموقف قد دعم السير الحسن للتعاون بينهما. فبعد أن أستبعد عمداً السان سيمونين الذين كانوا هم أصحاب المشروع الأصليين ، اعتقد دي ليسبس بناءً عليه أن في إمكانه القيام وحده بدور قائد الفرقة : "إن طموحي وأعترف بذلك هو أن امسك وحدي بكل خيوط هذه العملية الضخمة حتى اللحظة التي تتمكن فيها الشركة من

الوقوف على قدميها . باختصار ، لا أرغب في الخضوع لشروط أحد، وهدفي أن افرض كل شروطي»^(٨) ذلك ما أسَّره لمدام ديلامال (Delamalle) في ١٨٥٥ . وكان اختيار مدير عام الأشغال الأول والمقاول تابع من هذه الإستراتيجية ذاتها . وإن كان قرار إلغاء التعاقد مع هاردون كان في غاية الصعوبة بالنسبة لدي ليسبس ، فذلك لأن هذا القرار كان بكل تأكيد يعني نهاية الدور الذي يريد لعبه ، بل يقرّ أيضاً عدم كفاءته في الاضطلاع به . وعندما رحل المدير ، تم تفويض إدارة الورشة منذ ذلك الحين إلى شخص فوازان الذي كان محترفاً . وحينئذ انتقل جزء من السلطات التي كان يحتفظ بها دي ليسبس لنفسه سابقاً إلى فوازان . فمجلس الإدارة الذي كان مخلصاً في الماضي للأول أصبح فيما بعد طوع يد الثاني . وفي الواقع ، تبين دراسة مذكرات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة بأنه فعلاً عند إجازة المصروفات المختلفة كان يكتفي المجلس بالتصديق على المقترحات المقدمة من دي ليسبس في بداية الورشة و بعد ذلك يوافق على مقترحات فوازان .

ولو نظرنا بنظرة فاحصة الآن إلى العلاقات بين مدير عام الأشغال واللجنة الإستشارية سوف نلاحظ تغيير تسمية المجلس الذي يجمع الخبراء من خارج الشركة والتي أصبحت اللجنة الإستشارية بعد أن كانت المجلس الأعلى . ولا يعتبر هذا التغيير عفوياً فهو يعبر عن رغبة فوازان في أن يمحصر عمل المجلس في دور استشاري .

ومع أن فوازان لم يعترف بذلك صراحة ، فقد أثبت بأفعاله أنه يريد أن يكون وحده صاحب القرارات التي تتعلق بمسيرة الأعمال و التنظيم المراد تطبيقه وكذلك بشأن التجهيزات المستعملة . وقد وضحت هذه الرغبة في الخلاف الذي نشأ بينه وبين وجيل هانيت - كليري (Jules Hanet - Cléry) في بداية عام ١٨٦٣ والذي أدى إلى الفراق بينهما ، وهو الذي عُين في أكتوبر ١٨٦١ ، مهندساً استشارياً بالشركة لشراء الآلات بالقرب من الإدارة المركزية في باريس . علاوة على ذلك ، فقد كان على هذا المهندس ، خريج مدرسة المناجم ، مهمة المشاركة في مداولات اللجنة الإستشارية بصفته السكرتير المساعد . و بعد إلغاء التعاقد مع المقاول هاردون وجدت الإدارة العامة للأشغال نفسها مسئولة عن تنفيذ الأعمال ، فقامت بإعادة تنظيم الإدارات ونقلتها إلى الشركة عدداً من الوكلاء الذين كانوا يعملون من قبل في خدمة المقاول العام . في ذلك الوقت ، عُين المهندس هانيت - كليري كبير مهندسي إدارة الأعمال بباريس ، وهي وظيفة أضيفت إلى منصب السكرتير المساعد الإستشاري للجمعية الذي كان يشغله آنذاك . ولقد رأى أن هذه المهمة المزروجة وضعته في موقع يجعل منه ممثلاً للمدير العام للأشغال في باريس ، وقادراً على توثيق العلاقات بوجه خاص مع مجلس الإدارة . ولكن فوازان لم يكن مجبداً لذلك ، إذ أنه رأى أن الوظائفيتين اللتين يمارسهما هانيت - كليري متعارضتان . وحاول هذا الأخير أن يثبت لفوازان

مخاطر مركزية السلطات التي يريد تحقيقها ولم يتردد بأن يقول له بوضوح وجهة نظره في هذه المسألة : " لماذا تريد عزل المندوب، أي أنك تعزل نفسك عن اللجنة الاستشارية ؟ ألا تقلل بذلك صلات المندوب بها إلى حالات ظنتت نفسك قادر على توقعها بدرجة كافية . إن الأحداث سوف تلوي ذراعك ؛ لا تحاول أن تقنن ما هو من المستحيل تقنيه أي الأمور الطارئة وأترك هامشاً لحرية التصرف [...] أحذر من أنك بمحاولتك لتجنب خطر وهمي قد تعرض نفسك إلى أخطار فعلية وتضييق مشاركة لجنة في أمور الشركة ، يمكن أن أقول بهذا القدر من التعاطف والتبصر مقارنةً باللجنة التي تعمل حالياً والتي تحاول ثانياً عزل مندوبها [...] ويمكن أن أذهب أبعد من ذلك موضحاً أنه بسبب التنظيم نفسه الذي اعتمدته والذي يبدو أنه تركيز لكل إدارة التجهيز بمصر ، قد يخشى أن تنتهي أحياناً إلى قيام نزاعات وضياح للوقت، إن لم يكن لديكم هنا لجنة عادلة ، نزيهة وسريعة لفض الخلافات التي قد تظهر بين المشروعات الآتية من مصر والمشروعات التي يمكن أن تقدم من قبل الصناع الذين يقع عليهم تنفيذها. أما من جهتي فأتنبأ بصعوبات في هذا الموضوع وإن أردت ألا أقوم في بعض الحالات بدور كاساندر (Cassandra) قارئة الغيب الذي لا جدوى منه ، وأن يكون لي في وقت ما سلطة فعلية للتنفيذ ، يجب أن أستند إلى سلطة لا تقبل المنازعة وهذه السلطة لا يمكن أن تكون إلا اللجنة" (٩).

وليدعم رأيه في توزيع الأدوار ، استدلل هانيت-كلاري على نجاح وضع مماثل في شركة السكك الحديدية الروسية. فبينما كان المدير العام يقيم في سان بيترسبورج ، كان يقع على رئيس القسم الفني للإدارة الباريسية مسؤولية كافة العمليات التي تتم خارج روسيا وهي شراء آلات للأعمال الدقيقة والأدوات المكتبية ، والتأمينات البحرية ، والبحث عن المراجع والوثائق . ولما كان على دراية بما يجري تنفيذه من أعمال أو مزادات فقد كان يخبر عند الحاجة المقاولين الفرنسيين الذين يودون الذهاب إلى الورشة في روسيا . علاوة على ذلك ، كان يجمع آراء مختلف المهندسين الاستشاريين بصدد المشروعات التي تقترحها إدارة سان بيترسبورج والتي تُعرض في اجتماعات مجلس الإدارة. ولكن هذه الأدلة وهذه الخبرة لم تكن مقنعة بالنسبة لفوازان . ويجدر القول بأن اقتراحات هانيت-كلاري لم تكن تتلاءم مع تصور المدير العام للأشغال للعلاقة مع الإدارة الباريسية من جهة أو مع اللجنة الاستشارية من جهة أخرى . فقد تزعم المبادرات التي قد يتخذها هانيت-كلاري فوازان لأنها قد تقلل من الرقابة الكاملة التي يود ممارستها على تنفيذ الأشغال . آملاً في خروج الورشة من الورطة ، تعجل دي ليسبس بإرضاء فوازان عندما طلب منه وقف طموحات هانيت-كلاري : " لقد أوصيت بإيقاف اندفاع كل من السيد دي شانال (M de Chanal) والسيد جونيت كلاري (Gonet Cléry) (sic) (١٠) الذي يجب عليه أن يقتصر

دوره بأن يكون المهندس الاستشاري والمراقب العام في باريس للإدارة العامة للأشغال الموضوعة حصرياً بين يديك في مصر" ، فضلاً عن ذلك ، فغالبا ما تكون لكل واحد نوايا الجميع طيبة ويكفي تقويم التزاعات الفاسدة في البداية ، كي لا تعترض انتظام وقوة [٩] أي موانع أخيراً فقد قلت أن كل شيء يجب أن يبدأ من مبادرة أو رأي مُقدم من الإدارة العامة للأشغال في مصر . وليس من الملائم أن يُرفع إلى اللجنة الاستشارية تقرير السيد جونسبي كلاري (Gonet Cléry) أو خلافه بصدد المسائل التي لم تقم الإدارة العامة للأشغال من قبل بفحصها والتي قد تتطلب لها حلاً علوياً^(١١) .

وبعد ذلك بوقت قليل أعلم الرئيس المدير العام بالاستعدادات الجديدة التي أُخذت وفقاً لرغبته بتعيين فيكتور كاديا (Victor Cadiat) : " أعتقد أنني سويت مسألة هانت كليري بما ترتضيه تماماً . وسوف يبقى هانيت — كلاري الذي أراد الاحتفاظ بوظائفه، ملحقاً باللجنة الاستشارية كأمين وعضو مساعد له صوت استشاري [...] أما رئيس قسم الأشغال ، ممثلك في باريس ، فهو مهندس إنشاءات بحرية ، شاب توفرت لدينا معلومات جيدة عنه سوف يرسل إلى مصر كي تقدم له النصيح وتعطيه الإرشادات بعد أن توافق على تعيينه وسوف يتولى القيام بشئونك دون تدخل من هانيت — كلاري " ^(١٢) .

بالإضافة إلى العلاقات بين الإدارة العامة للأشغال في مصر وإدارة الشركة في باريس، يعتبر دور اللجنة الاستشارية هو صميم الخلاف الناشب بين فوزان وهانيت — كلاري. وبشان هذه النقطة، صمم مدير عام الأشغال على رأيه الأول وهو استبعاد اللجنة . وقد تغيرت كيفية استدعاء اللجنة للاجتماع ؛ فلم تعد تجتمع إلا بناءً على طلبه و هو الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. وظل كقبطان السفينة " وحده صاحب الأمر والنهي " وتبين الممارسة أنه في أغلب الحالات كان يأخذ في الاعتبار اقتراحات أعضاء اللجنة. وبما أنه لم يكن في استطاعته بطبيعة الحال حضور الاجتماعات التي تعقد بفرنسا، فقد عمل على أن ترسل له تقارير الجلسات. وربما كان في ذهنه منيح هذه الجمعية دوراً مماثلاً لدور المجلس العام للطرق والكباري بفرنسا الذي كان مطالباً بإبداء رأيه فيما يتعلق بكل المشروعات الكبرى التي تنجز على أرض الوطن. ويؤكد هذا الافتراض أن معظم أعضاء اللجنة التي تجمعها الشركة ينتمون إلى هذا المجلس. وتظهر بجلاء خطة تنظيم الإدارة لعام ١٨٦٣ رغبة المدير العام في إبقاء جميع الإدارات التي لها علاقة بالأشغال تحت سلطته ، ليراقب ويسيطر على العملية في جملتها . ونجد في هذه الخطة أن مجلس إدارة باريس أصبح فرعاً من الإدارة العامة للأشغال.

الإدارة العامة للأشغال لعام ١٨٦٣



حين تم ضم العاملين في بداية عام ١٨٦٣ ، تم دمج سياما (Sciama) ، كبير مهندسي الأشغال في الشركة المقاوله، بنفس الرتبة في شركة القناة كنائب عن فوازان . ولكن لم يستمر الحال إلا فترة بسيطة ، ففي الواقع ألقي المنصب في مارس ١٨٦٥ . وبعد فصله دخل سياما في خدمة الحكومة المصرية بفضل تزكية دي ليسبس .

في شهر مايو ١٨٦٧ ، وبعد استقالة جيرردان (Girardin) ، مُنح فوازان وظيفة الوكيل الأعلى للشركة على أثر تعديل في لوائح الشركة التي تشترط أن الوظيفة يجب أن تُشغل بواسطة عضو من مجلس الإدارة مقيم بالإسكندرية . وربما يجب النظر إلى هذا القرار على أنه دليل على الثقة التي حصل عليها فوازان عند دي ليسبس ومكافأة على التضحيات والخدمات التي قدمها . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اعتبار هذه الوظيفة تأكيداً لوضع مضي كان المدير العام للأشغال يقوم فيه من قبل تقريباً بهذا الدور . وجع فوازان اعتباراً من ذلك الحين بين وظيفتين وهما الوكيل الأعلى ومدير عام الأشغال .

وقام فوازان بصفته الوكيل الأعلى يبحث كل المسائل التي هي موضوع النزاعات بين الشركة والحكومة المصرية والوزراء والموظفين العموميين . وقد ساعدته في هذا النوع من العلاقات خبرته السابقة كمهندس طرق وكباري في فرنسا وهي وظيفة عادة ما تجعله على صلة بالحاكم والأعيان المحليين . و علاوة على ذلك ، منذ ١٨٦٦ برهن الخديوي إسماعيل ، وإلى مصر ، على ثقته في فوازان عندما منحه لقب "بك" رغم أنه لم يكن مصرياً ولا موظفاً في خدمة مصر . وأصبح فوازان إذن ، ومنذ ذلك الحين ، الممثل الوحيد للشركة في مصر ، وأمسك بين يديه بزمام الورشة . ولا يقل هذا الوضع تشابهاً مع الوضع الجاري في مثل نفس الفترة في شركات السكك الحديدية ، حيث كما لاحظ جورج ريبيل (Georges Ribeill) " احتل المديرون الذين تم اختيارهم من بين المهندسين جزءاً من سلطة المجالس " (١٣) .



فوازان بك



(صورة عن جان شارل روه : الخليج وقناة السويس مجلد ١ ص ٣٤٩)

إقامة علاقات جديدة

أنجزت الشركة خلال عام ١٨٦٣ الأعمال وفقاً لنظام الإدارة المباشر ، ولكن بالرغم من التحسينات التي تمت على مستوى التنظيم ، ظلت النتائج المتعلقة بالأعمال دون المتوقع بكثير . وقد فشلت جهود شركة القناة في تصميم آلات الحفر على وجه الخصوص . وكان رأي فوزان حينذاك أن اللجوء إلى شركات كبرى هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفير ضمان حقيقي سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو بالمصاريف ^(١٤) .

فكر فوزان مستفيداً من دروس التجارب السابقة، في نوع من التعاقد يختلف عما سبق . وأوحى له الفشل الذي حدث مع المقاول هاردون بتقسيم الورشة إلى مناطق متناصفة حسب طبيعة الأشغال المراد إنجازها وبتفضيل العقود بالمقولة على نظام الشركة المنتفعة.

ولقد تم إعداد قائمة للمقاولين خاصة الفرنسيين والإنجليز منهم من الذين اشتهروا في مجال الأشغال العامة الكبرى، وأُرسلت لهم كراسات الشروط ^(١٥) . وأنتهى العطاء في ٢٠ أكتوبر ١٨٦٣ . بتفويض شركة الأخوة ديسكو (Dussaud) من مارسيليا لبناء أرصفة مرسى بورسعيد . أما أعمال الحفر فقد تم توزيعها إلى عدة مناطق جغرافية . وتم اختيار المقاول ألفونس كوفرو (Alphonse Couvreur) لأعمال عتبة الجسر . وهو أول عقد وقع منذ أول أكتوبر ١٨٦٣ . وبعد ذلك جاء في ١٣ يناير ١٨٦٤ توقيع صفقة أخرى مع المقاول الاسكتلندي ويليام آيتون (William Aiton) لحفر مجرى ماء ضيق وأحواض بورسعيد وكذلك إنهاء حفر الستين كيلومتر الأولى من القناة بدءاً من بورسعيد حتى بداية منطقة كوفرو .

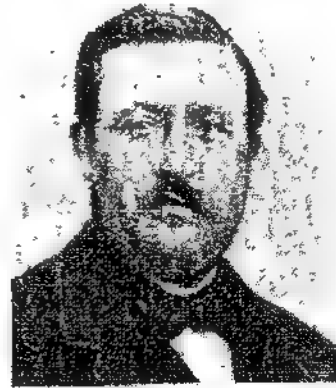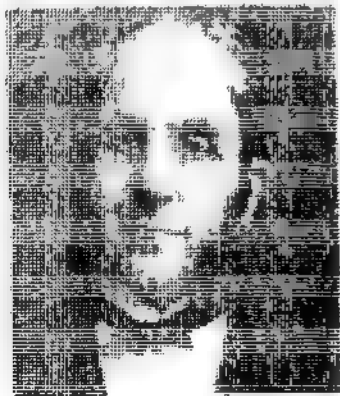


صورتان : كوفرو وديسو

صور فوتوغرافية اخذت عن ج. شارل رو (الخليج وقناة السويس) الجزء الأول ص ٣٥٣ - وص ٣٧٣

تم اختيار آيتون (Aiton) بالرغم من بعد المسافة ، إذ يلزمه خمسة وعشرون يوماً ليأتي من إسكتلندا إلى مصر . وقد قدم فعلاً عرضاً بأسعار أقل بكثير من أسعار منافسيه وقد توفر أفضل

المعلومات عن خبرته السابقة في جلاسجو^(١٦) كما حظيت باهتمام الشركة أربع من بين المتعهدين الذين تقدموا للأشغال الباقية وهي مقاولات جويان (Gouin) ؛ وموبار ومارول (et Maubert) ؛ و لومبار (Lombard) ؛ وبوريل و لافالي وشركاؤهما (Borel , Lavalley et Cie) . وقد سحبت مؤسسة إرنست جويان عرضها ربما بسبب منافسة عميلها السابق السكندر لافالي ؛ وقد اختيرت مؤسسة بوريل و لافالي وشركاؤهما ، فهي الوحيدة التي تقدمت بعرض لتنفيذ جميع الأشغال التي لم تسند لأحد بعد .

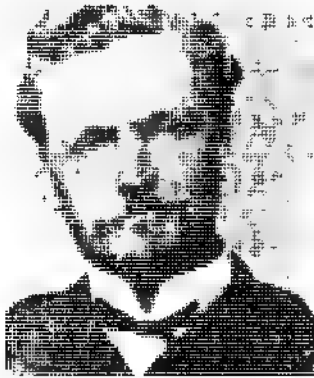

صورتان : بوريل و لافالي

صور عن اخذت من شارل رو (الخليج وقناة السويس) الجزء الأول ص ٣٥٤ و ٣٥٥

وقد تم تحديد الأدوار الخاصة بكل واحد من المقاولين الذين قد رسي عليهم المزايد بعناية كبيرة حتى لا يحدث تداخل أو تشابك بين الأطراف في العمل ، إذ يجب على المقاولين القيام بقصارى جهودهم لئلا يتسببوا في توقف حركة النقل في أجزاء القناة أو الميناء التي يشتغلون فيها . كم عليهم أن يتعهدوا بنقل آلات الحفر إذا لزم الأمر لإتاحة حرية المرور في القناة . وواكب كل صفقة جدول استحقاقات للأعمال وهكذا قد نص عقد كوفريه على حجم ما يجب إنجازها من عمليات الحفر سنوياً . ويعتبر تحرير الصفقات عملية حساسة . وكان الهدف الذي تسعى إليه الشركة هو عدم وجود ما يمكن أن يتسبب في مطالب وشكاوي لاحقة من جانب المقاولين فقد شاعت في هذا القطاع ممارسة المطالبات الناتجة عن تباين في وجهات النظر حول شروط العقد الموثق بين الجانبين . وغالباً ما كان المقاول يجد في هذا الأسلوب الوسيلة للحصول على تعويضات مالية كبيرة .

ويعتبر اختيار المقاولين أمراً جوهرياً وهو ما تؤكداه المصوم الجديدة التي سوف تعاني شركة القناة منها مع المقاول الإنجليزي آيتون . إن هذه المشاكل التي لم يكن هناك ما يشير إلى إمكانية وقوعها . كانت ناجمة عن الأزمة المالية التي تعرضت لها الأسواق التجارية الرئيسية في بريطانيا العظمى . إذ وجد المقاول نفسه بسرعة في حاجة إلى قروض وغير قادر ليس فحسب على سداد قيمة توريدات

المالكينات بل أيضا على توفير أجور عماله. لقد سبب فسخ عقد المقاول الإسكتلندي بعد عدة شهور من استقراره في خليج السويس ، بالإضافة إلى توقف الأعمال في الأقسام المكلف بها، عانقا كبيرا كما قام بتعبئة من مستخدمي الشركة التي اضطرت فعلا لإرسال العديد من ممثليها إلى إسكتلندا لسداد الممولين والدائنين للمقاول ومحاولة بيع الآلات التي أتت إلى مصر وخاصة لإيجاد مقاول عام جديد لتفويضه بالأعمال^(١٨). تم نقل بعض الصفقات لاسيما تلك المتعلقة بشراء البواخر باسم الشركة ولكن معظم الصفقات التي عقدت مع الصناع الإنجليز والإسكتلنديين وجب إلغاؤها^(١٩). ويمثل الوقت الذي قضاه آيتون في الإقامة وفي إحضار الأجهزة والموظفين والمواد التي كان يعتقد أنه في حاجة إليها ، ضياع عدة شهور على الشركة. علاوة على ذلك، يعتبر المؤلف بين المقاولين أن يحاول كل مقاول الاستفادة من العقد الذي وقعه برفضه أن يحتل من يعقبه مكانه فوراً^(٢٠) وقبلت الشركة عندئذ أن تدفع له مكافأة مائتي ألف فريك^(٢١) حتى لا تضطر لانتظار تأخر المحاكمة. واستؤنفت الأعمال الموكلة للمقاول الإسكتلندي وفقاً لنظام الإدارة المباشرة حتى شهر أبريل ١٨٦٤ ، أي حتى استلامها من قبل المقاول العام بوريل لآفالي وشركاؤها.

لقد صارت مهام مصلحة الأشغال التي يديرها فوازن اعتباراً من ذلك الحين أكثر استقراراً. ويتمثل دوره أساساً في توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة المقاولين والإشراف على إعداد الصفقات والدفاع عن مصالح الشركة والحفاظ على احترام الآجال رغم صعوبة الاتصال بفرنسا التي يكاد يصل منها كل شيء أو على الأقل معظم الأشياء . و تطلب الأمر من المدير العام القيام بدور الوسيط بين ثلاث مجموعات من العاملين لهم طموحات متباينة ولكن يجب طبعاً التوفيق بينهم وهم الموظفون تحت مسؤوليته من جانب و المقاولون من جانب آخر ورئيس الشركة والمساهمون من جانب ثالث .

ويسند إليه دور الرقيب على المسائل الفنية على وجه الخصوص في التقارير التي توزع على جمهور يتعدى دائرة وكلاء الشركة. وتعني توجيهات الرئيس في الواقع أن كل شيء يجب أن يتم لزرع الطمأنينة في المساهمين . وفي هذه الظروف لم يكن ملائماً إطلاعهم على الوضع الحقيقي للأشغال ، فمن الأفضل عدم إزعاجهم وعدم إثارة الشك في نفوسهم . فكان على فوازن أن يصحح أو حتى أن يُحرف التقارير الفنية قبل توزيعها لتوحي بالثقة . وهكذا قام فوازن بتصويب نسخة من تقرير لاروش كبير مهندسي بورسعيد والتعليق عليها بقصد نقله إلى الجمعية العامة للمساهمين في عام ١٨٦٩ وكانت عبارات لاروش التالية : " يبلغ طول الرصيف الغربي ٢٥٠٠ متراً من المصدر حتى طرف السد . مازالت بعض الأجزاء في هذه المسافة ضعيفة وتتطلب تدعيمها في القريب العاجل " فأصبحت بقلم مدير عام الأشغال على النحو التالي : " يبلغ الرصيف الغربي

٢٥٠٠ متراً من المصدر حتى طرف السد ويحمي تماماً مدخل الميناء حتى في أسوأ الأحوال الجوية .
وتقوم الكتل بصفة جيدة تأثير الأمواج" (٢٢)

كما حُذفت من نفس التقرير وبكل بساطة عدة ملاحظات مخافة أن قد تثير بعض القلق بشأن حسن سير الأعمال ونجاح الشركة المقاوله .

وهكذا يقوم مدير عام الأشغال الذي يحتل أعلى رتبة في التسلسل الإداري وكملاذ أخير بالبت في كل المسائل الفنية والإدارية . كما يقوم ، بالإضافة إلى ذلك ، بصفته رئيساً لشئون الموظفين بقبول أو إلغاء أو التأشير على أي اقتراح ترقية أو نقل لموظفي الشركة يُعرض عليه من رؤساء الأقسام كما أنه يدافع عن مصالح موظفيه أمام هيئة الإدارة جاهداً في أن يوفر لهم خصوصاً أفضل ظروف الحياة . ففي عام ١٨٦٤ على سبيل المثال طلب الموافقة بأن يُسدد للموظفين الذين أقاموا ثلاث سنوات بمصر مرتباتهم على أن يحتفظوا بها كاملة أثناء شهور الإجازة الثلاثة التي لهم الحق فيها في نهاية هذه المدة وأن تتحمل شركة القناة (٢٣) مصاريف السفر ذهاباً وعودة من وإلى أماكن إجازتهم و عادة ما تكون فرنسا وقد نجح في ذلك .

وأما فيما يتعلق بتصور المدير العام لدوره إزاء المقاولين فيمكن فهمه من خلال الخلاف الذي حدث بشأن حدود تقسيمات الأعمال . فقد تم تقسيم طول القناة البحرية إلى عدة أجزاء ، وحدد كل من المقاولين ، من جانب ، والشركة ، من جانب آخر ، القطاعات التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة . وكان من المهم بالنسبة لفوزان أن يكون هناك توافق وإن لم يكن كاملاً فعلى الأقل التطابق بين حدود التقسيمات التي أخذت في الاعتبار (٢٤) السهولة مراقبة الشركة على نشاط المقاولين . لذا وجب تكييف التنظيم الذي وضع في شركة القناة مع اختيارات المقاولين . والحال أن هذا التعديل قد حدث عدة مرات . وقد عبر الدورادو جيويو (Eldorado Gioia) رئيس قطاع " الجسر " عن الزعاجه : " لرباع مرة تطلب منا الشركة المقاوله تغيير حدود الأقسام ويجب أن أعترف بأنني لم أستطع أبداً إدراك المزايا الجديدة والحقيقية التي ترواها في هذه التغييرات المتواصلة" (٢٥) .

ويبدو أن رد مدير عام الأشغال لم يُرضه ولكنه يوضح بما فيه الكفاية الاختيار الذي يميل إليه فوزان في أكثر من حالة : " اجد أن كل الأسباب التي عرضتها جيدة لمقاومة طلب السادة بوريل ولافالي بشأن تغيير حدود أقسام الشركة مرة أخرى [...] ومع ذلك أعتقد أنه يجب إعطاء الموافقة على هذا الطلب [...] استسلم إذا لتغيير تقسيماتك" (٢٦) .

بقيت عملية الإشراف على الأعمال التي أنجزها المقاولون عملية حساسة ، فقد اعترضت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما المكلفة بأعمال الجرف على تكرار تدخل وكلاء

الشركة في الورش الخاصة بها ، ولإلغاء هذا التدخل تذرعت بأن عمليات الرقابة تعطل سير العمل وفي شهر ديسمبر ١٨٦٨ وقبل افتتاح القناة بعدة شهور، اشكت شركة مقاوله بوريل ولافالي وشركاؤهما مرة ثانية من أن مراقبة عمل الجرافات تعطل الأشغال ذاتها. (٢٧) . وبحسب فوازان عن حل للمشكلة التي أثرت أي تخفيف الرقابة لعدارك قدر المستطاع الأضرار التي يشكو منها المقاولون . فوجه إلى رؤساء القطاعات مذكرة وضع لهم فيها ملاحظاته بصدد هذا الموضوع. ونبه بهذه المناسبة إلى المهام التي يجب على إدارة الأشغال بالشركة أن تقوم بها" يتم إشرافنا من منظورين . فهو يتم بغرض جمع بعض المعلومات التي لا تهم سوى شركة القناة و لأجل الحرص على الحفاظ على المنشآت من جهة ، فمثلا:

(١) التعرف على طبيعة التربة بعد استخراجها لكي يتم فيما بعد تحديد تكوينها الجيولوجي بطريقة دقيقة جداً ويكفي لذلك حضور عابر للمشرفين على الجرافات .

(٢) الحصول على معلومات عن أعمال الجرافات اليومية وعن عمق المضائق البحرية ويمكن الاكتفاء من الآن فصاعداً بالنتائج التي توفرها تكوين التربة والبيانات الشهرية .

(٣) الحفاظ على الأوتاد أو المقارز والتصخير (رصف الحجارة في الماء) و المفرسات وأنبوب الماء العذب وملاحظات عن استهلاك المياه . وكل ذلك لا يتطلب من المراقبين الصعود إلى الجرافات . ومن جهة أخرى ، لأخذ الملاحظات الموجهة مباشرة للجعل من شركة القناة قادرة إما على البت في مطالب الشركة المقاوله المتوقعة أو غير المتوقعة إما بتوجيه ملاحظات للمقاولين عن بعض ظروف العمل مثل:

(١) بيانات عن مدد تعطل الأعمال الذي يمكن أن يحدث نتيجة العثور على أثر التعرض لأجسام غريبة في أعمال التنقيب .

(٢) مراقبة حدود الرفرفة.

(٣) إثبات جميع الحوادث التي قد تقع مثل الارتباك في عمليات الملاحة أو جنسوح السفن أو تصادمها [...]]

(٤) إثبات كل الوقائع التي قد تضر بالشركة مثل: فقدان مراكب الشحن أثناء السير والخنادق التي حفرت مؤقتاً عمودياً على الأوتاد الكيلومترية ثم ردمت خلال فترة من موقع لآخر الخ... وهي كلها أمور قد تتحول إلى مطالبة بحقوق عينية [...]]؛

٥) التحقق اليومي من مسيرة أعمال شركة المقاولات حتى يمكن توجيه ملاحظات لها عند الحاجة. وأوضح بعد هذه الشروح المقدمة أوجز بالقول أنه باستثناء الأقسام التي تتطلب أعمال الجرف فيها بالضرورة بموافقة الجميع ، تطلب القيام باستمرار بمعاينات ومعاينات مضادة ، يجب تخفيض عدد المراقبين بنسبة كبيرة جداً ، وأيضاً تحديد اختصاصاتهم الجديدة والمحدودة بشكل جيد ، وكذلك تخفيض عدد ومدة زيارتهم إلى أدنى درجة على الجرافات. وأن توجه لهم التوصية الملحة بالآ يوجهوا بتاتا إلى الشركة المقاوله أدنى ملاحظة ، وأن يسعوا بهذا الشكل على ألا يوجه إليهم أحد اتهاماً بأنهم كانوا السبب في اضطراب العمل بورش الجرف (٢٨)».

هكذا قدم فوازن تسوية تهدف إلى الحفاظ على المهام التي هي من واجب رب العمل مع الأخذ في الاعتبار مطالب الشركة المقاوله . ويصور هذا النص عمل المدير العام ودوره كما يبرز أسلوب عمل الهيئة الذي كان يتربع على قمته . كما يعكس جانباً هاماً من نشاطه في الشركة ، من جهة ، المذكرات والتعليمات الموجهة إلى رؤساء القطاعات ، ومن جهة أخرى ، التقارير الشهرية الشاملة المقدمة لمجلس الإدارة . علاوة على ذلك يحق له تنسيق العلاقات وفض المنازعات المحتملة مع المقاولين بالتفاوض بل أيضاً مع الحكومة المصرية منذ أن شغل كذلك وظيفة الوكيل الأعلى، مع الحكومة المصرية . باختصار ، يصبح مدير عام الأشغال الحكم بين مختلف الفاعلين على مستوى الورشة فيما يتعلق بالخلافات الرئيسية.

نموذج تنظيم فرض نفسه

التنظيم : ضرورة أصبحت ملحة

لقد أجمع رجال الشركة من خلال تشخيصهم للمرض العضال الذي عانت منه الورشة في عصر المدير على أنه راجع إلى الخلل في التنظيم . فقبل أن يفقد فوازن الثقة كلية في قدرات المقاول العام على تذليل الصعوبات والقيام بإصلاح حالة طارئة كتب قائلاً : " يبدو أن المقاول يدرك جيداً كل يوم، مستعينا بالخبرة، أن مشروعاً ضخماً كالذي بين يديه لا يمكن أن ينجح وينجح بجدارة إلا بواسطة إدارة قوية ، وأن النظام والإدارة ، بعيداً عن أن يشكلوا قيوداً ، هما وحدهما وسيلتنا النجاح [...] إلا أنه ليس من السهل والسريع إعداد تنظيم شامل خاصة إذا كان ماضيك حافلاً بالسليبيات " (٢٩)

لا شك أن الإدارة تعتبر في أغلب الأحيان البعد الخفي للعمليات الفنية . ولم يقدم لاروش تشخيصاً مختلفاً حين قال " سبب هذه الحال، وجود الكثير من الأعمال التي بدأت ولكنها لم تتم ، بعبارة أخرى هو الفوضى الهائلة في شركة المقاولات سواء من ناحية سير الأعمال أو من ناحية الإدارة (٣٠)"


وإن كان من الممكن إخفاء أو تجاهل هذا البعد في حالة المشروعات البسيطة إلا أنه يظهر جلياً في المواقف المعقدة . وقد ندد مونتو (Montaut) في مذكرة استقالته " بالانعدام التام للتنظيم" (٣١) وقد أنطلق فوازن من إثبات حالة مماثلة وقرنها بنفس الحجج المثيرة : " في شركة كبيرة مثل شركتنا كان المهم قبل كل شيء هو تنظيم كل شيء على أكمل وجه . وقد كان شرط النجاح الذي تسعى كل الشركات العظمى إلى تحقيقها أصبحت في حالتنا هذه ضرورة أكثر إلحاحاً وأنه كان علينا العيش والعمل في الصحراء أي وسط أعظم الصعاب بكافة أنواعها (٣٢)" .

لذلك تم أدراك أن التنظيم شرط ضروري أن لم يكن كافياً لنجاح الشركة . وسوف تنحو جهود فوازن أساساً إلى التوصل إلى هدف إقامة إدارة سليمة ، لاسيما من خلال قيامه بممارسة فعلية وكاملة لكل السلطات النظرية الواقعة على عاتق مدير عام الأشغال . ويرجع الطابع الاستثنائي لهذه الورشة إلى ضخامتها وكذلك أيضاً إلى شدة تنوع وتعقد المشاكل المراد حلها ولأن كلاً منها قد يكون له نتائج وخيمة للغاية على حسن سير العمل . وقد اتضح في هذه الظروف أن التنظيم هو العلاج الناجح الوحيد.

وأمام الوضع المرتبك الذي وجده ، اهتم المدير العام بإحلال النظام ووضع حداً للإدارة القائمة على الارتجال ، وبالحل من الاختلاسات بقدر المستطاع . لذلك كان من المهم التحديد الواضح والدقيق لدور واختصاصات كل من يقوم باتخاذ القرارات ومن يعطي التعليمات ومن يصيغ الآراء وكيفية تداول المعلومات وباختصار تشكيل هيكل وتحديد طرق التنظيم خاصة .

بناء هيكل تراتبي ومركزي

فيما يتعلق بشأن إدارة الأشغال بالذات، أقام المدير تحت سلطته هيكلًا هرميًا تراتبيًا قوياً . يخضع له مباشرة رؤساء القطاعات الذين يتلقون أوامره ، ثم رؤساء الأقسام الذين يرأسون الرسامين و مسيري أو مراقبي الأشغال الذين يدورهم يأمرهم رؤساء الورشة.

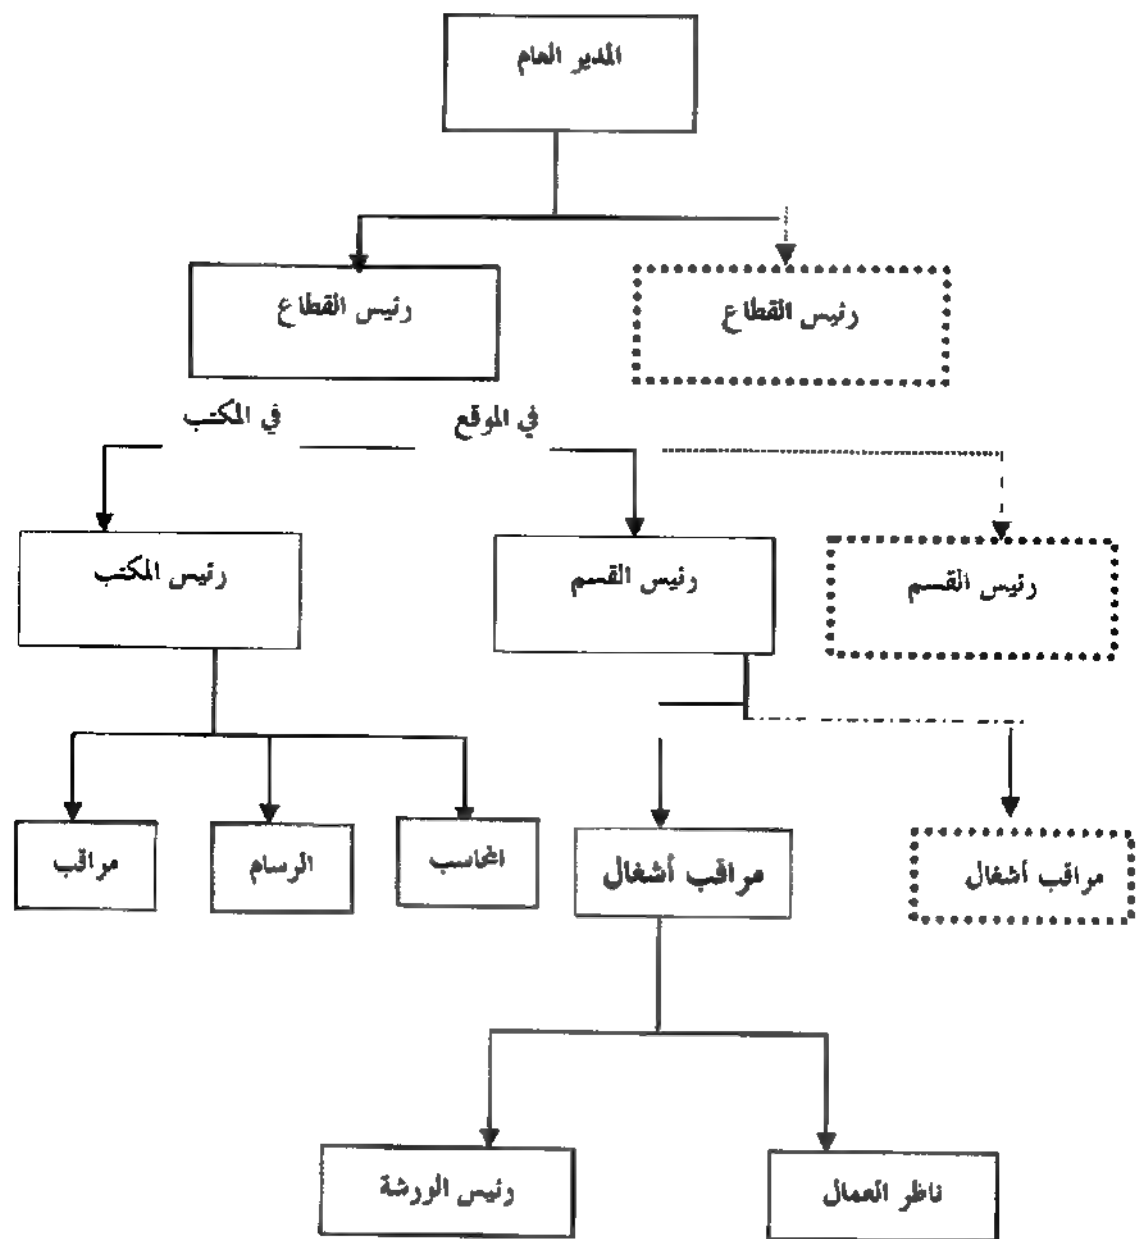

وقد أخذ النظام التراتبي الواضح في سلم المرتبات والذي وضعه فوازان في شهر فبراير عام ١٨٦١ عن النظام المعمول به في إدارة الطرق والكباري الفرنسية

مستوى المرتبات في الشركة في فبراير ١٨٦١	
٣٦٠٠٠	كبير المهندسين (فوازان)
٢٠٠٠٠	مهندس رئيس قطاع (لاروش ، مانتر ، لاروس)
١٢٠٠٠	نائب مهندس بمهام رئيس القطاع
١٠٠٠٠	من الدرجة الأولى
٩٠٠٠	من الدرجة الثانية
٩٠٠٠	مراقب عمال من الدرجة الأولى
٨٠٠٠	من الدرجة الثانية
٧٠٠٠	من الدرجة الثالثة
٦٠٠٠	ناظر عمال من الدرجة الأولى
٥٤٠٠	من الدرجة الثانية
٤٨٠٠	من الدرجة الثالثة
٣٦٠٠	وكيل مساعد من الدرجة الأولى
٣٠٠٠	من الدرجة الثانية
٢٤٠٠	من الدرجة الثانية
٩٠٠٠	مراقب الإدارات البحرية
٦٠٠٠	مراقب مخزن من الدرجة الأولى
٥٤٠٠	من الدرجة الثانية
٤٨٠٠	من الدرجة الثالثة
٤٢٠٠	من الدرجة الرابعة
٣٦٠٠	مساعد مراقب مخزن من الدرجة الأولى
٣٠٠٠	من الدرجة الثانية
٢٤٠٠	من الدرجة الثالثة
١٢٠٠٠	رئيس إدارة المحاسبة
٦٠٠٠	رئيس حسابات القطاع من الدرجة الأولى

٥٤٠٠	من الدرجة الثانية
٤٣٠٠	من الدرجة الثالثة
٤٢٠٠	من الدرجة الرابعة
٤٨٠٠	مراجع حسابات من الدرجة الأولى
٤٢٠٠	من الدرجة الثانية
٣٦٠٠	من الدرجة الثالثة
٣٠٠٠	من الدرجة الرابعة
٦٠٠٠	رسام من الدرجة الأولى
٥٤٠٠	من الدرجة الثانية
٤٨٠٠	من الدرجة الثالثة
٤٢٠٠	من الدرجة الرابعة
٣٦٠٠	كتاب مترجم من الدرجة الأولى
٣٠٠٠	من الدرجة الثانية
٢٤٠٠	من الدرجة الثالثة
٣٠٠٠	مُراسل من الدرجة الأولى
٢٧٠٠	من الدرجة الثانية
٢٤٠٠	من الدرجة الثالثة
٢١٠٠	من الدرجة الرابعة
١٨٠٠	من الدرجة الخامسة

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم يتدرج مثله مثل سلم المرتبات ضمن الحيز والمكان . فقد تم تقسيم خط الأعمال إلى قطاعات قسمت بدورها إلى أقسام .

قطاعات وأقسام الأشغال بورشة قناة السويس في ١٨٦٦ كيلومتر




حدود القسم

حدود القطاع


إن دراسة الخطط العضوية (organigrammes) السنوية تتيح المتابعة المستمرة لتطور مراحل العمل و تعمير الخليج بالتدريج. ففي عام ١٨٥٩ كان هناك قطاع بور سعيد فقط. وفي العام التالي ظهر قطاع التمساح. وفي عام ١٨٦٣ تم تقسيم الخليج كلياً والدليل على ذلك ظهور قطاعات بور سعيد والجسر والتمساح والسويس وترعة الماء العذب. أما قطاعات الخليج الأربع فسوف تستمر حتى نهاية الأشغال ، والامتداد الجغرافي لأي منها سوف يتقرر حسب حجم الأعمال المراد تنفيذها فقد امتد قطاع بور سعيد الذي يشمل أعمال الموانئ في الطرف الشمالي للقناة البحرية إلى ثلاثة وعشرين كيلومتراً ، أما قطاع الجسر فهو يغطي أكثر من خمسين كيلومتراً، وتتغير حدود الأقسام قليلاً بمرور الزمن لكي تتوافق مع الظروف الطارئة . وهكذا تم مد قسم بور سعيد في يوليو ١٨٦٨ حتى الكيلومتر ٢٧ وبعد ذلك في شهر مايو ١٨٦٩ حتى الكيلو متر ٣٠ .

ولتجنب استمرار حالة الفوضى التي كانت في السنوات الأولى و التي تشابكت فيها صعوبات لا حصر لها ، حاول فوازان تحديد مختلف المشاكل التي تعرضت لها هذه الورشة الخارجة عن المألوف كل واحدة على حدة والعمل على حلها مع إدراكه الكامل بتربطها. وفي بداية الأمر قام بالتميز بين الأشغال ذاتها ، والتي تم في النهاية تكليف مقاولين يعملون تحت إشراف شركة القناة والمهام التي تقوم بها الشركة مباشرة والتي لها علاقة بكل ما يشكل محيط الأعمال من النقل البري والبحري ، المواصلات داخل الخليج أو مع فرنسا و التموين بكافة أنواعها _ من المياه العذبة إلى مستلزمات التشغيل و إقامة العمال والموظفين والرعاية الصحية و بوجه أكثر شمولاً الحياة الاجتماعية في الخليج لهم.

تنظيم الإدارات المصرية في الشركة عام ١٨٦٩ ، مع إبراز الإدارة الأشغال العامة

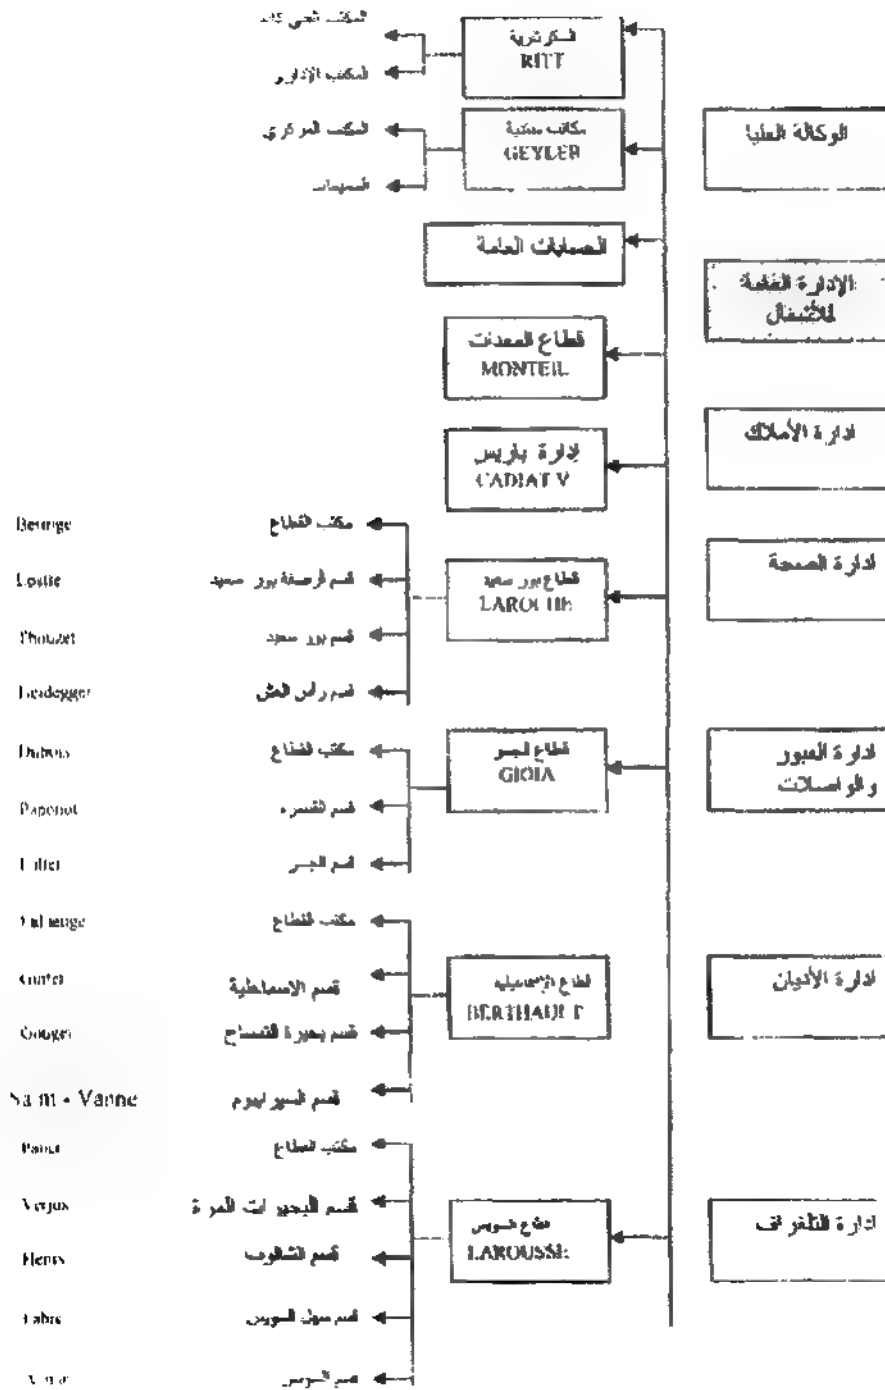

إنشاء وإلغاء إدارات في الشركة

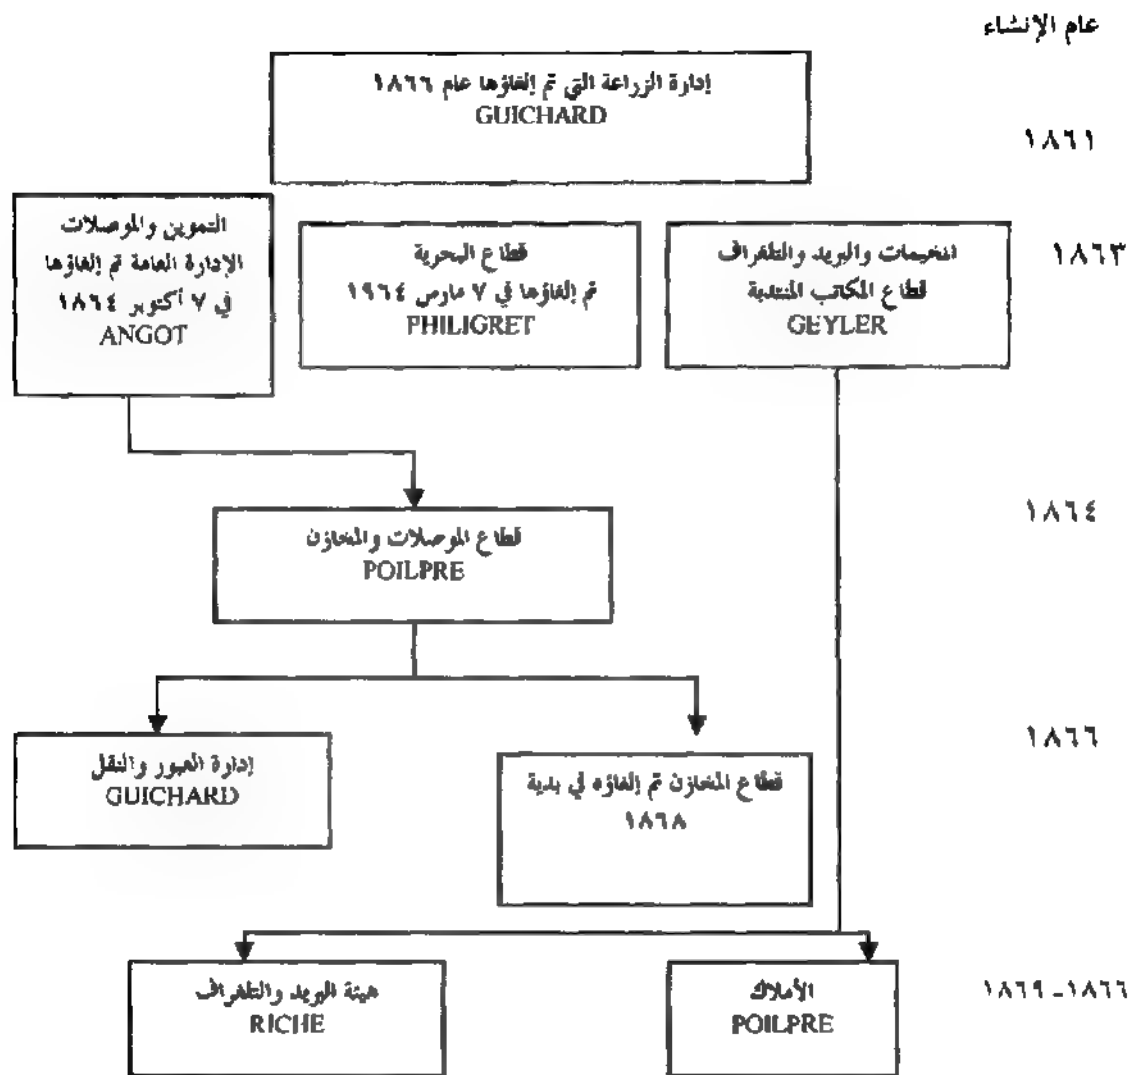

عند التعرض لأي نوع من المشاكل كان رد فوازن إنشاء إدارة جديدة لمواجهةها. وتتبع الإدارات التي أنشئت الوكالة العليا أحيانا وإدارة الأشغال العامة أحيانا أخرى. وهي تسمى للحصول على الاستقلال عندما تصبح علاقتها بالأعمال دقيقة ، أما عن تسميتها فهي متغيرة ؛ يشار إليها باسماء قطاع أو إدارة حسب الظروف وتخضع لإعادة تشكيل وتعديلات مع تقدم الأشغال أو تطور الاحتياجات .

هكذا تم إلغاء إدارة الزراعة التي أنشئت على أثر شراء منطقة الوادي^(٣٣) في مارس ١٨٦١ بعد إعادة بيعها إلى الحكومة المصرية في عام ١٨٦٦. وفي نفس السنة اختفى قطاع ترعة

الماء العذب عندما قررت الحكومة المصرية أن تأخذ على عاتقها تنفيذ هذا الطريق المائي. بالإضافة إلى ذلك ، تقلص في هذه السنة أيضاً قطاع النقل والمخازن إلى قطاع المخازن . بينما أطلق أسم "إدارة العبور والنقل " على إدارة المواصلات وبما أن عبور الخليج أصبح مباحاً لمرور أولى السفن ^(٣٤). وتم التمييز بين القطاعات الجغرافية والمصالح الموضوعية بأمر إداري الذي أعطى المهندس رئيس القطاع في فبراير عام ١٨٦٣ السلطة على جميع أفراد شركة القناة العاملين في قطاعه ^(٣٥). بمعنى أنه بالرغم من استقلاليتهم الظاهرية يمكن القول إن المصالح الجانبية ظلت تخضع لإدارة الأشغال العامة وأن فوازن له السلطة على كل العاملين بواسطة رؤساء القطاعات . وتفوق إذاً المنطق الجغرافي على المنطق الموضوعي ، وهكذا وجدت ورش الخليج الرئيسية الواقعة في بورسعيد نفسها تحت سلطة رئيس هذا القطاع ولم يتم هذا دون إثارة اعتراضات كما ستراه فيما بعد.

بصفة عامة لا تبقى هياكل الشركة جامدة ولكن تتطور باستمرار على الهامش وتبعاً لتقدم الأشغال والمهام الجديدة التي يجب القيام بها ، أو الأساليب التي يتم اختيارها لإنجاز الأعمال. ويدل التطور المنتظم على مرونة الإدارة التي وإن بدت على أنها ضرورة واضحة فهي لم تكن أقل تعقيداً عند تطبيقها . هكذا توضح خطط الشركة العضوية المتتالية، أنه يجب أن تتكيف بنية مصلحة الأشغال باستمرار مع الأهداف المحددة وأن تأخذ في الأوروبيين البيئة التي تعمل فيها. إن الطابع المؤقت أساساً للورشة يفرض هذا التنظيم المرن . وتختلف في ذلك عن المنتجات الصناعية الأخرى التي يمكن أن يأخذ التنظيم القائم فيها طابعاً دائماً ويعاد تشكيل خطة الشركة أولاً بأول مع استقرار العاملين بالخليج وتطور الأشغال . ويؤدي إنشاء إدارة أو قسم ما ، سواء أكان جذرياً أو جغرافياً ، إلى حشد للإمكانات ينشط الأعمال في هذا الميدان أو في هذا الحيز الجغرافي . ويتطور كل من الورشة والتنظيم الإداري معا ويؤثر كل منهما في الآخر دون أن نستطيع دائماً القول إذا ما كان الإطار الإداري هو الذي يدفع الأعمال أو أن الأعمال هي التي تتطلب تغيير البنية الإدارية.

وتتدرج أيضاً المركزية الشديدة التي تميز تنظيم الورشة ضمن المكان ، فقد قرر فعلاً المدير العام ابتداء من فبراير عام ١٨٦٢ إقامة مقر إدارة الأشغال العامة بالإسماعيلية في وسط الخليج والأشغال، وفضلاً عن ذلك أختار فوازن الإقامة والعمل في وسط الإسماعيلية على رصيف محمد علي.

نموذج مشترك

إن دراسة المسيرات المهنية السابقة و التدريبات التي تلقاها في أول الأمر العاملون الفنيون ^(٣٦) بالورشة وكذلك أعضاء اللجنة الاستشارية، تساعد على معرفة لماذا وكيف فرض نموذج نفسه تدريجياً في مجال التنظيم وهو نموذج الإدارة الفرنسية .

يمكن إبراز مصدرين مفضلين لتعيين العاملين الفنيين في كل من شركة القناة وشركة مقاولات هاردون . وقد تم تلخيص المعلومات التي تم جمعها المتعلقة بالتدريبات والتي أخذت حسب المفهوم العام لمجموع أساليب نقل المعارف والمهارات في الجدول الآتي ^(٣٧) :

التدريب	صاحب العمل ^(٣٨)	هاردون	الشركة
المدرسة العليا متعددة التقنيات (بوليتكنيك) فقط	صفر	صفر	صفر
المدرسة العليا متعددة التقنيات + هيئة الدولة	١	١	١١
مدرسة المناجم	١	١	١
المدرسة المركزية للفنون والصناعات	٢	٢	٩
مدرسة الفنون والحرف ^(٣٩)	٥	٥	٣
المدارس الأجنبية	٤	٤	٤
مدارس فرنسية أخرى ^(٤٠)	صفر	صفر	٥
مجموع جزئي للمدارس	١٣	١٣	٣٣
تدريب في هيئات الطرق والكباري	٢	٢	٤٣
تدريب غير معروف أو دون تدريب ^(٤١)	٨	٨	٢٨
المجموع الكلي	٢٣	٢٣	١٠٤

ولنوضح أن الأشخاص الذي تم حصرهم من بين قدامي تلاميذ مدرسة ما ، هم عامة الذين حصلوا علي شهادة هذه المدرسة . أما الذين واطبوا علي متابعة الدراسة بصفقتهم طلاباً مستمعين أحرار وبالتالي لم يحصلوا علي شهادة، فلانجذب لهم أثراً في دليل قدامي تلاميذ المدرسة . وفي هذه الظروف إن لم يتم هناك إشارة إليه من قبل المعني فإن هذا النوع من التدريب يظل غير معروف إلا فيما ندر . أما عن دراسة العصامين فإنها تواجه المشكلة الأبدية التي تتمثل في غياب المصادر الكفيلة بتناول العناصر المختلفة لمسارهم . ففي ورشة قناة السويس يحمل بعض الفنيين المستخدمين فقط شهادة البكالوريا قسم علمي، وكان بعضهم جديراً بالقبول في المسابقات . هكذا تغلبي هنري ريشارد (Henry Richard) عن الالتحاق بمدرسة سان _ مير الحربية (Saint Cyr) بعد قبوهم بها بدرجة مراقب الطرق والكباري ليتحق بالشركة . كذلك كانت شروط القبول للالتحاق بالمدرسة العليا متعددة التقنيات متوفرة في إدوارد كومبول (Edouard Comboul) ولكنه لم يقبل . وآخرون لا يمكنهم الاعتزاز بأية شهادة فقد تعلموا فقط علي الطبيعة وبالتجربة وبالاحتكاك بأصحاب الخبرة ولا سيما مديري التقنيين (قياس الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض) .

ويوضح الجدول التالي أن شركة القناة قامت على نطاق واسع بالتوظيف من بين العاملين بالدولة في إدارة الطرق والكباري الفرنسية. فقد تم تعيين إحدى عشر من مهندسا من قدامى المهندسين بالهيئات الفنية بالدولة. وتم توزيعهم ، حسب مؤسستهم الأصلية ، على النحو التالي:

مهندسو الهيئات التي قامت الشركة بتعيينهم مباشرة

هينة	الكباري	المدفعية البحرية	المدفعية البرية	الهندسة البحرية	الهندسة المائية	المجموع
عدد	٥	١	٢	١	١	١١

وقامت شركة القناة أيضا بتعيين مكثف للعاملين من بين الذين عملوا في إدارة الطرق والكباري أو هيئات الطرق الريفية الفرنسية^(٢٢) وهما بوتقتان مهمتان لتعليم عملي لمن قطاع الأشغال العامة على الطبيعة. إذ يُدرب القطاع الأول المراقبين ومفتشي العمال أو المساعدين^(٢٣)، أما الثاني فيوفر الخبرة للمهندسي الطرق القروية. ونميز بين المراقبين المساعدين والمجندين. وفقاً لقرار عام ١٨٥١ الخاص بتنظيم هيئات الطرق والكباري فإن كل متقدم نجح في امتحان المراقب يحصل على رتبة مراقب مساعد وعندئذ يعمل في وزارة الأشغال العامة ، ويمكن للمساعد بعد عامين من الخدمة وباقتراح من المهندس رئيس الطرق والكباري أن يتقدم للحصول على مرتبة مراقب مجند على أن يزود بشهادة كفاءة تمنح له بموافقة مفتش القطاع. وإذا لم يتمكن من الحصول على هذه الشهادة بعد ست سنوات، يُفصل من العمل (٤٤). وغالباً ما يكتسب البعض المعارف الضرورية لشغل وظائف مراقب أو مفتش عمال في مجال الطرق والكباري في إطار مدارس الفنون والحرف. كما هو الحال بالنسبة لخمسة أفراد عينتهم الشركة:

عناصر من هيئات الطرق والكباري، قدامى تلاميذ مدارس الفنون والحرف

درجة	ناظر عمال Piqueur / عامل مساعد	مراقب عمال conducteur مساعد	مراقب عمال مجند
مدارس الفنون والحرف			
مدينة أنجيه	١	١	٢
مدينة شالون	-	-	١

ويتعلق الأمر في أغلب الحالات وحق بعد عام ١٨٥١، بتكوين العاملين على الطبيعة عن طريق احتكاكهم بالمتمرسين ذوي الخبرة. كما يتم تدريبهم تربوياً بطريقة ياتباع أسلوب تربوي

معين وهو أسلوب المثال. في البداية كان معظم المتقدمين لاختبار المراقبين شباباً يشتغلون في مكاتب المهندسين زيادة على العدد المقرر و بدون أجر وأيضاً أفراداً حصلوا من قبل على درجة ناظر عمال أو عامل مساعد (agent secondaire) و مع ذلك نجد أشخاصاً متفردين مثل فرنسوا بيتس (François Bettès) الذي كان معلماً قبل أن ينجح في مسابقة المراقبين ، وكذلك دي فورتيه كرفورن (Fortuné Kerforne) الذي بدأ بحاراً في الثالثة عشر من عمره.

ويتم توزيع أولئك الذين عينتهم الشركة من بين قدامى العاملين بشبكة الطرق الريفية أو بإدارة الطرق والكباري على النحو الآتي:

تعيينات الشركة من بين قدامى العاملين

في شبكة الطرق الريفية وفي إدارة الطرق والكباري

الطرق الريفية	الطرق والكباري		
عامل الطرق القروية	مراقب أعمال مهندس	مراقب أعمال مساعد	ناظر أو مفتش عمال
٤	١٥	١٤	١٠

وفي عام ١٨٦٥ ، غادر إدارة الطرق والكباري الفرنسية ما يقارب المهندس الواحد من بين خمس مهندسين ومراقب أعمال مهندس من بين سبعة مراقبين وذلك ليتحققوا بخدمة شركات الأشغال العامة^(٤٥). وقد أتاح هذا الهروب من العمل ظهور لائحة جديدة في عام ١٨٥١ صدر بفضليها تشريع يسمح بإجازة غير محددة المدة للمهندسين والمراقبين المتجدين الذين يتركون مؤقتاً العمل في الدولة ليعملوا في شركة خاصة^(٤٦). وقد حظي هذا القانون الجديد بنجاح لدرجة أنه لإيقافه تم بعد سنوات إخضاعه لشروط مقيدة . ابتداءً من عام ١٨٥٧ خصص حق الإجازة المفتوحة للمهندسين الذين أمضوا خمس سنوات من العمل الفعلي^(٤٧) بالإضافة إلى ذلك أكد من جديد منشور وزارة الأشغال العامة في ١٠ نوفمبر ١٨٦١ على شروط تطبيق القرار المذكوراً أنه ممنوع منعاً باتاً على موظفي هيئة الطرق والكباري أن يصبحوا مقاولين أو حتى أن يعملوا في خدمة مقاول. أما بالنسبة للمراقبين غير المتجدين وكذلك المساعدين في الطرق والكباري ومراقبي الأشغال فيختلف وضعهم حيث أنهم لا يتمتعون بحق الإجازة المفتوحة؛ ويعتبرون مستقيلين عند قبولهم وظيفة في الشركة دون أي ضمان للعمل من جديد في الإدارة. كما توجد أحكام قانونية مماثلة في معظم الهيئات بخلاف الطرق والكباري^(٤٨).

وقد حظيت شركة قناة السويس ، دون أن نعرف لماذا ولا من الذي أخذ القرار بهذا، بنفس الإمكانات التي تتمتع بها شركات السكك الحديدية فاستطاعت من ثم دون أدنى صعوبة تشغيل وكلاء من إدارة الطرق والكباري. وعلى العكس من ذلك لم تستطع شركات المقاولات التي تعمل من أجل الشركة المتمتع بنفس المزايا. وتبين حالة جيل سياما (Jules Sciama) كيف أن البعض استفاد من الإمكانات التي توفرها الإجازة المفتوحة ، دون احترام قواعدها. في البداية كان سياما في أجازته مفتوحة في الفترة من ١٨٥٢ إلى ١٨٥٧ ليشارك في إنشاء خطوط سكك حديد في سيسيل (Sicile) وفي جنوب فرنسا، ثم عاد إلى الإدارة قبل أن يطلب من جديد أجازته في ١٨٦١ ليلتحق هذه المرة بشركة قناة السويس. هذه هي الرواية الرسمية للأحداث. ولكن في الحقيقة أن المقاول هاردون عينه للتو ولم يكن الهدف من تزييف هذا التعيين إلا إتاحة الفرصة له للعودة إلى الإدارة التي يتبعها^(٤٩).

بالنسبة لشركة قناة السويس ليس هناك ما يسمح لنا بفترض وجود علاقة من أي نوع مع الحكومة الفرنسية ، ولا دليل يتيح لنا التفكير أن هذه الأخيرة كانت على وشك أن تحل محل الشركة عندما بدأت فترة الانتفاع. ويمكن القول بأن نابليون الثالث كان ينظر إلى هذه الشركة بعين الرضى لأنها قد تزيد من وهج فرنسا في هذه المنطقة من العالم، ولاشك في أن هذا الترحيب المعزز بالعلاقات العائلية التي تربط فردينان دي ليسبس بالسلطة يضاف إليه الإرادة التي عبر عنها مهندسو الطرق والكباري في المشاركة في هذه الأشغال ، قد سهل عملية تعيين الشركة لأفراد تابعين للإدارة مستفيدين من الإجازة المفتوحة. ويمكن أيضا اعتبار هذا السخاء من جانب فرنسا استمراراً للتقليد المتبع في عهد محمد علي والمتمثل في إرسال فنيين ومهندسين من الهيئات الفرنسية إلى مصر.

ولو تفحصنا الآن بالتدقيق تشكيل اللجنة الاستشارية واستعدادات ومؤهلات أعضائها ، نلاحظ أن مهندسي الطرق والكباري قد شغلوا فيها مكانة عظيمة . ويتطور تشكيل هذه اللجنة بحسب ظروف الوفاة والمعاش بانتهاء الخدمة وشغور المناصب .

وقد حضر أول اجتماع أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للأشغال القدامى ، انضم إليهم مفتش عام الطرق والكباري ألبر توستان (Albert Tostain) المتخصص في أشغال الموانئ ورئيس الأشغال الجاري إنجازها على أرض الجزائر. باستثناء كونراد (Conrad) الهولندي الذي انسحب في عام ١٨٦٤ فكل الأعضاء كانوا فرنسيين . فحين إذا بعيدون كل البعد عن الطموح المعلن في البداية يشارك كل الأمم الأوروبية الكبرى في هذا العمل على غرار مشروع السان-سيمونين وكانت اللجنة الاستشارية تتكون من ستة أعضاء عند افتتاح القناة في نوفمبر ١٨٦٩ : ثلاثة مفتشين عموميين للطرق والكباري - سيزاير ريميو (Césaire Rumeau) القائم بمهام الرئيس

وبير ليباستير (Pierre Lebasteur) وفكتوران شيفاليه (Victorin Chevallier) -
 ومهندس المناجم جيل هانيت - كليري، (Jules Hanet-Cléry) المكلف بأعمال السكرتارية ،
 ومهندس الهندسة البحرية سوليه (Sollier) وقبطان الفرقاطة دي كومباريه (Combarieux) .
 وقد طُلب من الأخير أن يلحق باللجنة قبل افتتاح القناة بزمن قليل وفي الوقت الذي بدأ يظهر
 الاهتمام بمشاكل الملاحة في قناة المياه المستقبلية .

اجتماع الشركة بحضور أعضاء من خارج اللجان والمجلس

الجنة ١٦ لاسعلا ١٨٦٨ أكتوبر	الجنة الملاحة ٢٥ نوفمبر ٨٦٨	الجنة الأعمال الإستشارية		الجلس الأعلى للأعمال ٢٢ نوفمبر ١٨٥٨	الجنة الدولية ٣٠ أكتوبر ١٨٥٥	
		نوفمبر ١٨٦٩	٢٩ أغسطس ١٨٦١			
					X	هاريس +
					X	ماكليان +
					X	رانديل +
					X	ماني +
					X	نجريلي (دي) +
					X	مولنزيفو +
				X	X	باليو كابا +
	X		X	X	P	كومراد +
					X	لينس +
X	X				X	جوريس *
					X	ليسو ○
			P	P	X	رينو ● ○ □
	P				X	ريجو * ◆
X	X		S	S		ليسير ● ○ □
X	X		X	X		بسكال ● ○
			X			توبتان ● ○ □
X	X	P				ريجو ● ○ □
X	X	S				هاليت كلاري ○
X		X				ليستير ● ○ □
X	X	X				شيفاليه ● ○ □ ◆
		X				سولي ● ○ ◆
X		X				كامباريه (دي) *
X	X					جيرمان دي
						لاجرفيار *
X						ديوي دي لورم ○
X						اجرمان *
X						فيرسه
X						دشوديه

X عضو جديد X عضو P رئيس S سكرتير ● مهندس طرق وكباري + أجنبي
○ عضو هيئة دولة * ضابط بحري □ عضو مجلس الطرق والكباري العام
◆ عضو مجلس الأعمال بوزارة البحرية

ومع مرور الزمن أصبحت إذا شركة القناة تلجأ فقط إلى خبراء فرنسيين وبصفة أخص خبراء رسامين ومعظمهم مهندسو دولة . تسعة من بين أحد عشر شخصا الذين كانوا ضمن اللجنة الإستشارية ينتمون إلى جهاز الدولة ومن بينهم سبعة مهندسين من الطرق والكباري . ينتمي كل من رينو وتوستان وريميو إلى نفس الدفعة التي التحقت بالمدرسة العليا متعددة التقنيات في عام ١٨٢٢ ، وينتمون جميعا باستثناء باسكال إلى مجلس الطرق والكباري العام . أما بالنسبة لسوليه (Sollier)، مهندس الهندسة البحرية ، فهو عضو مع شيفاليه (chevalier) في مجلس الأشغال بوزارة البحرية^(٥٠).

وبذلك فإن تشكيلة الكفاءات التي عينتها الشركة على أرض الواقع كما في وسط الخبراء قد شرعت في التقلص تدريجياً ونحت إلى الجمع حول المدير العام لأغلبية من الأفراد يشاركونه نفس الثقافة ألا وهي ثقافة إدارة الطرق والكباري الفرنسية . ونذكر في ظل هذه الظروف كيف أمكن الوصول تدريجياً إلى الإجماع على المناهج التي تطبق لتنظيم الورشة . وفي نفس الوقت، سهل تعيين الفنيين وخبرة سابقة تطبيق أساليب عمل أخرى .

المراقبون : القوة المحركة ومحور التنظيم

إذا تجاوزنا البنية التراتبية ذاتها سوف نجد أن تحديد رتب العاملين والمهام الموكلة إلى كل واحد منهم في الإدارة العامة لأشغال شركة قناة السويس يشكل نسخة مطابقة للممارسات الإدارية الفرنسية.

مهمة رئيس القطاع ولقب المهندس

ترتبط الرتب التي تمنحها الشركة عند التعيين ارتباطاً وثيقاً بالخطرات و التدريب الأولى . ولإبراز ذلك تم تصنيف الرتب إلى سبع فئات . كما هو الحال في كل الممارسات من هذا النوع ، فقد سجلت بعض الانحرافات نتيجة لعدم الدقة في تحديد بعض الرتب والجمع العشوائي أحيانا بين عناصر متنافرة في نفس الفئة . ومع ذلك ، كانت كل فئة متجانسة من وجهة نظر المرتبات . وتم ترتيب الرتب على النحو التالي:


رمز الرتبة	الوظيفة
٠	مراقب المعدات ، مأمور الاستلام ، ناظر العمال ، عامل منفذ ، موظف (رئيس) مكتب، عامل فني ، مورد بضائع ، آلائي ، رئيس ورشة
١	رسام
٢	مراقب عمال ، مفتش ، رئيس عمال
٣	(نائب) رئيس القسم، رئيس مكتب القطاع، مراقب عمال رئيسي ، رئيس الأشغال ، رئيس المخزن ، نائب رئيس الصيانة .
٤	مهندس رئيس القطاع ، رئيس إدارة ، مفتش
٥	المدير
٩	آخرون: أمين صندوق ، محاسب، رئيس مصلحة الحسابات

ويبرز الجدول التالي توزيع أفراد الشوكة حسب نوع المؤهل وأول وظيفة

الوظيفة التأهيل (من)	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	المجموع
المدرسة العليا متعددة التقنيات (بوليتكنيك)								٠
المدرسة العليا متعددة التقنيات + الطرق والكباري					٣	٢		٥
المدرسة العليا متعددة التقنيات + هيئة أخرى			١	١	٣		١	٦
المتخرج		١						١
المركزية	٢	١	٥	١				٩
الفنون والمهن	١	٢	٠	٠				٣
مدارس أجنبية		٠	٢	١	٠		١	٤
مدارس أخرى	١	٢	١		١			٥
تدريب في هيئات الطرق والكباري	٤	٢	٣٢	٤	١			٤٣
مجموع المؤهلات	٨	٨	٤١	٧	٨	٢	٢	٧٦
دون مؤهل أو مؤهل غير معروف	٢	١٣	١٠	٢	٠	٠	١	٢٨
المجموع	١٠	٢١	٥١	٩	٨	٢	٣	١٠٤

من ثم نرى أنه كلما ارتفع مستوى تحصيل الدراسة النظرية كلما عظمت فرص الحصول على مرتبة عالية في السلم الوظيفي. لذا شغل مهندسو هيئات الدولة معظم وظائف المديرين ورؤساء القطاعات أو الفروع أما خريجو المدارس المركزية فقد تم تعيينهم مثل قدامى المراقبين (مَسِيرِي

الأشغال) في الإدارة . وتم منح وظيفة آلائي ورئيس العمال الميكانيكيين لأشخاص بدون شهادة أو من كان لهم خبرة في هيئات الطرق والكباري (مثل حالة مراقب أشغال وأثنين من مراقبين مساعدين ومراقب مجند). وتم أيضا توظيف اثنين من خريجي المدرسة المركزية في درجات مماثلة ، ليقوما بمهام إدارة حركة المعدات بوظيفة مُستلم أو مأمور المعدات . ويتم اختيار الرسامين قبل كل شيء بين أشخاص تعلموا في الورشة على الطبيعة ، رغم أن بعضهم من الحاصلين على شهادات . وكانت الغالبية العظمى من الرجال الذين شغلوا درجة مراقب من الذين عملوا سابقا مراقبا للأشغال أو مراقب مجند أو مساعداً في إدارة الطرق والكباري . وتم أيضا تعيين مراقبين من بين خريجي المدرسة المركزية أو العصامين . وكان الاثنان الذين تم توظيفهم من خريجي مدرسة البوليتكنيك وكلاهما من قدامى الجنود . وقد تم تقاسم لقب رئيس القسم من قبل مراقبين مجندين من ناحية وفنيين مختلفي التأهيل بل حتى من عصامين من ناحية أخرى . أما تعيين رؤساء القطاعات فكاد يكون مقصوراً على مهندسي الهيئات إذ كان نصفهم من بين مهندسي الطرق والكباري والنصف الآخر من الهيئات الأخرى . ويوجد استثناء لهذه القاعدة مثل حالة كازو (Caseaux) مراقب مساعد سابق ، وحالة كاييه (Caillé) طالب مستمع بالمدرسة المركزية ، وأخيراً كان مديرا الأشغال وهما مهندسان تابعان للطرق والكباري.

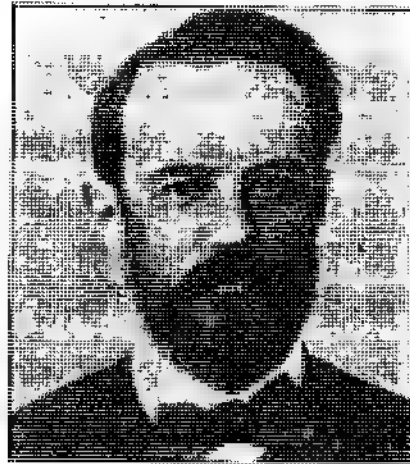

رئيسا قطاع لاروس و لاؤوش

صور أخذت عن ج ٠ شارل روو (الخليج وقناة السويس) الجزء ١ ص ٢٦٧ و ٢٩٥

وكانت الترقيات نادرة نسبياً طوال مدة الورشة . وقد احتفظ بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع الموظفين بالدرجة التي كانوا عليها عند التعيين . ثم تم ترقية بعض المراقبين كرؤساء أقسام ولكن مع ذلك كانت ترقيتهم محدودة نظراً لأن تعيين رؤساء القطاعات يتم مباشرة . ولم يتوان عن الاستقالة الأفراد الذين اعتبروا أنهم قد بحس قدرهم (وبالتالي مرتباقيهم) . أما لقب المدير فيتم الحصول عليه

منذ اليوم الأول وإلا فلن يحصل عليه أبداً كما لا يوجد تراجع لا في الرتب ولا في المرتبات المقررة، ويتم فصل الذين لم يشتروا كفاءة في الوظيفة التي اختيروا لأجلها .

وقد خُصص لقب مهندس لعدد محدود جداً من الأفراد ، بالإضافة إلى أن هذه التسمية لا تظهر أبداً بمفردها، فنجد فعلاً رئيساً لمهندسي الأعمال (فوازان عندما كان يساعد موجيل وسياما بعد دمج العاملين عند المقاول وعمال الشركة) ، ونجد مهندسين رؤساء ومهندسي تجهيز (شيمت ثم مونتيل) ومهندس استشاري (هانيت - كليري) . ولا ينطبق بالضرورة اللقب عند تساوي الوظيفة كما يبدو أن اللقب يتبع في الغالب التأهيل الأول و يحمل كل المستولين عن مقاطعة في الورشة لقب مهندس رئيس قطاع باستثناء كازيو المراقب السابق للطرق والكباري ورئيس قطاع ترعة الماء العذب الذي وجب عليه أن يكتبي بلقب نائب مهندس الذي صيغ خصيصاً له . غير أنه في ديسمبر عام ١٨٦٣ عند وصول المياه العذبة إلى السويس و"مكافأته" على جهوده ،قررت الإدارة " ترفيته إلى درجة مهندس" ^(٥١) . ونشر أيضاً إلى حالة بيتيس (Bettès) المراقب ومُسِر الأشغال السابق للطرق والكباري الذي جاء إلى مصر لإدارة قطاع الإسماعيلية محل فيليه (Viller) والذي عين بدوره بلقب نائب مهندس . ولما مات بعد سنة ، حل محله بيرتو (Berthault) خريجي المدرسة متعددة التقنيات وضابط مدفعية سابق، مستعيداً في نفس الوقت الوظيفة ولقب نائب مهندس وبعد ذلك بعام تم تعيينه باقتراح من المدير العام مهندساً رئيساً لمقاطعة الإسماعيلية . ومن هنا نستنتج إن كان البعض قد حصلوا منذ البداية على لقب مهندس فإن الأمر يتعلق للبعض الآخر بمكافأة يجب أن يكونوا جديرين بها . علاوة على المديرين فقد حصل خمسة عشر رجلاً منذ وصولهم على لقب مهندس وكلهم من خريجي المدرسة متعددة التقنيات ماعدا ثلاثة . من بين هؤلاء الثلاثة ، واحد حرم من اللقب فيما بعد . وشغل الاثنان الآخران على التوالي وظيفة مهندس تجهيز . فإذا لا تقتصر المؤهلات الأساسية على تحديد الوظيفة ولكن أيضاً على الحصول وإلى حد كبير على لقب مهندس . وبذلك تعكس ورشة قناة السويس بصورة واضحة الوضع السائد في فرنسا حيث لا يزال لقب مهندس موقوفاً على خريجي المدرسة متعددة التقنيات .

وتبدو المرتبات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤهلات الأساسية كما يشهد بذلك الجدول التالي:

المرتبات السنوية لرؤساء قطاعات الشركة بالفرنكات ^(٥٢)

رئيس المقاطعة	الاسم	المؤهلات	السنة			
			١٨٦٣	١٨٦٥	١٨٦٧	١٨٦٩
بورسعيد	لاروش	مدرسة الطرق والكباري	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠
الجسر	جيوبا	جامعة تورينو	١٥٠٠	١٨٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٧٠٠٠
الاسماعيلية	فيلاز	مدرسة الطرق والكباري	٢٢٠٠٠	٣٠٠٠٠		
"	بيتيس	مُسِير أشغال طرق وكباري مجند		١٠٠٠٠		
"	بيرتول	مدرسة مينس		١٠٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠
السويس	لاروس	مهندس مياه	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠
قناة المياه العذبة	كازيو	مساعد مراقب طرق وكباري	١٢٠٠٠	١٥٠٠٠		
المعدات	مونثيل	مدرسة الفنون والحرف		١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠

على هذا النحو ولأنه لم يكن من خرجي المدرسة متعددة التقنيات لقد تأخر جيوبا عدة سنوات حتى حصل على مستوى مرتب يتساوى مع وضع زملائه رؤساء القطاعات .

وبمجرد وصول فوازان ، في ٢٦ فبراير ١٨٦١ ، قام بوضع " اللائحة العامة للمستثمرات والورش والمشاغل" والتي تحدد إختصاصات كل فرد وخاصة إختصاصات المهندسين رؤساء القطاعات. وتفسر هذه اللائحة واجباهم بخمسة أفعال: الإدارة ، اطاعة الأوامر ، الحفاظ على النظام ، مسك الحسابات والتوقع . ويقوم رؤساء الإدارات والفروع بالمسئوليات الآتية:

- (١) حسن سير وإدارة العمل
- (٢) تنفيذ الأوامر
- (٣) الرقابة والنظام والحفاظ على الورش والمشاغل والمعسكرات الخ
- (٤) الرقابة اللازمة لضمان متابعة التقييد الكتابي باستمرار
- (٥) تقدير إحتياجات مناطقهم من معدات و لوازم و مواد وأموال . بإختصار عليهم مسئولية كل ما يدور في مناطقهم. ^(٥٣)

ويحدد البند التالي فئات العاملين المختلفة التي تعمل تحت سلطتهم وهم رؤساء الأقسام والمشغلين و المراقبين ومسيري الأشغال أو رؤساء الورش ورؤساء العمال ورؤساء الحسابات والمحاسبين والمخلصين وأمناء المخازن . وبالنسبة لمهام رؤساء الحسابات تشير اللائحة إلى أيام الشهر التي يجب فيها إعداد العقود المختلفة. ففي العاشر من كل شهر يجب أن يتم تصدير مستندات الأرصدة والمرتبات وكذلك تقدير احتياجات الشهر التالي من الأموال. ويقع على عاتق رئيس القطاع مسؤولية تسجيل بعض مستندات التنظيم الإداري في منطقته مثل " سجل دليل المرسلات الواردة والرد عليها" و "سجل القرارات الذي يوضح فيه كل القرارات والزيارات"، و"سجل قيد أسماء العاملين" و"سجل قيد العمال الأوروبيين" وأيضاً "يومية تاريخ العمل وكل الأحداث البارزة".

ويسيطر المهندسون رؤساء القطاعات على كل العاملين في قطاعهم ويقع على عاتقهم أيضاً إدارة الأفراد . كما يجب عليهم مرة في كل عام تقييم كفاءات كل واحد من موظفيهم وإقتراح المكافآت والترقيات لمن يستحق منهم. ويجب عليهم باستمرار تشجيعهم وتأييدهم إذا لزم الأمر، والتأكد من الملاءمة بين احتياجات العمل وكفاءة الرجال التابعين لهم ، وعليهم طلب موظفين جدد والعمل على تسريع غير الأكفاء .

وسوف نرى في هذا القرار الإداري الذي يحدّد بدقة مهام المهندس رئيس القطاع وسيلة مسن وسائل فوازن للسيطرة على نظام الورشة وصورة واضحة لأسلوبه في الإدارة . أما عن النموذج المتبع فقد حددته اللجنة الإستشارية في نفس الوقت الذي عبرت فيه عن الرغبة في تطبيقه بدقة : "منذ الآن وطبقاً لممارسات مصلحة الطرق والكباري السليمة سوف تشمل المسائل المطلوب منها فحصها بالإضافة إلى آراء السيد المهندس رئيس الأشغال والسيد المدير العام ، تقارير واقتراحات المهندسين الذين يشغلون قمة الهرم الوظيفي"^(٥٤). إذاً والمهام الواقعة تحت مسؤولية رؤساء القطاعات تعتبر بالأساس ذات طابع إداري ، فهم يؤدون عملاً إدارياً قبل كل شيء .

ويعتبر جيويو الذي كان قد عينه المقاول هاردون من الذين يرون أن المهام الإدارية شيئاً ثانوياً. فقد كان يعمل في ورشة عندما كُلف بتولي وظيفة سكرتير عام في مقالة هاردون ولم يسره هذا التغيير فقد قال : " بمجرد أن بدأت أعيش حياة الورشة النشيطة و الأخاذة إستلمت قراراً بتسليم عملي إلى شميت (Schmitt) وإستلام مهام منصبي الجديد [...] و قد منحت لي الفرصة بدخول مدرسة عليا للإدارة كان يجب ألا أفوقها في إنتظار فرصة جديدة تعيدني إلى بيئتي الطبيعية في الورشة"^(٥٥) وصرح لمراسله بما تسبب له العمل الجديد من خيبة : " يجب أن أعترف أن بداياتي

كانت غير مرضية ، فقد سببت لي كل الأوراق التي تركني سيما وحدي بينها إنزعاجاً عصبياً وكنت أرى كل هذا الوقت الذي يضيعه الناس في كتابة جبال من الرسائل يومياً [...] وأخذت على عاتقي أن أشدد عليهم وأنصحهم بزيادة العمل والتقليل من الكتابة عما كانوا يفعلون . ولم تلق نصائحي رضا الجميع فقد أفهمني السيد سياما بوجوب التصرف بتأن وعدم تقديم الكثير من المطالب مرة واحدة ."

لقد عيّن هاردون سياما مهندس الطرق والكباري على ما يبدو على إثر تدخل شركة القنساء محاولة إحتواء إهمال الشركة المقاوله الواضح فيما يتعلق بالإدارة. وتعتبر تصريحات جيويو الذي اكتشف هذا العالم الجديد مفيدة من جانبين. فمن جانب هي تجعلنا ندخل المكاتب ونطلع على عمل نادرا ما تم وصفه ويشبه كثيراً عمل رؤساء قطاعات الشركة. كما أنها تساعد أيضاً على تقييم مدى إهمال الموظفين بالمقاولات للبعد الإداري للورش. لم يتوصل جيويو وهو رجل الورشة إلى فهم لماذا " تقوم شركة المقاولات من المفترض أنها كانت وستظل مؤسسة صناعية لا إدارية ببذل هذا القدر من الجهد لعلاج هذه المسائل. وقد عبر عن رأيه في مهامه الجديدة ووصفها بالعبارات التالية : " هنا أبقى مستمراً على كرسي مكثي ، أصرف كل القضايا سواء المتعلقة بالشركة أو غيرها ، وإذا طرحت قضية بالغة الأهمية على بساط البحث ، أقوم بدراستها وأقدم مشروعاً للحل وأرسله لسياما وما عليه إلا أن يقرّر إما بالإيجاب وإما بالرفض . هكذا أدركت ماهية دوري وأدعو الله ألا يدوم سوى الوقت اللازم حتى أتشبع بجهاز الإدارة القائم لأعرفه بما فيه الكفاية ولأطبقه بعد ذلك في حدود ماهو ضروري فقط " . بعد فترة من الزمن دفعه انهيار الشركة العامة للمقاولات التي يعمل بها إلى مراجعة تقديره بشأن فائدة العمل الإداري الذي اشتكى منه كثيراً: "لقد أخطأت ، في الواقع [...] هل كان لابد من دراسة التنظيم أكثر من ذلك بدلاً من اتباع الشركة المقاوله لإحتواء الفوضى التي تقع حتما عند إعداد الأعمال الهامة؟ هذا احتمال وارد "

و زادت بالتدريج صلاحيات رؤساء القطاعات لتتجاوز حدود إطار الأشغال. ففي فبراير عام ١٨٦٣ صدر أمر إداري^(٥٦) يمنحهم فعلاً صراحةً السلطة على الموظفين في كل الإدارات الواقعة داخل حدود القطاعات الخاضعة لهم ويضطر مأموري البلديات بصفة خاصة إلى تلقي التعليمات منهم وتنفيذ أوامره^(٥٧). لذلك وجب على رئيس القطاع مواجهة مشاكل يومية متنوعة ومتزايدة الحجم .

أما المهندس المستول عن إدارة باريس فيقوم بناءً على أوامر المدير بدور همزة الوصل بين الورشة و البنائين والمقاولين والموردين الفرنسيين أو الأجانب. ويجمع المعلومات على أساس

المشاريع التي أرسلها فوازن عن الحلول المختلفة الممكنة ويقارن بينها حسب المعايير الاقتصادية والفنية ويدخل في محادثات مع البنائين ويعد الطلبات .

وقد فضلت شركة القناة تعيين موظفين سابقين بالدولة لأداء هذه المهام الإدارية المختلفة . وتتيح دراسة ممارستهم إلقاء نظرة جديدة على مهندسي الدولة ولاسيما إبراز أن الشركات الخاصة عندما تبحث عنهم فإن ذلك عائد وقبل كل شيء إلى كفاءتهم في مجالي التنظيم والإدارة . ويرجع الفضل في نجاح المهام التي يقومون بها خاصة للخبرة المكتسبة في الإدارة وهي ترجع بنسبة ضئيلة جداً على التدريب الأولي الذي تلقوه في المدارس . ويمكن أن تضمن هذه النسبة الضئيلة جداً ، تعلم الانضباط والسير وفق النظام التراتبي والتعود على العمل المنهجي . وفي الحقيقة وفوق كل شيء ، يعتبر هذا التأهيل مفتاح الوصول التلقائي إلى لقب مهندس وإلى أعلى درجات السلم الوظيفي . ويعتبر الفرق شامعا بين ممارسة مهندس الدولة والتعليم الذي تلقاه . ولايساعد ، وبأي حال من الأحوال ، تحليل الدراسات على تصور أهمية الأشغال الإدارية التي سوف يكلفون بها فعلاً فيما بعد . والعكس صحيح فهذه الأشغال الروتينية إلى حد ما لا تستدعي منهم اللجوء إلى ما حصلوه من معارف أثناء دراستهم . وهكذا فإن صورة مهندس الطرق والكباري التي تشكلت اعتماداً على المهام التي يضطلع بها يومياً لاتشبه إلا قليلاً الصورة المستتبطة عن التعاليم التي تلقاها أثناء دراسته ^(٥٨) أو أيضاً تلك التي شكلت إنطلاقاً من مقالات عن الممارسة أخذت عن بحوث أو نشرات مهنية دورية .

المراقبون (رؤساء الأشغال) : المحرك الأساسي للورشة

و مثل لفظ المهندس ، فإن كلمة مراقب أو مسير الأشغال تعبر يحتوي على التباس ، فهي تحيل إلى الدرجة وإلى الوظيفة معاً . ويرجع مفهوم وظيفة المراقب في ورشة قناة السويس ، كما هو الحال في جميع ورش الأشغال العامة في ذلك الوقت ، إلى التعريف و الوضع القائم في إدارة الطرق والكباري والذي استلهم منها إلى حد بعيد .

ففي ورشة قناة السويس ، تنص اللائحة العامة لمستثمرات الورش والمشاغل ، التي سبق ذكرها ، على تماثل اختصاصات وظيفة رئيس القسم مع وظيفة رئيس القطاع إذا كان الإقليم الجغرافي الذي تمارس فيه الوظيفة محدوداً نوعاً ما . فلا وجود قاعدة مطلقة وجامدة تحدد نشاط المراقب . كما لا يوجد تخصيص منظم للأدوار فيمكن مثلاً حمل المراقب على المشاركة في مشروع أو في دراسة أو كذلك المشاركة في تنفيذ أعمال أو رقابة نشاط شركة مقاوله . وقد يحدث أيضاً أن يهتم المراقب فقط بجزء من عملية تطور بناء أو بموضوع دراسة محدد . وعلى سبيل المثال قام للمان

(Lallemand) في ١٨٦٤ بتفيذ العمليات والدراسات من أجل حفر قنوات الإسماعيلية والسيرابيوم (Sérapéum) تسهيل الاتصالات ^(٩٩) وفي عام ١٨٦٥. وكُلف شانوان (Chanoine) بتحرير مشروع ترعة الماء العذب من العباسية إلى القصاصين ثم عمل القياس المتري لهويس السويس ^(١٠٠) . وبالإضافة إلى أعمال البناء والردم ذاتها ، تحتاج ورشة بمثل هذه الضخامة إلى أعمال لا يمكن الإستهانة بأهميتها من صيانة وإصلاح ، يُكلف بها أيضا المراقبون.

و نجد أن لقب مراقب يطلق على الموظفين الذين يعملون في الورش وعلى غيرهم ممن يعملون في المكاتب أو أشخاص يوزعون وقتهم بالعمل بين هذين المكانين . بالإضافة إلى ذلك ، فإن دراسة السيرة الذاتية للإفراد والهيكل الوظيفية المتعاقبة لشركة قناة السويس طوال مدة الورشة ، تبرز وجود مراقبين مستقرين في نفس الوقت تم تعيينهم في مصلحة واحدة منذ وصولهم حتى رحيلهم ، وأيضاً وجود مراقبين يتمتعون بسهولة الحركة الجغرافية والوظيفية .

عندما يتم إنجاز الأعمال بنظام التكليف المباشر (الإدارة العامة مباشرة) ، يأخذ المراقب على أرض الواقع المبادرات فيما يتعلق بالتنظيم وفي طرق تنفيذ الأعمال الواقعة تحت مسؤوليته مهما كانت نوعها. ويعطي التعليمات لرؤساء العمال ورؤساء الورش التابعين له بل يلقيهم أساليب العمل. ويُقيم قدرات مرؤوسيه ويحثهم ويشجعهم أو يوبخهم حسب الظروف. وتقع على عاتقه أيضاً مهمة الحفاظ على النظام والعمل في الورش المسئول عنها. ولا تعتبر ، من وجهة النظر هذه ، ورشة حفر قناة السويس أكثر الورش سهولة ، إذ يجد المراقب نفسه مضطراً يومياً لمواجهة صعوبة مهمة إدارة الخلافات التي تحدث باستمرار بين الجماعات من جنسيات مختلفة كما يشهد على ذلك التقرير الذي وجهه هذا المراقب إلى رئيسه في أغسطس عام ١٨٦٩ : " منذ أيام قامت مشاجرة على الجرافة ٣٣ بين نجار فرنسي يدعى ديران (Durand) و بوبل (Popel) ، مساعد حداد ، تبادلا بعض الضربات ولكنها طفيفة ، وفي اليوم التالي جاء يشكو لي النجار الفرنسي وهو رجل وديع وهادئ جدا ، وطردت الإيطالي الذي علاوة على ذلك كان قد سب طاقم البحارة اليونانيين عندما رسم صلبان على سطح المركب وبصق عليها وكاد البحارة أن يلقوه في الماء لو لا تدخل صاحب العمل الذي أراد تجنب اللوم. وحينئذ قال بوبل الإيطالي لديران " أنه سيدفع ثمن ذلك" ^(١٠١)

وليس من الضروري مواصلة رواية هذه القصة التي من الممكن تصور وقعها لفهم هذه النماذج من المواقف التي تشتمل على صراعات والتي يجب على المراقب تسويتها. ويعتبر تفهم المسائل الإنسانية والسلطة من غير شك ميزتان ثميتان في مثل هذه الظروف. وليس لدى كل الناس موهبة العلاقات الإنسانية. فقد توالى الهجوم على كايه (Caillé) الذي تعرضت كفاءته بشدة للنقد: "لا يعرف هذا الموظف أدنى شيء وليس لديه الكفاءات اللازمة لممارسة المنصب الذي يشغله ،

وماثير العجب أنه شغل نفس الوظيفة في رأس العث ، ومع ذلك فقد ظل على نفس الدرجة من الجهل لبعض تفاصيل عمله ولقد أضاف إلى عدم كفاءته المعروفة والتي انكشفت أمام أعين أبسط العاملين الخاضعين لأوامره وهو ما لم يبق له سوى سيادة وهمية لإدارة العاملين، قدرأ من الغرور لا يساويه إلا جهله ، ويؤدي به إلى علاقات صعبة في العمل مع رؤوسيه كما مع رؤسائه وتحت على الاستبداد الطائش من جهة وعلى عدم الانضباط من جهة أخرى^(٦٢)

ويقوم المراقب مسير الأشغال بدور العامل الميكانيكي أثناء المهام الفنية الدقيقة مثل قياس الارتفاعات أو في حالة الأعمال التي تقع تحت مسؤوليته مثل تقديم البيانات الشهرية عن تطور العمل. فعليه حينئذ استعمال المطر (سلسلة لمسح الأراضي طولها عشرة أمتار) و الزوايا (آلة يستعملها المساحون لقياس الزوايا الأفقية والرأسية) والمساواة (مقياس التسوية) أو المجلاة (مسطرة مرقمة كبيرة تستعمل في مسح الأرض لمعرفة الارتفاعات) . وترتبط أعماله في المكتب بإعداد المشاريع و مسك الحسابات وكتابة التقارير . وتأخذ نتائج نشاطه شكل الحسابات العددية (حساب المردوم والحفر وكتابة المقاسات وحساب المردودية ...) و الرسومات والمخططات والتقارير .

غير أن الأعمال الرئيسية لتنفيذ بنظام الإدارة المباشرة، لذا يتضح أن الرقابة والتفتيش هما أساس نشاط المراقب في الورشة بشركة القناة . وتأخذ أشكالاً مختلفة حسب الهدف من الرقابة . وتعتبر الرقابة عملية في غاية الغموض لدرجة لا يمكن تصور دائما طبيعتها تماما. ففي بعض الأحيان ، و تشبه المراقبة بالسلبية. فمن يراقب لا يعمل ولكن ينظر إلى عمل الآخرين. فما هناك سوى أن نخطر خطوة واحدة للقول بأنه لا يفعل شيئا وهي الخطوة التي غالبا ما نخطوها. وتشمل الرقابة على الأقل نتاج عناصر متابعة نشاط الشركة المفاولة وكتابة التقارير الدورية ومتابعة تطور المقاييس والمعايير التي تم اختيارها حسب العمل المطلوب مراقبته . ويمكن ممارسة التفتيش والرقابة على جميع نماذج العمل . فنجد في عام ١٨٦٤ المراقب لتور دي شوميل (Le Tors de Chaumesnil) يراقب العمل في مدينة الإسماعيلية^(٦٣)، بينما كان كولاس (Collas) ، في عام ١٨٦٠ ، مفتشاً ومراقباً في محاجر المكس^(٦٤).

ولنفحص عبر بعض الأمثلة التي تبدو لنا أكثر دلالة عن التفسيرات الطويلة المجردة ما هي مهمة الرجال المكلفين بالرقابة . في نهاية شهر أبريل عام ١٨٦٩ ، قام اسكندر توزيه (Alexandre Touzet) رئيس قسم في بور سعيد ، بطرح سؤال على لاروش (Laroche) ، رئيس القطاع التابع له ، عن طبيعة مهمته الحقيقية في إطار أشغال وضع أساسات منارة بور سعيد الجديدة^(٦٥). ورداً على التعليمات المبهمة التي قدمها له رئيسه ، أجاب بإقتراحات تهدف إلى تحديد اشتراطات الرقابة التي يزعم تطبيقها. وتدل هذه الإقتراحات في نفس الوقت على مدى استقلاله الذاتي

وخبرته في ممارسة الأعمال. ومع أن المقصود هو وضع أساسات لمئارة من كتل خرسانية ، وهو نوع حديث من البناء لم يسبق له مثيل، فقد اكتفى رئيس القطاع بأن يشير للمراقب الى كتاب له صلة بالمئارات بصفة عامة . وعندما نعرف أن بناء المئارات في ذلك العهد كان يتم بواسطة طوب البناء او المعدن يمكن أن نشك في جدوى مثل هذا الكتاب . والخلاصة ، أنه على المراقب أن يتخذ القرار إذا كانت أساسات المئارة من الطوب يمكن أن تخضع لقوانين استتبقت عن تجارب تمت على مئارات مبنية من مواد أخرى . وفي مهمة التفتيش والرقابة على أعمال المقاولات من الباطن لا يمنع المراقب من أخذ المبادرة بتقديم النصائح أو باقتراح بديل للحلول التي أوصى بها المقاولون. و يجمع التقرير المقدم من توزيه (Touzet) إلى رئيسه وصف الأشغال التي قامت بها الشركة المقاولـة وبيان عن المبادرات التي أخذها بنفسه : " يشرفني أن أخبركم بأنه في صباح اليوم في الساعة التاسعة بدأنا بصنع وتنفيذ مونة أساسات المئارة . لقد حضرت عمليات الخلط الأولى لأشرح للعامل الذي عينته في موقع ثابت، التعليمات التي قدمتها له لمسك دفتره . وقرأت بعناية عقد الصناع وتوقفت عند البنود التي بدت لي من وجهة نظر وضع أساسات البناء الوحيدة التي يجب إتباعها باحترام (المادتان ٤ و ٥ من الصفقة) . تقول المادة ٤ أن مونة " الأساسات سوف تنفذ جزء بخلط ٤ أحجام من الرمل وحجم واحد من الجير المائي وجزء من خليط ٥ أحجام من الرمل وحجم جير مائي وربع من الأسمنت " لست أدري ماهي الأجزاء التي يجب عملها بأول خليط وماهي تلك التي يستخدم فيها الخليط الثاني . إلا أنني لاحظت أن المونة الأولى التي نفذت لا تحتوي إلا على أربع أحجام من الرمل أي أربع مائة لترا مقابل سبعة وسبعين لترا من الجير المائي. ينقص إذا ثلاثة وعشرون لتراً من الجير في كل خليط للإلتزام بشروط الصفقة. المكيال المستخدم للرمل سعة مائة لتر. فهو صندوق حجمه $0,50 \times 0,50 \times 0,40 = 0,10$. يخلط أربع مقاييس من الرمل على كيس جير. وقمت بوزن كيس وجدته ٥٠ كيلو جرام بدون الكيس فرغت محتواه في صندوق مثل المستعمل للرمل وكان الفراغ ٠,٠٩ ٪ أي مايساوي ثلاثة وعشرون لترا تقريباً. لم أوجه اية ملاحظة للسيد جيروزيه (G rouzet) [رئيس شركة بناء قوالب خرسانات الطوب المسئول عن الورشة] الذي لم أقابله أثناء جولاتي في الورشة. ولكن أعتقد أن البند الخامس من العقد يخول لنا حق المطالبة بتنفيذ الخليط المشار إليه في البند الرابع [...] سأكون شاكراً لو تكرمت بإفادتي عن إذا ما كان يتوجب علي التدخل لتنفيذ الصفقة " (٦٦)

و يقوم المراقب بدراسة وتفسير العقد بنود الصفقة ويختار البنود التي سوف يأخذها بعين الإعتبار في عملية المراقبة وإذا لم يشترك في كتابة العقد فهو يستطيع كما هو الحال هنا ، أن يبرز نقاط الضعف أو ما قد يتسبب في مشكلة . وبعد الإطلاع على مضمون بنود العقد يحدد ثم ينظم

ويشرع في عمليات تفتيش ومراقبة الأشغال كما وكيفا . وتساعده نتائج ومقاييس جهاز الرقابة القائم معرفة إذا ما كانت الأشغال تجري وفقاً للتوقعات. ويرجع في ذلك بصفة دورية إلى رئيس القطاع . ويقوم إذا ما لزم الأمر بتحديد المشاكل ويقدم له إقتراحات لحلها. وعندئذ يأخذ رئيس القطاع القرارات على أساس المعلومات التي قدمها له المراقب وبناءاً على مقترحاته.

ولا يوجد عقد وقع عليه من مؤسسة لتوريد المواد أو التجهيزات لم يوضح فيه حق وكلاء شركة القناة في مراقبة جودة ماتم إنتاجه في مواقع الصنع والقيام بتحقيقات على حساب الموردين للتأكد من مطابقتها للشروط المقررة أو إذا إقتضى الحال ، رفض بعض المستندات^(٦٧). ويتم انتداب المراقبين عند أكثر الموردين أهمية ليقوموا بمراقبة الجودة ومتابعة المواد والإستلام المؤقت أو النهائي أو كذلك التأكد من طبيعة المواد الواردة. لذلك تم إرسال المراقب إميل جاجيه (Emile Gaget) في عام ١٨٦٢ إلى إنجلترا لمراقبة صنع أنابيب من الزهر خصصت لمواسير لتوصيل المياه العذبة إلى شمال الخليج والتي طلبها شارل لاسيرون (Charles Lasseron) من شركة لوانيسيس إدوارز (Francis Edwards). إذ كان عليه التحقق من أن نوع الزهر المستخدم يتفق تماماً مع المعايير المطلوبة في دفتر الشروط . وفي العام التالي سافر جاجيه إلى تريستا مكلفاً هذه المرة باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان إستمرار توريد الخشب. تساعد المراقبة التي تتم في نفس موقع الإنتاج على تفادي العقاقب التي قد تنجم فيما بعد وخاصة عيوب التصنيع وضياح الوقت الذي يسببه ذهاب وعودة الواردات في حالة المشاكل.

ويحتل المراقب بين رئيسه ، المهندس رئيس القطاع والرجال الذي يديرهم في الورشة ، مكاناً وسطاً بين عالمين ، لكل منهما مناهجه ومصالحه المتميزة بل و المتعارضة. وتعطي المراسلات المتبادلة والتي سنقوم بعرضها تالية صورة عن سلسلة العمليات المتتالية التي تقع بمجرد حدوث أقل مشكلة فنية على أرض الواقع . ففي هذه المراسلات تثار مسألة اتخاذ نماذج جديدة لرسم الأراضي. فقد كتب فوازان في ٢١ يونيو ١٨٦٥ الرسالة التالية إلى مديري شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما :

سادي

رداً على رسائلكم A ٢٩ و C ٦ بتاريخ ١٣ مايو الماضي و ٦ يونيو الجاري ، أتشرف بأن أرسل لكم طيه ، ربما لنموذج منظور هندسي لإعتماده لعبور بحيرة المولة وبحيرات البلاح. سوف تلاحظون أن هذه المقاطع تشبه المقاطع التي أرفقت مع رسالتكم بتاريخ ١٣ مايو وكنتم قد صممتوها وفقاً لتعاليمي السابقة. وسوف تطبق هذه الرسومات في كل مكان لا ترتفع الأرض فيه أكثر من مترين فوق متوسط مستوي البحر المتوسط أي حتى الشاطئ ٢٠,٢٠. بخصوص الأراضي فوق هذا المرتفع سأقوم بدراسة المقطع النهائي وسوف أرسله لكم في أقرب وقت ممكن."

وفي نفس اليوم كتب فوازان إلى جيويا (Gioia) رئيس القطاع المعنى هذه المسألة :

عزيزي المهندس

" أتشرف بأن أرسل لكم طيه للعلم نسخة من الخطاب الذي كتبته إلى السادة بوريل ولافالي وشركائهما بشأن إقرار نماذج المقاطع الجديدة والتي أرفق رسمها مع هذه الرسالة [...] أرجو أن تقدم لي مقترحاتك المسببة فيما يخص المقطع المراد تطبيقه في النقاط التي تحفر فيها القناة عبر أراضي يزيد إرتفاعها عن مترين فوق متوسط مستوى البحر المتوسط ^(٦٩) .

بعدها بيومين ، في ٢٣ يونيو، أرسل جيويا إلى فليكس بابونو (Félix Paponot) رئيس قسم القنطرة الرسالة التالية:

سيدي

" أتشرف بأن أرسل لكم طيه للعلم نسخة من الخطاب الذي كتبته السيد المدير العام إلى السادة بوريل ولافالي وشركائهما بشأن إقرار نماذج المقاطع الجديدة والتي أرفق رسمها مع هذه الرسالة [...] أرجو أن تقدم لي مقترحاتك المبررة فيما يخص المقطع المراد تطبيقه في النقاط التي تشق فيها القناة عبر أراضي يزيد إرتفاعه عن مترين فوق متوسط مستوى البحر المتوسط " ^(٦٩) .

وفي ٢٨ يونيو رد بابونو على جيويا بأنه بدأ الدراسات الضرورية ويقترح عناصر الإجابة الأولى على السؤال الذي وجه له . و في ٢٩ يونيو وقع جيويا رسالة جديدة تخبر بابونو أنه ينتظر منه إقتراحات كاملة . وأرسل في نفس اليوم المقترحات الجزئية التي إقترحها بابونو إلى فوازان . وفي ٨ يوليو بلغ فوازان جيويا أنه ينتظر دراسة جديدة أكثر تعمقا...

ولنتوقف هنا قليلا إذ يوحي هذا المثل مثل العديد من الأمثلة التي يمكن الإطلاع عليها في سجلات المراسلات الضخمة ، بضياغ الوقت في المكاتب في مهام مملّة نوعا ما مثل المراسلة والكتابة و ايضا مجرد نسخ الخطابات أو الرسومات. وتوضع الديباجة المستعملة في هذه المراسلات الصلات القرية أو البعيدة بين مختلف العاملين، وترجم إنتماءهم إلى طبقات وشبكات علاقات (تكتلات) معينة . إلا أن هذه المراسلات تساعد بصفة خاصة على فهم تشغيل نظام تراتبي الفقي وفي نهاية الأمر الدور الذي يقوم به فيه المراقب. ونلاحظ بوضوح على وجه الخصوص عبر هذه الرسائل المتبادلة مسئوليات كل من الوحدات الإقليمية. فيشكل القسم الخلية التي يستند إليها صرح تنظيم الأعمال. أما القطاع الذي يحوى على عدة أقسام فيظهر حينئذ وكأنه إقليم وسيط أو مُرحّل. فالعمل الذي يتم على مستوى القطاع من حيث الجوهر ذو طبيعة إدارية بحتة : فمن

جهة يقوم بإنجاز ملخص للأعمال التي إنجازت في الأقسام التابعة له ، ومن جهة أخرى يعكس أوامر المدير العام على كل الأقسام . وبشكل عام يُنتظر من المراقب أن يجد الحلول المناسبة التي سوف تثير التحليل وتوجه الخيارات أمام المستوى الأعلى . وفي النهاية يعتبر المراقب الذي يستند عليه النظام التراتبي محور التنظيم والجهاز العصبي للورشة.

ولعل أكثر ما يدهش هو تعدد المهام التي تقع على عاتق المراقب وتكمن الصفة الرئيسية لدور المراقب في إختلاف المواقف التي يجب عليه مواجهتها . ويمكن التعرف على العبارات المستخدمة كثيراً من الكشوف السنوية لوصف الخدمات التي يقدمها مختلف المراقبين العاملين بالشركة . وهي الأفعال الآتية: التنسيق ، التنظيم ، كتابة المحاضر ، التقييم ، التوفير ، سرعة الإنجاز ، الإرشاد ، الملاحظة ، التحليل ، الإقتراح ، الحساب ، الإدارة وإطاعة الأوامر . وتوضح الأعمال المقابلة في نفس الوقت مختلف أوجه واتساع مهام المراقب. ويكشف وصف نشاط المراقب أميل هنري (Emile Henry) مدي تنوع المهام الملقة على عاتق المراقب : " لقد تولى مهمة تصفية الحسابات الخاصة بالوحدات ومنطقة مخيم الشالوفة وقام بعمل الخرائط والمقاطع والقياس بالترخ فيما يتعلق بتسليم الورش إلى السادة بوريل ولافالي وشركائهما وكذلك رفع أنقاض الصخور من عبور مدخل الشالوف. ونفذ الرسم العام للمعسكر ورسم إعادة أملاك شركة القناة . وقدم معلومات مختلفة عن الحفر [...] وأشرف على وضع حدود المعالم لمعاينة التخطيط العام. وكُلف بعض الوقت بمصلحة البريد ولا يزال منذ شهر يوليو يشغل بصورة ثانوية مهام رئيس المعسكر " (٧٠)

على هامش المهام المعتادة يقوم بعض المراقبين باختصاصات فريدة من نوعها. هكذا فالبعض في ورش الخليج اضطروا للقيام بدور المصور لحساب الشركة (مثل حالة كوفيه Cuvier) أو رسام المناظر الطبيعية.

تتطلب وظيفة المراقب تكويناً جسمانياً متيناً إذ يتعرض لظروف قاسية بل أنه لا بد أن يتحلى أيضاً بالشجاعة ، فقد يضطر المراقب إلى العمل في ظروف مناخية صعبة أحيانا (فقد عرف البعض تباعاً برودة روسيا (٧١) الشديدة وشمس صحراء مصر الحارة) التي بالإضافة إلى مشقة الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحته (٧٢) . و تعتبر ظروف الحياة في الصحراء مرهقة للغاية لاسيما بالنسبة للذين يضطرون للإقامة في المخيمات (٧٣) وحتى في غياب الظروف الطارئة تظل مهنة المراقب مع ذلك مهنة شاقة جسمانياً ويشهد بذلك المراقب الأعلى ؛ هنري ريشار (Henry Richard) : " لا بد أن تكون قوي البنية حتى تنزل وتصعد عشرين مرة في اليوم منحدر إرتفاعه بين ١٥ و ٢٠ متراً وذلك في حرارة غالباً ماتكون خانقة في الحفائر " (٧٤).

وتقع على بعض المراقبين التزامات ثقيلة تضطرهم إلى البقاء باستمرار رهن الإشارة ليلاً ونهاراً وفي أيام الراحة تماماً كما في أيام العمل. فمثلاً عندما انفارت سدود القناة أثناء البناء وهذا ما تكرر حدوثه مرات عديدة كان لابد من التدخل على الفور .^(٧٥)

ولم ترحم الأمراض المراقبين . ولا يمكن بسبب غياب الإحصائيات تحديد إن كانوا أكثر إلى حد ما تعرضاً للأمراض من غيرهم . وتعتبر الدوزنغاريَا والرمد الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر كاملاً . هما المرضان الأكثر شيوعاً والذين عانى منهما رجال الورشة . ويجد الذين لم يحالفهم الحظ بالشفاء أنفسهم مضطرين للإستقالة أو الطرد . وكان المراقب لكونت (Lecomte) الذي أصيب بالإسهال المزمن من هؤلاء . لقد كان بيتس (Bettès) في الورشة يراقب في ساعات شديدة الحرارة رفع سد واق مؤقتاً عندما أصيب بضربة شمس خطيرة قضت على حياته بعد أربعة أيام^(٧٦) . وعرف مواطنه و صديقه لاصال (Lassale) نفس المصير المشؤوم^(٧٧) . و لشدة إخلاصهما وإهتمامهما بعملهما ، يقع بعضهم فريسة للمرض من كثرة العمل والإرهاق . ويلاحظ أيضاً حالات إرهاق شديدة لرجال لا يدخرون جهداً في العمل بمكائهم^(٧٨) . في السنة الأخيرة للورشة تمت تعبئة كل الطاقات وتوجيهها نحو هدف واحد هو افتتاح قناة السويس في التاريخ المعلن . و في ذلك الوقت تم تعليق طلبات الأجازة المخصصة لدى البعض للسفر بغرض إسترداد صحتهم . وتعرض أيضاً المراقبون لعدوى الكوليرا^(٧٩) التي اجتاحت الورشة في عام ١٨٦٥ . فقد شاهد جان ريهير (Jean Riehr) ، بمجرد وصوله ، الكوليرا^(٨٠) تقضي على زوجته وإبنه الصغير فلم يتحمل الصدمة . أما نيقولا لامبار (Nicolas Lambert) فقد جمع بين الكبر في السن (بلغ من العمر تسعة وأربعين عاماً في سنة ١٨٦٦ وكان أكبر المراقبين سناً في الورشة) وبين تدني روحه المعنوية بسبب مرض أقاربه : "كان ملحفاً ألحق في آخر الأمر بمقاطعة الإسماعيلية حيث شغل فيها مهام رئيس القسم المكلف ببناء وصيانة المباني . كان السيد لامبار عاملاً شريفاً وحي الضمير ومخلصاً ولكن لا يمتلك سهولة العمل ولا النشاط البدني بما يناسب أشغال القناة البحرية . [...] وأسباب مؤلمة كثيرة (المرض ثم وفاة إبنته ، أحزان زوجته على أثر هذا البلاء) تضافرت هذه الأحزان وشملت طاقته"^(٨١) . وقد اتخذت الشركة من ضربة الشمس التي تعرض لها أثناء عمله في الورش ذريعة لفصله وأعطته مكافأة تعادل ستة شهور من مرتبه . طبعاً من الأسهل الإحتفاظ للعمل بمن كان شاباً ، عازباً وفي صحة طيبة !

تعادل رُتب رئيس القسم ورئيس مكتب القطاع أعلى مرتبة لمراقب سواء في الورشة أو في المكاتب . ويخضع لأوامر رئيس القسم ، مختلف المراقبين المعينين في الورش الخاصة التي تقع في نطاق القسم وهي المساحة الجغرافية المخصصة التي يرأسها . ويقوم بتنسيق الأعمال التي تجري فيه سواء كانت أعمال حقيقية أو إصدار مستندات قانونية أو إدارية: "فهم يحرسون على مسك دفاتر حسابات أقسامهم بدقة ، وخاصة على التسجيل اليومي في دفاتر اليومية وجدول المنجزات

اليومية ويوميات الورش والمخازن وتسليم نسخة يومياً من هذه التقارير مدعومة بالمستندات".^(٨١) ويقدم رئيس القسم تقريراً عن نشاطه إلى المهندس رئيس القطاع . ويُترك لرئيس القسم المبادرة في تنظيم العمل لدرجة أنه في إمكانه تحديد مواعيد العمل بالمكاتب والورش حسب فصول السنة وكما يراه مناسباً له ^(٨٢) ويتوقف طبعاً تنوع المهام التي يقوم بها وأعباء وظيفته على الأعمال الجارية في قسمه. وكان عام ١٨٦٤ خصوصاً بالنسبة لجوجيه (Gouget) رئيس القسم عاماً مثقلاً : " كان جوجيه مشغولاً أساساً بأعمال المباني والطرق وسير المياه والترع وأهوسة الإسماعيلية وأضيف إليه علاوة على ذلك منذ شهر مايو ، إدارة المشاغل وأيضاً إدارة قسم طوسوم حتى شهر أكتوبر، وأخيراً في اثناء شهور الأجازة الثلاثة التي منحت للموقع أدناه [ويقصد المهندس فيلار [Viller] وأضيف إليه أيضاً وكالة القطاع . ^(٨٣)

ويعتبر رئيس مكتب القطاع مراقباً يقع على عاتقه مسئولية مكاتب رئيس القطاع . إذ يطلع يومياً على الرسائل التي تصل إليه ويحرص على الرد عليها ، كما أنه يدير أعمال الحسابات ويحرر الطلبات ويقوم بالدراسات ويوزع العمل على العاملين تحت إمرته في المكتب من مراقبين أو مصدري البضائع. وقد قام جورج لأكروا (Georges Lacroix) بهذه الوظيفة على أحسن وجه وقد أشاد رئيسه بأعماله : " إنه رسام ممتاز وفي منتهى النشاط ومثالي في المواظبة ، وسهل القيادة ينصاع لكل الأعمال ويجمع كل الشروط المرضية لإدارة مثل المكتب الفني حيث العمل متنوع للغاية ويغلب عليه طابع العجلة " ^(٨٤).

وفي أغلب الأحيان يعرف رئيس مكتب القطاع أعمال الورشة جيداً لأنه سبق أن مارسها ، وقد يحدث له أحيانا أن يعود إلى الموقع : " أتيت للسيد لأكروا (Lacroix) علاوة على ذلك الفرصة ليظهر على أرض الواقع كفاءة تامة في رسم الخطط ومسك الدفاتر. عندما إنتدب على التوالي في قطاعي الإسماعيلية والجسر ليساهم في عمل يتعلق بتسليم المباني إلى أملاك شركة القناة وقد قام لأكروا بماتين المهمتين بطريقة جلبت له شهادات تقدير عظيمة. ^(٨٥)

ويتطلب الانتقال من وظيفة مراقب إلى وظيفة رئيس مكتب صفات ليست متوافرة في الجميع . " لذلك لم يستطع هيديجير (Heidegger) مثلاً التقدم لهذا النوع من العمل بالرغم من أن رئيسه اعترف بأنه " أكثر العاملين ثقافة وله أيضاً وفي نفس الوقت خبرة في ممارسة العمل " إلا أن طلب ترقينه إلى درجة رئيس مكتب قد رُفض للسبب التالي : " لو كان هيديجير يتقن الكتابة وله معرفة أفضل للغة الفرنسية وأكثر خبرة في الممارسات الإدارية ، لكان قد حصل وبدون جدال على وظيفة رئيس مكتب في إدارتنا " ^(٨٦).

كما كان لدى مدير عام الأشغال أيضاً دراية دقيقة للغاية عن الصفات المطلوبة ليصبح أحدهم رئيس مكتب جيد : " أود أيضاً أن أنجح في العثور على رئيس مكتب ماهر لفيلير ليشغل محل

السيد لامبار (Lambert) الذي يعتبر بطبعه الخامل ويطنه في العمل غير كفء تماماً لأداء وظيفته وكان لابد من وجود رجل قوي جداً يبعث النشاط في كل مكان ويوقظ العمال المتأخرين ولا يترك الأعمال تتبطلأ البتة : إذاً يجب عليه معرفة الأعمال والإدارة ويجيد الكتابة ^(٨٧).

ويتمتع المراقب باستقلالية كبيرة . إذ يرجع له اتخاذ القرار في حالة الطوارئ أو في مشكلة في الورشة تحتاج إلى حل سريع . وفي حالات كثيرة يتقن رئيس القطاع في مهارة وخبرة المراقب معترفاً ضمناً بتفضيل الممارسة الطويلة على النظرية أو الحسابات العلمية . وقد اعتمد سياما في لهاية دراسته المعقدة لأجور عمال السخرة على قدرة تقدير أحد مراقبيه : " طبعاً ، ليس من الضروري ، يا سيدي ، عند كل تقييم مهمة القيام بالحسابات الدقيقة التي أشرت إليها للتو . فسوف يكتسب عمالك بسهولة التعود على هذه التقديرات وسوف يقدرون تقريباً بصورة أكيدة إلى حد بعيد بالنظر إلى الصعوبات قدر ما يمكنهم عمله بالكتابة [وفي يدهم القلم] ^(٨٨) .

والسؤال : ماذا ينتظر رئيس القطاع من المراقبين العاملين تحت أوامره ؟ تعتبر الطاعة دون شك الصفة الرئيسية الثمينة . ويقدر أيضاً رئيس القطاع عند مؤسسه الاعتدال و المرونة واعتدال المزاج وهي كلها صفات تتمشى غالباً مع الطاعة . فيما يخص جوجيه (Gouget) فقد لاحظ رئيسه أنه : " أقدم وأعظم رئيس قسم في الشركة ولكن من المؤسف أن حدة طباعه جرت به إلى تطرف لفظي غير مقبول ضد رئيسه السابق . لو استطاع جوجيه أن يتحكم في أعصابه ويستجيب لمطالبات الرؤساء لكان عاملاً من الدرجة الأولى " ^(٨٩) .

يجب على المراقب أن يحسن التقدير ويأخذ المبادرة ، صفتان إفتقدهما ليونس لوسقي دي كرهور (Léonce Lostic de Kerhor) ونسباً في فصلة ^(٩٠) . لو افترضنا رسم صورة افتراضية "لربوت" ليمثل المراقب النموذجي في نظر رؤساء القاطعات فلن يكون بعيد الشبه عن المراقبين : بالاه (Palaa) و إرنست كومبول (Ernest Comboul) . ولم يكف رئيس القطاع عن مديح الأول : " تفان تام . لا يدخر أبداً وقته ولاصحته . فهو من أفضل العاملين لدينا يكسبه إنظامه وإخلاصه التام وفهمه الجيد للواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقه في كل القطاع سواء نحو الموظفين الآخرين أو عمال المقاولين والتي تعطيه قوة معنوية تركي قدراته " ^(٩١) . اما بالنسبة للثاني فهو : " يحرّر و يرسم ويكتب جيداً ويمسك دفاتره بإتقان . وهو حسن المظهر وفي صحة جيدة وحسن السلوك ، كما أنه لطيف يتمتع بحسن التنظيم . كما انه نشيط ومخلص ويحسن قيادة العاملين معه ، فهو عامل ممتاز " ^(٩٢) .

الحماس والإخلاص لفظان يستعملان بكثرة سواء بمدح وجودهما أو بذم عدم توافرها للتعبير عن رأي رئيس القطاع في مرسومه المراقب. ويحكم على المراقب بمذنبين المعيارين رغم أن هناك أيضاً ميزات أخرى ولا سيما الإهتمام بالإقتصاد في النفقات^(٩٣)

بما أننا نتم بالورشة والموقع والممارسة ، يظهر المراقب وكأنه عنصر فاعل أساسي . رغم أنه رجل ورشة مثالي إلا أنه من الصعب أحياناً إبراز نشاطه . ويرجع ذلك فعلاً إلى أنه قليلاً مايكتب وأن مايكتبه من تقارير يتم اتلافه في أغلب الأحيان خاصة عند القيام بفرز الوثائق ويفضل عليها الاحتفاظ بتقارير رؤسائه التي تلخص مضمون التقارير العديدة الصادرة عن مراقبين . وبالإضافة إلى أن هذا التلخيص يخفي عمل المراقبين ، فهو يمثل عقبة بالنسبة للمؤرخ لأنه يضيع بعض التفاصيل المتعلقة بالأساليب المستخدمة وهي ذاتها التي قم مؤرخ التقنيات . مع ذلك فإن بعض التقارير التي كتبها المراقبون حفظت في وثائق شركة القناة . وتوضح المقارنة بين هذه التقارير وتلك التي كتبها رؤساء القطاع أو الإدارة بجلاء مدى الاختلافات في مضمون الإهتمامات الفنية المتطورة ، ليس ذلك فحسب كما كان متوقعاً ، ولكن أكثر من ذلك ، فهي توضح الاختلاف الشديد في شكل ومضمون الصياغة. فلو كانت الآراء الفنية التي عبر عنها رؤساء القطاعات تأخذ كما شاهدنا في أغلب الأحيان هي نفسها الأفكار التي بلورها المراقبون ، فإن أساليب الكتابة على العكس تختلف اختلافاً جوهرياً. وتفيض التقارير الذي كتبها المراقبون ، باستثناء القليل منها ، بكثير من الأخطاء و ينقصها الوضوح بصفة خاصة . ولا نجد ذلك عند المهندسين من خريجي المدرسة متعددة التقنيات الذين أثبتوا من جانبهم كفاءة لا تقبل المناقشة في هذا النوع من الأداء. بالإضافة إلى أنهم لا ينتمون إلى نفس الوسط الاجتماعي فإن الدراسة التي حصلوا عليها في مدرسة الهندسة متعددة التقنيات تساهم في منحهم بكل تأكيد نوعاً من التحكم في كتابة التقارير الإدارية أو أيضاً في كتابة الرسائل. وتحتل هاتان المهمتان مكاناً لا يمكن تجاهله في مشاغلهم اليومية. ففي الواقع ، يتابع خريجو المدرسة متعددة التقنيات تعليماً أدبياً موجه صراحة لتأهيل ضابط المستقبل أو المهندس بالقدره على " حسن التعبير عن افكاره بوضوح وكتابة المذكرة والدفاع عن رأيه والقيام بذلك بقدر ما من سلاسة الأسلوب و الأناقة أيضاً " ^(٩٤) ومن الممكن أيضاً أن تصاحب هذه الكفاءة العظيمة ثقة أكبر في الخطابة. وهنا يجب أن نبقى عند مستوى الافتراضات لأن المؤرخ يجد صعوبة كبيرة عند طرق مجال الكلام والأسلوب .

المراقب المساعد / مساعد رئيس الأشغال

و تعد دراسة الرتب الأدنى أكثر صعوبة من دراسة المراقبين وذلك بسبب ندرة المصادر. فلم تترك فعلاً هذه الفئة إلا قليلاً من الآثار المكتوبة عن نشاطها. ويظهر لنا بوضوح عالمان متباينان ، من جهة، عالم المكاتب حيث نجد الرسامين والموظفين و من جهة أخرى، عالم المشاغل والورش ويجمع بين رؤساء الورشة ورؤساء العمال والمشرفين.

ويشارك في عمل المكتب نماذج كثيرة من الكفاءات . يرأس المهندس رئيس القطاع المراقب الذي يقوم بوظيفة رئيس المكتب والمستول عن كافة المهام الإدارية في المقاطعة. ويضم المكتب أيضاً محاسبين ورسميين وكذلك وكلاء إستلام البضائع . وتتخيل بسهولة مهمة المحاسب وتشمل الجمع والتسجيل والإضافة ، ويستعمل الرسام المسطرة والزوايا أما مأمور الإستلام أو ساعي المكتب فهو يعيد ، دون ملل ، كتابة عدة نسخ من المذكرات والرسائل والمستندات وذلك في الوقت الذي لا يسمى فيه بالبحث عن شخص أو شيء ما أو قضاء أية مصلحة بسيطة أخرى. و لقد أصبحت مهمة النسخ وتكرار نقل المستندات ، في وقت ما ، عبئاً لدرجة أنه تم تزويد إدارة باريس بطابعة نسخ من نمط راجينو (Ragueneau)^(٩٥).

وتقوم المكاتب بعمل الخطط والتقارير أو مذكرات الدراسات والمراسلات ومستندات المحاسبة . ويتم ملء كيلومترات مربعة من الورق بماتم قياسه بالتر من حفر لتستعمل فيما بعد لتقدير حجم الرديم المطابق لإفتراضات رسم القناة المختلفة . وأمام هذه الحسابات التي لا تحصى والتي كدست حاصلاتها اليوم في عدد كبير من صناديق المحفوظات ، نتخيل حتما مدى ما كان يمكن أن توفره الآلة الحاسبة من كسب للوقت في مثل هذه الظروف. وعلاوة على أن الفكرة كانت خيالا إلا أنها طرأت وعبر عنها في ذلك الوقت أوبرمان (Oppermann) .^(٩٦)

ويحتل المحاسبون ، من جهة، والرسامون من جهة أخرى، مكانة مرموقة لدى رئيس القطاع . وتعتبر الرسومات المنفذة على ورق شفاف بالخبر الأسود والتي تركها لنا الرسامون ، آثاراً لأعمالهم في ورشة قناة السويس. وتشمل ألوانا قليلة بخلاف اللون الأزرق الذي يمثل الماء. فلا تتناسب متطلبات الورشة مع تنفيذ الرسومات الفنية . فضلاً عن ذلك، في عصر الإمبراطورية الثانية ، وبالرغم من استمرار تعليم تقنية الرسم المائي إلا أنه لم يعد يستعمل إلا نادراً. ومع غياب لقب رسام في إدارة الطرق والكباري حيث أن الوظيفة يقوم بها المهندسون بل أيضاً المراقبون وأحيانا مراقب العمال إلا أن الشركة أنشأت رتبة خاصة لهذا النشاط المتميز. ويمكن وضع هذه الدرجة ، إذا ما رجعنا إلى جدول المرتبات ، في نفس مستوى درجة ناظر العمال.

ونتساءل : من الذي يرسم ؟ تحمل الرسومات بصفة منتظمة توقيع الرسام ورئيس القطاع ومدير عام الأشغال . وفي كل الأحوال من الصعب تحديد نصيب عمل كل منهم. ولا يقوم رؤساء القطاعات أو الإدارات بعمل الرسومات بأنفسهم إلا فيما ندر ، فالرسام ينفذ الرسم ولكن ما هو نصيبه من المبادرة العملية ؟ هل يكفي، وفقاً للقواعد الساري العمل بها ، بتصميم الرسم الذي حدده له رئيسه وطلب منه تنفيذه ؟ قد تختلف الإجابة على هذا السؤال تبعاً لطبيعة الرسم

والمواقف . فقد تخصص رسم الآلات (منظر عام أو رسم قطع أو جزء منها) ، أو المباني (مخطط واجهة ، إسقاط) ، أو القنوات (مقطع طولي ومقطع عرضي) أو منشآت أو خلافه . وتوجد رسومات تسمى برسومات مواقف ، ولكن هناك أيضاً رسومات لها صلة بمشاريع أو دراسات . وفي الحالة الأولى ، يهدف الرسم لإظهار وضع قائم في لحظة ما . ويدخل في هذا النوع مثلاً رسم حدود آلات الحفر في الورش أو مقاطع عرضية للقناة البحرية كما تم حفرها في وقت ما . وفي الحالة الثانية ، يقصد بالرسم تجسيد الأفكار . وهامش المبادرة هنا أكبر .

ولابد أيضاً وبشكل روتيني من إعادة نسخ الرسومات من جديد إلى عدة نسخ لتكون مطابقة قدر الإمكان للأصول . وعلى العكس في حالة نقل النصوص التقنية يحتاج استنساخ الرسومات إلى تأهيل معين . لذلك فإن القدرة على تحقيق أو قراءة الرسم في الورشة ذاتها وكذلك في المكتب هي تحديداً ما يميز بين العاملين المرؤوسين والموظفين الآخرين . ويعتبر الرسم جزءاً ضرورياً من المعارف الضرورية والتي يجب أن يتحكم فيها الفنيون فهو أداة مشتركة تحت تصرفهم . فبمجرد خروجها من خيال رئيس القطاع أو المراقب أو الرسام ، تُشكل الأفكار على الورق بالرسم . ومن الفكرة نصل إلى أول رسم يُناقش بعد ذلك ويتم تعديله قبل أن يصبح نقطة إنطلاق لتحقيق الموضوع .

وقد تم استخدام رسامين للعمل في إدارة المشاغل والمعدات كما هو الحال في أقسام الأشغال إلا أن مهنة الرسام ليست تخصصاً ولا وظيفة نهائية بالضرورة . إذ تبين تطورات المهنة أن بعض الرسامين تم ترقيتهم إلى مراقبين وأحياناً إلى رؤساء أقسام . أما موريس ليهمان (Maurice Lehmann) فبعد أن كان رساماً ، في عام ١٨٦٣ ، أصبح رئيساً للحسابات في قطاع المعدات ومشغل بور سعيد .^(٩٧)

تشابه مهام رؤساء الورش ومراقبي العمال والمشرفين لدرجة إنه من الصعب التمييز بينها ، إلا أن المسؤولية التي تقع على عاتق رئيس الورشة أكثر قليلاً . علاوة على ذلك ، أن المصطلحات تطورت مع الزمن في داخل الشركة نفسها . لذا في ١٨٦٥ عندما أصبح تنفيذ كل الأشغال تقريباً موكلاً إلى شركات المقاولات اختفى لقب رئيس الورشة . أما لقب مراقب العمال فهو يحيل بدوره إلى رتبة موجودة في إدارة الطرق والكباري . فعلى المراقبين الإشراف على الورش ويتولون تقييد استهلاك المواد وحساب يوميات العمال (ومن هنا جاءت تسمية المراقب) أو الثقيب (التخريم) على ورقة دفتر أمام أسماء العمال الغائبين الذين يتخلفون أثناء ساعات العمل .^(٩٨) وكان دورهم في ورشة قناة السويس مشابه لهذا نفسه .

ويقضي رئيس الورشة معظم وقته في الورشة يدبر ويشرف على الأعمال التي تجري فيها ويضع الزيت في التروس لإحتواء أقل المصاعب . ولتأخذ فكرة عن ذلك ونترك للمراقب فيلتر

(Fulter) العناية ليصف لنا النشاط ويعطينا صورة عن تينتي (Tinti) رئيس الورشة " هو عامل له إرادة قوية في مواجهة الخن . ليس لديه ثقافة خاصة تمكنه من أداء مصلحة ما خارجة عن إطار اختصاص ، ولكن في ورشة الفردان حيث كان عليه القيام بأعمال داخل المخزن وكتابة السوارد والصادر وإمسك بطاقات حضور العمال [...] كان مفيدا للغاية وقام بمهمة شاقة . وبفضل معرفته عدة لغات استخدم غالباً كمتوكل للعمال وكان يستطيع أن يطلب منهم إنجاز عمليات معقدة في أقل وقت ممكن ^(٩٩) ."

يقوم رؤساء القطاع الإداريون الخاضعون لسلطة المدير العام ورب العمل إذاً الحقيقي بإدارة شئون مقاطعاتهم وتلخيص التقارير التي تصلهم من مختلف أقسام العمل وتنفيذ أوامر المدير . وهم أيضاً السلطة على رؤساء الأقسام ورؤساء المكاتب والمراقبين الذين هم صلة بالأشغال . ويقع المراقبون في مواجهة مناهج أحيانا متناقضة . ففي المكتب أولي الورشة هم وسطاء بين رئيس القطاع والعمال يضطرون للتوفيق بين النظرية والتطبيق وبين أوامر الإدارة والمواقف العملية ، كما يعتبر المراقبون محور النظام التراتبي والتنظيم . ويشكلون في النهاية المحرك الرئيسي للورشة . وقد ساعدت دراسة الممارسات على توضيح دور هذه المجموعة التي تشبه مجموعات أخرى وسيطة غير معروفة ^(١٠٠) . وهذا الجهل يرجع أساسا إلى أن خبرات المراقبين تكون أصلاً على أرض الواقع وليس في منشآت تعليمية فلا تشكل الدراسة حتى الآن المبع الرئيسي لدراسات تاريخ هذه الحرف والمهن الفنية بل هي أيضاً نتيجة لوضعهم المهني . ففي الواقع غالبا " ما تحتوي شخصية المهندس المراقبين الذين يقومون بخدمته " بل قد ذهب البعض إلى أنه " يسلبهم ملكية أفكارهم " ^(١٠١) . ومن خلال الإجراءات المطبقة لحسم تنظيم هذه الورشة ومناهج تفعيل البنى التي تمت إقامتها ، نستطيع الوصول إلى بعض العناصر التي تشكل الثقافة الإدارية التي تخص الناحية الفكرية لمهندسي الطرق والكباري . وبالإضافة إلى ذلك ، وبحكم مميزاتها فإن التطبيقات التي ظهرت هناك توحى بصورة الشركة الحديثة .

هوامش الفصل الثاني

وضع تنظيم حديث

1) Alfred D. Chandler, La main visible des managers. Une analyse historique, trad. française de l'ouvrage publié à Londres en 1977, P., Economica, 1988, p. 3.

٢) نشر حفيد أتين ميكار مقتطفات من رسائل جده في كتاب حاول أن يذكر فيه الدور الذي قام به جده في عملية حفر قناة السويس

. Le canal de Suez et le génie français, P., Société mutuelle d'édition, 1922.

3) Ibid , p. 124.

4) Ibid., p. 141.

5) Ferdinand de Lesseps. « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 19 juin 1861.

6) Ferdinand de Lesseps, « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 26 décembre 1861.

7) Ibid. Lettre du 18 juin 1863.

8) F. de Lesseps, Souvenirs de quarante ans dédiés à mes enfants, P., Nouvelle Revue, 1887, tome 1, p. 129-130.

. رسالة إلي حماته Madame Delamalle ، من القاهرة في ٢٢ يناير ١٨٥٥

9) AN 153AQ/INJ296. . رسالة من المهندس المستشار هانيت-كلاري إلى فوازان ، فبراير ١٨٦٣ .

١٠) المقصود هم شانصل وهانت-كلاري ولم تنقل كتابة دي ليسبس حديثاً.

11) F.de Lesseps. « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 26 décembre 1861, p. 203.

أبرز الكاتب التعبيرات بوضع خط

12) F. de Lesseps, « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 26 décembre 1861, p. 205 .

بقرار مجلس الإدارة في ٢٦ يونيو ١٨٦٣ تم حرمون هانيت-كلاري من مهمته ماعدا وظيفة السكرتير المساعد باللجنة الاستشارية للأشغال

١٣) حديث لصحفي بجريدة الفيجارو نقله

Georges R.beill dans La révolution ferroviaire, , La formation des compagnies de chemin de fer en France (révolution 1823-1870), P., Behn, 1993, p.209.

14) AN 153Q.1610B- تقرير مدير عام الأشغال أول فبراير ١٨٦٤

15) N 153AQ/TE1.

16) L'isthme de Suez , n° 222, p. 327.

١٧) AN 153AQ/TE139. اتين موبار وميشل مارول

(Etienne Maubert et Michel Marolles)

مقاولان للأشغال العامة بمرسيليا فقد حقق الأول أشغالاً في مرسيليا بناء على طلب هاردون وربما نفذ الثاني أعمال جرف هامة في لاسبيزيا.

18) AN 153AQ/TE144.

19) AN 153AQ/1618B .

20) AN 153AQ/TE144 رسالة من فوازان ، مارس ١٨٦٥

21) L'isthme de Suez..., n° 222, p. 327

22) AN 153AQ/1610A.

23) AN 153AQ/INJ118/C.

قرار مجلس الإدارة في سبتمبر ١٨٦٤.

24) AN 153AQ/TE134

رسالة من فوازان إلى روش ، أكتوبر ١٨٦٥.

- 25) AN 153AQ/TE134.. رسالة من جيوييا إلى فوازان في مايو ١٨٦٩.
- 26) AN 153AQ/TE134. رسالة من فوازان إلى جيوييا في مايو ١٨٦٩.
- 27) AN 153AQ/TE13.
- 28) AN 153AQ/TE137.. مذكرة من فوازان موجهة إلى رؤساء القطاعات ديسمبر ١٨٦٨
- 29) AN 153AQ/1610A.. تقرير من مانتر في يناير ١٨٦١
- 30) AN 153AQ/TE409. رسالة من لاروش في مارس ١٨٦٢.
- 31) AN F¹⁴ 2285/2. ملف مانتر... تقرير
- 32) AN 153AQ/1610A. رسالة من فوازان ، مارس ١٨٦١.
- (٣٣) اشترت الشركة من أحد أفراد عائلة الخديوي هذه الضيعة التي تشمل مساحتها حوالي عشرة آلاف هكتار وأنشأت عليها ملكية زراعية تزرع الأراضي للفلاحين والبدو
Jules Guichard, « Colonisation de l'isthme de Suez, 1861-1866 », Nouvelle Revue, 1882, 16 p.
- (٣٤) عبرت أول سفينة تجارية قناة السويس في شهر مارس ١٨٦٧ في خمسة أيام وقد اضطرت للتوقف يوماً في الإسماعيلية بسبب أشغال الجرف
L'isthme de Suez, journal de l'union des deux mers, n° 259, 1^{er} mars 1867, p. 134.
- 35) AN 153AQ/TE142.. أمر إداري رقم ٦ في فبراير ١٨٦٣.
- (٣٦) استعمل أسم الموظف الفني أو الفنيين لتحديد مجموعة الأفراد العاملين في مهام ذات طابع تقني ها صلة بالأشغال باستثناء العمال
- (٣٧) اعد موجز للمسيرات الشخصية وكان من الضروري جمع وتطابق المعلومات المتناثرة وشتات مسيرة مهنية أو مقتطفات من مسارات مهنية نلب عنها في عدة مصادر: أولاً محفوظات الشركة (AN153AQ/ RU2 , 1678A et G1 à G7) ولكن أيضاً في ملفات إدارية شخصية (العاملون بشركة السويس المالية ، المهندسون والمراقبون بالطرق والكباري ومهندسو البحرية وطلاب المدرسة المركزية للفنون والصناعات وطلاب المدرسة متعددة التقنيات و جوقة الشرف) والتنقيب في دلائل (وزارة الأشغال العمومية ووزارة البحرية والمستعمرات وقدايمى مدارس الفنون والحرف وأعضاء جمعية المهندسين المدنيين) ، والمجلات الدورية (حوليات مراقبي الطرق والكباري APC, MCSIC, Annales des mines) والمطبوعات (خاصة للبوليتكنيكين : مدرسة البوليتكنيك، كتاب الذكرى المتوية ١٧٩٤-١٨٩٤، Livre du centenaire 1794-1894، ولما يخص خريجي مدارس الفنون والحرف :
- Gauthier-Villars et Fils, 1894, 3 tomes Livre d'or des ingénieurs des arts et métiers 1780-1980, P., Arts et métiers, 1980, 855p.
- وبالنسبة لمهندسي الطرق والكباري :
- André Brunot et Roger Coquand, Le corps des ponts et chaussées, P., Editions du CNRS, 1982, 914 p.
- وبالنسبة لبعض تواريخ الميلاد تم الرجوع إلى محفوظات المقصورات الماسونية بالخليج. وبمقارنة المعلومات التي نتجت عن الملفات الإدارية للأشخاص تبين أن المعلومات التي تحتويها الدلائل نادراً ما تكون مطابقة تماماً وتكاد تميل دائماً إلى تجميع المواقف ، ونأخذ منها على سبيل المثال أوجين رينيه كايه (Eugène René -Caillé) رئيس قسم الورش بالجسر ثم بالإسماعيلية . دليل خريجي المدرسة المركزية للفنون والصناعات لعام

١٨٩٤ رفع منصبه إلى " مهندس رئيس ورش القناة السويس البحرية" وهو منصب لم يشغله أبداً . ونجد مثل هذا النوع من المعلومات عند استعمال المؤلفات المطبوعة الخاصة بسيرة القديسين التي تشمل المذكورين فيما سبق.

(٣٨) لقد أخذ في الاعتبار أول مستخدم في ورشة قناة السويس.

(٣٩) تم حصر قدامى مدارس القنون والحرف الذين صاروا مفتشين أو مراقبي الطرق والكباري في التدريب في إدارات الطرق والكباري

٤٠ (يضم الآخرون عناصر غير متجانسة ويقصد بهم ما يشبه قدامى تلاميذ المدارس الثانوية . من وجهة نظر أهمية الترقيات أو هامشيتها بالنسبة للقطاع المدروس مثل حالة أميل دورجه (Emile Dorget) الذي تاهل في مدرسة تريجو وأشيل مايهلي (Achille Maehly) الذي تعلم في مدرسة الفنون الصناعية وجان ماريشل (Jean Marichal) سابقاً طالب بمدرسة سان-سير من قدامى مدرسة الفنون الجميلة وأوجين رينيه كايه طالب منتسب بالمدرسة المركزية.

٤١ (تم هنا حصر الأشخاص الذين لم يدرسوا بمدرسة والذين لا نعرف عنهم معلومات وعددهم قليل.

٤٢ (أقيمت هيئات الطرق القروية بقانون بتاريخ ٣١ مايو ١٨٣٦ ووضعت تحت مسئولية المحافظ وهي مسئولة عن الحفاظ و صيانة شبكة الطرق القروية .

٤٣ (وضع قرار صادر بتاريخ ١٨٥٣ لقب عامل مساعد محل لقب مراقب أشغال.

44) Alphonse Debaue, Dictionnaire administratif des travaux publics, P., Vve Dunod, 1892, vol. 1, p. 570.

45) Annales des conducteurs des ponts et chaussées, 1865, p.295.

٤٦ (المقصود البند ٣٧ من القرار بتاريخ ١٣ أكتوبر ١٨٥١ بشأن تنظيم هيئة الطرق والكباري .

٤٧ (قرار بتاريخ ٢٦ مارس ١٨٥٧ .

٤٨ (بالنسبة لضباط الهندسة البحرية يعتبر القرار المؤرخ في ١ نوفمبر ١٨٦٢ الخاص بإجازة بدون مرتب هو الذي يحدد شروط ترك الخدمة المؤقت للذين يرغبون في " مساعدة شركات صناعية تتعلق بالفنون والأشغال البحرية" .

٤٩ (AN 153AQ/G1.

٥٠ (لعب هذا المجلس بالنسبة لوزارة البحرية دوراً قريباً من دور المجلس العام للطرق والكباري بالنسبة لوزارة الأشغال.

٥١ (AN 153AQ/G78 قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٨ ديسمبر ١٨٦٣ .

٥٢ (المصادر : AN 153AQ/RU2 وملفات الأفراد

٥٣ (AN 153AQ/TE142 أمر إداري رقم ٢٤ قانون عام استغلال الورش والمشغل

٥٤ (AN 153AQ/INJ72 . جلسة اللجنة الاستشارية بتاريخ ٢٤ يونيو ١٨٦٣

55) Antonio Monti, Gli italiani e il canale di Suez, Roma, Vittoriano, 1937, pp. 334-336.
Lettre de Gioia à M. Albert, 12 mars 1862.

٥٦ (AN 153AQ/TE142 أمر إداري رقم ٦ ، فبراير ١٨٦٢ .

٥٧ (AN 153AQ/TE107 أمر إداري بتاريخ ٢٨ فبراير ١٨٦٣ .

58) A. Picon, op. cit عن شكل آخر انظر .

٥٩) (ذكر المرجع بشكل موجز فيما يلي. : CFS. D Lallemand) الشركة المالية لقناة السويس . ملف
الألمان

60) CFS. D. Chanoine. .

61) AN 153AQ/TE137

٦٢) بطاقة وصفية للخدمات التي قدمها أثناء عام ١٨٦٥ . CFS. D. René-Caillé

dans ce qui suit en F. 1865 . (abrégé)

63) CFS. D. le Tors.

64) CFS. D. Collas.. -تقع محاجر المكس بالقرب من الإسكندرية

65) AN 153AQ/TEP3

66)AN 153AQ/TEP3

٦٧) AN 153AQ/INJ36 عقد تم مع SFCM من أجل توريد قوارب بخارية وبمروحة في ١٢ أغسطس ١٩٦٨

بند ١٦

68)Antonio Monti, op. cit., p 404 et suivantes

رسائل مأخوذة من مراسلات جيويا.

69)Antonio Monti, op. cit., p. 404 et suivantes, lettres extraites de la correspondance de

Gioia . - رسائل مأخوذة من مراسلات جيويا .

70)CFS. D. Henry. F. 1864.

٧١) جاء كثير من الفيين من شركة السكك الحديد الروسية التي سرحت العاملين بها في مارس ١٨٦٢

72)CFS. D. Durand. F. 1866

73)CFS. D. Riche. F. 1864.

74)CFS. D. Richard. F. 1865.

75)CFS. D. Paponot. F. 1866.

76)O. Ritt, op. cit., p. 341.

77)CFS. D. Lassale.

78)CFS. D. Rous. F. 1864.

79)CFS. D. Riehr. F. 1865.

80)CFS. D. Lambert. F. 1866.

٨١) AN 153AQ/TE142 . أمر إداري رقم ٢٤ : القانون العام لاستغلال الورش والمشاغل فبراير ١٨٦١ ،

بند رقم ١١ .

82)Ibid. Art.

83)CFS.D.Viller. F. 1864

84)CFS. D. Lacroix. F. 1866

85)Id.

86)CFS. D. Heidegger. Feuilles... 1864 et 1867.

87)AN 153AQ/1610B رسالة فوازان عام ١٨٦٥

85)AN 153AQ/TE109. دراسة بتاريخ مايو ١٨٦٣ قمتا بإبراز الأقوال

89) CFS. D. Gouget. F. 1864.

90)CFS. D. Lostie de Kerhor. F. 1866.

91)CFS. D. Palaa. F. 1866.

92)CFS. D.Comboul. F. 1866

93)CFS. D.Comboul. F. 1865

٩٤) خطاب من محافظ المدرسة متعددة التقنيات بوزارة الداخلية في ١٥ نوفمبر ١٨٢٢ ذكرها أندريه شيرفيل :

André Chervel « Les études littéraires dans la formation polytechnicienne » La formation polytechnicienne 1794-1994, P , Dunod, 1994, p. 124.

٩٥) AN 153AQ/CX147 تصريح باستخدام الصحافة تم الحصول عليه من وزارة الداخلية بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٨٦٣.

96) C. A. Oppermann, op. cit., 1866, p. 288. Proposition n° 288

اقترح باستعمال الآلة الحاسبة لإنجاز عمليات المكاتب والمشغل والورش بسرعة وبدقة.

97) CFS. D. Lehmann.

98) A. Debaue, op. cit., vol.3 art. « Piqueur ».

99) CFS. D. Tinti. F. 1867.

Corps à Corps ...op.cit

١٠٠) مع ذلك لابد من الإشارة إلى كتاب أندريه جيلرم

الرائد والأعمال الجارية لجون هيل فيس ، المؤرخ الأمريكي

101) A. Dubois, Observations sur le projet de fusion du service vicinal avec celui des ponts et chaussées et sur sa décentralisation, Versailles, 1871, p.12, cité par Claude Vacant dans Routes et Ponts en Yvelines du XIXe au XXe siècle, P., Presses des Ponts et Chaussées, 1996, p.18.

الفصل الثالث

مناهج إدارية فعالة

مبادئ ونماذج

تُعد معظم وثائق القناة التي حُفظت نتاج لنشاط الإدارة. وتلقي دراسة هذه الوثائق الخاصة و الملاحظات الملحقة بها الضوء على أساليب تنظيم الورشة والتعرف جيداً على المناهج التي طبقتها الإدارة وكذلك كَشَفَ النماذج التي استُلهمت منها هذه المناهج ، كما تساعد هذه الدراسة على إبراز الآليات التي استخدمتها الإدارة . وتدل النتائج التي حصل عليها على فاعلية مثل هذه المناهج وبخاصة قدرتها على التغلب على اختلال النظام في بداية عمل الورشة .

عناصر المنهج

وبالنظر إلى الاعتراضات التي وُجِعت للمقاول هاردون و إلى كم الإرشادات التي قدمت إليه بوفرة ، يمكن إدراك مميزات وأسس المنهج الذي سوف يطبق فيما بعد .و يعتبر هنا التوضيح الذي تفرضه المواقف المتعارضة كما هو في الغالب هبة من حظ المؤرخ ، فهو يساعد على قطع حبل الصمت عن هذه القواعد الضمنية المتبادلة التي تضع أساساً لثقافة كما يساعد هذا التوضيح على كشف خفايا المهارات التي لم يفصح عنها غالباً.

كان من وجهة نظر المدير والمستشارين بالشركة أن هناك ثلاثة أنواع من الضرورات فرضت نفسها بالتدريج .

أولاً: إعادة تركيز عمل الإدارة العامة للأشغال نحو الهدف الرئيسي وهو حفر القناة البحرية.

ثانياً: القيام بعمل دراسات أولية قبل البدء في أي عمل مهما كان .

ثالثاً: الرقابة الشديدة على أعمال مقاولات الباطن للحفاظ على إدارة عملية الإنتاج في مجملها.

إعادة تركيز الأعمال نحو الهدف الرئيسي

لقد أوصى فوازان ، في عام ١٨٦٣ ، بإعادة تركيز جهود الشركة نحو الهدف الرئيسي المراد تحقيقه واللجوء إلى قطاع الصناعة الخاص فيما يتعلق بجميع الأعمال الثانوية . ومنذ ذلك الحين


بذل قصارى جهده ليخلق في خليج السويس الظروف الممرية بما فيه الكفاية لجذب الشركات الصناعية والتجارية للإستقرار في الخليج وتقديم مساعداتها . ورأى من ناحية أخرى أن على موظفيه التفرغ تماماً للإشراف ومراقبة الأعمال ولا يجب عليهم بتاتاً أن ينشغلوا عن ذلك بأي مسئوليات أخرى .

لذلك سوف يقوم فوازان بإلغاء أسطول السفن الصغير الذي كانت تمتلكه الشركة والمتسبب في النفقات الباهظة بفعل تكاليف الصيانة المرتفعة وكذلك إلغاء هيئة الملاحة . وكان هذا الأسطول المكون من ٣٢ قارباً تم شراء أغلبها من مارسيليا قد ساعد في بدايات العمل على التخلص من التكاليف الباهظة التي فرضها الموردون المحليون لتأمين السفن وساعد أيضاً على إقامة خدمة بحرية منتظمة بين الإسكندرية وبورسعيد. ومنذ ذلك الحين ، ساهم تعمير الصحراء تدريجياً و إنشاء الميناء في تقليل مخاوف القوارب الخاصة من التردد على هذا الساحل الموحش . و مع ذلك ، كان لابد من الإنتظار عدة سنوات أخرى حتى يصبح الدخول إلى بور سعيد يسيراً فعلاً.

أيضاً كان من مصلحة الشركة أن تستطيع السفن القادمة من فرنسا أن ترسو مباشرة في بور سعيد بدلاً من الإسكندرية . و بسرعة أصبح ميناء مارسيليا وهو ثاني مواني فرنسا من حيث حركة المرور ، يقوم بدور مفترق طرق المواصلات إلى الخليج وإلى الورش^(١) التابعة له . وكانت المون الآتية من جميع أنحاء فرنسا تتوجه إلى مارسيليا بفضل شبكة خطوط السكة الحديد وخاصة خط باريس - ليون - مارسيليا . وقد أقامت شركة المقاولات العامة في هذه المدينة منذ الشهور الأولى لعام ١٨٦٠ وكالة ضمتها شركة القناة إليها فيما بعد . وكانت هذه الوكالة تقوم بمهمة استلام وتخزين المعدات والبضائع بل أيضاً التفاوض مع متعهدي تأمين السفن بالمدينة لنقل الرجال والبضائع المتجهة إلى الورشة وكذلك التفاوض مع شركات التأمين بشأن البضائع التي تمر عبر البحر المتوسط . ومنذ عام ١٨٦٢ ، عملت الشركة على إتخاذ إجراءات تهدف إلى إغراء الشركات البحرية لكي ترموا سفنها في ميناء بور سعيد^(٢) . و في بداية الأمر إستجابت شركة مقاولات الإخوة شارل وأوجيست بازان (Charles et Auguste Bazin) بمارسيليا إلى هذه النداءات في عام ١٨٦٥ ، و جهزت خدمة منتظمة للسفن البخارية بين مارسيليا وبور سعيد لحساب شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما التي تركت لها مهمة إدارة وتأمين الورش^(٣) . ومنذ ذلك الوقت ، ازدادت حركة مرور السفن في بور سعيد بمرور الأعوام .

و تأتي من وقت لآخر شركة مصرية تدعى عزيزية (Azizié) وشركة النقل البحري العام من مارسيليا لنقل البضائع إلى بور سعيد ، أما الشركة الروسية فقد جعلت من بور سعيد المرسى الدائم لأحد خطوطها و تبعتها شركة فريسينه (Fraissinet) من مارسيليا في بداية عام ١٨٦٦ ،

حركة الملاحة في بور سعيد من ابريل ١٨٥٩ حتى نهاية يونيو ١٨٦٩ بالطننة

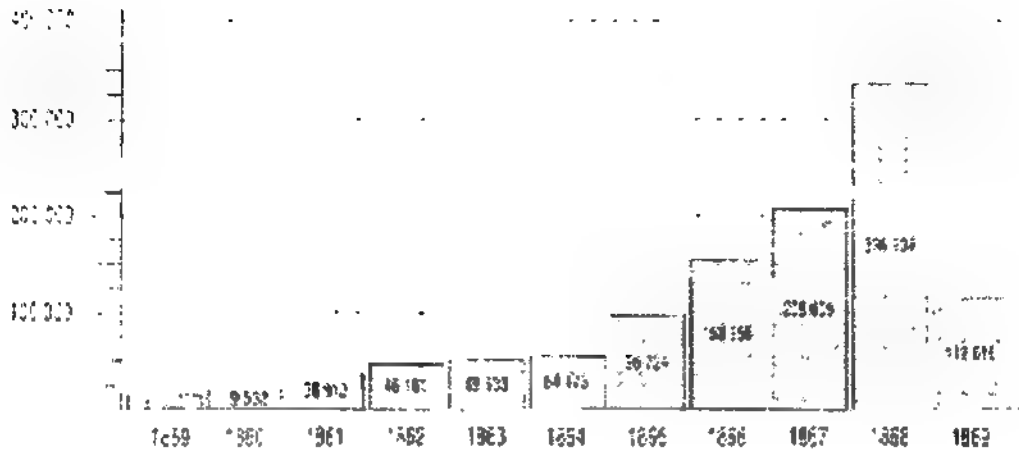

ثم مكاتب سفريات الإمبراطورية (Messageries impériales) منذ يونيو عام ١٨٦٧. وفي عام ١٨٦٧ كان تصل كل شهر عشرون سفينة نقل بخارية إلى بور سعيد^(٤). وفي عام ١٨٦٨ إقتربت عشر شركات ملاحية من رصيف السويس. بالإضافة إلى ذلك، وحسب إتفاق تم توقيعه في ١٦ يوليو ١٨٦٥ بين شركة القناة وشركة إخوان صافون (Savon) وشركائهم من مارسيليا، تتولى الأخيرة عمليات نزول وصعود المسافرين والبضائع في المرسى أو ميناء بورسعيد^(٥). وفي نهاية الأمر اقتصر نشاط الشركة في مجال المواني على الإشراف على أعمال بناء الأرصفة الممتدة في البحر ومنارة بور سعيد وذلك بعد أن استطاعت الإعتماد تدريجياً على الشركات الخاصة في القيام بعمليات أخرى كثيرة لها صلة بنشاط الميناء.

أما فيما يخص المؤن فقد تم الإنتقال من نظام الاحتكار المفروض إلى التجارة الحرة. وكانت شركة المقاولات العامة قد احتكرت فعلاً بيع شتى أنواع المنتجات في الخليج في السنوات الأولى، وأنشأت في المخيمات الرئيسية محلات الجزارة والمخابز والمطاعم والمساكن للعائلات والفنادق وأقامت أيضاً محلات للمواد الغذائية والملابس ولوازم الحياة اليومية الأخرى كي تستغلها مباشرة. وعندما منحت شركة القناة الإحتكار لشركة المقاولات، كانت تأمل في إشباع الإحتياجات الأساسية وفي نفس الوقت ضمان أسعار معقولة و أيضاً الإشراف على القادمين إلى الخليج. ولكن الواقع كان خلاف ذلك، فقد دفع نقص المنتجات الرئيسية وارتفاع الأسعار التي مارستها شركة المقاولات، شركة

القناة إلى إنهاء الاحتكار في أبريل عام ١٨٦١ ، وفتح أبواب المخيمات أمام حرية بيع المنتجات^(٧). كما قامت الشركة في نفس الوقت بإلغاء نسبة ال ٧ % المقتطعة والتي كانت تُحصلها شركة المقاولات عن جملة إيرادات التجار الذين جازوا لبيع منتجاتهم . فقد كان يصل إلى بور سعيد عدد من سكان مدينة دمياط لبيع محاصيلهم الزراعية الطازجة وكان يخاطر أيضاً الباعة المتجولون بأنفسهم بدخول مخيمات الخليج المختلفة . وبالإضافة إلى ذلك ، شجعت الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها الأراضي الواقعة حول القناة البحرية^(٨) بعض الخاصة في ذلك الوقت على الإقامة لممارسة تجارتهم .

وعلاوة على وجود الوكالات بالإسكندرية والقاهرة والسويس ودمياط لشراء البضائع المصرية والتصدير، تم في البداية توظيف وكلاء متخصصين لاستلام وتوزيع البضائع في المخيمات على خط الأشغال الرئيسية . وكُلف وكلاء آخرون بمهمة التخزين المؤقت وإعادة التصدير إلى قطاعات مختلفة حيثما يستلزم التناقل بين السفن ، مثل مدينة سمند على النيل ، والزقازيق عند منبع ترعة الوادي أو أوبيت (Awebet) وهي محطة سكة حديد على طريق القاهرة السويس ونقطة لتموين الجزء الجنوبي من الخليج . كما تم إنشاء مخازن للنقل العابر (ترانزيت) عند نقاط توقف عمليات النقل .

في عام ١٨٦٠ ، أقامت شركة المقاولات مخزناً عاماً للمؤن بدمياط في مبان تابعة لمصنع غزل سابق ومخزناً آخر في بور سعيد تحول بسرعة إلى أهم مستودع للتموين والمعدات . وهكذا تم تدريجياً إنشاء شبكة مخازن حقيقية . وفي منتصف عام ١٨٦١ قامت شركة هاردون بإنشاء إدارة عامة لتحسين إدارة عملية التموين خصوصاً مع توقع حالة التدفق الضخم للعمال في المستقبل، بل أيضاً لتدارك العجز الذي قد يتعرض له الورش المنعزلة وتأخير تسليم البضائع . وتم تعيين أنجو (Angeot) ، وهو معتمد عسكري في الجيش الفرنسي ، لرئاسة هذه الإدارة . وقد عمل مدة طويلة في الجزائر ثم شغل منصباً في إسطنبول أثناء حرب القرم (de Crimée)^(٩) . وبدل اللجوء إلى هذا النوع من الكفاءات لما له من خبرة في مجال إدارة العمليات العسكرية على أن ورشة قناة السويس تشبه في بعض جوانبها الأعمال العسكرية . وكانت الإدارة العامة مكونة من مصلحتين للتفتيش . تضم المصلحة الأولى دمياط وبور سعيد والجانب الشمالي من الخليج حتى الفردان أما الثانية فتقوم بالتفتيش على بقية الخليج وورش ترعة الماء العذب . وفي عام ١٨٦٢ أصبح لإدارة المخازن العامة ثلاثة عشرة فرعاً في مصر^(١٠) يعمل فيها ستة وستون موظفاً . وأصبحت مدينة القاهرة بفضل موقعها مركزاً لجهاز الإدارة نظراً لأنها المكان الرئيسي لصناعة البسكويت المخصص للعمال من أبناء البلد وأهم مركز تموين لعلف الحيوانات كما أنه مكان

يتم منه الإتصال بالجسر بسرعة عن طريق النيل وقنواته الفرعية. وقد اتخذ أنجوت (Angot) قراراً بإنشاء مستودع ضخم فيه للمؤن من كل نوع لمباشرة الأعمال وإقامة مقر الإدارة الجديدة به. وبناء على ذلك ، تم إنشاء مخازن بولاق الكبرى الواقعة على شاطئ النيل في ضواحي القاهرة^(١١). وما لبثت أن عرفت نشاطاً كبيراً في شهر مارس عام ١٨٦٢ ، إذ تم فعلاً إستهلاك خمسة عشر طناً من البسكويت يومياً في ورشة عتبة الجسر وحدها كانت تصل كل صباح بواسطة القوارب من مخازن بولاق. هذا وإن كان قد إستطاع أنجوت في نهاية كل شهر تقدير كمية المواد الغذائية المستهلكة والموفرة^(١٢) - زبدة ، بسكويت ، زيت ، عدس وردي ، بصل ، أرز ، فول... الخ - إلا أنه على العكس من ذلك ولسوء حظ مدير عام الأشغال ظل غير قادر على إعداد تصورات وتوقعات عامة أو تحديد الإحتياطي اللازم حفظه في المخازن^(١٣). وقد ازدادت صعوبة المهمة إذ أن ما يتم شراؤه فعلاً من خارج مصر لا يصل إلى الخليج إلا بعد أربعة أو خمسة شهور من تقديم الطلب، وأيضاً لعدم كفاءة الموظفين العاملين في الإدارة وكثرة تنوع المنتجات الموجودة بالمخازن^(١٤).

وبعد فسخ التعاقد مع شركة مقاولات هاردون إستردت الشركة قسم الإدارة ، وتم جمع عدة أقسام بقصد زيادة فاعليتها أيضاً تحت سلطة الكولونيل أنجوت مثل التموين والنقل ووسائل المواصلات^(١٥) ، و اختفت المخازن رويداً رويداً أمام إنتشار التجارة الحرة في الخليج . وأغلق مخزن دمياط في نهاية عام ١٨٦٣ ، وبعد فترة قليلة من الزمن توقف محل البيع بالقطاعي ببور سعيد ومخازن طوسوم والجسر وسمنود. وبعد التعاقد مع شركات المقاولات للأشغال وسحب فرق السخرة ، هُجرت مخازن بولاق تدريجياً^(١٦). ولم تحتفظ الشركة حينئذ إلا بمخزين كبيرين في بور سعيد والإسماعيلية لإستخدامهما خصيصاً في الأشغال التي تنفذ في الإدارة العامة. وفي ٧ أكتوبر عام ١٨٦٤ ، تم إلغاء الإدارة العامة^(١٧) وإبعاد الكولونيل أنجوت ، وأصبح تموين ورش الخليج مرتبطاً منذ ذلك الحين بالتجارة الخاصة التي أخذت تحل محل الشركة ، الأمر الذي جعل فوازن يبدى إرتياحه قائلاً : " سوف نتجنب شتى أنواع الخسائر التي تحملناها بدرجة كبيرة حتى اليوم في المواد الغذائية والمشروبات الفاخرة والملابس والأدوات المنزلية وكذلك أدوات الترفيه ، الخ "^(١٨)

ورغم أن الشركة لم تعد تهتم بتموين المواد الغذائية إلا أن فوازن دون في أول يناير عام ١٨٦٧ جدول الأسعار الجارية للمواد الغذائية ومواد إستهلاكية أخرى في مخيمات الخليج المختلفة^(١٩). و بمقارنة النتائج مع نتائج كشف مماثل نُفذ قبل بضعة شهور ، إستطاع فوازن متابعة تطور الأسعار ومعرفة مصدر الزيادة بدقة. وتسعى هذه الدراسة بالفعل إلى تحقيق رفاهية العاملين . والهدف من إنجازها هو إقناع أعضاء لجنة الإدارة بوجود ظروف مادية صعبة ، ومن ثم ضرورة الإبقاء على مكافأة غلاء المعيشة التي منحت منذ عدة شهور لموظفي الشركة . فبالرغم من تخلص

مدير عام الأعمال من مشاكل التموين التي لا ترتبط مباشرة بالأشغال إلا أنه لم يصرف النظر بالكامل عن المشاكل التي مالبثت تثيرها.

لقد اطلعنا على الأسباب التي أدت إلى صرف النظر في السنوات الأولى - بالرغم من وجود المشروع الأساسي - عن حفر ترعة الماء العذب بغرض تنفيذ مجرى مائي يُعطي صورة مسبقة للقناة البحرية . وكانت هذه وجهة نظر مانتر : "لقد تم إهمال حفر ترعة الماء العذب المتفق عليها في البداية والشروع في أشغال القناة البحرية الكبرى دون هذا الإعداد الذي لاغنى عنه " (١٩) وقد أخذها عنه فوزان " من بين الشروط الرئيسية لتنظيم جيد ، كان في البداية قرار حفر ترعة الماء العذب لإنشاء طريق مواصلات مضمون وسهل وإقتصادي بين بحيرة التمساح ، مركز كل أشغالنا، والقاهرة والإسكندرية. ولكن من المؤسف للغاية ان تفرض خواطر بعيدة تغيير في أصل تنفيذ الأشغال (٢٠) " .

وعندما تولى فوزان الإدارة ، استأنف المشروع الأول واهتم أيضاً بتنفيذ فرع ترعة الماء العذب بين القاهرة والوادي والسويس ، وكذلك بإنشاء شبكة مواسير من الزهر وخزانات لتوفير المياه العذبة لشمال الخليج . واستبعد بذلك بالتدريج الطريقة السابقة الخاصة بتوصيل المياه العذبة إلى ورش الخليج عن طريق صناديق تُنقل على قوارب من دمياط أو في براميل سعة ٦٠ لتراً تنقلها الجمال عبر الصحراء.

ورغم أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه تدريجياً التجارة في الخليج وكذلك المواصلات بين مارسيليا وبور سعيد ، ورغم أن الضرورات الفنية قد تغلبت على كل الاعتبارات الأخرى ، فقد ظلت مع ذلك وحتى إفتتاح القناة البحرية الأعمال الإدارية الواجب على الشركة مواصلة القيام بها والتغلب على الإهمال ، من المهام بالغة الأهمية ، كما سنرى ذلك بطريقة أكثر تفصيلاً في الفصل التالي.

الدراسات لاتخاذ التدابير و الرقابة .


شمل المنهج الذي وضعه فوازان ، علاوة على تحديد الأولويات ، عتصرين هامين : الأول هو اتخاذ التدابير عبر الدراسات الأولية ثم الرقابة فيما بعد بواسطة الحسابات . إن مظاهر تطبيق مبادئ هذا المنهج لا تحصى وسوف نفحص كلاً منها تباعاً من خلال : تحديد أجور العاملين بالشركة ، تنظيم العمارة ، تقدير احتياجات الماء ، الإنذارات التي وجهت للمقاول الأول ، بناء مدينة الإسماعيلية وإنجاز عمل الخرائط .

وكان من رأي مدير عام الأشغال عدم اتخاذ القرارات بشكل تعسفي والإستناد قدر المستطاع على الدراسات . لذلك حينما كان الأمر يتعلق بتحديد أجور العمال بالشركة أستند المدير العام ^(٢١) إلى المقارنة مع المرتبات التي منحت عند بناء خطوط السكك الحديدية . وقد جمعنا النتائج الرئيسية لهذه الدراسة وخاصة المرتبات الممنوحة ^(٢٢) في الجدول التالي:

مقارنة المرتبات السنوية بالفرنك

المستخدم الوظيفة	سكة حديد أورليان	سكك الحديد الجزائرية	سكك الحديد الروسية	قناة السويس
سنة السداد	١٨٦١	—	١٨٥٨	١٨٦٣
المدير العام	٣٧٥٠٠	—	١٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠
كبير المهندسين	٢٤٠٠٠	٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠
مهندس عادي	١٥٠٠٠ ^(٢٣)	١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
رئيس إدارة	١٣٦٠٠	—	١٨٠٠٠	١١٥٠٠
رئيس قسم	٩٠٠٠	—	١٢٠٠٠	٧٩٠٠
مراقب	٣٦٠٠	٤٢٧٥	٦٨٠٠	٥٥٠٠
مفتش عمال رئيس ورشة مشرف	٢٠٠٠	٢٢٠٠	٢٦٠٠	٢٧٠٠
مدير مكتب	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٩٦٠٠	٥٦٠٠
رسام	٢٢٥٠	—	٦٣٠٠	٣٦٠٠
محور أو محاسب	٢٧٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٣٢٠٠
مرسل البضائع	١٩٠٠	٢٢٠٠	٣٠٠٠	٢٢٠٠

ويمكن أن نكون فكرة عن أهمية دور هذين النشاطين وهما التقدير والرقابة وتكاملهما خاصة إذا لاحظنا تنظيم أماكن مكاتب الإدارة العامة للأشغال . ولقد أعد جيمس بوشيه (James Pouchet) ، رئيس مكتب الدراسات ، مستلهماً من النمط المعماري الشرقي ، مشروعاً لمبنى يضم مسكن فوازن ومكاتب إدارته.

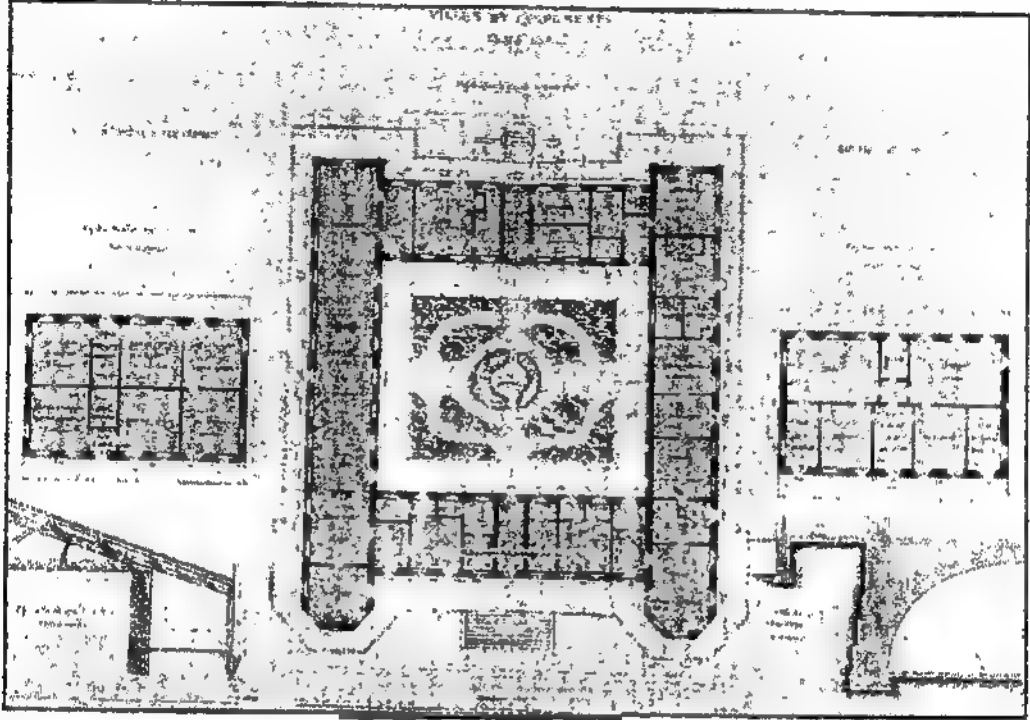


مكتب ومسكن الإدارة

(أطلس مونيل وكاساني لوحة ٢١)

والمنشأة عبارة عن مجموعة سكنية مكونة من ثلاثة مباني مستطيلة : المبانى صغيران على جانبي المبنى الكبير وتطل جميع الواجهات على رصيف محمد علي . ويتكون المبنى الرئيسي الضخم من أربعة أروقة متلاحقة تحيط بمدينة ، وتشرف ساحة الأمامية على شارع عريض أمام البحيرة وتستخدم لإقامة فوازن وعائلته المكونة من زوجته وابنته . ويخصص الجناح الخلفي للخدم، ويوجد في إحدى جناحي المبنى الجانبية مكتب المدير والمسئوب التي تشغلها سكرتارية الإدارة العامة . وفي الجناح الآخر ، قاعات الاستقبال . ولاشك أن وضع المكاتب ومسكن المدير الخاص في نفس المبنى هو دليل على إلزام المدير شخصياً ، إذ يقع مكتبه في حجرة ركنية عند تقاطع القاعة الموجود بها مكاتب السكرتارية والجناح المخصص لسكنه. كما أن كل المبانى متقابلة بالنسبة لمحور المبنى الرئيسي أو المركزي وعمودية على الرصيف. وفي واحد من المبانى الجانبية ، توجد الحسابات العامة ومكتب البحوث. وفي الآخر، المكاتب المنفصلة وتشمل مقر إقامة الشعائر الدينية والطرق

والبريد والتلغراف . و هذا التوزيع ليس عشوائياً فهو يعبر عن إهتمامات المدير العام وتوظيفها مكانياً . فقد جمع في جانب خدمات التخطيط والإعداد ومراقبة الأشغال وفي جانب آخر أقسام الشؤون الإدارية . وقد إعتد على هذين الجانبين في إدارة الورشة . وقد لاحظ ليون مونتاي (Léon Monteil) بصدد هذا المبنى : " ان المجموعة كانت تشكل وزارة إلى حد ما تعد فيها كل المسائل المتعلقة بحفر القناة " (٢٤) ولن يفوت الزائر بدوره أن يلقي نظرة إعجاب على الهندسة المعمارية لهذه البناية التي لا تترك مجالاً للشك في أهمية الدور الذي يقوم به ساكنها : " مبنى فسيح يطلق عليه عموماً قصر المدير وفي الحقيقة رغم أنه من دور واحد إلا أن حجم وأناقة القاعات التي تحيط به تجعله يستحق هذا اللقب المفخم " (٢٥) .

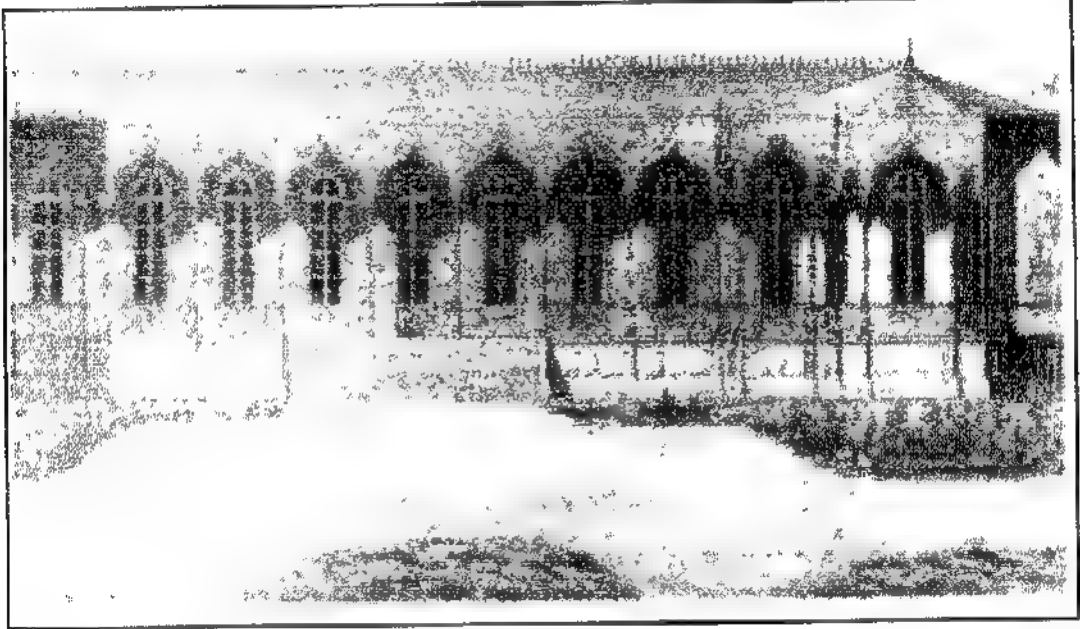

مسكن المدير العام

(أطلس مونتيل وكاساني لوحة ٢١)

و لتقدير الكميات وتقييم الإحتياجات يعتمد العاملون الفنيون بالشركة على الملاحظات على الطبيعة وكذلك على المتوسطات الحسابية . وهكذا ساعدت الحسابات التقديرية بخصوص الحاجة إلى الماء في فترة تدفق وفود عمال السخرة إلى ورشة الجسر خلال عام ١٨٦٢ على تقدير الإحتياجات المطلوبة بعدد ١٥٠٠ جماً لضمان نقل الماء العذب (٢٦) . وحيث أن كل جمل يستطيع حمل برميلين سعة ٦٠ لتراً ولما كانت المسافة التي يقطعها الجمل لاتتعدى ٤٥ كيلومتراً في اليوم ، وكل جمل يقوم بثلاث رحلات ذهاباً وإياباً كل يومين ، لذا يمكن لكل جمل توصيل ١٨٠ لتراً من الماء إلى الورش يومياً . ولما كان من الضروري ، علاوة على ذلك ، توفير عشر لترات من الماء يومياً لكل واحد من ال ٢٠ ألف من العمال من سكان البلد و ٢٠ لتر ماء يومياً لكل فرد من بين ١٥٠٠ أوروبياً مقيماً في البلد، ثبت إن الإستهلاك اليومي لورشة العتبة (Le Seuil) بلغ

٢٣٠٠٠٠ لترًا ويحتاج إلى استخدام ١٢٨٠ جملاً ، وهذا الرقم قد يزيد بحوالي ١٥% إذا أخذنا في الاعتبار الحيوانات المريضة وأيام الراحة الإجبارية ليكون المجموع ١٥٠٠ جملاً . وأتبع نفس الأسلوب لتحديد كمية وصول المعدات والغذاء وأستد الإداريون بالورشة في عملهم المتوقع على الملاحظات الآتية : " يحضر نصف الرجال تقريباً ومعهم غذاؤهم [...] وفي المتوسط تُستهلك القفة بعد نقل ٣م١٠ . وكذلك بعد حفر ٢٠٠ ٢م يصبح الفأس العربي غير صالح للإستعمال" (٢٧) .

لقد ظهر واضحاً إقتناع فوازن بضرورة اجراء دراسات أولية و أخذ التدابير قبل بدء العمل، وذلك من خلال تعدد الإنذارات التي وجهها المدير العام للمقاول هاردون. ففي الوقت الذي كان يتوقع يقظة المقاول ، حاول فوازن أن يثبت فيه مبادئه . فقد لاحظ المدير العام بشأن الروافع التي طلبها المقاول من كومب (Combe) ، صانع الروافع بمدينة ليون ، أن الرسومات المقدمة من مقاولات هاردون غير كاملة وغير واضحة المقاييس فقد اكتفى المقاول بإعطاء المورد إرشادات مبهمة للغاية وعبر له عن ذلك قائلاً : " باختصار دائماً ما تكون الدراسات غير الكاملة من جانبك هي التي تعوق مثل هذه الأعمال ولعل التجربة تكون قد أثبتت لك ضرورة عمل هذه الدراسات بدقة لكي تحصل على آلات ترضى عن تشغيلها" (٢٨) .

ويصاحب ضرورة عمل الدراسات الأولية الرغبة في المراقبة عن ذي قرب للأشغال التي تنفذ . وتتفق آراء أعضاء اللجنة الإستشارية للأشغال مع وجهة نظر المدير في هذا المجال ، إذ كانت وجهة نظرهم أن من واجب الشركة ممارسة امتيازات وحقوق صاحب العمل حسب القواعد والتقاليد المتبعة في فرنسا . وتعتبر عملية الاستلام أحد هذه الأساليب المعتادة التي بموجبها وأحياناً طبقاً لبعض الشروط يتسلم صاحب العمل الأعمال التي أنجزتها شركة المقاولات . لذلك في نهاية عام ١٨٦١ عبرت اللجنة الإستشارية للأشغال عن أسفها لعدم قيام شركة القناة بالرقابة والإشراف على تصنيع الأجزاء التي شكل منها رصيف المرفأ الحديدي المؤقت والذي تم تنفيذه في بور سعيد وفضلاً عن ذلك لم تتمكن من إستلامه مؤقتاً (٢٩) . وليس هذا إلا مثلاً لمخالفة شركة المقاولات للقواعد الأساسية التي يرى أعضاء اللجنة أنه من الواجب احترامها . علاوة على ذلك كانت شركة المقاولات ترفض بعناد تطبيق نظام المحاسبة الذي أوصت به شركة القناة . ففي الواقع ، عارضت شركة مقاولات هاردون كل أشكال الرقابة على عملها .

وكان لابد من تطبيق ذات المنهج أياً كان الشئ المورد ومن ثم ، عندما تعلق الأمر بتشديد مدينة جديدة من العدم في قلب الخليج ، الإسماعيلية ، تم إستبعاد الإرتجال : "لا يمكن الإرتجال في هذه المنشآت التي متبني وفقاً لطابع محدد والتي لابد أن يضاف إليها في المستقبل منازل لإقامة عدد كبير من السكان الأوروبيين [...] و لا داعي للعجلة ويُراعى كذلك اتباع الدقة والعناية في دراسة المشروعات الكبرى بمنطقة التمساح" (٣٠)

ويعتبر اختيار بناء مدينة الإسماعيلية ، التماسح سابقاً ، في وسط الخليج اختياراً علمياً مفيداً من عدة جوانب ، ويكشف قرار إقامة مقر إدارة الأشغال عن تصميم المدير على تركيز المسؤوليات والرقابة على جميع الأنشطة في مكان واحد ويبرهن أيضاً على حرصه على تحسين النظام العام للخدمات وتبسيطه . فعندما تجتمع في مدينة الإسماعيلية الخدمات الرئيسية الموجودة في مدن دمياط والقاهرة والخليج ، فهذا يعني وضع نهاية لتعدد مواقع الإدارات المركزية للشركة ولشركات المقاولات مما يتيح أيضاً بهذا التقارب زيادة الرقابة عن طريق ممارسة الحسابات: " وتكون أول نتيجة ينبغي السعي إليها للوصول إلى هذا التغيير هو تركيز المصالح بالتمساح. وقد كان الهدف من هذا الحشد الحصول من شركة المقاولات على التمسك الدوري بالكتابات وحسن إثبات ما يبرر المصاريف التي تتباطى في تقديمها . وتعتبر هذه المركزية أيضاً ضرورية لتبسيط آليات الحسابات المعقدة وإلغاء ازدواج تشغيل العاملين الذي يشكل عبئاً كبيراً على تكاليف النفقات العامة غير المنتجة " (٣١)

ويمكن توضيح المبادئ التي اقتادت فوازن إلى ذلك من خلال قرار الشروع في رسم الخرائط . لقد بدأت أعمال الورشة دون الشعور بالحاجة إلى إعداد خريطة حديثة لخليج السويس. ففي عام ١٨٦٥ ، ويلاحظ بالفعل إرنست كاديال (Ernest Cadiat) ، رئيس المكتب الفني في سكوترارية الإدارة العامة للأشغال قائلاً : " ان الخرائط التي نفذت حتى الآن قد نقلت بمقاييس مختلفة عن خريطة الحملة الفرنسية ورسم عليها خط القناة البحرية وقناة الماء العذب والسكك الحديدية القائمة بمصر " (٣٢) وبعد فترة من تعيينه في إدارة الأعمال قرر فوازن ضرورة رسم خريطة جديدة للخليج . وكلف في بداية الأمر أوجين لاروس (Eugène Larousse) مهندس المياه الذي عينته الشركة بعمل مسح هندسي جديد للخليج . والمقصود هو عمل تليث من الدرجة الثانية بشكل أكثر دقة من الذي نفذه بول أدريان بوردالو (Paul Adrien Bourdaloue) في عام ١٨٤٧ وتغطية الخليج بشبكة من المعالم يلحق بها من الآن فصاعداً خط سير القناة وتضاريس الأرض وبشكل عام كل الخرائط التفضيلية (٣٣) وقد احتسبت إحداثيات النقاط المختلفة المحددة لمعالم الأرض الممهدة بالنسبة لمثارة بور سعيد، أما النقاط الكثيرة الثابتة التي أخذت في الاعتبار فقد زودت بأرتاد معدنية لتساعد إذا اقتضى الأمر على القيام بالمعاينة أو الوصل بين عمليات جديدة لاحقة . وهنا تظهر بوضوح الرغبة في جمع أجزاء متناثرة ووصلها ببعض في مجموعة متناسقة وتصميم الإطار العام لتفاصيل الخطط المستقبلية .

فضلاً عن ذلك ، في عام ١٨٦٤ وبناء على طلب فوازن ، تم القيام بتمهيد جديد للخليج وهي عملية هدفها هذه المرة قياس نقاط الخليج المختلفة التي كانت قد وضعت كعلامات . وتم تكليف لاروس أيضاً بمسئولية هذه المهمة . وساعدت نتائج هذه التسوية الممهدة للأرض على


تقديم بيان حسابي أكثر دقة لحجم الأتربة التي مستخرج من حفر القناة البحرية حسب المخطط التمهيدي المتوقع. وكان أيضاً من نتائج التثليث والتسوية الجديان إدراك خطأ هام في الحسابات التي تمت حتى هذا الوقت . فقد كان الاعتقاد أن المسافة بين طرفي القناة هي ١٥٠ كيلومتراً واكتُشف في الحقيقة أن القناة المقترحة تفصل بمسافة ١٦٠ كيلومتراً بين بور سعيد والسويس... عندئذ تم بسرعة تصحيح الخطأ في سرية تامة وبوجه خاص بعيداً عن المساهمين الذين لو عرفوا ذلك لشككوا في جدية جميع العمليات الجارية في الخليج. فغياب الملاحظات بشأن الخطأ وخاصة من جانب المناهضين للمشروع وبعض المستثمرين المترصدين لمثل هذه الأخبار هو دليل واضح بأن السر قد تم حفظه تماماً^(٣٤). وقد اتاحت دقة التثليث الذي تم في عام ١٨٦٢ وبعد ذلك التسوية الجديدة للخليج في عام ١٨٦٤ فرصة الحصول على المعطيات اللازمة لإعداد خريطة جديدة. وقد قام فوازان بالعمل على إعداد خريطة جديدة لخليج السويس بمقياس ١ / ١٠٠٠٠٠. ورسمت من خريطة العمل هذه خريطة مقياس ١ / ٢٠٠٠٠٠ تم حفرها وطباعتها ونشرها قرب نهاية عام ١٨٦٦. وخصصت لتزين مختلف المطبوعات الخاصة بقناة السويس. في نفس الوقت ، قرر فوازان في بداية عام ١٨٦٣ القيام بحملة إستفتاء منسقة لرسم خريطة جيولوجية للأراضي التي تمر بها القناة البحرية.

تسمح هذه العمليات المختلفة الخاصة بقياس مسطحات و أعماق المعالم الطبيعية لخليج السويس بإعداد مجموعة من الخرائط للأرض ، كما تساهم في نفس الوقت في معرفة أفضل للمكان وتوجه أيضاً عمليات تنفيذ الأشغال ، كما تشكل أساساً للدراسات وتستطيع المساهمة في توجيه بعض الاختيارات التقنية . وتوضح الرغبة في إنتاج الخرائط مناهج عمل مدير عام الأشغال . وتعتبر الخرائط وهي أداة الخبير المثالية وسيلة مفيدة للتخطيط والإدارة بل أيضاً جزءاً من الدراسات التمهيدية اللازمة وتلك حقيقة واضحة عند المهندسين الذين اعتادوا التفكير والعمل بهذا الأسلوب. وتمثل الخريطة التي رسمت كل خليج السويس حتى غرب مدينة القاهرة. وفي أغلب الظن تحدد ضمناً مساحة الأرض التي ترغب الشركة في ممارسة سلطتها عليها.

الإدارة : مصادر استلهاها والقواعد والآليات

يمكن بوضوح تحديد بعض المراجع والنماذج التي استلهم منها رجال شركة القناة الفكر لإدارة الورشة لأنهم ذكروها صراحةً . وهي قد صدرت في البداية عن إدارة الأشغال العمومية الفرنسية و أيضاً ولكن بقدر أقل عن شركات السكك الحديدية والجيش. ولا تشير هذه الإستعارات الدهشة قط حيث أن رجال إدارة الأشغال العامة بشركة القناة جاءوا هم أنفسهم من

الأقسام الإدارية . ومن الطبيعي أن يأخذ التنظيم داخل الشركة ، وكذلك غط العلاقات مع شركات المقاولات عن الممارسات الجارية في هذه الأقسام .

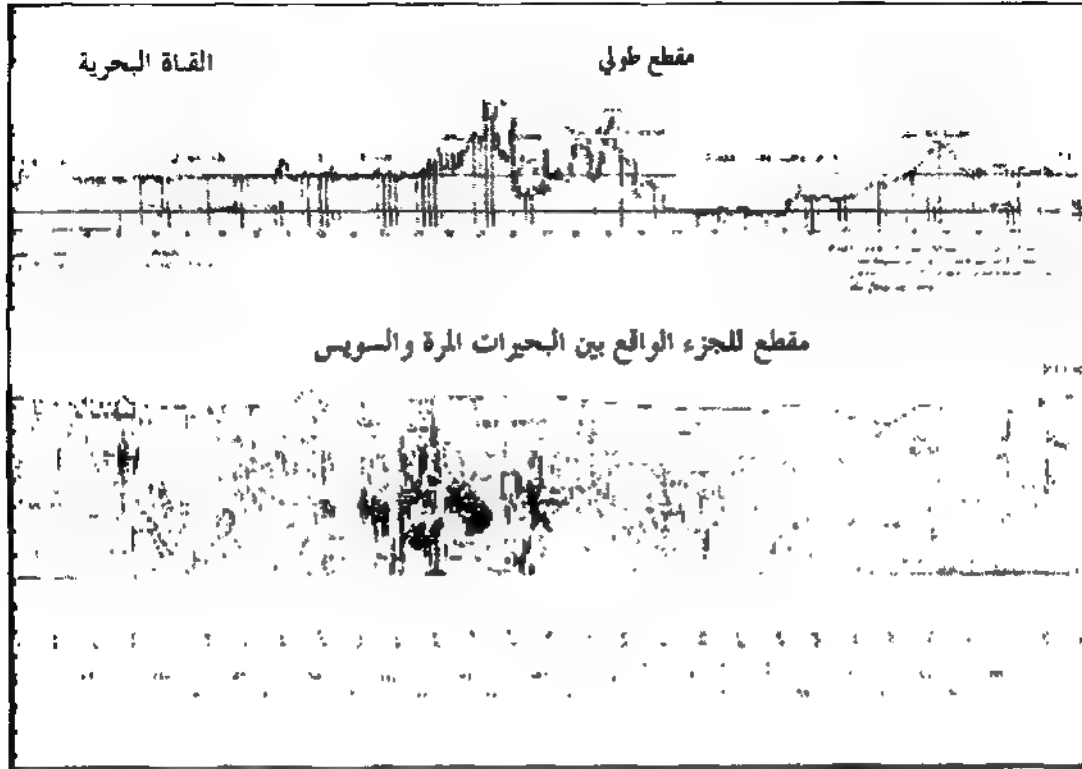

القناة البحرية القطاع الطولي

مقطع جزء القناة الواقع بين البحيرات المرة والسويس

أعلى : قطاع طولي للقناة - فوازان بك . محاضرة ألفت في مدرسة الطرق والكباري الوطنية عن قناة السويس البحرية ، ١٨٧٢ (لوحة ٢ تفاصيل)

أسفل : جزء من مقطع جيولوجي للقناة - فوازان بك . قناة السويس . أطلس ١٩٠٦ (لوحة ١٦ تفاصيل)

وسائل نقل المهارات

لا تُنقل النماذج والمهارات بواسطة الرجال فقط ، بل تُنقل أيضاً عن طريق الوثائق التي تشكل دعامة للممارسات التقنية والإدارية.

لنأخذ مثلاً دفتر الشروط وهو المستند الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة . عند كتابة دفتر الشروط الذي يشمل التدابير الخاصة بتنفيذ الأشغال وتسوية وسداد المصروفات ، لاحظ هانيت_كليري أن نموذج المستند الذي أقرته الشركة ، "باستثناء بعض التعديلات، أخذ عن دفاتر مماثلة تستخدمها شركات السكك الحديدية المختلفة . ويبدو أن مصممه قد إستند عند

كتابته بصفة عامة إلى نصوص مشتركة أخذت عن شركات الشمال والجنوب التي نقلتها بدورها مثل الشركات الأخرى عن الدفتر العام للطرق والكباري الصادر في ٢٥ أغسطس ١٨٣٣^(٣٥).

رغم ذلك ، فقد تم تعديل هامش المستند لمراعاة الظروف الخاصة بأشغال الخليج لاسيما إمكانية اللجوء إلى مواد إستهلاكية من مخازن الشركة أو احتمال إستجار معدات من ورشها . وبمساعدة دفاتر شروط الإدارة ، أقامت الشركة نمطاً من العلاقات مع شركات المقاولات مماثلاً لذلك تستخدمه إدارة الأشغال العمومية مع مقاوليها، كما استفادت الشركة أيضاً من خبرة الإدارة التي أثرت هذا النوع من المستندات.

و قد اعتمدت الشركة أيضاً المعايير التي قررتها شركات السكك الحديدية عند إستلام المعدات المطلوبة للبنائين . ففي الطلب المقدم في ١٨٦٦ إلى " بيت " جوان (Gouin) لشراء ١٢ قاطرة بخارية (locomobiles) مخصصة لورشة الجسور المائلة في الشلوف وسهل السويس ، أخذت بعض المعايير عن مصدر واضح : " يتم تسليم كل آلة إلى ورشكم بعد محاولة تشغيل الفرامل مدة ست ساعات متتالية وتنفذ هذه التجربة بعناية دقيقة جداً وحسب الشروط التي تفرضها شركة سكك حديد دي نور (الشمال)^(٣٦)

وبخصوص توريد الصلب استعملت دفاتر شروط خاصة بالمناقصات وضعتها البحرية الإمبراطورية ، وقد حصلت الشركة على عدة نسخ منها لإستعمالها كنماذج . وهكذا نجد في وثائق ومحفوظات شركة القناة نسخ من " دفتر الشروط الخاص بالمرادات بتعهدات مختومة لإمدادات الصلب المنصهر لتنفيذها في المؤسسة الإمبراطورية في أندريه (Indret) بتاريخ مايو ١٨٦٠ أو صفقة بالتراضي لتوريد الصلب المملط المحص إلى ميناء روشفور (Rochefort) في عام ١٨٦٢ ، أو تعهد إضافي لتوريد الصلب المنصهر إلى ميناء شربورج (Cherbourg) في عام ١٨٥٦^(٣٧) . ولا يعتبر بالطبع وجود هذه النماذج مجرد مصادفة . ومن ناحية أخرى تعتبر شركات المقاولات التي تختارها الإدارات وكأفها إذا صح هذا القول حاصلة ضمناً على علامة الجودة. وهذا ما أوحى به موقف المهندس هانيت_كليري ، رئيس إدارة باريس . فالعقد الذي أبرمه التاجر ويليام دي ما توس (William de Mattos) ، مُورد الفحم الإنجليزي للشركة ، شمل بنداً يحدد قائمة المناجم التي يستطيع التزوّد منها . وهي وسيلة تضمن للشركة التأكد من جودة الفحم الذي يُورد لها . وبعد فترة من توقيع العقد في يوليو ١٨٦٣ طلب التاجر الإنجليزي السماح له بإضافة ستة عشر منجماً جديداً على القائمة الأولى . وقد قبل هانيت_كليري بتوسيع قاعدة مصدر توريد المورد الإنجليزي بعد أن لاحظ أن سبعة من المناجم الجديدة التي ذكرها دي ماتوس

من بين المناجم التي تتعامل معها البحرية الفرنسية ^(٣٨). وبنفس الطريقة تقدمت الشركة إلى مصانع شوليه (Chollet) مورد الجيوش ^(٣٩) عندما إحتاجت إلى شراء كمية كبيرة من معلبات الخضر واللحم المسلوق لمواجهة صعوبة تموين بعض المخيمات.

واستخدمت الشركة نشرات وإستثمارات وكشوف حسابات وبطاقات ومفكرات من نماذج مختلفة حُدّد مضمونها بعناية لضمان إدارة مصالحها المختلفة وعلاقتها مع مقاولين الباطن . وقد نُقل تصميم معظم هذه المستندات العينية الخاصة بأعمال الإدارة بدقة متناهية عن نماذج موجودة بإدارة الأشغال العمومية . والنقطة التي ينبغي إبرازها هنا أنه تم نقل المهارات والمناهج عن طريق هذه المستندات المختلفة التي تعتبر آليات حقيقية للإدارة .

في أكتوبر عام ١٨٦٣ طلب فوازان ضرورة وضع قائمة جرد الآلات الدقيقة المتوفرة للأشغال وأوضح بأن : " يتم العمل بالصيغة المستعملة في الطرق والكباري كنموذج " ^(٤٠) وقد نقل العاملون السابقون بإدارة الأشغال العمومية والمهندسون والمراقبون ومفتشوا العمال نماذج التنظيم وأعادوا نشر خبرات الإدارة المألوفة لهم . ويجب الاعتراف أن تلك الإدارة كانت رائدة في هذا المجال . فمنذ بداية سنوات ١٨٥٠ بُذلت الجهود فعلا من أجل تنسيق المناهج وتوحيد الممارسات. ففي عام ١٨٥٠ ، قدمت وزارة الأشغال العمومية إلى جميع المهندسين منهجاً يجب عليهم إتباعه عند القيام بصياغة المشاريع ^(٤١). ويوضح هذا المنشور بدقة الطريقة التي يجب إتباعها عند وصف تفاصيل مراحل المشروع المختلفة - مخطط المشروع وتصور المشروع النهائي - وكذلك المستندات الواجب تقديمها في كل مرحلة منها وعمل التنسيق العام للملف . ويحدّد المنشور بكل دقة القواعد التي يجب مراعاتها والإجراء الذي يجب إتباعه والمستندات الواجب تقديمها كما يحدّد المقياس الذي يجب استعماله في الرسومات البيانية. ولم يترك المنهج مجالاً للصدفة، علاوة على ذلك، تخضع الممارسات اليومية في إدارة الطرق والكباري إلى إجراءات شكلية موحدة تماماً. والدليل على ذلك يكفي الرجوع إلى التعليمات الصادرة بشأن الإدارة في مكاتب مهندسي الطرق والكباري ^(٤٢) بتاريخ ٢٨ يوليو ١٨٥٢ وفي مقدمتها : " تركت الإدارة حتى الآن للسادة المهندسين العناية بترتيب تفاصيل التنظيم الداخلي لمكاتبهم [...] وقد حان الوقت لتقويم هذا التنظيم بإدخال التنسيق القائم بالفعل في أقسام مصلحة الطرق والكباري الرئيسية " ويحتوي صندوق آليات مهندس الطرق والكباري على السجلات والكشوف ونماذج المطبوعات وقد أعتاد إستخدامها ليعرض أنشطته أو يضمن إدارة القسم المسئول عنه. ولتوضيح درجة تفاصيل القواعد المنصوص عليها والصلة الوثيقة القائمة بين أساليب العمل ونموذج التنظيم المتبع ، يمكن الرجوع إلى الإجراء الذي يجب إتباعه عند إرسال أجزاء من ملف كبير المهندسين إلى المهندسين العاديين : "

عندما يرسل كبير المهندسين موضوعاً إلى مهندس عادي سواء لطلب معلومات أو لمعرفة وجهة نظره أو مجرد الاتصال ، عليه توضيح الأسباب. ويكتب أمر الإرسال على الطرف الذي لصق عليه طابع التسجيل أو على الكشف، مؤرخاً وموقعاً عليه. ويضيف كبير المهندسين عند اللزوم إرشادات خاصة على المستند نفسه أو عند الحاجة عن طريق خطاب التوجيه " (٤٣) .

مثل آخر للقواعد المطبقة في الإدارة وهو يتعلق بإعداد الملفات وترتيبها: " يجب أن تكون مسودات المراسلات والتقارير والمستندات المكتوبة ورسومات المشاريع مطابقة تماماً لأصل المستندات المرسله [...] وترتب أسوة بالمستندات المرسله إلى المهندسين والتي يجب أن تظل في مكاتبهم حسب طبيعة الموضوعات وتحفظ مُصنفة في صناديق من الكرتون . . ويوضع على المسودات أرقام التسلسل الزمني وتغلف من جديد بواسطة حافظة أوراق نموذج رقم ٢٥ يكتب عليها رقم وتاريخ وموجز عن كل مستند. وعلاوة على ذلك ، يكتب على المستند نفسه دلالة موجزة لعنوان الملف في الحالات التي لا يكفي فيها العنوان أو طبيعة المستند على التعرف مباشرة على المجموعة التي يُلحق بها. وينقسم كل ملف، عند الحاجة، إلى مجموعات أعيد لف كل منها بحافظة أوراق كما ذُكر من قبل. ويكفي، في هذه الحالة، بالكتابة على غلاف الملف عنوان كل مجموعة " (٤٤) .

إن هذه التعليمات الدقيقة التي تفنن أساليب العمل والأشكال المادية التي تتخذها الأنشطة المختلفة ، تنظم عملية سير الأعمال الإدارية التي يقوم بها المهندس وتكفل تجانس الممارسات. ويميل بالطبيعة المهندسون والمراقبون خريجي الطرق والكباري عند تعيينهم في الشركات الخاصة ، قدر ما تتيحه لهم الظروف ، إلى استعمال هذه المناهج وتطبيق فنون هذه الإدارة . وهذا ما حدث في ورشة قناة السويس حيث نجد المستندات مطابقة أو شبه مطابقة لمستندات التنظيم الإداري.

وقد تم تعيين معظم الفنيين الذين استخدمتهم الشركة في ورشة قناة السويس على أثر تقديمهم بطلب عفوي للعمل . وفي أغلب الأحيان كان المتقدمون يعملون بشركة أو إدارة حينما كانوا يتقدمون بطلبهم إلى إدارة شركة القناة بباريس . وكانت تطلب من المرشح للوظيفة أن يقدم معلومات عملية مختلفة مثل الشهادات والخبرات السابقة كما تطلب منه شهادات من المستخدمين السابقين وطبيعة الوظيفة والمرتب . وعند ما تظهر الحاجة من جديد إلى تعيين فنيين يقوم رئيس الإدارة في باريس بفحص الطلبات ولا يتردد في اللجوء إلى المستخدمين السابقين للإستعلام عن كفاءات المتقدم إذا لم يقدم من نفسه تلقائياً شهادات موقع عليها منهم . وتشكل البطاقات الشخصية المستعملة في الشركة لإدارة شئون الأفراد مثلاً آخرأ مأخوذاً عن أساليب تنظيم الإدارة. والإستمارة بعنوان " معلومات لتذكية طلب وظيفة قدم في يوم ... ١٨٦.... " تتيح بطريقة


موجزة ومتناسقة جمع إرشادات خاصة عن كل مرشح لوظيفة بالشركة. علاوة على ذلك ، يملأ المسئول سنوياً عن كل عامل من عمال الشركة " بطاقة لوصف الخدمات التي قام بها في عام ١٨٦٠... ". ويرز هذا المستند المهام التي قام بها أو الإقتراحات التي قدمها رئيس القطاع أو مدير عام الأشغال للحصول على علاوة أو مكافأة و الأدلة المبررة لذلك . ويشبه هذا المستند في الشكل وفي المضمون المستند المستخدم في إدارة الأشغال العمومية . وهناك مثل آخر للتشابه لا مجال فيه للصدفة وهو استعمال الشركة لمصطلح " أجازة غير محدّدة " وهو تعريف مأخوذ عن لغة الإدارة لوصف حالة العمال الذين عينتهم الشركة وتركوها فترة للعمل لحسابهم الخاص كمقاولين لتنفيذ أشغال لها . وإذا كان فوازن قد سار طويلاً على نهج ممارسات الإدارة في مجال شئون العاملين إلا أن هناك بعض المواقف واجهها ودفعته إلى إدخال أساليب عمل مختلفة تماماً . فنجد . على عكس ما هو متبع في هيئات الطرق والكباري أن السلم الوظيفي في إدارة الأشغال العامة بشركة القناة يتطور بسرعة بما فيه الكفاية ، حيث أن الوظائف الثابتة لا تدوم إلا بضعة شهور . وذلك لأخذ تطور الأشغال بعين الاعتبار . ويتم تعيين العاملين في قسم أو آخر من الأشغال حسب الاحتياجات والأولويات. علاوة على ذلك ، هناك اختلاف جوهري آخر ، فالظروف الشاقة للغاية التي تنفذ فيها الأشغال، جعلت وظيفة تشغيل العمال عملاً دائماً . ورأى فوازن أن " البقاء على عدد محدّد من العاملين في مصر يلزم تجديد هذا العدد باستمرار " ^(٤٥) إذ أن مدة بقاء الفنيين بالشركة للعمل بالورشة لا تزيد في المتوسط عن أربع سنوات إلا قليلاً ^(٤٦) ولقد استمر خمسة فقط من الفنيين البواصل في العمل أكثر من عشر سنوات، على العكس من ذلك ، لم يستمر بعض الفنيين في العمل إلا بضعة شهور. وترجع الاستقالات قبل نهاية العمل (لأسباب صحية أو لظروف شخصية وخلافه) أو الإقالة (لأسباب صحية وعدم صلاحية أو سوء سلوك أو إلغاء الوظيفة أو غير ذلك) أو الوفاة. ومن بين الفئات التي دُرست بشكل خاص ، فئة العاملين الفنيين و عدد هم ١٨٧ شخصاً . وبين السجل إثنتي عشرة حالة وفاة معظمها بسبب أمراض أصابتهم في الخليج مثل التيفود والدوننتريا والكوليرا وضربة الشمس .

و يعتبر الموجز المستخدم بشأن أسعار الأعمال الجارية هو المرجع التقليدي الذي تستعمله إدارة الأشغال العامة. وهو عبارة عن كتاب صغير الحجم تعاد طباعته باستمرار منذ عام ١٨٣٩ وعنوانه "قائمة أسعار موريل" (Morel) ويحدّد هذا الكتاب أسعار الأشغال العمومية الجارية في باريس وفي يناير عام ١٨٦٢ طلب فوازن من إدارة الشركة بباريس إرسال عدة نسخ من هذا النموذج إلى الخليج " حتى يمكن مراقبة الأسعار الموضحة في حسابات شركة المقاولات يسر وفاعلية " ^(٤٧) وفي شهر يوليو عام ١٨٦٩ تقدم بوشيه (Pouchet) بطلب مماثل ^(٤٨).

ويتم تجميع البيانات المدونة في مختلف الورش بصورة شهرية في كل قطاع ثم في كل قسم ، ثم تقوم سكرتارية الإدارة العامة بتلخيصها في تقرير منتظم حول حالة الأشغال إذ يجب على فوازان إرساله بالضرورة إلى اللجنة الإدارية . ومن المهم التوقف بعض الشئ عند الشكل الذي يأخذه البيان الشهري للأشغال ، فهو دليل على حداثة آليات الإدارة التي تزودت بها الشركة . حين تولى فوازان إدارة الأشغال ، اقترح أعضاء اللجنة إعادة النظر في شكل وتنظيم المستند المرسل لهم دورياً: " ترى اللجنة أن كشوف وصف الأشغال قد تزداد وضوحاً ودقة إذ بدلاً من أن تظهر في شكل تقارير ضخمة حيث تبدو البيانات من نفس النوع مشتتة ، اقتصر عرضها بيانياً بواسطة خطوط وألوان مختلفة موضحة على الخرائط والمقاطع الطولية أو العرضية تلك التي تم طباعتها على الحجر من قبل والتي يرافقها جدول إجمالي وتقرير لايسجل عليه سوى الأحداث والملاحظات القليلة التي قد لايتسع وضعها على الرسومات و المقاطع أو على الجدول الإجمالي" ^(٥٩) وبناء على ذلك ، أعد مكتب الأشغال في باريس نموذجاً لمخطط " من نوع النماذج التي صممت لتستخدمها إنشاءات شركات السكك الحديدية والمسماة خطوط السير" ^(٦٠) ولكن هذا المخطط الذي يتيح التعرف " بمجرد إلقاء نظرة على حالة التقدم التدريجي في تنفيذ الحفر" (٥١) لم يستخدم فعلاً إلا منذ عام ١٨٦٦ ، ربما لأنه بدأ الحصول على نتائج منذ ذلك الوقت فقط . و سوف تتولى إدارة باريس من الآن فصاعداً إعداد هذا المخطط شهرياً من خلال البيانات التي ترسلها الإدارات المصرية عبر التلغراف ^(٦١).

ومن ناحية الشكل ، يبلغ طول المستند حوالي تسعين سم وعرضه حوالي ثلاثين سم ويتم طيه في أربعة أجزاء متساوية لسهولة تداوله . على النصف الأعلى رُسم مقطع طولي للقناة لإيضاح تطور الأشغال ، وكذلك تضاريس الخليج ومستوى البحر والحد الأعلى للقناة وكذلك المسافات . و تمثل الأجزاء الملونة بالأسود على هذا المقطع الأراضي الممهدة وأما المنطقة التي تُركت بيضاء فهي تصور الكتل التي سوف يتم استخراجها . ووضحت حدود قطاعات العمل المختلفة وسُجل على كل منها الكمية المطلوب استخراجها والكمية التي استخرجت في الشهر والكمية الباقية استخراجها . بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت بواسطة الرموز الأماكن الخاصة بالآلات المختلفة ومجموعات من ٢٥٠ عامل حفر ولُجِد في النصف الثاني من المستند مقطعين عرضيين للقناة ، أحدهما عرضه كبير والآخر عرضه صغير وكذلك نُجِد بداخل الإطار ملاحظات لفيكتور كاديا ، رئيس المهندسين بإدارة باريس ، عن نتائج الشهر . بناءً عليه ، يضم مستند تطور الأشغال رسومات في صورة مقاطع طوليه ومقاطع عرضية وجدول يلخص الأرقام الرئيسية المبثرة على المقطع الطولي وكذلك بعض ملاحظات رئيس الإدارة الباريسية . و لهذا المستند ثلاث وظائف تلخصها هذه الأفعال : [لخص ، أظهر ، ألقع] ؛ أي المقصود أولاً تلخيص المعلومات الأساسية عن تطور

الأشغال وثانياً إظهار للعيان المعطيات وتحديد مكافئ بواسطة الرموز ومقطع يمثل أرض الخليج الذي يمر به القناة ، وثالثاً إقناع لجنة الإدارة بحسن سير الأشغال ولرب الانتهاء منها. وبذلك تكون الشركة قد ابتكرت واحدة من لوحات القيادة الأولى إن لم تكن ابتكرت أول اللوحات لتابعة الأعمال . يعتبر تمثيل مواقع المعدات والرجال بالقياس إلى التضاريس ممارسة ليس لها سابقة حسب علمنا حتى لو كانت الطريقة قد تقارب طريقة شارل مينار (Charles Minard) مهندس الطرق والكباري الذي قدم في نفس الفترة الجداول البيانية والخرائط التصويرية (٥٣) . بناء على ذلك، ويمكن إضافة أسلوب عرض حالة الأشغال ووسائل التنفيذ والأهداف إلى رصيد ورشة قناة السويس.

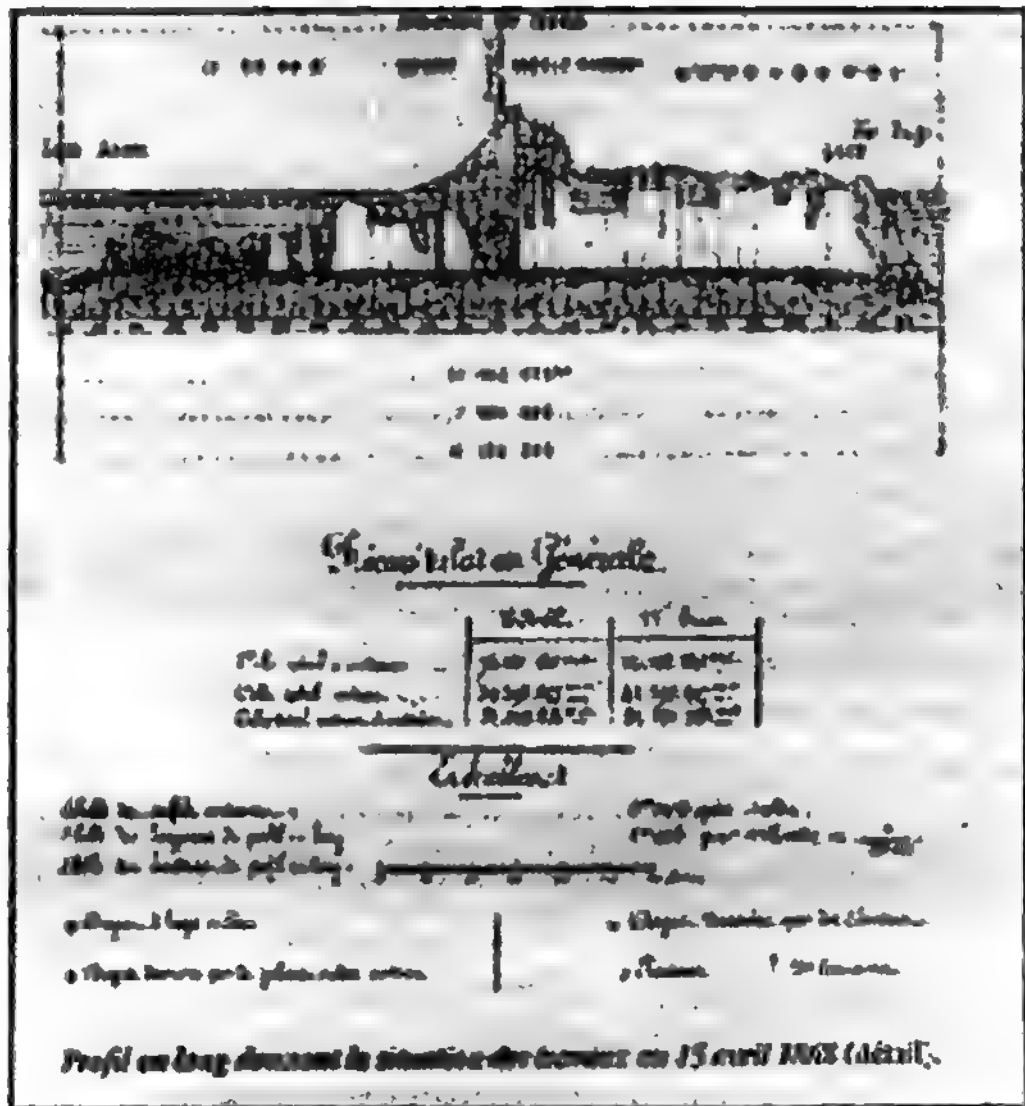

قطاع السويس

مقطع طولي لحالة الأشغال في ١٥ أبريل ١٨٦٨ (تفصيل)

الاستفادة من شبكة العلاقات

أما فيما يخص التعيينات التي تقوم بها الشركة ، فإن المتقدم يُقبل إذا جاء من طرف أحد أفرادها سواء كان إدارياً أو عاملاً. وغالباً ما تؤدي التوصيات الشخصية إلى تركيز بعض الطلبات التلقائية. و في كل الأحوال يظهر في الطلب المقدم الذي يملأه المرشح مكان بعنوان "تحت رعاية". وخلاف هذه الطلبات التلقائية العديدة يتم التوظيف بالشركة عن طريق شبكة المعارف. ولا يمكن أن نتصور قط اليوم امكانية كشف شبكة العلاقات ومحاولة إعادة تشكيلها بشكل منظم. ففي الواقع ، بواسطة إشارة غير مباشرة في الرسالة أو تلميح في بطاقة وصف الشخصية ، تظهر العلاقات و الروابط أوتبدو للعيان معالم الصلة القديمة بين شخصين. فقد امكن هكذا إثبات أن فرانسوا فيلير (François Viller) ، مهندس الطرق والكباري ، علم عن طريق رينو (Renaud) ، رئيس اللجنة الإستشارية ، بخلو الوظيفة التي كان يشغلها من قبل مانو في قطاع الإسماعيلية^(٥٤). و مع ذلك ، يظل هذا النوع من المعلومات جزئياً و متفرقا حتى لو أمكن تحديد بعض قادة الشبكات . وبدا واضحاً في خضم التعيينات الأولى للشركة أن المدعو بوردون (Bourdon) قام بهذا الدور. ولحقيقة ان هذا المهندس المدني والمقاول السابق خطط سكة حديد ليون - جنيف الذي لا نعرف عن مسيرته المهنية غير أنه مرّ مرور الكرام عدة شهور بالشركة ، عُيّن رئيس لإدارة الأشغال بباريس واصطحب معه عدداً كبيراً من مستخدميه السابقين . ولما كانوا قد إعتادوا العمل معاً، فإنهم أعادوا تشكيل مجموعة من أفراد فريقهم القديم^(٥٥) في ظل هذه الظروف الجديدة. وقد لوحظت نفس الظاهرة على أثر تعيين فوازان الذي استدعى فعلاً بالقرب منه العديد من رؤسياه السابقين. هكذا نرى وصول المراقبين دانيال بالاه (Daniel Palaa) وفرنسوا بيتس (François Bettès)^(٥٦) وجان رو (Jean Rous) ، الذين عملوا تحت إدارته عندما كان يدير مقاطعة بُو (Pau) وإدارة المياه في باس بيرنيه (Basses Pyrénées) . وتكررت على التوالي هذه الظاهرة حيث أنه في عام ١٨٦٥^(٥٧) بناء على طلب و توصية من بيتس تم توظيف هنري لالوج (Henry Lalheugue) ولاسال (Lassale) المساعدين السابقين لأوليرون (Oléron). وقد اتسع نطاق هذه الظاهرة للدرجة اثار رئيس مهندسي بيتس السابق إذ رأى " بأسى أن بيتس حاول ومازال يحاول تفكيك إدارة المحافظة بمحاولته جذب أفضل المستخدمين المساعدين بها الي السويس^(٥٨) " ويكفل مثل هذا الأسلوب في التوظيف بعض الضمانات بالنسبة لكفاءة الأفراد المهنية التي تقوم الشركة بإستخدامهم وضمان سرعة إندماج القادمين الجدد . و بالنسبة للشخص المستخدم إذا استطاع بالفعل مخاطبة شخصيات معروفة وموجودة في الورشة تستطيع أن تصف له الموقف الفعلي في الخليج وتساعدته عند وصوله وأثناء إقامته فإن ذلك يمكن أن يؤثر على قراره. لقد كان بعد الورشة عاملاً ، دون شك ، على ترجيح

هذا الأسلوب في التعيين . ولنوضح أخيراً ، أنه في الوقت الذي كانت فيه الإحتياجات تفوق العروض التلقائية ، يقوم فوازان بتوزيع كتاب دوري على مهندسي الطرق والكباري المستخدمين في شركات السكك الحديدية بهدف تركية أو إرسال موظفين إليه. ^(٥٩)

ولا تلعب شبكات العلاقات دوراً عند التعيين فحسب ، إذ إضافة إلى مهارة الفني وتجاربه السابقة فهو يحمل معه شبكة معارف عند التحاقه للعمل بالشركة . يستعين بها الموظفون في مكتب باريس بصورة يومية . فقد استفاد هانيت-كلاري و فيكتور كاديا الذي خلفه من شبكة علاقاتهما الشخصية للحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات أو مساعدة فنية . ومن ثم لم يتردد هانيت-كلاري من الحصول على معلومات من زملاء سابقين آخرين من خريجي المدرسة متعددة التقنيات بباريس والاستعانة بأواصر شبكة الزمالة في الدراسة: " زميلي العزيز . لما كنت بصدد شراء سلاسل حبال لرافعات بمصر ، أرجوك التكرم بإفادتي إن كنت تعرف مصانع أخرى خلاف مصنع جيريني (Guérigny) تصنع هذه الأنواع من السلاسل وما هي أسعار بيعها في السوق" ^(٦٠) أو في رسالة أخرى كتب : " زميلي العزيز . قبل أن أرد على طلب (اسم غير مقروء) الجأ إلى كرمك وأرجوك إفادتي عن هذا الوكيل لو كان في إدارتك معلومات عنه تستطيع بها الشركة تقييم الخدمات التي يمكنه أن يقدمها لها" ^(٦١).

وتنتشر أيضاً الأخبار عن التجارب الجارية في فرنسا بواسطة شبكة مهندسي الطرق والكباري. كتب مهندس محافظة باص بيرينيه (Basses Pyrénées) تلقائياً إلى مانو (Mantout) ليخبره في نفس الوقت عن وجود نظرية أعدها ويليام - ب - تريشار (William B Trichard) المهندس المدني عن سبب تكوين جروف رملية بالقرب من الشواطئ و ليخبره عن آخر التطورات التي لوحظت بخصوص تلك التي تكونت في ميناء بايون (Bayonne) ، إذ يخشى من حدوث نفس الظاهرة في بور سعيد ^(٦٢). وإذا منحت الفرصة ، يرسل المهندسون بالورشة إلى زملائهم بمكتب باريس صياغة للمشكلة المطلوب حلها ومعها في نفس الوقت يشيرون إلى اسم شخص للرجوع إليه . ففي المثل التالي ينصح فوازان فيكتور كاديا بالاستعلام لدى مهندس ملاحه في قناة دي سنتر (du Centre) يُدعى دورو (Dureault) : " كُلفت بتدبير إرسال ثنائي رافعات مزدوجة بصناديق في أسرع وقت ممكن إلى مصر لتشغيل عيون سد مَسْرَب الماء وذلك لاقتراب وصول قناة الماء العذب إلى السويس. واستبجح لنفسي أن أطلب منك بعض المعلومات تتيح لي شراء وإرسال هذه الآلات في حينه. السيد فوازان مدير عام أشغالنا حينما أوصاني بإختيارها على غرار نمط وشكل آلات قناة ملاحه دي سنتر ، طلب مني أن أكتب لك بهذا الصدد وأن أطلب منك إن كان يمكننا الحصول من الإدارة التي تديرها التنازل عن بعض هذه الآلات لأرسلها فوراً إلى مصر" ^(٦٣)

وعند دراسة كيفية انتشار الخبر عملياً وإبراز الدور الذي تلعبه الشبكة التي يشكلها مهندسو الطرق والكباري المنتشرون في جميع أنحاء فرنسا ، نلمس بوضوح أحد العناصر التي بواسطتها تتوطد روح التضامن ومبدأ الجماعة .

وفي عام ١٨٦١ عمل هانيت-كليري ، مهندس المناجم ، مهندساً استشارياً للشركة ولكنه لم يترك مهام عمله في وظيفته الأصلية وكان على يقين أن الشركة تستطيع الاستفادة من هذا الوضع: "يمكن أن أضيف أن الشركة لها مصلحة إذا حرصت ، بشكل أو بآخر وحتى يصبح قسم المعدات على أحسن وأكمل وجه ، أن تحافظ على بقائي بقدر الإمكان في وظائف تتيح لي من خلال العلاقات الرسمية التي تنشئها أن أنفذ إلى التنظيمات و أدل الشركة على كل التفاصيل التي يمكن أن تستفيد من محادثاتها في شتى المجالات والتي سيكون التعرف عليها مجدياً في كل الأحوال" (٦٤) ويشير مهندس الدولة عند ذكره "هذه العلاقات الرسمية " فعلاً إلى سبب من أهم أسباب عدم استهانة الشركات الخاصة بضم بعض مهندسي الهيئات إليها.

وعند استحالة انتداب موظف من إدارة باريس للإشراف على تصنيع أو إستلام شيء ما ، توكل هذه المهمة إلى شخص آخر من غير العاملين بالشركة ولكنه يكون قد مارس من قبل وظيفة لحساب شركة أو إدارة أخرى وتسدد له الشركة أجراً بالقطعة مقابل الخدمة التي أداها. إذ غالباً ما يستدعي رؤساء إدارة باريس مراقبين بالطرق والكباري ، وقد أنتهز هانيت - كليري فرصة علاقاته مع ليروه (Leroy) مراقب من بولوني سيمار (Boulogne-sur-Mer) والذي كان مشرفاً على جودة الأسمنت المرسى للخليج (٦٥) وذلك ليستفسر منه عن محاولات المقاول كستور (Castor) بصدد استخدام جرّاف في هذا الميناء (٦٦). كما تتيح شبكة زملاء الطرق والكباري بانتشارها في أنحاء الوطن ، لكل عضو من أعضائها ليكون على علم بآخر تطورات التقنية أينما كانت. وتخطب الشركة خبرات مهندسي البحرية بخصوص الرقابة على تصنيع الماكينات . فقد قام هانيت-كليري ، في فبراير ١٨٦٣ ، بتكليف المهندس أشيل زاني دي فيرانتي (Achille Zani de Féranty) ، مهندس الإنشاءات البحرية الذي كان يعمل في مارسيليا ، بالإشراف على الجرافات التي تصنعها شركة مصاهر الحديد والورش بالبحر المتوسط وكذلك كلف المهندس لويس كوررد (Louis Corrad) بمهمة مماثلة في شركة مقاولات جوان (Gouin) (٦٧). أما إرنست كاديّا (Ernest Cadiat) الذي كان يعمل في ذلك الحين لحساب مقاولات جوان والذي سوف تقوم شركة القناة بتعيينه ، فقد طُلب منه الإشراف على جودة القوارب المسطحة ذات الشراع (هرهور Hopper-barges) المصنوعة في بلجيكا .

إن أهم الصعوبات التي تعرضت لها إدارة هذا المشروع الضخم تكمن في تنسيق الأنشطة فيما بينها في مختلف مواقع وجود الشركة خاصة في باريس ومارسيليا والخليج. وهناك مشكلة إضافية

وهي تعدد كثرة المنتجات المستوردة في منطقة الخليج واختلاف الأماكن الواردة منها، وإذا كان من السهل الحصول في مصر على معدات أولية لعامل حفر من أهل البلد وأيضاً بعض المواد الغذائية ، إلا أن أغلب المؤن اللازمة للورشة يجب أن تصل من أوروبا. فيأتي الخشب من تريستا وكرواتيا و المجر ^(٦٨)، وبأتي القمح اللازم للآلات البخارية من بريطانيا ^(٦٩). أما الباقي مثل مواد الإستهلاك العادية و الآلات و الأجهزة والأوعية والماكينات الضرورية للورشة فتستورد من فرنسا. وتنوع المعدات التي تصل إلى الخليج بصورة كبيرة للغاية وتفرغ بالآلاف في الورشة : مسامير بصمولة ، المسامير ومواد أخرى للغلايات — مسما مير بيرمة ، رزات ، سبلونات، خطافات ، مزالج (توابيس) ، مفصلات ، وكوالين الخ . وتساهم عدة مراكز تصنيع فرنسية في كل أنواع المؤن دون تمييز ^(٧٠) : باريس والمنطقة الباريسية ، منطقة مارسيليا ومنطقة ليون وسانت إتيان ومحافظات الشمال (Nord) والهيرو (L'Hérault).



* ميناء البحار

● منطقة مناجم الفحم الجيري

المتجم	مواني الشحن	بريطانيا العظمى
جنوب يوركشاير	جرمسي الكري	إنجلترا
ييلسيد وست هارلي جونسهونس هارلي لامبارت ويست هارلي ييلسيد كوليري		
شمال ولس لانكشير	ليفربول	
ويست مينستر بريمو مين شمال ولس مين ليردس ويلش هارلي	بيركنهد	
جوزيف أوبر فور فيت ميرثر ترويديهن دونرفن ميرثر بولفا مارين ميرثر كومامان ميرثر دواليز ميرثر كارز ميرثر	كارديف	بلاد الغال
بولز دوفرين تويليجار	نيوبورت	
أبرؤدار ميرثر فوذار جيلز أبرؤدار مانتلين ميرثر واينس ميرثر	موانسي	
نيكسون ميرثر	ميلفورد	
لندن دياموند	أردروسان تروون	إسكتلندا
جريسيسك (هيو) بورت وسينيشاس (جار) جراند كومب (جار) بيسيج (جار)	مارسيليا	فرسا هيو/ جار

تكوين الفحم لشركة بوريل ولافالي وشركائهما



الموردون بالفرنسيون : التوزيع حسب المقاطعات

ملاحظات .

رسمت هذه الخريطة بعد فرز الأسواق والسجلات ورسائل صفقات مقاولات كوفريه وهاردون وبوريل ولافالي وشركا لهما . وتخص هذه الصفقات الماكينات والآلات والمعدات والمواد الأولية والتنوعات وإجمالاً ، تم حصر ٣١٩ مورداً منهم ١٩ من الخارج (٧ من إنجلترا و ٢ من أسكتلندا واحد من ترينستا وواحد في ميسين و ٥ من بلجيكا و ٢ من هولندا واحد من الإسكندرية) . وأعتبر أن مكان المؤسسة هو العنوان البريدي أو العنوان المدون على أوراق رسائل المورد . وغالباً ما يكون عنوان المقر الاجتماعي وليس اسم مكان إنتاج البضائع الواردة . هذا السبب لا تعتبر نتائج باريس بالضرورة معبرة عن أماكن التصنيع الفعلي للبضائع ، و نفس الشيء بالنسبة للمدن الكبرى .

وتعطي الإجراءات التي اتخذت لطلب المعدات مثلاً جيداً عن كيفية حل مسألة التنسيق على المستوى الإداري . فقد استلزم كتابة مراسلات كثيرة وتكرار نسخ العديد من المستندات وإحترام المواعيد المحددة التي كان من الضروري متابعتها في آن واحد في أماكن عديدة . ورداً على إحتياجات مدير عام الأشغال في مصر ، قامت إدارة باريس باختيار أفضل الموردين والتعامل معهم ، وإستلام المعدات وسداد الفواتير المستحقة المتعاقبة كما تحملت أيضاً مسؤولية متابعة إرسال البضائع من مركز التصنيع إلى الورشة عن طريق الإتصال بإدارة مارسيليا . وكانت أهمية العمل الإداري الذي يشمل هذا النشاط كبيرة . فعندما تم طلب شراء أدوات مكتبية في ١٥ يوليو

١٨٦٩ كوزان (Cousin) من تاجر الورق بباريس و مورد الشركة المعتاد ، طُلب من الشركة إرسال الطرود مباشرة إلى مارسيليا لملئوها السيد سانت-اود الذي يجب إفادته بالإرسال وبشرط أن تنقل الطرود بواسطة السكة الحديد ب.ل.م (PLM باريس - ليون - مارسيليا). وتلتزم من جانبها إدارة باريس بإرسال صورة من الطلب إلى إدارة مارسيليا لكي تكون على علم بالطلبية. ^(٧١) ويتيح عدد كبير من السجلات والكشوف أو الدفاتر بقسيمة ، التي يتم تحديث وقائعها بانتظام ، لموظفي إدارة باريس القيام بهذه الإدارة. ويرسل مدير الإدارة بباريس إلى الإسماعيلية كل شهر " التقرير الأدبي " الخاص بإدارة باريس شاملاً " المعلومات العامة عن الطلبات الجاري تنفيذها والمطلوب تدبير أمرها " ^(٧٢)

وتتعلق الطلبات التي تقوم الشركة بإدارتها من جهة باحتياجاتها من كل أنواع المون ومن جهة أخرى طلبات الآلات الضخمة التي تحتاجها شركات المقاولات . وفي الواقع و نظراً للارتفاع الكبير في ثمن بعض الماكينات مثل الجرافات فإن الشركة تقوم بسداد نسبة مئوية من المبلغ المطلوب مقدماً . و لما كان يتدخل في كل هذه الطلبات عدد كبير من الشركاء كان لابد من التنسيق بين أعمالهم فوكلاء شركات المقاولات (يشرفون على التصنيع أو استلام الماكينات) ، و المقاولون من الباطن في شركة المقاولات (مهمتهم الاستلام في مارسيليا وإعادة التصدير إلى الخليج مثل بازان (Bazin) ، أما وكلاء المورد أو الصانع ووكلاء الشركة (إدارة الشركة بكل من باريس ومارسيليا) . ولنضرب مثلاً بطلب شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما إثني عشرة قاطرة بخارية من مصنع جوان (Gouin) مخصصة إلى ورش الجسور المائلة في الشالولة وسهل السويس. ويوضح الطلب بالتحديد أن الماكينات سوف تصدر من ورش المصنع مباشرة إلى محطة سكة حديد ليون في مواعيد محددة مع توقيع غرامات عن كل يوم تأخير. ويفترض تسليم المحركات مفككة ومغلقة حسب تعليمات وكيل شركة المقاولات المفوض بمراقبة واستلام الماكينات. ويجب على الصانع شحن كل ماكينة من المحطة الكبرى بمارسيليا وتسليمها إلى بازان ، مراسل ومقال من الباطن تابع للشركة ، و يجب إرسال إشعاراً بالتفاصيل وذلك في نفس يوم الشحن إلى إدارة الشركة بباريس وكذلك إلى بازان حسب المواصفات التي تحددها شركة المقاولات وعلى مطبوعات سلمت خصيصاً لهذا الغرض. ويعتبر سداد القوائم جزء من التنظيم الإداري للطلبات. كما ينضج السداد لقواعد محددة في التعاقد مع الموردين وذلك على النحو التالي :

(١) يتم سداد ٤٠ % من إجمالي قيمة الطلبية من خزانة الشركة بباريس في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.

(٢) ٦٠% أو باقي ثمن كل ماكينة من نفس الحزينة بباريس بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستلام في مارسيليا عند تسليم فاتورة من أربع نسخ وكذلك محضر الاستلام^(٧٣) وإذا أخذنا في الاعتبار ما يحدث من تعديلات باستمرار على الأسعار ومواصفات المنتج المطلوب يمكننا تقدير حجم العمل الإداري اللازم حتى يصل هذا المنتج في نهاية الأمر إلى ورشة قناة السويس.

نظام المحاسبة : حجر الزاوية لآليات الإدارة

إن أهم ما أخذته الشركة عن مهارات الإدارة يكمن في استخدام نظام محاسبي مطابق لمحاسبة إدارة الأشغال العمومية . و ينبغي أن نذكر بضع كلمات عن المحاسبة قبل إعادة النظر في هذه النتيجة الهامة وعواقبها.

إذا كان إهتمام المؤرخين بالمحاسبة قد اقتصر منذ زمن طويل على نتائجها لسهولة الحصول على بعض المعطيات العددية ، فقد غيرت الدراسات الحديثة النظرة المعتادة إلى ذلك عندما اعتبرت تقنيات المحاسبة نفسها موضوعاً للدراسة والتحليل لتهتم بتطوراتها ومتطلباتها^(٧٤) وقد نتج عن هذه الدراسات أن ممارسة المحاسبة لم يبدأ الحديث عنها فعلاً سواء في الشركات الخاصة أو المصالح العامة^(٧٥) إلا منذ القرن التاسع عشر . ويمكن فضلاً عن ذلك إثبات أنها منذ منتصف القرن لم تكن قد إنتشرت بعد. فقد كان حساب " المصروفات الحقيقية" في مصالح إدارة الأشغال العمومية، على سبيل المثال ، مكسباً جديداً في وقت بدء حفر خليج السويس. كما ينبغي التمييز في هذا المجال كما هو الحال في مجالات أخرى بين الأوامر وضعف الإرادة من جهة والتطبيق العملي من جهة أخرى. فرغم أن المنشورات الدورية والقرارات كانت موجودة من قبل إلا أنها لم تعرف بداية حقيقية لتطبيقها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وتعني كلمة المحاسبة بالتحديد مجموعة من القواعد تساعد على إدارة الحسابات بطريقة منهجية ولكنها أكثر من ذلك وهذا ما نسعى إلى إثباته ، خاصة أن نظام المحاسبة هو الذي يحدد أسعار التكلفة وتحليل تكاليف الإنتاج . ويقدم أيضاً أدوات أخرى مفيدة لإدارة الورشة. ولكن أكثر من نتائج المحاسبة نفسها فقد بدا لنا مهماً دراسة الطريقة التي تتبعها المحاسبة حيث أن إختيار الإطار الحسابي تسحب نتائجه على مناهج العمل.

ونأتي بإيضاح أخير إذ أننا سوف نتم فيما بعد بالمحاسبة المتعلقة بتنفيذ الأشغال دون سواها . ومن ناحية أخرى ، يجب على مستوى الشركة المساهمة وهي شركة القناة إدارة الحسابات التي تتعلق ببيع الأسهم أو توزيع حصة الربح (ربح الأسهم) على المساهمين أو توظيف الأموال أو

إبداعات الحكومة المصرية التي قبلت أن تأخذ على عاتقها الأسهم غير المكتتب فيها والتي لا تعيننا في هذا المقام .

صعوبة إدخال نظام المحاسبة

لم يكن إدخال نظام المحاسبة في ورشة قناة السويس أمراً سهلاً ، ولكن تم ذلك بعد تاريخ طويل من الرفض وبعد صراع مرير . لقد تم فرض نظام المحاسبة أخيراً بفضل عزيمة وصلابة رجل واحد هو فوازان . وقد حدث ذلك على ثلاث فترات من تاريخ توزيع الأدوار بين الشركة وشركات المقاولات من الباطن . تميزت المرحلة الأولى برفض عنيد من جانب شركة المقاولات العامة للأشغال بشأن اتباع نظام المحاسبات الذي أوصت به الشركة . أما المرحلة الثانية فهي فترة إنتقالية شهدت وضع النظام المرتقب موضع التنفيذ في نهاية عام ١٨٦٢ بعد استبعاد شركة المقاولات . و ظهرت بوضوح النتائج الأولى لنظام المحاسبة الذي تم تطبيقه ، منذ سنة ١٨٦٤ التي تعد بداية المرحلة الثالثة .

ولنعد النظر في فترة الرفض . لقد كان برنار مانتو هو أول من اهتم بمجدية موضوع المحاسبة في الورشة . فقد كان يشكو باستمرار من مخالفات شركة مقاولات هاردون العامة . وبعد تكرار الطلب عدة مرات حصل في يونيو عام ١٨٦١ من شركة المقاولات على كشف بالعاملين بها - لكن لم يرضه المستند الذي حصل عليه إذ قال : " لا تنفق المرتبات المحددة لعدد من الموظفين مع ما يتقاضونه في الحقيقة من رواتب معترف بها ومصدق عليها من الما قول العام أو من وكيله المفوض بالتوقيع . علاوة على ذلك لم يظهر في هذا الكشف عدد كبير من الموظفين خاصة من هم في الدرجات العليا مما يدل مرة أخرى على أن شركة المقاولات لم تكن لتقبل الخصوص لإحراجات نظامية تتيح معرفة العمليات التي تحطها المقاولات بستر من الغموض ^(٧٦) " إلا انه في نهاية عام ١٨٦١ إستقال مانتو الذي لم يحتمل بتاتاً الوضع في الورشة بعد أن أحبر فوازان أنه لم ينجح في مراقبة مصاريف شركة المقاولات كما ينبغي حتي هذه اللحظة . "من المثير للدهشة أن شركة المقاولات تعمل منذ عامين ونصف و لم تتمكن من الحصول إلا على تقييم حساب واحد فقط للأشغال . ولا يمكن معرفة سعر عمل أو سعر أية سلعة على وجه التحديد [٠٠٠] ولا نعرف من الذي يثير عجبنا أكثر أهي شركة المقاولات التي خرقّت كل القواعد ، أم الشركة التي تزودها بالمال بلا توقف وبدون حساب [٠٠٠] . لقد كان من المستحيل حتى الآن أن تمارس الشركة رقابة ناححة لأن الإدارة السيئة والسلبية حالت دون المراجعة والتدقيق في السجلات و دفاتر الحسابات " ^(٧٧)

وعندما حل فوازان محل مانتو واصل وحده حملته لتقوم شركة مقاولات هاردون بتقديم أدبي قدر من مستندات المحاسبة. ولم يلبث أن استنكر بدوره مقاومة شركة المقاولات تطبيق الإجراءات المحاسبية ، و منذ شهر يونيو عام ١٨٦١ كتب في تقريره الشهري : " حسابات شركة المقاولات غير مرضية تماماً ويعتبر عدم إدارة الحسابات بصورة دقيقة في معظم مستندات المصاريف أحد الأسباب التي تجعل من مراجعة الحسابات بالنسبة لنا عملية طويلة الأمد وفي غاية الصعوبة . ولم يتم بعد إتباع الأنظمة الجديدة بشكل تام حتى الآن. ولا يصل لمهندسي القطاعات نسخ من كشوف اليومية ودفاتر المخازن، باختصار كل الوثائق التي تستحيل بدونها مراقبة الحسابات . بالرغم من كثرة تكرار طلبنا بإلحاح ، لم يكن ممكناً الحصول على دفتر أحوال للخزينة ولا على كشف عام عن العاملين وهذا ما لا يمكن فهمه " (٧٨)

وعندما لاحظ أن شركة المقاولات لم تخضع بعد لتنفيذ قواعد المحاسبة التي نادت بها الشركة ، لم يخش مدير عام الأشغال من إعادة توضيح ما ينتظره بهذا الصدد عدة مرات : " قمنا باستكمال قائمة المصطلحات الجديدة ببيان محدد عن الأنظمة الدائنة والمدينة لكل حساب ولكل المصروفات الواجب دخولها في كل بند أو قسم بحيث يمكن بسهولة تخصيص النفقات دون إتاحة الفرصة لوقوع أخطاء في أماكن الأشغال نفسها ول ابتكر للحسابات المركزية سوى مجرد المراجعة " . (٧٩)

ورغم ذلك لم يغير تبسيط هذه الإجراءات التي أدخلت على الوضع شيئاً . و أمام إصرار شركة المقاولات العامة على رفض التعاون مع إدارات الشركة ، قررت هذه الإدارات القيام بالعمل بنفسها مؤقتاً . ولما كان أول مطلب هو استمرار الأشغال حاول فوازان أن يبدو متساهلاً إذ كتب : " لا توجد أية تحسينات ملحوظة في الأقسام الإدارية ولا في حسابات شركة المقاولات . فقد طلب المهندسون والمراقبون بالشركة ، بدون جدوى ، مراقبة الأنظمة المعتمدة بدقة. ورغم إرادتنا لنضطر مرغمين للتفاوضي عن الصرامة التي علينا إظهارها لأن خلاف ذلك سيضطرننا لرفض تجديد اعتماد حساب القرض الجاري لغياب مايرر المصروفات مما يعني إيقاف كل شيء. إن الإصرار والحزم ضروريان في جهودنا وجهود كل العاملين للوصول إلى تحسينات تدريجية للموقف ولكن في ذات الوقت علينا التحلي بالإعتدال والصبر الذي يضيفه التقدير الصائب للصعوبات الشديدة التي يواجهها رؤساء الشركة الذين يحاولون العمل على تحسين النظام وانتظام الحسابات للتغلب على المقاومة العنيفة من جانب رؤسيتهم " (٨٠)

ولو دققنا النظر في الأمر لاتضح لنا أن ذلك الإصرار على عدم تقديم أوراق الحسابات على أكمل وجه يعني إخفاء ممارسات مريبة . ويلجأ فوازان إلى الوكيل الأعلى في هذا الشأن حين

كتب: " فيما يتعلق بالإختلافات الكبيرة بين اسعار نفس البضائع المشتراه في أغلب الأحيان خلال فترات قصيرة والمغالاة في بعض الأسعار فإن المعلومات العامة الواردة لا يمكن قبولها مبدئياً بطريقة كاملة كما هي بما أن كثير من المشتريات تتم عن طريق بعض الأفراد في دمياط وفي أغلب الأحيان أسماء معارة من رجل إنتهز الثقة العمياء التي حظى بها عند وكلاء شركة المقاولات ليتعاقد معهم على مشتريات، يحقق فيها أرباحاً شائعة فهذا على الأقل مايشاع بين العامة " (٨١) .

في هذه الأثناء ، كان المقاول يسخر من الممارسات التي رغبوا في إخضاعه لها قائلاً : " أكاد أجد الجرأة لأحدثك عن نظام المحاسبة العملاق الذي تخيلته إدارة باريس [وهي في الحقيقة من صنع فوازن ولكنه يتظاهر بعدم معرفة ذلك] ومن غير المجدي في هذا الوقت أن نقيم دليلاً على أنه غير مفيد لأحد بل على العكس من ذلك فهو باهظ التكاليف بالنسبة للجميع . وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على مجموع العاملين بالأدارة ، سواء في شركة القناة أو في شركة المقاولات ، فإننا نتبين أنه ابتداءً من مدير عام الأعمال حتى أقل مشرف ، فإن تسعة أعشار الموظفين يستخدمون في إعداد هذه الحسابات " (٨٢)

وربما لم يكن المقاول العام لينتهج هذا النوع من الحديث ولم يكن المدير العام ليقابل مثل هذه الصعوبات لو لم يأخذ دي ليسبس جانب الأول ويساند شكواه : " أينما مررت لا أرى سوى أناس منشغلين في عمل الحسابات ، يوجد مائتا محاسب تحت تصرف الرؤساء الأربعة الذين يديرون الأشغال . مع ذلك ، عندما أقرأ في تقريرك بتاريخ أول يناير عن عدم وجود حسابات ، أعترف أنه من الصعب أن أقتنع بديهيًا بأن هذا العدد الضخم من الرجال الشرفاء والأكفاء يكرسون جهودهم دون جدوى منذ عدة شهور لإعداد حسابات دقيقة ، لابد أن هناك عيب ما في باطن الأمر " (٨٣) هكذا وبخ دي ليسبس فوازن . رغم ذلك لم يستسلم مدير عام الأشغال واستمر في المطالبة بتطبيق قواعد الحسابات وتؤكد تقاريره الشهرية دون كلل الدافع التالي : " لم يتم ضبط الحسابات للسنة المالية الحالية بطريقة مرضية تماماً وبالرغم من القيام بالمحاولات الضرورية لتطبيق الإجراءات الجديدة، نلاحظ للأسف أن تنفيذ التعليمات التي تنظم المسألة لم تحظ بإيمان كاف " (٨٤)

لقد سطرنا الكلمة التي أستمعناها فوازن لأنها تساعد على ما يبدو على فهم أسباب الصعوبات التي يقابلها . فهو الوحيد بين عدد قليل من صناع القرار في الشركة الذي يؤمن بضرورة عمل حسابات دقيقة . ولو إستدنا إلى عدد الإنذارات لمراعاة النظام ، تكون المحاسبة هي نقطة النزاع الرئيسية بين الشركة وشركة المقاولات (٨٥) . وقد أخذت الإنذارات شكل أوامر الإدارة . ففي الفترة من ٢٠ مارس ١٨٦٠ و ١٢ يناير ١٨٦٣ صدر اثنان وثمانون أمر إداري منهم ثمانية عشر أمراً ، أي أكثر من الخمس ، تخص بالدرجة الأولى المحاسبة . وقد أدت الطلبات المتكررة بشكل

مستمر من وكلاء الشركة إلى مندوبي شركة المقاولات لتنفيذ التعليمات إلى وجود مراسلات ضخمة . وبالإضافة إلى الإنذارات التي ذكرت سابقاً ، فإن تكرار أسباب السخط ، دفعت الشركة إلى إلغاء التعاقد خلال شهر يناير ١٨٦٣ مع شركة المقاولات العامة .

وبدأت حينئذ مرحلة قامت الشركة خلالها بتنفيذ الأشغال بنظام الإدارة المباشرة (régie directe) . وانتهزت الفرصة لإقامة نظام محاسبة ملائم لها . ومضت نهاية عام ١٨٦٢ في إعداد سجل جرد عام . وكان الهدف من ذلك هو إعادة تنظيم كل الحسابات . واستخدمت الغالبية العظمى من المحاسبين والمراقبين خلال أكثر من خمسة عشر يوماً ، في هذا العمل الرتيب . وقد نه فوازن إلى رهان هذا الجرد بقوله : " إذا تم عمل الجرد على أتم وجه ، وهو مانسعى إليه بكل جهودنا ، سوف تملك الشركة لأول مرة مستنداً يمكن إستخدامه كنقطة بداية جادة وحقيقية لكل قواعد المحاسبة في الماضي والحاضر والمستقبل . لقد أصبح في الواقع من المنفعة الكبرى تصفية الوضع الحالي تماماً بشقيه : المصاريف الفعلية والنتائج المحرزة حتى يمكن إذا لزم الأمر إبراز المزايا المرتقبة من تغيير النظام الحالي " ^(٨٦) . ومنذ نهاية عام ١٨٦٣ ، ساعدت " عملية إمساك الدفاتر المستمرة على القضاء على أكثر من خطأ " ^(٨٧) وفقاً للملاحظة فوازن الذي أعلن بشئ من الرضا عن بداية مرحلة أكثر هدوءاً على الأقل بهذا الصدد .

عينة من النموذج

عندما وصل فوازن إلى مصر كان قد إكتسب خبرة طويلة تجاوزت الخمسة عشر عاماً في العمل في المصالح الإدارية وكان يعرف جيداً قواعد الإدارة وممارسات الأعمال الإدارية ، فقواعد المحاسبة التي وضعها بعد عدة شهور من وصوله إلى ورشة الخليج من أجل محاولة القضاء على الفوضى الشاملة السائدة قد نقلت عناصراً عن نموذجين : نموذج إدارة الأشغال العمومية ونموذج شركات السكك الحديدية الفرنسية ^(٨٨) . لو استطعنا إيضاح الصلة بين المحاسبة التي نفذت في ورشة قناة السويس والمحاسبة المعمول بها في إدارة الأشغال العمومية . إن الإشارة إلى شركات السكك الحديدية تطرح أكثر من مشكلة لأن مناهج المحاسبة بها لم تكن قد درست بعد . وهنا يجب التساؤل خاصة عن وجود نظام مشترك بين الشركات المختلفة والتساؤل أيضاً عن ما إذا كانت مناهجها ذاتها قد استلهمت من مناهج إدارة الأشغال العمومية .

وقد حاول مانتو قبل وصول فوازن وضع نظام محاسبة للأشغال دون جدوى كما رأينا . ومنذ عام ١٨٥٩ طلب من رئيس القطاع المركزي للأشغال بباريس مجلداً عنوانه : " نظام المحاسبة Règlement de la comptabilité " الذي يحتوي على نماذج لمستندات تستخدم في هيئة الطرق والكباري ^(٨٩) . كانت فكرة تبني نظام المحاسبة المستعملة في الإدارة إذاً موجودة بالفعل . ويجب القول أن الشركة وجدت نفسها في وضع فيه أكثر من تشابه مع وضع هيئات إدارة الأشغال وهي

تُحكم السيطرة على أشغال قناة السويس. و يرجع تاريخ المستند الذي طلبه مانتو إلى عام ١٨٤٩. ويمثل اللائحة التي تهدف ، في نفس الوقت ، إلى تحديد وتبسيط وتوحيد الممارسات النافذة فيما يتعلق بالحاسبة على أرض الوطن^(٩٠) . بالرغم من التعليمات التشريعية المتعددة التي بدأت منذ ١٨١٧ - سنة ارساء الحاسبة الإدارية بفرنسا - كانت تحاول تنظيم الممارسات ، ولا بد من الملاحظة أنه حتى عام ١٨٤٨ لم تحظ الممارسة من جانبها إلا بقليل من الاهتمام^(٩١) . من هنا يتضح النظام الخاص بتاريخ ٢٨ سبتمبر عام ١٨٤٩ وتطبيقه في السنوات التالية في جميع هيئات الطرق والكباري بفرنسا. ولم يتعرف على هذا النظام المهندسون حديثو التخرج خلال فترة دراستهم بمدرسة الطرق والكباري بل أثناء تدريبهم العملية. وعلى كل حال، يعتبر تعليم نظام الحاسبة هو أحد الأهداف الصريحة لهذه التدريبات.

وحق لاخوض في تفاصيل المنهج وكل الآليات الحاسبية حسب تصور اللجنة التي صاغت هذا النظام ، فإنه من الضروري كي نفهم جيداً النظام الذي نفذ في ورشة قناة السويس أن نذكر بعض مظاهر الحاسبة الإدارية .

يحدد قانون ١٨٤٩ بطريقة دقيقة للغاية تدخل مختلف درجات السلم الإداري في الطرق والكباري (مراقب ، مهندس عادي ، وكبير مهندسين) ، كما يحدد أشكال الجداول التي سوف توضع والسجلات الواجب على كل واحد الالتزام بها . وتقتد مسؤولية المراقب وهو الرجل الأساسي في الجهاز الحاسبي لتشمل في مجموعها إثني عشر مستنداً . ويعتبر دفتر الإنجازات اليومية محور النظام وقد أطلق عليه هذه التسمية لأنه كما يذكر ألفونس دييوف (Alphonse Debaue) : " يربط بين مصلحتين متبادلتين مصلحة المكاوالم المنفذ للأشغال و مصلحة الدولة التي يجب عليها دفع التكاليف " ^(٩٢) و من هذا العقد تستنتج الحقوق الخاصة الملزمة للطرفين. وبشكل ملموس يظهر في دفتر الإنجازات على " الصفحة اليسرى نص العمليات ونتائجها الكمية والإيرادات وأمام كل عملية على الصفحة اليمنى رسوم تخطيطية ورسومات وخطوط بيانية ومعلومات من كل نوع توضح ظروف الخدمة المختلفة " ^(٩٣)

ولنفحص الآن المبادئ التي تُشكل نظام الحاسبة بأكمله ، إن الهدف من الحاسبة هو الحصول على قيمة المصروفات الفعلية والمتوقعة والتي لم تدفع بعد بالضرورة ، وإمكانية تقدير قيمة مفردات المبلغ وفقاً لبعض المعايير المعطاة مقدما والتي تشكل بنود المصروفات. وعند إعداد هذا النظام كانت الفكرة العامة السائدة أنه حتى لا تبقى السنة المالية غامضة ، يجب ربطها قدر المستطاع بالأحداث وخاصة تدفق المواد الأولية أو الأشغال المنفذة . وليبان العلاقة الوثيقة بين حجم

الأعمال والمصروفات تم الأخذ في الاعتبار كل " حصة عمل " : بمجرد أن يستلم موظف عام بضاعة أو بمجرد الإنتهاء من حصة عمل لحساب الدولة يقدر ثمنها بالكم . هناك مصروف حقيقي^(٩٤) " كما أشارت اللجنة . لذلك يستخدم مبدأ تقسيم العمل كدعامة للسنة المالية . علاوة على ذلك ، من الضروري تحديد كل حدث من الأحداث الأساسية ليس بشكل مطلق ولكن وفقاً للمكان والزمان ، وذلك حتي يتم تجميع المعطيات على مستويات مختلفة من الزمان والمكان ومن جهة أخرى ، إمكانية ضبطها فيما بعد عن طريق التحقق والتطابق : " ولكن ماهي النتائج التي يمكن إستنتاجها من عدد لا يحصى من الأحداث التي لم ينظر إليها إلا بصورة متفرقة " و لكي تثبت ذاتها من الضروري إمكانية النظر إليها في علاقتها الخاصة وفي ترابطها المتواصل و في مجموعها كاملة . وهذا يفترض "ملاحظة المبررات الأولية للمصروفات لأقرب تاريخ ومجال إنفاقها، ثم نقلها بأمانة من القاعدة إلى القمة دون أي تغيير سوى ترتيبها بانتظام وجمعها دورياً" ويتم بناء الترتيبات المعنية وفقاً لقوائم وقواعد تصنيفه مسبقاً ، نتجت عن معطيات نهائية تعد أولياً مفيدة .

تتم متابعة جدول المجزات اليومية للعمل عن ذي قرب وذلك بتسجيل الكميات المرتبطة به سواء مدة العمل أو حجم المواد. كما يخصص سجل آخر أطلق عليه الدفتر الكبير (grand-livre) يستخدمه المراقب أيضاً ليعيد ترتيب المعطيات وفق قائمة البنود المقررة سلفاً . وتنقل الأحداث عندئذ في القطاعات من سجل مسلسل زمنياً إلى ترتيب تحليلي. " يجب التنبيه إلى أنه يحدث ها تحول منهجي للأحداث " أوضح ذلك مقرر اللجنة الإدارية ثم أضاف : " هذا النقل يمكن أن يتم بمجرد كتابة الحسابات " ، لأنه يخضع إلى قواعد مبادلات ثابتة بشكل نهائي وأهدف هو مجرد النقل دون ضرورة تدخل أي شخص ما . وتسهل الأشكال التي إتخذتها المستندات المختلفة كتابة الحسابات لدرجة تجعلها آلية ومنظمة ويلفت المقرر النظر وهو يذكر بالممارسات السابقة إلى أنه في حالة عدم وجود مناهج مماثلة ومستندات موحدة المقاييس تسود فوضى عامة و " بدلاً من أن يكون تاريخاً للوقائع ، فإن الحساب الظاهر الأكثر تنسيقاً لا يمكن إلا أن يكون خيلاً "

لقد أعد نظام المحاسبة الجديد للقضاء على الفوضى و الإرتجال أو التأويل حتي يصبح سداً محكماً أمام كل مبادرة فردية. ومن هنا جاءت فكرة ربط كشوف الحسابات بالوقائع وفي الحالة الراهنة بالعمل الفعلي. أكثر من الإعجاب الذي قد يثيره العمل التصوري الذي يفرضه ترتيب نظام المحاسبة إلا أنه يجب التساؤل عن تداعياته. وقد أدت ملاحظة صدرت عن أحد أعضاء اللجنة أثناء عملها، إلى فكرة أن الأهداف المرتقبة من إرساء نظام معقد كهذا تتعدى الإطار الصارم لبيان الكشوف الحسابية لتصبح أداة إضافية لرقابة الرؤساء على مؤسسيهم ووسيلة تساعدكم ليكونوا على إتصال بالورشة التي إبتعدوا عنها جسدياً.

آثار المحاسبة على تنظيم الورشة

لقد نُقلت أسس المحاسبة التي طبقها فوازان في ورشة قناة السويس عن نفس أسس المحاسبة التي ذكرناها توأ . كما أخذت عنها نماذج كثيرة لمستندات وجداول ومواصفات السجلات . بناء عليه ، اتبعت المبادئ والقواعد المستخدمة في إعداد هذه المستندات . ويقوم مهندس الطرق والكباري الذي حصل على أجازة غير محدودة بنقل مناهج الإدارة الفرنسية إلى شركة القناة . ومع ذلك ، لم تُصدّر هذه المناهج إلى ورشة قناة السويس وحدها . فبالقرب الشديد من هناك في ورشة حوض اصلاح السفن بالسويس ، وقد أعلن بصراحة ستوكلان (Stoecklin) ، مهندس الطرق والكباري والمكلف من قبل الميساجري إمبريال (Messageries impériales) بالإشراف على الأشغال ، أنه قد استخدم أيضاً هذه المناهج : " سوف تكون المحاسبة مطابقة لمحاسبة هيئة الطرق والكباري بفرنسا [١٠٠٠] " وتم اتباع نظام المحاسبة بدقة في كل أعمالنا في السويس وقد أثرت عن نتائج ممتازة " (٩٥) .

ويتطلب إقامة نظام المحاسبة من الناحية العملية في البداية اعداد قائمة مصطلحات لعناصر تؤخذ في الاعتبار . ويبدو جلياً أن الأمر يتعلق بمنهج استباقي بحيث يتطابق كل بند في جدول المصطلحات مع منتج خاص متوقع من الورشة يراد معرفة تكاليفه . ويؤدي إعداد قائمة المصطلحات إذن إلى القيام بتقسيم الهدف الرئيسي المرتقب ، وهو هنا حفر القناة البحرية ، إلى عدد من الأهداف الثانوية ونكتفي بذكر واحد منها وهو إنشاء ميناء بورسعيد . وبعد تحديد مجموع الأهداف الثانوية يجب القيام بعملية تقسيم جديدة للحصول على مستوى ثان في قائمة المصطلحات أكثر تفصيلاً . ويعتبر العمل المنجز هو العنصر الذي يقام عليه تنظيم المحاسبة . و لكل ورشة خاصة تفسر حسابي . وتشكل قائمة المصطلحات هيكل المحاسبة . وسوف يجد بالضرورة كل عمل يتم في الورشة مكاناً له . ولتسهيل هذه الصلة بين العمل المنفذ في الورشة والمصروفات اقترحت الشركة على شركة المقاولات إعطاء رقم خاص لكل عمل قبل أن ينفذ ويتم نقل هذا الرقم من جديد على كل ورقة مصروفات تتعلق بوحدة العمل المعني (٩٦) .

وتأخذ المحاسبة في الاعتبار عناصر غير متجانسة . وفي نفس النظام ، إلى جانب الورش الخاصة ، يجب أيضاً مراعاة نشاط الورش . و تلقى حساباتها إهتماماً خاصاً ، ويوضح سياما (Sciana) ، مهندس شركة المقاولات الذي انتقل إلى الشركة ، لجويوا (Gioia) رئيس القطاع ذلك : " على عكس ورش الأشغال التي تمثل مجموعات معينة مرتبطة بعمل واحد بشكل عام للغاية ، تشمل الورش مراكز تصنيع يتم فيها في نفس الوقت سلسلة من الأشغال مختلفة تماماً عن مصادر الاستهلاك التي من المهم تخصيص مصروفاتها لكل عمل يتم الإنتهاء منه . و تؤدي هذه الخاصية إلى

ضرورة عمل تفاصيل أكثر في دفاتر المنجزات اليومية الأساسية ، حتى يمكن معرفة التوزيع لكل منتج مصنع من المواد والأدوات التي وصلت من المخازن ، والعمالة التي استخدمت وبناءً عليه تحديد أسعار التكلفة لكل شئ^(٩٧)

ولا تعتبر الورش أماكن الإنتاج الوحيدة التي تخضع لحسابات أكثر تفصيلاً ، إذ تعتبر ورشة كتل الأسمنت الموجهة إلى أرصفة ميناء بور سعيد وحدة خاصة على مستوى الطبيعة والمحاسبة على حد سواء . لقد كان من الضروري إحكام الرقابة المكثفة على هذه الورشة من وكلاء الشركة بسبب الحداثة الخاصة بالتقنيات والأساليب المستخدمة.^(٩٨)

كما يتم تسجيل كل معطيات الورشة كمياً كما حددها إطار المحاسبة . لذا تبدو المحاسبة وكأنها أداة لتفعيل إدارة المعطيات و الرقابة الفنية . فهي نوع من التنظيم النهجي لجمع المعطيات على أرض الواقع و بعد معالجة هذه المعطيات بواسطة جيش من المحاسبين ، عليه توفير المعلومات العامة التي تساعد على مراقبة الأشغال التي تنفذها شركة المقاولات و على ضمان تفعيل إدارة إجمالية للورشة .

عناصر ومنتجات نظام المحاسبة

الدعائم المادية والفاعلون

لم يتم حفظ كل المستندات المتعددة التي استخدمت في النظام المحاسبي بورشة قناة السويس ولم يبق منها اليوم إلا التعليمات التي كان يجب على كل فرد إتباعها، وبما نستطيع أن نستنبط المعلومات التالي ذكرها . وقد قام فوزان مرة أخرى بتقليد أساليب عمل الإدارة عند كتابة هذه التعليمات لتشكيل كتاباً مرجعياً لرجال الورشة وتحديد الممارسات المشتركة .

ومن بين الإستثمارات الأولية التي وجدت بلا تغيير، الإستثمارات الخاصة بالعمال ، وكذلك الإستثمارات الخاصة بالأشغال المنفذة. وبالنسبة للإستثمارات الأولى فهي تميز بين الأشغال المنفذة بصورة يومية والأشغال التي تمت بالقطعة . وفي الحالة الأولى يستخدم "دفتر اليومية " الذي يخضع للتعليمات الآتية: " يتم متابعة دفاتر عن الأعمال نفسها يوماً بعد يوم يسجل فيها أسماء كل عامل باليومية مع بيان ساعات العمل والأجور موزعة حسب الورشة وطبيعة العمل"^(٩٩)

وقد تم تخصيص مستند رئيسي مختلف من حيث الشكل للعمال الذين يشتغلون بالقطعة هو "دفتر المقطوعية " يخضع للتعليمات الآتية " ضبط دفاتر منفصلة يومياً عن الأشغال يتعلق بعمل العاملين بالمقطوعية ، تحت إشراف عامل المقطوعية أو رئيس العمال ، يوضح فيها اسم العامل

وتذكر المهام وعدد العمال المشتغلين مع كل منهم، وأسمائهم إذا أمكن ذلك ، وجملة ساعات العمل الفعلية (قدر المستطاع حسب طبيعة العمال) ^(١٠٠)

يرجع إلى الفئة الثانية من المستندات " دفاتر المنجزات اليومية " التي لاغنى عنها . " ضبط دفاتر المنجزات اليومية التي تصف الأشغال يومياً حسب تسلسلها التاريخي [...] وتوضح هذه الدفاتر رقم كل عمل وبياناتها كالتالي :

(١) أسماء المراقبين ورؤساء الورش ورؤساء العمال أو غيرهم خاصة المرتبطين بالعمل ، عدد العمال من كل نوع ، المهنة أو الصنعة ، قيمة أجورهم على الأقل باليومية أو بالمقطوعة ، أسماء العاملين بالمقطوعة وعدد عمالهم، عدد الدواب والمواد المختلفة التي أخذت من المخازن وأخيراً كل المصروفات المتعلقة بها.

(٢) المواد المرتجعة إلى المخازن أو أرسلت إلى ورش أخرى وكل ما يخص من مصروفات.

(٣) كل المعلومات المختلفة المتعلقة بسير العمل ووصفه باقتضاب أو توفقه ، الحوادث ، حضور الأجانب و المستخدمين من شركة المقاولات أو من الشركة ، والإمتناع عن إتباع الترتيب المشار إليه ، والأنقاض ، باختصار عرض صحيح للأحداث التي جرت في موقع العمل ^(١٠١).

وتحفظ هنا بكل وجاهتها الملاحظات التي صيغت بشأن محاسبة إدارة الأشغال العمومية ، الدور الذي تقوم به هذه الدفاتر على صعيد آخر غير المحاسبة ذاتها.

أخيراً نموذج رابع من الدفاتر يجب ضبطه يومياً ، والمقصود به دفتر القياس المتري : " دفاتر الإنجازات اليومية الخاصة بالقياس بالمتري ، يدونها كل عامل مكلف بمعرفة الأشغال المنفذة . تبين هذه الدفاتر أمام كل رقم عمل المخططات الإجمالية والمقاييس أو كل أنواع الملاحظات اللازمة لوصف العمل المنفذ وتقدير سعر تكلفته " ^(١٠٢).

ويتطلب جمع المعلومات تدخل كل مستويات السلم الوظيفي في الورشة . و كما هو الحال في إدارة الأشغال العمومية تم تحديد المهام والمسئوليات لكل الدرجات بدقة ووضوح . ويعتبر رؤساء الورش هم محور هذا العمل المحاسبي " فهم يسجلون في دفاتر اليوميات مكافأة العمال بعد موافقة المراقبين، ويحرسون على تسجيل أوزان وكميات المواد التي وصلت من المخازن في دفاتر اليوميات وكذلك يحرسون على تسجيل السعر في اليوم التالي في الحسابات ويتم تسجيل اليوميات بدقة لكل الأعمال ويضعون عليها رقم العمل ^(١٠٣)

أما مراقبو الأشغال فيجب عليهم التسجيل يومياً في الدفاتر طبقاً للتعليمات . كما يوجد نسختان من كل الدفاتر التالية - دفتر العمل باليومية ودفتر العمل بالمقطوعة ودفتر الإنجازات اليومية - أحدهما للأيام الزوجية والآخر للأيام الفردية ، مما يتيح لإدارة المحاسبة مراجعتها دون إعاقة العمل واستغلال دفتر اليوم السابق . بالإضافة إلى ذلك ، "يسجل مراقبو الأشغال على دفتر اليوميات ، كل فرد من عمال نفس الورشة قدر المستطاع حسب طبيعة العمل ، ويحدد ساعات الحضور لكل منهم . وعلى دفتر المقطوعة إسم رئيس المقطوعة، ثم أسماء العمال وجملة ساعات العمل ، حسب فئة العمال بقدر الإمكان. وعلى دفتر الإنجازات اليوميات وبرقم قسيمة سلموها بأنفسهم بدون تمييز وبعضهم وراء البعض ، فقط كمية المواد التي سلمت من المخازن واستخدامها في كل رقم عمل . ويسجلون على دفتر المنجزات اليومية بإنجاز العمل النفذ والصعوبات التي تواجهه وحوادثه العارضة والأوامر التي صدرت ... الخ" (١٠٤)

وبفضل الدفاتر يتم ضبط اليوميات بصورة يومية والمقصود بالدفاتر " كشف مصاريف الأشغال" و "يوميات الأشغال المنتهية" . ويعتبر كشف المصروفات بمثابة تجميع وتلخيص لمختلف دفاتر الإنجازات اليومية. ويكتبه مراقبو الأشغال أو المحاسبون الذين يعملون تحت امرتهم . ويشمل كشف الأشغال التي تم إنجازها ، تفاصيل كاملة لكل أحداث اليوم ويذكر الأوامر الصادرة والمتبعة والرسائل المستلمة والمرسلة والزيارات والإستقبالات ووصف موجز لسير الأشغال وكل أنواع الإصابات والحالة الصحية والمناخية " عند الحاجة" .

ويتم تكليف رؤساء الأقسام أو القطاعات " بالرقابة اللازمة لضمان إستمرار ضبط دفاتر الحسابات" (١٠٥) وهي واحدة من المهام الخمسة كما حددها أمر الإدارة رقم ٢٤ في ٢٦ فبراير ١٨٦١ . علاوة على ذلك ، " يتم مراجعة كل المستندات الحسابية بعد تصديق المحاسب أو الوكلاء المعيّنين لهذا الغرض ، مع الحرص على أن يتم إرسال هذه المستندات في الأوقات المقررة وهي بالنسبة لليوميات بشق أنواعها و الوثائق المؤيدة في أيام ٥ أو ١٠ أو ١٥ أو ٢٠ أو ٢٥ أو ٣٠ أو ٣١ من كل شهر. وبالنسبة للمختصرات، أوراق المرتبات في العاشر من كل شهر".

يشغل رؤساء الفروع أو الورش العامة والمراقبون نفس مناصب رؤساء الأقسام والقطاعات. ولكن لا يمتد عملهم إلا على جزء من العمل المكلفين به " يحرصون على ضبط حسابات فروعهم وخاصة التسجيل اليومي لدفاتر اليوميات والمنجزات اليومية وسجلات الورشة والمخازن وتسليم نسخة يومية من هذه السجلات مع الوثائق المؤيدة " (١٠٦)

لم يستثن أي قطاع في الورشة من قواعد المحاسبة حتى لو كان من الضروري إدخال تعديلات في بعض المجالات . وهو ما حدث خاصة في مجال الصحة : " تم تبسيط هذا الجزء من الخدمة قدر المستطاع بعد إستشارة الرجال المتخصصين في الأمر . فاقصر في كل منطقة على جدول دخول وخروج ودفتر زيارات تسجل فيه التعليمات اليومية ودفتر إيصالات بقسيمة، ويتم عمل كشف دخول وخروج كل ثلاثة أشهر . والصائدة المقتصدون لهم وحدهم دفتر كبير يجب عليهم كل ثلاثة أشهر عمل كشف منه وتقديمه إلى رئيس الأطباء مع طلبات الأدوية الضرورية ومواد التضميد والمنقولات . يتم مراجعة هذه الدفاتر والسجلات بعضها ببعض كما تتبادل الرقابة على بعضها البعض (١٠٧)

بالإضافة إلى رجال الورشة ، كان هناك عدد كبير من المحاسبين يعملون في مشروع المحاسبة الضخمة والرثية سواء في مكاتب القطاعات أو في الوكالة العليا للأشغال . ولتسهيل عملهم ومحاولة الاستفادة بشكل ما من هذه المستندات، أعطيت تعليمات عامة للعاملين في الأشغال بياها كالتالي : " يجب كتابة كل دفاتر الحسابات وأرقام الدفاتر وبشكل مقروء وبقدر الإمكان دون شطب أو إفراط في كتابة الحروف " . (١٠٨)

نتائج النظام المحاسبي

ويمكن مقارنة المستندات المختلفة الصادرة من الورشة لدرجة ما بعضها ببعض . وكانت هذه أول مهمة تقوم بها إدارة الحسابات . و تساعد هذه المستندات الإدارة أيضاً على تشكيل نماذج عديدة من الوثائق متميزة الأغراض . وتعطي هذه المستندات أولوية إما للمستوى الجغرافي الخاص (ورشة خاصة، قسم أو قطاع أعمال) وإما لفترة زمنية أو لعمل معين في قائمة المصطلحات .

ومن أهداف المحاسبة إن لم يكن أول أهدافها ، هو عمل كشف سنوي لمصاريف السنة السابقة . وقد ظهر أول كشف كامل في عام ١٨٦٤ . ويقدم كل عام كشف مصاريف الأشغال إلى المساهمين . و منذ بداية عام ١٨٦٧ أظهرت الحسابات الدقيقة والمنضبطة بعناية أن الشركة تملك ٣٠٠ مليون فرنك ، تم صرف ٢٣٧ مليون فرنك منها في ذلك الوقت وأن المصاريف المتوقعة حتى نهاية الأشغال تتطلب اللجوء إلى إستدانة ١٠٠ مليون فرنك إضافية . حينئذ تم الإعلان عن إصدار السندات في سبتمبر ١٨٦٧ وصدر : ٣٣٣ ٣٣٣ سنداً سعر السند ٣٠٠ فرنك . ولكن فشل الإكتتاب (١٠٩) إذ لم يتم الإكتتاب إلا في ثلث المبلغ المطلوب فقط . ويجب القول أن الظروف العامة كانت غير ملائمة ، فلم تعد العمليات الإستثمارية في الخارج تجذب المستثمرين الفرنسيين (١١٠) . و أن نتائج الأشغال المنقذة في الخليج لم تكن تدعو إلى التفاؤل بالنجاح في المستقبل بما فيه الكفاية . وقد استطاع رئيس الشركة ، في ذلك الحين ، أن يقنع الحكومة الفرنسية على تقديم مشروع قانون للبرلمان للحصول على الموافقة بإصدار سندات بمخصص . وبما أن قيمة هذه السندات من جانب العامة فقد كانت موضع رعاية خاصة . وقد طلب من لوزان عمل

مذكرة لتبرير طلب زيادة رأس المال من جديد وهو ماتم عمله بإجتهد^(١١) . وبعد مناقشات طويلة ، تم التصويت على القانون وصدر في ٤ يوليو ١٨٦٨^(١٢) . وبدأ فتح باب إكتتاب جديد وتم إغلاقه هذه المرة بنجاح بفضل أسعار الفوائد المغرية ، تلك التي كرس لها الشركة سنوياً مبلغ مليون فرنك .

وقد تدف المحاسبة أيضاً إلى تقديم مستندات إدارية بصفة دورية . وتسمح المعلومات التي جمعت عن الورشة بإعداد مرتبات العمال من خلال كشوف اليوميات التي أخذت عن دفاتر اليوميات أو المبالغ المطلوب سدادها إلى عمال المقطوعة من خلال كشوف المهمات التي أخذت عن الدفاتر . كما تسمح أيضاً بعمل المتوسط وقوائم الجرد ولوحات القيادة وحساب الإنتاجية ومقارنة أسعار التكلفة^{١٣} . وتعتبر كلها عمليات تساعد على توجيه القرارات . ويصبح المعيار الاقتصادي مسيطراً وتصبح تقييم الأداء التقني لعمل ما وقد أصبح بفضل آلية المحاسبة - التكلفة الخاصة به . الذي أصبح ممكناً بفضل آلية المحاسبة . وعندما قامت آلية المحاسبة بترتيب المعطيات الكمية المختلفة القادمة من الورشة ، ساعدت على مراعاة حصة المصاريف التي تخص أسلوب التقية بدقة . ويدل الجدول الذي أعده كازو وهو المسؤول عن قطاع ترعة الماء العذب والذي تم فيه حساب ناتج عمل فرق الفلاحين ، على مدى ممارسة المراقبين في ورشة قناة السويس .

شهر	رقم تمثيل الساعة	حجم المستخرج بالتر المكعب	عدد		حجم م رجل/يوم	المصاريف بالفرنك	
			الرجال	يوم رجل		أغذية	نفود
أبريل ١٨٦١	١	٣٣١١٠,٨٠٠	٢٤٢١	٢٩٠٥٢	١,١٣٩	١٣٧٠,٢٧	١٣٥٨٩,٥٩
مايو	٢	٥٣٣٣٥,١٥٤	٢٧٧٧	٤٩٦٧١	١,٠٧٤	٦٦٢٥,١١	١٥٨٧٤,٦٠
يونيو	٣	٤٤١٦٢,٥٢٣	٢٦٣٧	٢٧٠١٣	١,٦٣٤	٤٥٦٧,٤٠	١٥١٦٠,٨٢
يوليو	٤	٣٩٩٨٨,٧٣٩	٢٠٩٥	٢٨٥١٦	١,٤٠٢	٣٣١٩,٤٦	١٣٥٤٧,٠٧
أغسطس	٥	٩٥٤٨٣,٥٣٤	٥٧٧١	٨١٦١١	١,١٦٩	٣٦٥٠,٣٢	٣٧٧٠٨,٢٩
سبتمبر	٦	١٢٨٥٩٨,٠٢٦	٩٣٩٠	٨٧٦٨٤	١,٤٦٦	٣٧٦٤,٣٦	٤٥٠٠١,٤٨
أكتوبر	٧	٢٣٤٢,٤٤٠	٥٢٧	٢٦٧٥	٠,٨٧٠	٣٨٥,٧٢	٥٧٤,٠٨
نوفمبر	٨	١٩٣٢٦٣,٦٤١	٧٠٧٠	١٢٩٠٨٩	١,٤٩٧	٦٩١٥,٤٤	٦٦٣٦٤,٦٩
ديسمبر	٩	٢٤٦٣٠٧,٧٦٧	١٠٨٤٤	١٦٢٨٣٣	١,٥١٢	١٢٩٦٣,٠١	٧٥٤٢٥,٨٨
يناير ١٨٦٢	١٠	١٩٩٥١٧,٦٠٨	١١٥١١	١٩٨٤٠٠	١,٠١٥	٩٦٠٩,٧١	٥٩٠٤٦,٤٧
المجموع		١٠٣٦١٠٩,٢٦٢	٥٥٠٣٣	٧٩٥٥٤٤	١,٣٠٢	٥٣٠٩٣,٨٠	٣٤١٢١٢,١٧

وانطلاقاً من هذه المعطيات استطاع كازو تقدير نسب معينة أخرى على أساس الوحدات تساعد على إعطاء فكرة عن متوسط المصاريف - المبلغ المصروف لكل رجل ، في اليوم ، عن كل متر مكعب مستخرج - أو عن العمل المنجز مثل حجم ما يستخرجه العامل وكمية المستخرج في الشهر . و تشبه طريقة العمل هذه بشكل دقيق جداً أسلوب ممارسات الجنود.

وفي كل ورشة من الورش تم إختيار معايير قياسية يتم مراقبتها دورياً وتستخدم كمؤشرات للعمل والإنتاج . ففي ورشة حائل أمواج بور سعيد، يقوم مراقب الشركة يومياً بتدوين أيام البطالة وعدد الماكينات العاملة وعدد الكتل المصنعة وعدد الكتل الفاطسة... الخ^(١١٣) ويبقى عدد الأمتار المكعبة التي استخرجت في كل قسم من أقسام الأشغال المؤشر الأساسي لنشاط ورش الخليج المخصصة أساساً لأشغال الحفر. ويفضل المعطيات التي تم الحصول عليها يتم عمل مقارنة بين أسعار التكلفة . وتعتبر الدراسة التي قام بها في عام ١٨٦٤ تيسو (Tissot) ، رئيس المكتب الفني، أفضل مثل لمقارنة أسعار تكلفة الحفر الذي تم يدوياً في الورشة. من جهة المصاريف ، أضاف للأجور التي تدفع لكل واحد من عمال فرق المجندين والعمال المصريين المستقلين والعمال الأوروبيين ، مصاريف التوظيف والرقابة والمعدات . عندئذ وصل إلى النتائج الآتية:

سعر تكلفة المتر المكعب من الردم حسب نوع العمالة^(١١٤)

نوع العمالة	الأجر المتوسط رجل / يوم	سعر تكلفة المتر ٣
فرق المجندين	٠,٨٩ فرنك	٠,٣٤٢ فرنك
عمال عرب مستقلين (أحرار)	٢,٥٠ فرنك	٠,٨٩٤ فرنك
عمال أوروبيين	٤,٥٠ فرنك	١,٦٢٠ فرنك

بمجرد وصول الماكينات إلى الورشة ، يتابع المراقبون تطور إنتاجيتها مع مرور الوقت ويقارنون بين النتائج القياسية لمختلف الآلات المستعملة في الحفر . في ورشة الجسور المائلة التي كُلفت بها شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما ، قام المراقبون والمشرفون بعمل كشوف يومية سجلوا فيها عدد الجسور العاملة وعدد أيام استخدامها وعدد القاطرات التي رفعت. وهذا مثال لذلك^(١١٥) :

بيان نشاط ورشة الجسور المائلة

الفترة	عدد		
	الجسور	الأيام	القاطرات
من ٤ إلى ١٥ مارس ١٨٦٨	٣	١٥	٥٧٧
١٦ يونيو إلى ١٥ يوليو ١٨٦٨	٩	١٥٧	٢٤٥٨٤
١٦ أبريل إلى ١٥ مايو ١٨٦٩	٢٠	٥٣٥	٧١٤٩٥

أما في حالة الجرافات فلا يتم حساب الأيام ولكن يسجل بعناية عدد ساعات تشغيلها أو توقفها. وهكذا أعدت جداول على هذا النمط:

معطيات سجلت في فبراير ١٨٦٧ في قطاع الإسماعيلية

رقم الجرافة	عدد ساعات التشغيل	عدد ساعات العطل	عدد نقلات مراكب الشحن
٦	١١٩,٥	١٦٦,٥	١٨٠
١٤	١٨٩,٥	٩٠,٥	٣٠٦
١٩٥	٨٩,٧٥	١٣٠,٢٥	١١١
١٩٦	١٥٩	١٢١	١٨١

إن قياس الزمن موجود في الورشة . وبفضل هذا النوع من الملاحظات يتم حساب المتوسطات والنهايات العظمى المسجلة كما يلي:

إنتاجية الجرافات ذات الأذرع الطويلة المستعملة في قسم رأس العش عام ١٨٦٨ (١٩٦)

شهر	عدد الجرافات	حجم المستخرج بالمتر ٣		
		المجموع	في المتوسط	أعلى كمية
يناير	٥	١٢٩٧٧٤	٢٥٩٥٥	٣٤٩٠١
فبراير	٥	١٨٠١٦٦	٣٦٠٣٣	٤٣٨٣٤
مارس	٦	٢٠٨٠٨٠	٣٤٦٨٠	٥٢٩٠٤
أبريل	٦	٢٢٩٨٦٠	٣٨٣١٠	٥٩٨١٨
مايو	٥	٢٤٧٩٢٣	٤٩٥٨٥	٧٢٢٦٨
يونيو	٦	٣٠٢٦٠٨	٥٠٤٣٨	٧٦٨٣٨
يوليو	٦	٢٧٦٢٩٢	٤٦٠٥٠	٨١٦٢٠
أغسطس	٦	٢٩٤٧٧٣	٤٩١٣٠	٨٦٩٥٥
سبتمبر	٦	٣٥٠٩٥٨	٥٨٤٩٣	٧٨٠٥٦
أكتوبر	٦	٤٢٣٦٥٤	٧٠٦١٠	١٢٧٢٩٦
نوفمبر	٦	٣١٣٦٢٨	٥٢٢٧١	٨٨٨٨٩
ديسمبر	٦	٣٧٨٠٠٠	٦٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠

بالإضافة إلى البيانات الدالة على معدل تطور الأشغال ، تساعد المعلومات التي جُمعت على مراقبة التكاليف وسجل الاستحقاقات .

بفضل نظام المحاسبة من الممكن إيضاح مصروفات كل قسم على حدة ، ومن ثمّ أمكن تعديل نظام الإدارة نفسه . وأمکن بذلك فعلاً التعرف على حركة الإستهلاك الزائدة وتحديد الوظائف التي تشكل عبء على الميزانية . وقد كتب فوازن في مارس ١٨٦٤ إلى سياما (Sciana) الرسالة الآتية ليوزعها على القطاعات المختلفة :

" انزعجت الإدارة المركزية من المصروفات الباهظة في الماضي فيما يتعلق بالأدوات المكتبية والمطبوعات ، ولم يتقرر لي هذا العام إلا رصيد محدود جداً لهذا الموضوع . أرجو منكم التفضل إذا بإصدار التعليمات اللازمة حتى تقتصر الطلبات على الضروري وما لاغنى عنه " (١٧)

وفي إطار إهتمامه البالغ بالجودة إلى أقصى حد ، جدّد فوازن دعوته إلى التوفير والاقتصاد وذلك في رسالة وجهها إلى رؤساء القطاعات وذلك لحثهم على تخفيض سُمك الورق المستعمل في المراسلات الداخلية . وليعطى معنى لطلبه ، حدّد عدد المطبوعات لكل قسم بالأشغال وحدّد الأقسام مصدر الإسراف : " هكذا يذيع صيت الإدارة الجيدة والضمان والثقة الشاملة المتعلقة بها " (١٨) قال ذلك فوازن مبرراً أسلوبه .

سعى فوازن عندما أقام نظام المحاسبة في الورشة إلى تنظيم إدارة المخازن . " لا يجب أن تسلم المخازن إلى الورش البضائع التي تحتاجها إلا بإيصالات مأخوذة عن دفاتر بقسمة يكتبها ويوقع عليها مندوبون معتمدون لهذا الغرض . توضح هذه الإيصالات رقم العمليات التي يجب أن تستخدم فيها كل مادة مطلوبة . وتسلم إلى كل ورشة بالجملة المواد الغذائية المفروضة توزيعها على العمال العرب المستخدمين والمفروض اطعامهم ويتم التوزيع بنفس أشكال كل المواد الأخرى . وتخرج الطلبات المطلوبة من الورش لإدارة الأشغال بواسطة المخزن حسب نفس النظام " (١٩)

وتخضع المعدات لإجراءات مختلفة بشكل ملموس عن الإجراءات التي تستعمل بالنسبة لمواد الإستهلاك ، إذ يدخل في هذه الحالة في الحساب مظاهر التلف والإستهلاك : " تقوم المخازن بتسليم نوعين من المواد :

(١) مواد مباشرة إستهلاكية أو لوازم تضاف كمصروفات على أرقام العمل

(٢) لوازم آلات ومعدات ومنقولات وخدمات لم تسجل إلا كقيمة جرد أو تداول للمقاولات والتي يجب عرض قيمتها على أن يضاف استهلاكها وحده لاحقاً من مصاريف الإدارة في الحالة التي لا تكون الحصة المحددة كافية لتغطية هذا التلف . لهذا الغرض تحفظ في كل ورشة قائمة جرد لكل صنف ولكل قيمة مضافة ، و تحول المواد التالفة إلى حساب خاص يقفل وفقاً لتعليمات المحاسبة

المركزية. ويرفق مع المرتجع إلى المخزن إيصال طرد بكعب موضحا حالة المواد التي ردت وقيمتها^(١٢٠)

وقد أرسل سياما ، في فبراير ١٨٦٤ ، إلى جيوبا ، رئيس قطاع الجسر مذكراً إياه بقواعد الإدارة السليمة للمخازن قائلاً : " نتج عن المعلومات التي وصلتني أن المخازن تبيع نقداً إلى بعض مواقع للمقاولين أخشاب وحديد أو مواد أخرى من المؤن بجانب أشغالنا الخاصة. ولا بد من وضع نهاية لهذا الأسلوب من الممارسة التي قد تسبب في وقت ما عجزاً في مخازننا دون أن ندري وذلك لتلبية إحتياجات عامل ما بالقطعة. نتيجة لذلك قرر السيد المدير العام بناء على إقتراحي أنه ممنوع منعاً باتاً أن تقوم الإدارة المعتمدة مستقبلاً بتسليم معدات أو خلافه من أجل إحتياجات الخدمة مقابل الدفع نقداً دون أن يكون الطالب حاملاً لإيصال بالتخليص ووقع عليه كبير المهندسين بالقطاع والذي يبينها هذا الطالب لأشغاله " ^(١٢١)

ولم تعف أية مصلحة في الورشة من قرارات الإدارة الواضحة والملزمة لتقدير المؤن . ولم يُستثن حتى عن ذلك الخدمة الصحية. وقامت وكالة خصصت للأدوية بتمويل القطاعات سواء بالأدوية أو بالأدوات اللازمة مع إحترام قواعد مماثلة للقواعد المقررة لأنواع أخرى من المنتجات. ^(١٢٢)

ويساعد تحديد أسعار التكلفة المحددة بناء على الملاحظات التي جمعت في الورش على تقديم تقدير تكاليف إجمالية للعمليات التي سيشرع في تنفيذها . وفي نفس الوقت، يساعد تقييم الإنتاجية على تقدير الوقت الضروري لإنهاء الأعمال والتنبؤ بموعد نهايتها تقريباً. علاوة على ذلك ، تبدو مدى أهمية المحاسبة في نهاية الأعمال عندما يتم بالإتفاق مع المقاولين على تسوية كل حسابات أعمالهم. هكذا استندت بصفة خاصة تصفية حسابات شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما على كشوف بيانات مالية دقيقة ، أعدت بكل قسم من أقسام الأشغال . وعلى العكس من ذلك ، تعرضت التسوية النهائية لحسابات شركة مقاولات هاردون العامة إلى أكبر الصعوبات لغياب محاسبة دقيقة. فقد اضطرت شركة القناة أن تدفع لها تعويض ١٢٠٠٠٠٠ فرنكاً وهو المبلغ المقرر في العقد في حالة إلغاءه . ويضاف إلى هذا المبلغ ، أيضاً حسب بنود التعاقد، ٥٥% على المصروفات تحت مسمى مصاريف إدارية ثابتة متعلقة بأعمال غير متوقعة أو التي لم تخصص بما فيه الكفاية. فقد طلب هاردون ٧٧٩٧٠٦ فرنكاً أما فوازن فقد رأى أن التعويضات لا يجب أن تكون سوى ٤٩٥٠٠٠ فرنكاً . ودام الخلاف وخضع النزاع هيئة تحكيمية : " نحن نجتمع هنا كاسرة لكي لا نلجأ إلى القضاء" هذا ما ادعاه أحد الأعضاء^(١٢٣). ولم تتم المصالحة الودية التي أنهت النزاع بين الشركة والمقاول هاردون إلا في عام ١٨٦٥ وكان المبلغ الذي دفع في آخر الأمر ٦٠٠٠٠٠ فرنكاً^(١٢٤)

وتعتبر المحاسبة أداة لتنظيم الورشة وإدارتها اليومية ، فهي تسهل عمل التقارير الشهرية لحجم الأشغال وتقديم بيانات سنوية إلى جمعيات المساهمين ، مما يسهل التنبؤات في المستقبل . وهي أيضا تتيح فهم أعمال الورشة في مجملها وتعقيدها وتفصيلها على حد سواء . وتسهل المحاسبة التنسيق بين النشاطات المختلفة على مستوى مجموع الورش وتتيح مراقبة مكوناتها المختلفة . لقد تم دمج أعمال الصيانة والأشغال الجديدة والأشغال المكلف بها المقاول وأشغال الإدارة العامة وأشغال الورش والمشاغل والخدمة الصحية في نظام عام متجانس . و يعتبر تقسيم العمل هو المبدأ الذي تقام على أساسه الوثيقة الأساسية التي تتيح إعداد المحاسبة . وعلى كل مستويات الإشراف على الورشة ، من ناظر العمال حتى رئيس القطاع ، تم تحديد مكان وزمان لممارسة المحاسبة . بحيث يشارك كل حسب مكانته في عمل المحاسبة ونتيجة لذلك يخضع لمقومات المنهج التحليلي الذي يوجهه .

هل كان من الضروري فرض محاسبة متطورة ودقيقة لهذه الدرجة ؟ هل كان من الممكن حسن إدارة العمل بدون ذلك ؟ تؤدي الإجابة على هذه الأسئلة في أغلب الأحيان إلى تبرير إستدلالي إختيارات المتعهدين وكتابة تاريخ الفائزين . فقد تمت إدارة ورش عديدة بدون محاسبة . ولكنها لم تكن بحجم هذه الورشة . إن تنظيم ورشة على مساحة طولها ١٦٠ كم في قلب الصحراء يُعد مرهنة مستحيلة . وقد ساعدت البدايات الصعبة على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك . و ظهرت المحاسبة بعد ذلك وكأنها إجابة لتحدي إدارة جديدة ووسيلة لإنهاء الفوضى السائدة دون أن يكون إبداء الرأي في إجابات أخرى ممكنة حقا .

لقد استلهمت مناهج المحاسبة التي استخدمتها شركة قناة السويس من المناهج المتبعة في إدارة الأشغال العمومية . ومن قبل عدة سنوات ، في بداية عام ١٨٤٠ أخذت مبادئ المحاسبة التي درسها مازيار (Mazières) في المدرسة الملكية للفنون والحرف في مدينة شالون-سير-مارن (Châlons-sur-Marne) عن الممارسات التي كانت تتم في ترسانات البحرية (la Marine) ، فقد تعلم أثناء عمله مع فانسان (Vincent) مهندس البحرية الذي شغل منصب مدير المدرسة من عام ١٨٣٢ حتى عام ١٨٣٨ . وقد أدت متابعة الدفاتر في مصالح الدولة إلى عمل موجز (كتاب مختصر) موجه إلى المقاولين في القطاع الخاص^(١٢٥) وقد وضع من جهته يانيك ليمارشان (Yannick Lemarchand) أن مهندسي المناجم المكلفين بدراسة مشاريع الشركات المساهمة . حاولوا أن يفرضوا عليهم بعض القواعد الحسابية^(١٢٦) . وتتلاقى هذه الوقائع المختلفة وتهدف إلى إبراز -وهي فرضية يجب بالطبع زيادتها تدعيمها- أنه يمكن البحث عن مصادر محاسبة في الشركات الخاصة عبر مهارات وممارسات رجال الإدارات والمحاسبة العامة .

وتبرز دراسة الممارسات أن كفاءة المهندسين بالدولة تكمن في قدرتهم على مساهمة الأعمال الإدارية يوميا ، إذ أنهم يملكون مناهج فعالة لذلك ، وتظهر أيضا في التنظيم الجغرافي والزماني لمشاريع كبيرة الحجم . وبمواجهة تحديات جديدة فرضها تنفيذ مشروعات مثل ورشة قناة السويس . يعمل المهندسون بالدولة على تطوير المهارات المكتسبة في الإدارة ، من أجل مصلحة أعظم للشركات التي تستخدمهم .

هوامش الفصل الثالث

مناهج تفعيل الإدارة

١) مع ذلك فسوف يتعرض لبعض الحثافات . فقد غادرت من القاهرة في ١٨٦٥ الحفارات البخارية التي صنعها جبار . AN153 AQ/INJ118/E قرار مجلس الإدارة في ١٦ ديسمبر ١٨٦٥ ، محضر رقم ٥٣٠

٢) AN 153AQ/TE7 رسالة إلى الخدمات البحرية لشركة مكاتب سفريات الإمبراطورية .

3) Alexandre Lavalley, « Rapport sur les travaux du canal maritime de l'isthme de Suez, lu dans les séances du 7 et 21 septembre 1866 », L'isthme de Suez..., 1866, p. 326.

4) AN 153AQ/TE577.

٥) AN153AQ/TE133 . في ١٨٦٩ تكفلت مقارلات صافون ، الشريكة لمؤسسة بازان ، بالقيام بكل العمليات في المرسى الطبيعي وفي ميناء بور سعيد .

Bazin, Savon et Cie. Société des docks et entrepôts de Port-Saïd, Marseille, Barlatier, 1869.

٦) تقرير مدير عام الأشغال أبريل ١٨٦١ AN 153AQ/1610A

٧) عقد الامتياز بتاريخ ١٨٥٥ ، بند ٨ ، ثم عقد امتياز بتاريخ ١٥ يناير ١٨٥٦ بند ١٣ . مهدد منذ ١٨٦٨

لقد ألغى هذا الامتياز في أكتوبر ١٨٦٩

8) Olivier Ritt, op. cit., p.195.

٩) AN 153AQ/1623B تقع في المكس بالإسكندرية والقاهرة ودمياط وبور سعيد ورأس العرش والقنطرة والجسر والتمساح وطوسوم وترعة الماء العذب (محل متحول) الزقازيق وسمنود.

١٠) من سخرية القدر... كانت هذه المباني التي ماسحتها الكلية ١٠٠٠٠ م ٢ ، من قبل عدة سنوات مباني المدرسة البوليتكنيك التي أسسها السان سيمونيان شارل لامبار في عهد محمد علي

١١) جدول سجله الجور ، في القاهرة بتاريخ ٣٠ مارس ١٨٦٢ 1862, n° 140, p. 114 -'isthme de Suez.

12) Voisin-Bey, op. cit., tome 6.1, p. 27

13) AN 153AQ/1623B. 1862.

14) AN 153AQ/G77 قرار مجلس الإدارة بتاريخ يناير ١٨٦٣ أمر إداري رقم ١

١٥) ولفي اتفاقية بتاريخ ٢٣ أبريل ١٨٦٩

١٦) انشأ قطاع محلات تابعة للإدارة العامة للأشغال وكلف بها بوليري ، رئيس الخاوية المركزية سابقاً

17) AN 153AQ/1610A تقرير مدير عام الأشغال

١٨) جدول أسعار السوق للمواد الغذائية في الخليج ، أول يناير ١٨٦٧

19) AN F¹⁴ 2285/2. ملف مانتو . تقرير

٢٠) AN 153AQ/1610A رسالة فوازان مارس ١٨٦١ . بعد عدة سنوات عندما أعاد كتابة تاريخ هذه الورشة حذف مدير عام الأشغال السابق الإشارة إلى هذه الخلافات وسوف يترك للأجيال القادمة رواية أقل إنسارة للجدل للحادثة محاولاً تبرير الاختيارات التي اتقدها. Voisin Bey, op.cit., tome 4, pp 342-343.

21) AN 153AQ/RU2.

٢٢) توضح الدراسة المزايا العينية وسداد المصروفات والمكافآت التي كان يستحقها العملاء في كل حالة من هذه الحالات .

٢٣) علاوة على ذلك كانوا يتقاضون ٤٨٠٠ فرنكاً من المصاريف الغائبة.

24) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 72.

25) Georges Masson, De Suez à Port-Saïd, P., Masson et fils 1864, p. 41.

AN 153AQ/TE56 زيت الشرفة المسقوفة (فيرندا) من الخشبيات قام بها نجار من مرسلينا ومقطعة وفق أشكال أخذت عن أسلوب البناء المحلي . مازالت هذه الباني قائمة في الإسمايلية ولكنها تدر خربة بسبب عدم الصيانة.

26) AN 153AQ/1610A تقرير مدير عام الأشغال ، أبريل ١٨٦٢.

27) AN 153AQ/1623B.

28) AN 153AQ/1636 رسالة من فوازان إلى هاردون بدون تاريخ .

29) AN 153AQ/INJ72. اللجنة الإستشارية للأشغال ، جلسة بتاريخ الدلاء ١٢ نوفمبر ١٨٦١

30) AN 153AQ/1610A. تقرير شهري لمدير عام الأشغال ، مارس ١٨٦١.

31) AN 153AQ/1636. رسالة من فوازان ، فبراير ١٨٦٢

٣٢) AN 153AQ/1609A الخريطة المقصودة هي خريطة المندوغرافية (وصف مياه) الدلتا صممت على أثر عمليات علماء الفلك ومهندسي جيش الشرق من أجل أبحاث عن قناة البحرين بمقاس ١/ ٤٠٠٠٠٠ . سوف يأخذ منها لبنان دي بلفون بعد عمليات تكميلية على الطبيعة، الخريطة التي سوف تستخدم كأساس لمشروعه حفر قناة السويس في ١٨٤٧ (مقاس ١/ ٢٥٥٠٠٠) ثم التي إستعملتها الشركة في ١٨٥٥ و ١٨٥٦ (مقاس ١/ ٢٥٠٠٠٠).

33) AN 153AQ/TE267.

34) op.cit., tome 4, pp. 50-51

يشير فوازان بورسعيد في كتابه

35) AN 153AQ-INJ295

36) AN 153AQ/1618A.

37) AN 153AQ/TE577.

38) AN 153AQ/CL122

رسالة من هانيت -كلاري ، يوليو ١٨٦٣

39) AN 153AQ/TE869.

40) AN 153AQ/TE109 Octobre 1863

41) Alphonse Debaube, Manuel de l'ingénieur des ponts et chaussées, tome IV : Exécution des travaux, P., Dunod, 1877, p. 37

42) Ministère des Travaux publics : :Instruction sur la tenue des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées, P., Impr. Nationale, 28 juillet 1852. 133p.

43))Ministère des Travaux publics : :Instruction sur la tenue des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées, P., Impr. Nationale, 28 juillet 1852. 133p. chapitre II, art. 18.

44) Ibid Chapitre III, art 24.

45) AN 153AQ/1608A

رسالة فوازان إلى ليسبس

(٤٦) رقم حدد بناء على عينة من الفنيين

47) AN 153AQ/1623B.

48) Id

49) AN 153AQ/1606A.

50) AN 153AQ.G1.

قرار مجلس الإدارة في ١٨ أبريل ١٨٦١

51) AN 153AQ/INJ118E

قرار رقم ٥٤٩ ، ٥ مارس ١٨٦٦

52) AN 153AQ/1611A.

مقطع طولي يوضح حالة الأشغال في ١٥ أبريل ١٨٦٨

53) Charles Minard, Des tableaux graphiques et des cartes figuratives, P., Thunot, 1861.

54) CFS. D. Viller

55) AN 153AQ/TE15.

56) AN 153AQ/TE148 .

— رسالة فوازان إلى ليسبس

57) CFS D. Lalheugue.

58) AN F 2442

— ملف بيتس

59) AN 153AQ/CL122

منشور بتاريخ يونيو ١٨٦٣

60) AN 153AQ/CL122

61) Ibid. Mai 1863.

62) AN 153AQ/TE129.

63) AN 153AQ/CL122

رسالة من كاديا على السيد ديريو ، نوفمبر ١٨٦٣

64) AN 153AQ/INJ296

رسالة من المهندس المستشار هانيت — كلاري إلى فوازان . فبراير ١٨٦٣

65) AN 153AQ/CL121

رسالة من لروه ، يناير ١٨٦٣

66) AN 153AQ/CL121.

رد هانيت كلاري

67) AN 153AQ/CL 121.

68) AN 153AQ/TE869.).

69) AN 153AQ/135, TE136 et TE138 انظر خريطة أماكن تصدير الفحم التي طلبتها مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما ، المستهلك الرئيسي (ص ١٤٦)

٧٠ المصدر : AN 153AQ/INJ121, TE134, TE135, TE136, TE138, TE139 et INJ164

انظر خريطة الموردين الفرنسيين (ص ١٤٧).

AN 153AQ/TEP133 71)

٧٢ AN 153AQ/CL126 ، سجل المراسلات ، ٤ سبتمبر ١٨٦٨ .

73) AN 153AQ/1618A.

74) Voir notamment Marc Nikitim, La naissance de la comptabilité industrielle en France , thèse, 1992, Paris IX, et les travaux de Yannick Lemarchand

٧٤) بعد أن أخذنا من جديد نتائج مارك نيكيتيم ، جعل جان بيير ألين سنة ١٨٧٢ تاريخ إقامة أول خطة حسابية في شركة جان حوبان

75) In Jean-Pierre Allinne, « Compter et prévoir : les premiers pas d'une comptabilité de l'arentabilité industrielle chez Saint-Gobainn 1820-1880 », Histoire et mesure, 1993 vol.1- II, p. 53.

76) AN F ¹⁴2285 . ملف مانتر . تقرير

77) Id.

78)AN 153AQ/N1382. تقرير فوازان ، أول يونيو ١٨٦١ .

79) AN 153AQ/TE13 . أكتوبر ١٨٦١

80) AN 153AQ/N1382، . تقرير فوازان أول أغسطس ١٨٦١

81)AN 153AQ/N1382 ١٦ أغسطس ١٨٦١ 82) Alphonse رساله من كبير المهندسين إلى الوكيل الأعلى ، Hardon, Lettre à M. Alfred Feinieux, P., Poitevin, 1862, p. 40.

83) Ferdinand de Lesseps, « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 15 février 1862.

84) AN 153AQ/TE109 تعاليم رقم ٣٢

85)AN 153AQ/TE142

86)AN 153AQ/1610A . تقرير المدير العام للأشغال ، ديسمبر ١٨٦٢

87) Ibid. Bilan des travaux au 31 décembre 1863, signé Voisin

88)AN 153AQ/TE148

89)AN 153AQ/1609A. — رسالة من مانتر إلى بوردون . ٩ يونيو ١٨٥٩

٩٠ (وزارة الذواعة والتجارة والأشغال العامة - قانون خاص عن المحاسبة لوزارة الأشغال العامة -

P. Impr. Nationale. 1849. 32 p.

91) A. Debauxe, Dictionnaire...op. cit., tome I, p. 778.

92) A. Debauxe, Dictionnaire...op. cit., tome I, p. 779. -

93) Ibid p 781.

94) Ibid. p. 780 -

95) Auguste Stoecklin, Notice sur la construction du bassin de radoub de Suez, Bordeaux, Bord. 1867, p. 28.

٩٦) AN 153AQ/TE142 - أمر إداري رقم ٨ ، ٣ ديسمبر ١٨٦٠ . ثم أمر إداري رقم ٢٦ - قانون محاسبة الأشغال العامة بتاريخ ٢٦ فبراير ١٨٦١ ، أول بند .

97) AN 153AQ TE109 - رسالة من سياما إلى جيوبا ، ٧ أغسطس ١٨٦٣

98) AN 153AQ/TE148.

99) AN 153AQ/TE142 رقم ٢٦ أول بند . ، أمر إداري

100) Ibid. art. 2.

101) Ibid. art. 3.

102) AN 153AQ/TE142 رقم ٢٦ ، بند رقم ٤ ، أمر إداري

103) Ibid. art. 16.

104) Id

١٠٥) AN 153AQ/TE142 ، أمر إداري رقم ٢٦ رقم ٢٤ : القانون العام لاستغلال الورش والمشاغل بتاريخ ٢٦ فبراير ١٨٦١ أول بند

106) Ibid. Art. 12.

107) Dr Louis Rémy Aubert-Roche, « Rapport du service de santé », L'Isthme de Suez..., 1861, p. 137.

108) AN 153AQ/TE142 (رقم ٢٤ بند ٥ - أمر إداري)

١٠٩) طلب العامة بضع عشرة آلاف سند فقط . وقد أكتب في الخليج ما يقرب من ٢٥٠ شخصاً من بينهم مائة وكيل من الشركة في ما يقرب من ٨ آلاف سهم . وقد أكتب فوازن وحده في مائة سهم وهو ما يعادل نصف مرتبه السنوي في ذلك الوقت . وتم نشر أسماء المكتتبين في جريدة خليج السويس . وقد تباغت الشركة أمام المستثمرين بثقة رجال الورشة في نجاح مشروعهم .

110) A. Nouette-Delorme, Le canal de Suez et l'opinion publique, P., Schiller, 1868, p. 1.

١١١) AN 153AQ/TE148 مذكورة عن أسباب زيادة المصاريف التي تطلبها قرض مائة مليون ، مارس ١٨٦٨

١١٢) يمكن أن نرى في ذلك ظاهرة إضافية لمساعدة الحكومة الفرنسية للشركة .

113) AN 153AQ/1611A.

114) AN 153AQ/1615B.

١١٥) AN 153AQ/1618 - مذكرة عن الجور العادية والجسور المائلة باغراف لورش الشالوف وسهل السويس . وقد قمنا بوضع النتائج في الجدول .

116) Voisin Bey, op. cit., tome 5, p. 168.

117) AN 153AQ/TE148 رسالة من فوازن إلى سيما ٤ مارس ١٨٦٤.

118) AN 153AQ/1623B - رسالة من فوازن إلى رؤساء القطاعات ، نوفمبر ١٨٦٥ .

119) AN153AQ/TE142 - أمر إداري. رقم ٢٤ بند ٧

120) AN153AQ/TE142 - أمر إداري. رقم ٢٤ بند ٧

121) AN153AQ/1623B

١٢٢) " فقرة من تقرير مصلحة الصحة للدكتور روبروش " ، مجلة خليج السويس ١٨٦١

123) AN 153AQ/1617A

124) Voisin Bey, op. cit., tome 6. 1 , pp. 57-58..

125) Louis Mazières, *Comptabilité commerciale, industrielle et manufacturière ou cours théorique et pratique de la tenue des livres en partie double, enseignée aux élèves de l'Ecole d'arts et métiers de Châlons-sur-Marne*, P., L. Mathias, 1842, introduction.

126) Yannick Lemarchand, « Un précurseur de la normalisation comptable Brochant de Villiers, 1772-1840 », *Annales des mines*, décembre 1994, pp. 69-82.

الفصل الرابع

دولة داخل الدولة

بدأت أعمال ورشة حفر قناة السويس في صحراء رملية شكلت صعوبات شديدة جعلتها تختلف جوهرياً عن الورش القائمة في العواصم التي كانت تحظى بأوضاع ملائمة وتستفيد من التجهيزات الموجودة من قبل . بينما كان على المسئولين عن الحفر في خليج السويس مواجهة النقص الكامل في البنية الأساسية والخدمات العامة.

ولقد أدرك فواز أن الشئون اللوجستية التي أهملت في البداية جزءاً لا يتجزأ من عملية شق خليج السويس ولا يمكن فصلها عن أشغال الحفر: " لقد رأينا أنه كان من الوهم تصور إنجاز حفر القناة في عدة شهور بينما لا يوجد مساكن للعمال ولا ورش تركيب وتصليح للماكينات والآلات ولا مواصلات منتظمة ومضمونة" (١).

بل أكثر من ذلك ، رأى فواز أن من واجب الشركة أن تأخذ على عاتقها وبالرغم من أنه غير وارد في برنامجها الأصلي إقامة الإنشاءات الضرورية المختلفة للبنية الأساسية والتجهيزات التي تنقصها. في الخليج . لذلك سوف يعمل فواز على إنشاء إدارة للخدمات بداخل الشركة لا تكفل لها الاستقرار فحسب ولكن أيضا التشغيل والإدارة . ومن بين المشاكل العديدة التي أثارها الأعمال في قلب الصحراء ما يتعلق بتجهيز ساحة الخليج وبوجه خاص توصيل المياه وإقامة البنية الأساسية للنقل والمواصلات وإقامة المخيمات والمدن بل وتشيد عاصمة أيضاً هي الإسمايلية ، والبعض الآخر يرتبط بالحياة في المجتمع وعمس الصحة العامة والشعائر الدينية والأمن .


ومن خلال تحليل الحلول المتكررة التي قدمت لحل هذه المشاكل المختلفة سوف تتضح المبررات المنطقية التي تستند إليها بل ويظهر منها غموض موقف الشركة التي تهدف أفعالها في نهاية الأمر إلى إقامة دولة مصغرة على الأرض المصرية. وهو ما خصه الرسام ناريسس برشار (Narcisse Berchère) في صيغة مقتضبة : " باختصار ، فرض علينا أن نستعمر في ذات الوقت الذي نشق فيه القناة " (٢) . أما الكتاب المصريون من جانبهم فلقد سجلوا أن دي ليسبس لم يكن يتردد في الاستفادة كثيراً من الامتيازات الهائلة التي منحتها له الفرمانات الأولى و استغل ضعف الخديوي سعيد ، وذكرها بشأنه المثل العربي الشائع : " سكتنا له دخل بحماره " (٣) .

المواصلات والاتصالات

تم ربط مختلف المنشآت الضرورية للمواصلات التي تطورت استجابة لاحتياجات الورشة بالشبكات الأخرى القائمة في مصر وتشعبت فروعها تدريجياً إلى كل منطقة خليج السويس ، وهي بذلك قد أسهمت في تشكيل إقليم جديد بل وأيضاً في نفس الوقت الاستحواذ عليه وإحكام الرقابة على أحواله .

إقامة طرق المواصلات

في الدراسة التي أعدها عام ١٨٥٦ المهندس النمساوي نيجريلي (Negrelli) عضو اللجنة الدولية تم حصر وسائل وطرق المواصلات الموجودة في مصر ^(٤) و في بيان دراسة جرد المكان ظهر واضحاً أن الطرق المائية - فروع النيل المختلفة والقنوات العديدة - تمثل الطرق الرئيسية للمواصلات في البلاد. أما الطرق البرية فهي لا تتعدى تلك التي أنشئت في عهد محمد علي والتي استعملتها هيئة صندوق بريد الهند ^(٥) والتي تربط بين الإسكندرية والقاهرة والسويس . ويوجد في الخليج طريقان إلا أنهما في الحقيقة عبارة عن دروب توضحها خرائط مُعدة للمسافرين : "الطريق من القاهرة إلى السويس عن طريق وادي المتاهة" (ياله من برنامج !) و"الطريق الذي يصل مصر سوريا عن طريق القنطرة "

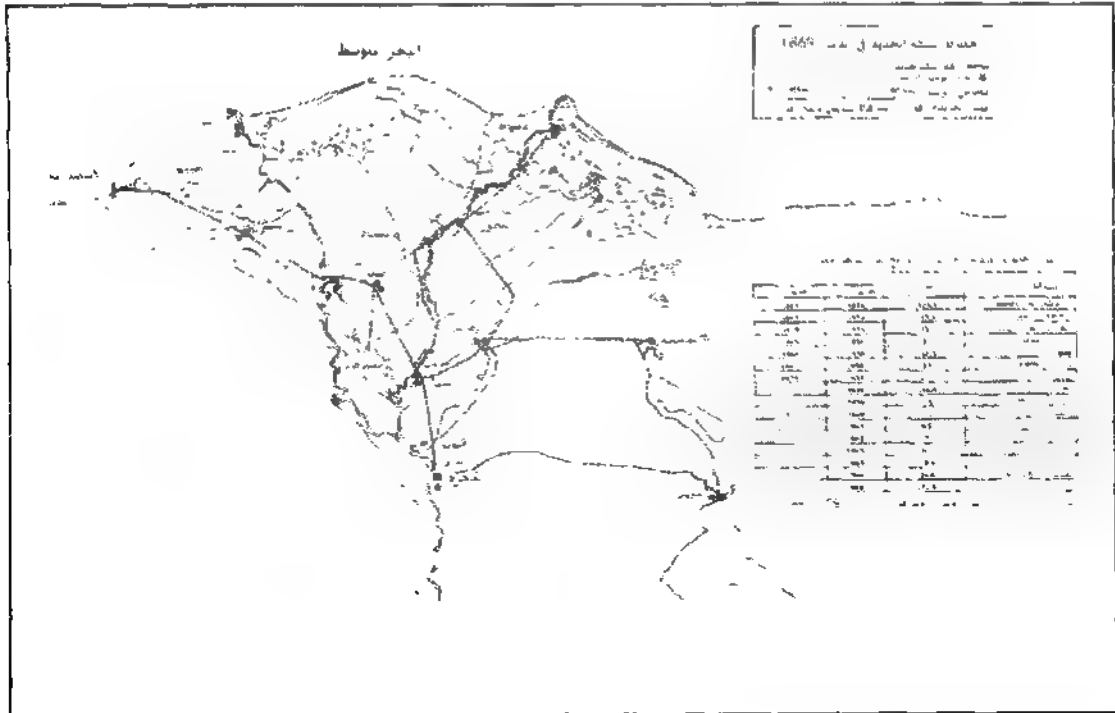

خطوط سكك حديد الوجه البحري في عام ١٨٦٩

أما بالنسبة لوسائل المواصلات المتوفرة في البلد فهي قبل كل شيء القوارب الشراعية الصغيرة التي تشق النيل والترع . وليس من العجيب أن تزدهر في هذه الظروف السكك الحديدية ازدهاراً كبيراً . وكان خط إسكندرية القاهرة هو أول خط تم بناؤه في القارة الإفريقية . وقد امتد حتى السويس في ديسمبر عام ١٨٥٨ أي قبل بضعة شهور من البداية الرسمية لورشة قناة السويس^(٦)

وفي السنوات الأولى سلكت البضاعة المتجهة إلى الخليج الطرق المصرية الرئيسية للمواصلات وجمعت بين أساليب النقل المتوفرة : القطارات والقوارب وقوافل الجمال . و أدت صعوبة أعمال الشحن إلى تأخير الرحلات التي كانت بطيئة في ذلك الوقت فتستغرق المسافة على النيل من سمود إلى دمياط أى ما يقرب من مائة كيلومتر حوالي ستة عشرة ساعة عندما تكون الرياح مرابية ولقطع هذه المسافة في الاتجاه المعاكس يلزم من يومين إلى أربعة أيام^(٧)

ولما وصل فوازن إلى الخليج أشار بوضوح إلى أن مشكلة المواصلات مسألة أولية يجب حلها وعبر عن اندهاشه للإستهانة بها إلى هذه الدرجة حتى ذلك الحين : " في غياب ترعة الماء العذب . لا بد أن نعطي اهتماماً بالغاً للبدء بتنظيم جيد وشامل للورش وخاصة المواصلات قبل تنفيذ أي عمل في عتبة الجسر ونعتقد من جانبنا أنه لم يكن هناك ثمة مجال للتردد في إنشاء سكة حديد تربط بين الزقازيق وبحيرة التمساح " ^(٨)

وسوف تتطور حالة المواصلات سواء باتجاه الخليج أو في داخله مع تقدم الأشغال . وقد حصلت الشركة أكثر من مرة على مساعدة الحكومة المصرية . وفي عام ١٨٦١ عمل الخديوي سعيد على إنشاء طريق مرصوف لمروء العربات على ضفة قناة الزقازيق بين محطة السكة الحديد المقامة بهذه المدينة وجسر التل الكبير حيث يلتقي بالطريق الصحراوي^(٩) . وهكذا أصبحت المواصلات المتجهة إلى الخليج سهلة وذلك حتى إنشاء ترعة الماء العذب . واستفادت أيضاً الشركة من مد شبكة طرق السكك الحديدية المصرية أثناء هذه الفترة بفضل قرار إسماعيل باشا في ١٨٦٦ بإنشاء خط سكة حديد جديد يربط القاهرة بالسويس عن طريق الزقازيق والإسماعيلية بدلاً من الخط القديم الذي لم يتجاوز عمره عشرة سنوات . وأقيمت أيضاً محطات في السرايوم وفي الشالوفة لاستخدام الشركة فقط . وبدأ في أول يوليو ١٨٦٨ فتح الجزء بسين الزقازيق والإسماعيلية ووصل الخط إلى السويس بعد شهر ونصف مما جعل المسافة من الإسماعيلية إلى السويس تستغرق ثلاث ساعات^(١٠) . وكان الهدف الواضح بالنسبة للحكومة المصرية إضافة إلى الأهمية التي توليها لإنشاء طريق مائي دولي هو الحفاظ على سيطرتها على هذا الجزء من الإقليم الذي استولت عليه شركة فرنسية خاصة مع احتفاظها على طرق السكة الحديد.

كما حاول رجال الورشة جاهدين بقدر الإمكان الاستفادة من القنوات الجاري حفرها سواء القناة البحرية أو ترعة الماء العذب بدلاً من إقامة بنية تحتية جديدة. وبفضل إقامة هويس جديد في الزقازيق عام ١٨٦١ استطاعت المراكب النيلية الإبحار أولاً حتى بلدة القصاصين عن طريق ترعة الوادي ثم عن طريق ترعة الماء العذب. وفي ٢٥ يناير ١٨٦٢ ساعد إقامة ممر ضيق بين الزقازيق والتمساح على وصول المراكب مباشرة إلى هذا المخيم^(١١). ونظمت الشركة لاحتياجاتها الخاصة خدمة يومية لصنادل مقطورة تسهل قطع هذه المسافة في يوم أو يوم ونصف تبعاً للاتجاه. وإذا بالحكومة المصرية تعترض بسرعة على حفر ترعة الماء العذب وهو ضمن بنود الامتياز. وتمت إضافات إلى اتفاقية ١٨ مارس ١٨٦٣ بعد بضعة سنوات وأعطت صفة رسمية لردّ الجزء الأول من الترعة بين القاهرة والوادي. وفي الحقيقة، طبقاً لبنود الاتفاقية الصادرة في ٣٠ يناير ١٨٦٦ تنفيذاً لقرار التحكيم بتاريخ ٦ يوليو ١٨٦٤ استعادت الحكومة المصرية ملكية ترعة الماء العذب بأكملها التي نفذها في ذلك الوقت الشركة ويقصد بذلك الجزء الذي يبدأ من الوادي ويصل إلى الإسماعيلية ثم إلى السويس. واستردت بذلك مصر تحت ضغط تركيا سيادتها على هذه الترعة وهي الجزء المتمم لشبكة مياه الدولة.

وفي بادئ الأمر تم حفر الجدول الذي مهد لثق القناة البحرية حتى بحيرة التمساح. وبذلك أتيح ضمان تروين الورش ونقل المعدات إلى أماكن العمل. وعندئذ طرح تساؤلان: الأول هو صلة الجدول بترعة الماء العذب والثاني امتداده إلى السويس. ولضمان المواصلات بين الفرع المشتق من النيل والقناة البحرية تم إقامة هويسين في الإسماعيلية على ترعة الماء العذب^(١٢) وحفر قناة اتصال في عام ١٨٦٤، إلا أنها أهملت فيما بعد إذ أنها أصبحت بلا فائدة بعد امتلاء بحيرة التمساح بالماء في الفترة بين ١٢ ديسمبر ١٨٦٦ و ١٥ أغسطس ١٨٦٧. وعندما اتضح استحالة توصيل الجدول المائي حتى السويس خاصة بسبب وجود وحدات يابسة واسعة بين البحيرات المرة انتهى الأمر إلى فكرة استخدام فرع ترعة الماء العذب من الإسماعيلية إلى السويس لتنفيذ طريق مائي دائم للملاحة بين البحرين بأسرع ما يمكن. لهذا الغرض تم بناء ثلاثة أهوسة وسيطة بين الإسماعيلية والسويس يسقط الماء من كل منها بمعدل ستين سنتيمتراً^(١٣)

ولما تنوعت طرق المواصلات في وسط الخليج، تحسنت وسائل النقل أي تحولت خلال بضع سنوات من الجمال إلى الآلة البخارية إلا أن الشركة اعتمدت أيضاً على صنادل صنعت من الخشب في ورش بور سعيد بدلاً من الجمال التي ساهمت كثيراً في توصيل الماء والمؤن للمخيمات المنعزلة وأيضاً في ضمان نقل المواد والمعدات. وكانت هذه الصنادل تمر عبر المجرى المائي بين بورسعيد والإسماعيلية في قوافل وكان عددها يتراوح من ٦ إلى ٨ تجرها بحبال سواعد الرجال على

طول الضفة أو بواسطة البغال أو الجمال . وفي عام ١٨٦٥ بدأ استخدام المراكب البخارية يحمل محل الجر على القنوات بواسطة الدواب البطيئة والباهظة التكلفة. ^(١٤)

كما تم تأسيس هيئة إدارية خاصة منذ شهر أبريل ١٨٦١ من أجل تنظيم وتنسيق المواصلات في الخليج. وتم إدارة بعض المواصلات بواسطة المقاولين من الباطن فضلاً عن تزويد الورش بالماء العذب ، ففي ذلك الوقت كانت القوارب التي يملكها محمد الجيار التي كانت تبلغ المائة وعشر تقوم بأعمال النقل على بحيرة المتزلة بين دمياط وبور سعيد ورأس العش وذلك لنقل البرقيات والمسافرين والمعدات وكذلك جزء من المجندين القادمين من المنصورة إلى ورش القناة البحرية والتي تذهب القوارب لأخذهم من المطرية. ^(١٥) . سوف تقوم هيئة المواصلات بمهمة إدارة التحركات وتوزيع الإمكانات . كما أسند لكل محيم عدد معين من المراكب والحمير والخيول والجمال يتناسب مع حجمه وعدد سكانه. وللرتب أحكام، إذ تم مراعاة الوضع الوظيفي فكل رئيس قطاع له حصانان ورئيس القسم له حصان أما المراقب فله حمار . ويقع على المستخدمين مسئولية رعاية دوابهم . وتم إقامة الإسطبلات و تعيين السائسين في المخيمات الرئيسية . وتم أيضاً وبناء على طلب الإدارات المختلفة، توفير الدواب والعربات الخ ، مقابل أيجار يومي أو بالمقطوعة وفق أسعار محددة يتم مراجعتها شهرياً ^(١٦) .

النقل البري

الشركة العامة لقناة السويس البحرية

هيئة النقل

أسعار استعمال وتأجير الركوب واللوالب

١- باليومية

٦,٥	حمل بستام	٣	حمل بستام
٥	المصلا	٣	المصلا
		٥	المطار

٢- النقل من مكان إلى آخر.

المسافة		بالكيلو مترات		خط السور	
المركبة والدواب		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	
نوع		نوع		نوع	

ووفق عليه
المدير العام للأشغال
فوازان


القاهرة في ٣٥ يناير ١٨٦١
مدير الإدارة العامة
أنشو

ويدير هذه الهيئة مراقب يخضع لأوامره طبيب بيطري وعمال للجمال مسئولون في كل ورشة أو مخيم. وقد اكتسب قسم الفروسية الذي أنشئ منذ البداية، أهمية خاصة حتى نهاية الأشغال بالرغم من ازدياد عدد الزوارق البخارية، وكان مقره الإسماعيلية ويضم ورشاً لصناعة السروج والحدادة والسراجة والبيطرة كما يستخدم عدد كبير من العمال المتخصصين ويقوم بالرقابة الصحية^(١٧) على جميع الحيوانات والخيول والبغال والحمير والجمال.

ومن أجل ضمان وسائل مواصلات مريحة للتجارة الحرة و للعمال والمستخدمين في مقاولات الأشغال التي استقرت في الخليج، أقامت الشركة خدمة منتظمة لنقل المسافرين والبريد إلى القناة البحرية وترعة الماء العذب. ومنذ أول يناير ١٨٦٥ قامت مراكب تجرها الخيول من الشاطئ بتأمين المواصلات بين المحطات المختلفة. و تغادر الصنادل الإسماعيلية وتوجه إلى الزقازيق وبور سعيد والسويس. وتعلن المواعيد لتحديد ساعات الرحيل والوصول إلى كل محطة على الخط وكذلك ثمن تذكرة السفر بالدرجة الأولى والثانية. وقد تستغرق الرحلة من بحر إلى آخر يومين^(١٨). ورغم أن الحكومة استردت في عام ١٨٦٦ ترعة الماء العذب إلا أنها تركت للشركة إمكانية إقامة خدمة ملاحية^(١٩) فيها طوال مدة الأشغال. ومع بداية استعمال خط السكة الحديدية الجديد في ١٥ أبريل ١٨٦٨ كانت نهاية المواصلات على ترعة الوادي بين الزقازيق والإسماعيلية

البريد والتلغراف في خدمة الأشغال

أخذت الشركة في بداية الأشغال على عاتقها مهمة توزيع البريد الخاص بها في كل القطر المصري. وأسست خصيصاً لذلك مصلحة البرق وأقامت مكاتب البريد في المخيمات وتطورت هذه المهمة تدريجياً مع زيادة أماكن العمل وإحتياجات إدارات الشركة وأيضاً مطالب المقاولات المكلفة بالأشغال. ففي شهر يوليو ١٨٦٠ وقعت الشركة مع إدارة البريد الأوروبية (Posta Europa) عقداً بناء عليه تقوم بتوزيع رسائلها في مصر مقابل مبلغ سنوي إجمالي قدره ٦٠٠٠ فرنكاً^(٢٠). وكانت إدارة البريد الأوروبية مؤسسة خاصة يديرها إيطاليون ويرأسها ميراني (Merati) وبعد وفاته أدارها ابن أخيه شيني (Chini)، وقد حصلت على ترخيص وإعتراف من الحكومة المصرية منذ أن فتحت أول مكتب لها في الإسكندرية في عام ١٨٢٠. وقامت بتوزيع البريد في كل أنحاء القطر^(٢١) وتقع أقرب مكاتب البوستة الأوروبية إلى الخليج في دمياط والزقازيق والسويس. وتقوم الشركة ذاتها بنقل البريد الضروري لمصالحها و بريد عملائها بين المكاتب الثلاثة ومختلف ورش الخليج. و إستخدمت الشركة في مارس ١٨٦١ عشرة رجال وعشرة جمال لتوصيل وتوزيع البريد في المحطات المختلفة^(٢٢).

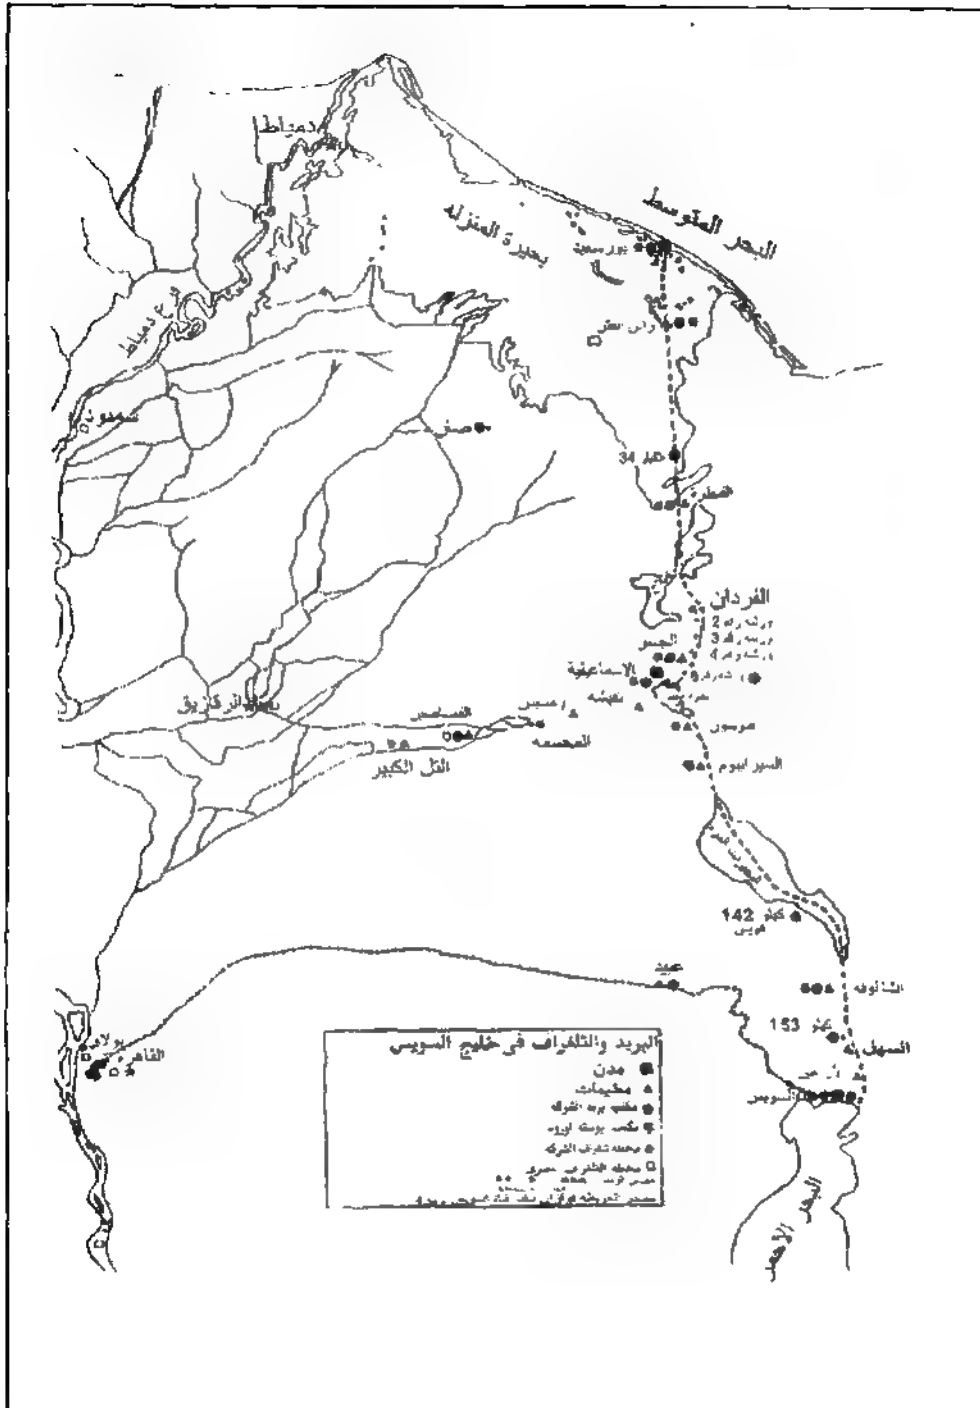

البريد والتلغراف أثناء الورشة

ومع تقدم الأشغال كثرت المخيمات وازدادت الإحتياجات ونتيجة لذلك تم تعزيز أعمال إدارة نقل البرقيات . وزادت سرعة الخدمة بفضل الإنتهاء من إنجاز مجرى الماء في نوفمبر ١٨٦٢ وبدأ

إستخدام صنادل-البريد التي حلت محل الجمال بل أيضاً بفضل الإدارة الحازمة للكولونيل أنجور (Angot) الذي كُلف بمسئولية البريد. وعلى مِثال وضع جداول مواعيد تحدد بدقة ساعات مرور موزعي البريد في كل محيم^(٢٣) وسعى لتناسب مواعيد وصولهم والرحيل من الزقازيق مع قطارات بريد السكة الحديد^(٢٤).

في أكتوبر ١٨٦٤ بعد إلغاء المصلحة الإدارية (service de l'intendance) انضم نشاط البريد إلى إدارة مكاتب منعزلة يديرها أدولف جيلير (Adolphe Geyler) رئيس مكتب المحاسبة السابق في الإدارة المركزية للأشغال. بالإضافة إلى ذلك لم تستطع الشركة تجاهل الإنقلاب الهام الذي فجره مرسوم الخديوي في ١٨٦٥ بشراء الحكومة المصرية لمؤسسة تشيني (Chini). وبناء عليه أصبح الإتفاق الموقع بين إدارة البريد الأوروبية وشركة السويس لاغياً. والأهم من ذلك ، أن الإدارة المصرية الجديدة للبريد أعلنت بعد فترة من تكوينها للشركة عن رغبتها في ممارسة نشاطها في كل أنحاء الوطن بما فيه خليج السويس دون إستثناء. ومع أن الشركة قد إعتمدت على خدمات البريد الجديدة فيما يخص مراسلاتها مع بقية البلاد ، فهي قد قررت في المقابل تجاهل طلبات إدارات الحكومة المتكررة للإقامة في الخليج. وداومت بنفسها على تأمين خدمة البرقيات بين مكاتبها المختلفة^(٢٥). وقد عمل فوازن على الإحتفاظ أطول مدة ممكنة بالإشراف الكامل على هذا النشاط نظراً لعدم الفاعلية العامة للإدارات في البلد والدور الإستراتيجي لهذه المصلحة التي يعتمد عليها في سرعة نقل المعلومات . فضلاً عن ذلك ازدادت سرعة نقل البريد في الخليج بشكل منتظم للدرجة أصبحت فيها مُرضية تماماً. وفي عام ١٨٦٨ قامت قوارب بخارية من نوع جديد صممه خصيصاً جلاسجو هاندرسون وكولبورن وشركاه (Glasgow Henderson, Coulborn et Cie) بتوزيع البريد بين بور سعيد والاسماعيلية في عشرة ساعات^(٢٦).

في نفس الوقت تم إنشاء خدمة التلغراف بواسطة اللجنة الدولية في عام ١٨٥٦ ضمن برنامج الأشغال في ذلك الوقت ، كوسيلة إضافية لزيادة الدخل فقط . ولكن في نهاية الأمر سوف يُستخدم التلغراف من أجل إحتياجات الأشغال ، فقد قرر فوازن إنشاء شبكة تلغراف لربط مراكز نشاط الورشة الرئيسية فيما بينها بل أيضاً عاصمة الخليج الإدارية مع القاهرة والإسكندرية وباريس . وقد تطور بسرعة وضع الأعمدة والكوابل التي بدأت في نهاية عام ١٨٦٢ رغم إعتمادها على وصول المعدات الخاصة بها المستوردة من فرنسا. في مارس ١٨٦٣ تم تشغيل الخط بين عتبة الجسر والزقازيق حيث التحم مع الشبكة الخاصة بالحكومة. وأدى إنشاء خطوط السكة الحديدية إلى الإستفادة من إقامة التلغراف الكهربائي في مصر كما هو الحال في أوروبا . لذلك منذ أغسطس عام ١٨٥٦ أصبح نقل الأخبار بين مدن الإسكندرية والسويس لا يحتاج إلا بضع

دقائق^(٢٧) بالإضافة إلى ذلك، تم ربط مصر بأوروبا بخطين تلغرافين ، أحدهما بحري يبدأ من الإسكندرية مارا بمالطا، والآخر أرضي عن طريق القسطنطينية وسوريا^(٢٨)

كما تم تجهيز مكاتب إيداع واستلام البرقيات في مخيمات الخليج الرئيسية . (٢٩) وفي أول يوليو عام ١٨٦٤ كانت قد انتهت عملية إقامة شبكة التلغراف الرئيسية واشتملت على عشرة محطات هي الزقازيق والتل الكبير والإسماعيلية والجسر والقنطرة ورأس العش وبور سعيد وطرسون وشالوفة الطرابية والسويس^(٣٠) وكذلك مائتي وخمسين كيلو متر من أسلاك التلغراف^(٣١) وقد تم تكليف جوستاف ريش (Riche Gustave) ، وهو الموظف السابق في إدارة خطوط التلغراف بفرنسا ، بمسئولية إنشاء وتشغيل مصلحة التلغراف .

وعلق فوازان قائلا: " إنما من الإنشاءات التكميلية الأكثر نفعا التي قمنا بها "^(٣٢) وأضاف في حديثه موضحا: " في الواقع تشكل سرعة معرفة الاحتياجات بكل أنواعها وكذلك سرعة تنفيذ الأوامر أحد الوسائل الأكثر فاعلية والأشد قدرة على ضمان حسن سير الأشغال "^(٣٣) .

لقد أصبحت إذاً شبكة التلغراف على هذا النحو أداة للاتصال لا غنى عنها بين الورش المنتشرة على طول مائة وخمسة وستين كيلو متراً من الخليج ، بل أيضاً بين الخليج وفرنسا . وفضلاً عن ذلك تساعد هذه الشبكة الإدارة الأمنية على التدخل السريع في حالة الحوادث. ويلتزم عمال التلغراف طوال ساعات الليل والنهار بإرسال البرقيات العاجلة التي يرسلها رؤساء إدارة الشركة^(٣٤) .

وفق اتفاق تم بين شركات السكك الحديدية كانت فرنسا تُقيم اتصالاتها التلغرافية الجديدة على شبكات الخطوط الأرضية لشركات السكك الحديدية ، وفي مقابل ذلك كانت الأخيرة تستغل هذه الخطوط لاحتياجاتها الخاصة^(٣٥) . كما شاهدنا مع استخدام التلغراف في ورشة قناة السويس خدمة جديدة ، فقد وُضعت هذه الآلية لأول مرة ، حسب علمنا ، لصالح تقدم الأشغال . ولمعرفة مدى حداثة تقنيات الاتصال المستعملة في الورشة المصرية نجد أن الحمام الزاجل كان يقوم في نفس الفترة تقريباً بنقل الأخبار في ورشة قناة قنوين الماء لمسدريد وأيضاً قناة إيزابيل الثانية (Isabelle II)^(٣٦) .

نفذ جوستاف ريش (Gustave Riche) الذي عين مديراً لهيئة البريد والتلغراف في ١٨٦٧ مشروعاً بفتح الخطوط المخصصة حتى ذلك الوقت للعاملين بالورشة أمام كل الشعب . و في ١٨ إبريل عام ١٨٦٨ بدأ تشغيل هيئة جديدة أخذت كمرجع شروط استغلال التلغراف والبريد في فرنسا . وأصدرت طوابع بريد خاصة للمراسلات داخل الخليج ، وأثناء الأربعة شهور الأولى من

عام ١٨٦٩ نقلت أسلاك تلغراف الشركة ٣١٢٧ برقية للجمهور^(٣٧). ووجدت الشركة أن في ذلك مصدراً وقيماً للإيرادات ، أما بقية بركات الخدمة فظللت مجانية .^(٣٨) ويوضح إعادة التنظيم أن النوايا التي عبرت عنها هيئة البريد المصرية لم تؤخذ بعين الاعتبار إلا نادراً . ومع ذلك سوف تستفيد الحكومة المصرية من تشغيل خط سكة حديد القاهرة - السويس عن طريق الإسماعيلية لإقامة مكاتبها في هذا الجزء من أراضيها ، ومن ثم لم يعد هناك ما يبرر استمرار الخدمة التي تديرها الشركة ، لذلك اختفت بعد عام من تشغيلها . وقد تقرر حسب الاتفاقية الأولى بتاريخ ٢٣ إبريل ١٨٦٩ أن تقوم الحكومة المصرية وحدها تدريجياً بمسئولية هيئة البريد والتلغراف في خليج السويس ورغم ذلك احتفظت الشركة بإمكانية امتلاك تلغراف خاص بها لاستعمالات مقصورة على خدمة الأشغال وعبر السفن في القناة البحرية .

هيئة الخليج : المدن والمخيمات

تعد إقامة المخيمات المخصصة لاستقبال رجال الورشة من بين الإنشاءات التكميلية للأشغال التي لا غنى عنها ، وهي عبارة عن مباني ومدن مؤقتة أسستها الشركة وشركات المقاولات أصحاب امتياز الأشغال وتديرها الشركة كاملاً .

في عام ١٨٥٦ كانت المنطقة مازالت صحراوية ماعدا تجمع السويس الصغير وهو ميناء إبحار الحجاج إلى مكة . وكان ينبغي على رجال الورشة الأول تخيل حلول لمشكلة أهملت دراستها سواء في مشروع المخطط التمهيدي أو مشروع اللجنة الدولية . وكان المصدر المكتوب الوحيد القادر على إرشادهم هو ما كتب في أدب الحروب وينطوي على معلومات تشمل مناهج وأساليب البناء والتنظيم الملائمة للمخيمات المؤقتة . و في الواقع ، يحدد بدقة فن إقامة وتنظيم المعسكرات الذي "يعتبر أحد فروع العلوم الحربية الهامة"^(٣٩) مواقع المعسكرات واختيار المكان المناسب لإنشائها ورسم المخيمات وإنشاء الأكواخ الخشبية الخ . وسوف نحاول ، خصوصاً عند دراسة أساليب بناء المخيمات في ورشة قناة السويس ، معرفة إذا ما كانت هذه الأساليب قد تم اتباعها .

اختيار المواقع و أسماء الأماكن

استقر رواد الورشة على ساحل البحر المتوسط في المكان الذي يجب أن تصب فيه القناة البحرية وأطلق على المخيم المتاخم لميناء المستقبل اسم بورسعيد ، تكريماً لحديوي مصر . وأقيمت مخيمات أخرى في الخليج بالقرب من خط الأشغال في مواقع تجعلها طوبوغرافية المكان ملائمة بل مريحة . واتجه الاهتمام على وجه الخصوص إلى مواقع لا يُخشى منها أن تنغمر بالماء وقت الفيضانات ، لذلك أقيم خلال عام ١٨٦١ على الجزيرة الوحيدة الجافة لبحيرة المتزلة مخيم في رأس

العش. وأعدت مخيمات أخرى على مداخل الجسر والسيرايوم والشالوفة . وتعني كلمة الجسر في اللغة العربية (ارتفاع) ، أما مخيم السيرايوم فيرجع اسمه إلى وجوده بالقرب من أطلال لآثار من الجرانيت والحزف الصلب مكرسة إلى سرايس .

وأقيم أول مخيم داخل الخليج قرب بحيرة التمساح وحمل اسم ابن والي مصر طوسون . وتبعد أقرب قرية لسكان البلد أكثر من أربعين كيلومترا في خط مستقيم عبر الصحراء . وتميز اختيار الموقع لأنه قريب في نفس الوقت من واحة بئر أبو البلاح الصغيرة ومن بعض الآبار التي تستطيع تزويد الإمدادات من الماء .

ويرجع أيضاً اختيار موقع القنطرة وسط المسافة بين بورسعيد وبحيرة التمساح تقريبا إلى التقاء عاملين أحدهما هو وجود بئر " بير شينان " ، والعامل الثاني هو أهمية موقعه في التقاء محور القناة المقبلة مع طريق سوريا الذي تسير فيه القوافل التي تعمل في تجارة المواشي . ويسهل توفير الماء والغذاء في هذه الهضبة التي تسيطر على الصحراء وتقع بين بحيرات المذلة والبلاح واسمها القنطرة ومعناها " الكُبرى " .


كذلك يعتبر وجود منجم عاملاً جذاباً بما فيه الكفاية في اتخاذ القرار لاختيار موقع الإقامة . لذلك منذ شهر ديسمبر ١٨٥٩ تم إقامة مخيم في الفردان على خط الأشغال لأن على مسافة قريبة منه أمكن فتح محجر من الذئبش وآخر من كربونات الجبس الهش ويوفر هذا المحجر الجص لكل أعمال بناء الخليج . ومن جهة أخرى هناك مخيمات مرتبطة باستغلال محاجر عتاقة وجبل جنيفة وكذلك محاجر المكس الواقعة على شاطئ البحر على بعد ٤ كيلومترات من غرب الإسكندرية . و ظلت أحجام هذه المخيمات متواضعة للغاية . وأقيمت أيضاً على طول ترعة الماء العذب بعض المخيمات الثابتة مثل مكسامة ورمسيس . كما شيد في التل الكبير مخيم في وسط ميدان الوادي حول مبنى ضخيم بناه محمد علي في عام ١٨٢٣^(٤٠) .

ويشمل المخيم النموذجي مثل مخيم الجسر المباني الآتية : مستشفى ومساكن للطبيب والصيادلة وأيضاً مخبز ومحل جزارة ومسكن راهبات وكنيسة صغيرة وبيت الكاهن ومحل مركزي ومحل بيع بالتجزئة ومساكن للمستخدمين في المقاولات والعاملين بالشركة وأماكن إقامة رئيس قسم المقاولات والمقاول العام والمهندس رئيس القطاع ومكاتب المقاولات ومكاتب شركة القناة وورش التجارة والحدادة وصناعة العربات والمناشير والمخارط ومكتب إنشاء الخيام وسوق للتجارة الحرة وحلقة ترفيهية وفندق للمسافرين ومقاهي ومطعم (كائنين) ومساكن للعمال الأوروبيين ومكتب هيئة النقل والإسطبلات وحظيرة للجمال^(٤١) وبحوار المخيم قرية عربية تجذبها مساكن يختلط فيها التجار والمقاهي وتختلف أساليب تشييد المخيم المخصص للأوروبيين .

حيث أن معظم المباني تم بناؤها على خلاف القرية العربية المكونة من أكواخ من ألواح الخشب. وبعض هذه الإنشاءات لها وجود مؤقت للغاية ، إذ أنه بعد انتهاء العمليات القرية منها تختفي هذه المخيمات المتنقلة أو المؤقتة أو تنقل لتلحق بمواقع الأشغال . وأثناء التمهيد في عام ١٨٦٤ أقام العاملون في أكواخ عائمة تأوي وتحفظ معداتهم وتجنبهم مشقة ومتاعب السفر في الصحراء.^(٤٢) ولا تعرف المخيمات المؤقتة دائما اسماً معيناً كما ذكر رحالة : " وصلنا إلى الكيلو ٢٠ وليس للمكان اسم آخر " ^(٤٣) . ويفهم من ذلك أن المكان يقع على بعد ٢٠ كيلومتر من بورسعيد بمسافة حددت في اتجاه محور القناة البحرية.

وتشارك في إعمار منطقة خليج السويس المخيمات المختلفة المتباعدة بشكل منتظم بين بورسعيد والسويس والموجود عدد كبير منها قرب القناة البحرية على الساحل الإفريقي أي الغربي . ويتغير مصيرها وازدهارها مع الزمن ويرتبط ارتباطاً شديداً بالأشغال في القناة التي تنفذ بالقرب منها . وقد حظي بعضها بوضع خاص عندما أصبح مركزاً إدارياً لأحد أقسام الأشغال . وتؤثر الظروف الحاسمة في تاريخ أشغال الورشة تأثيراً فعالاً في حياة هذه المخيمات وأوضاعها . وهكذا تعرض موقع الفردان للإهمال بعد رحيل عمال السخرة ، ومع ذلك أقيم أمامه مخيم صغير يحمل نفس الاسم خلال عام ١٨٦٤ وسوف يصبح مركزاً لأشغال الحفر التي نفذتها الشركة بإشراف الدولة . وفي عام ١٨٦٢ تم نقل مركز قسم أشغال بحيرة المنزلة الواقع سابقاً في القنطرة إلى رأس العش لما يوفره المكان من موقع أفضل للإشراف على أشغال الجرف التي يجب القيام بها في البحيرة . ومع مرور السنوات زادت مساحة الجزيرة الصغيرة التي يوجد بها رأس العش لتستوعب إنشاء مبان جديدة . وحتى نهاية الورشة بقي فيه مركز القسم الثاني للأشغال . وفي عام ١٨٦٢ أصبح الجسر مركزاً لأشغال الحفر الضخمة التي نفذتها فرق السخرة . وقد هُجر المخيم عند رحيل الفلاحين ولكن عادت إليه الحياة من جديد مع بدء أعمال مقاولات كوفرو (Couvreux) التي قررت حشد منشآتها الرئيسية فيه . وتعتبر كل من بورسعيد والجسر الإسماعيلية والسويس مقراً لقطاع من الأشغال . وقد تطورت سنة بعد أخرى قائمة المخيمات الآهلة واستفاد تنظيم الورشة من الإنشاءات التي أقيمت تدريجياً وكأنها ركائز يعاد تنسيقها باستمرار لخدمة شركة القناة .

وتعتبر الإسماعيلية حالة منفردة من البداية فقد وضع تصميم بنائها لتقوم بدور مركزي ثم تحولت الفكرة الأولى الموجودة في المشروع التمهيدي^(٤٤) والخاصة بإقامة ميناء داخلي على شواطئ بحيرة التمساح إلى فكرة بناء عاصمة إدارية بعدما تولي فوازان رئاسة الورشة . فالقرار الذي اتخذته خديوي مصر في عام ١٨٦٢ ببناء حوض إصلاح سفن بالسويس أوقف مشروع

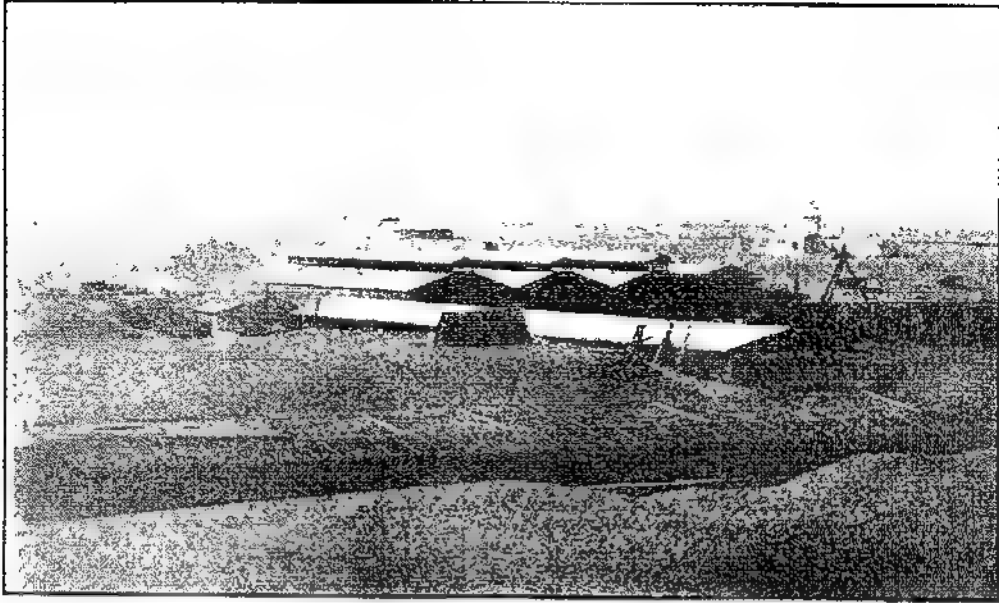

عجيم وورش الجسر


(صورة أديزيره - مقتنيات ديجورج الخاصة)

منشآت المرفأ على شاطئ البحيرة^(٤٥) واعتبر فوازان أن موقع التمساح في وسط الخليج موقعا استراتيجيا . فضلا عن أنه يقع تقريبا في منتصف المسافة بين طرفي القناة البحرية فهو أيضا نقطة التقائها مع ترعة الماء العذب المتفرعة من النيل . ومن هنا تأتي سهوله نقل وتوريد الماء العذب . لذلك صمم فوازان على فكرة جمع الإدارات الرئيسية للشركة ولقاوالات هاردون المتناثرة من قبل وجعل من التمساح مقرا لإدارة الأشغال . وكان الهدف في نفس الوقت هو إنهاء تعدد أماكن الإدارات التي كانت سببا في ضياع الوقت وإبراز أهمية مركزية مكان صنع القرارات . ولقد تم وضع حجر الأساس للمدينة الجديدة في إبريل عام ١٨٦٢ ، و استقرت بها مصالح الشركة بما في ذلك مكتب المدير في الشهور الأولى من عام ١٨٦٣ . وسميت المدينة في بادئ الأمر التمساح وابتداء من ٤ مارس ١٨٦٣ أطلق على المدينة اسم الإسماعيلية وذلك تكريما لجلوس الخديوي إسماعيل على العرش وأصبحت المقر العام للشركة والمكان الذي تُتخذ فيه القرارات الخاصة بالورشة . وجمع فوازان منذ عام ١٨٦٧ بين مهام مدير عام الأشغال والوكيل الأعلى وتم نقل الإدارات التي ظلت في الإسكندرية حتى ذلك الوقت إلى الإسماعيلية التي أصبحت منذ هذه اللحظة العاصمة الإدارية للخليج . ويربط التلغراف بينها وبين ورش الخليج المختلفة وكذلك بين الزقازيق والقاهرة والإسكندرية ومارسليا وحتى باريس . ولم يخف ذلك على الزائر الذي قال " نحن في الإسماعيلية التي هي قلب الأشغال نفسها والنقطة التي تنبعث منها الأوامر وتصل إليها التقارير وتنتهي عندها قنوات الاتصال "^(٤٦) .

تخطيط المخيمات والرسومات

عندما نتابع تطور إنشاء المباني مع مرور الزمن نلاحظ أنه في بداية الأشغال تمت الإنشاءات بطريقة تكاد تكون تلقائية في أماكن اعتبرت ملائمة لقربها في أغلب الأحيان من ساحة الأشغال. فلم يكن يوجد في ذلك الوقت خطة شاملة سابقة للبناء. ومع ذلك في بداية عام ١٨٦١ تم رسم خطط إجمالية للمخيمات الرئيسية تهدف إلى توجيه وضع الإنشاءات الجديدة وتصور مسبقا شكل تطور المدينة. وتزامن اتباع هذه الطريقة الجديدة مع وصول فوازان إلى الشركة الذي أوضح مرة أخرى عزمه على التخطيط في كل ما يتعلق بالورشة. ولم يكن يتم تنفيذ الخطة دائما بالسرعة المتوقعة. ففي بورسعيد " لم تتم إقامة المنازل في المرحلة الأولى على شاطئ البحيرة (القرو) إلا بصفة مؤقتة وكان لا بد أن تفسح المكان فيما بعد أمام مبان يتضمنها الرسم الصحيح للمدينة الذي كان يُدرس في ذلك الوقت وله علاقة بالأرصعة والأحواض المقبلة. ولكن زيادة السكان الهائلة وغير المتكافئة مع إمكانيات العمل التي كانت تحت تصرف الشركة لتنفيذ الرسم الصحيح اضطرت إلى الحفاظ على الخط الأول الذي أقيم عليه بالضرورة مبان أخرى هامة لم يكن تشييدها ممكنا على

ب. لم تمهد بعد " (٤٧)

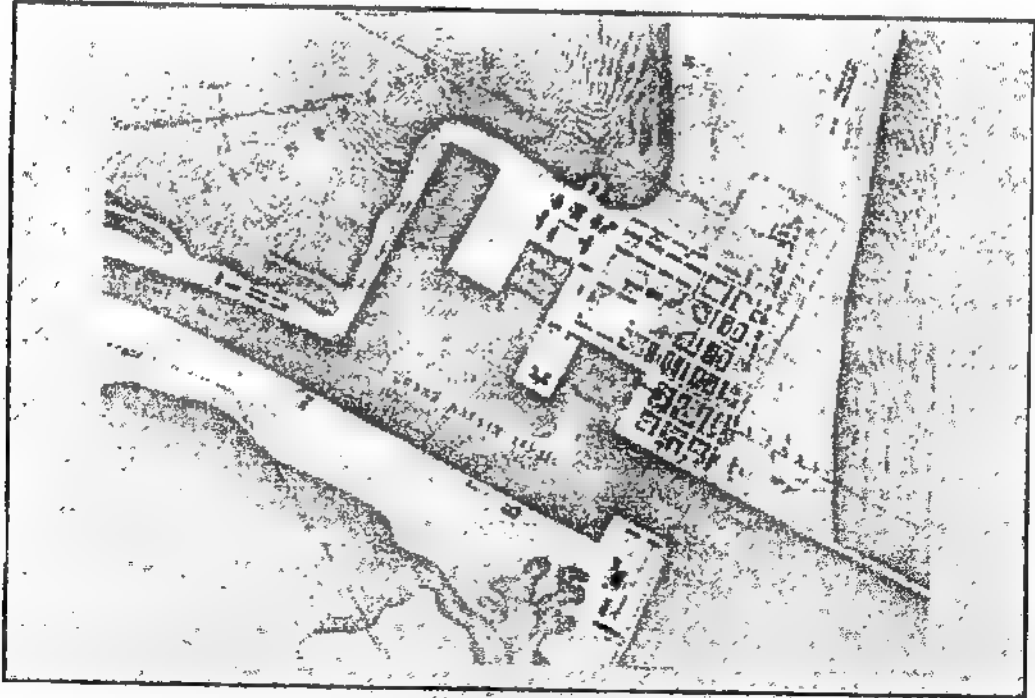

رسم خريطة مدينة بورسعيد

(ل. موتيل وأ. كاساني، في المرجع المذكور، الأطلس لوحة ٣ - تفاصيل)

نتج عن دراسة رسم خرائط المخيمات (٤٨) أن الشوارع أخذت شكل مربعات منتظمة، ويحدد اتجاهها محور القناة المستقبلية. وبشكل عام فرضت القناة البحرية على مساحة خليج السويس

اتجاهاً مميزاً أو أطلقت أسماء على معظم شوارع المدينة ، ولكن بدون ابتكار ملحوظ، إذ يحرص المبنى العام أو النشاط الرئيسي التسمية للشارع . لذا نجد في الجسر شارع الكنيسة وشارع المسجد وشارع المستشفى وشارع التجارة^(٤٩) . وعلى بعد عشرات الأمتار من المخيم تُظهر الخرائط بعض المباني التي قامت بشكل عشوائي وغير منتظم وهي القرية العربية ومع ذلك لا ترجع هذه الظاهرة إلى تقصير وكلاء الشركة وعدم محاولتهم إدخال قواعد التخطيط .




مخيمات القنطرة (فوق) والسرايوم (تحت)

(ل. مونيل وأ. كاساني ، في المرجع المذكور ، الأطلس لوحة ٦ - تفاصيل)

أما مدينة الإسماعيلية فلقد أنشأت بخلاف بورسعيد على أساس مخطط منذ البداية . وأيضاً وعلى عكس ما يحدث عادة مع مثل نموذج التخطيط هذا لم تظل المدينة في طور المشروع وإنما بنيت في الحقيقة على أساس ترتيبات تم توقعها منذ البداية ونظرة مستقبلية . فقد نشأت الإسماعيلية مع الورشة ولحقت بذلك مجموعة من المدن الخاصة التي نجد بينها لي كريزو (Le Creusot) وهي مدينة وليدة المصنع^(٥٠) ومدينة لوريان (Lorient) المدينة التي نشأت مع نشاط ورشة بناء السفن^(٥١) .

لم يهتم أعضاء لجنة الإدارة ولا اللجنة الاستشارية ولا دي ليسبس بأسلوب تصميم المدينة وبنائها ، فقد تصرف في ذلك الحين مدير الأشغال ورؤساء قطاع الإسماعيلية ، على حسب أهوائهم ودون مراعاة النظام السيامي أو العقاري . ولو عرفنا عدد المتعهدين الذين يتدخلون عادة في فرنسا في مسائل التنظيم لقدرنا موقف هؤلاء المهندسين الغير المألوف . و يمكن في ظل هذه الظروف القول أيضا بأن خريطة هذه المدينة تعبر إجمالاً عن فكر مهندسي الطرق والكباري بالشركة وفي مقدمتهم فوازان .

هكذا بنيت الإسماعيلية في وسط الصحراء على أساس رسم مسبق وليس وفق مخطط براغي المباني المرتبة ، وكان ذلك على شكل هندسي يحدد تخطيط الطرق ويوزع الكتل في الفضاء^(٥٢) ويمكن تقديم هذا الرسم على نحو مبسط كما يلي :



مخطط الإسماعيلية نحو عام ١٨٦٣

وهكذا تم وضع رسم للمدينة دون النظر للموقع أو السياق .^(٥٣) ونلاحظ أيضا أن المسقط السمي هو المنظور المختار لتمثيل المساحة المدنية المراد إقامتها . كذلك كان الاهتمام بالتناسق والتمسك بالتماثل راسخا . وبين المخطط المقترح أيضا بوضوح فكرة المدينة المفتوحة الحالية من الأسوار وبالتالي غير محددة في تطورها ويمكن إجراء توسعات بها بمجرد إضافة وحدة جديدة ويتعارض تصميم المدينة مع تصميم المهندسين في سلاح المهندسين الذين عندما شرعوا في بناء المدن في الجزائر من عام ١٨٤٠ و ١٨٦٠ أحاطوها بأسوار .^(٥٤) وفي ذات العصر عند توسيع مدينة برشلونة ، نفذ هيلدفونس سردا (Hildefonse Cerda) مؤسس لفظ " تنظيم المدن "Urbanisme" نفس الفكرة .

ويبلغ جانب ضلع المربع الأساسي الذي تتكون منه كل وحدة مائة متر ، ومن ثم رجحت المنطقية العشرية والترية التي تدعم الطابع الخيالي لرسم المدينة . ونلاحظ أيضا غلبة تخطيط طرق المواصلات على التقسيمات الصغيرة إذ تنظم شبكة الشوارع الخريطة وتسبق إقامة كل المباني وترتب تنسيقها . كما تساعد الشوارع الطويلة المستقيمة على الربط بين الوحدات المختلفة . ويخضع عرضها لأسلوب تدريجي ومثال ذلك كان عرض الشوارع الرئيسية ٣٠ متراً والشوارع القطرية ١٩ متراً والشوارع الأخرى عشرة أمتار أو أحد عشر متراً . ويمكن مقارنة هذه المقاييس

بمقاييس طرق باريس الجديدة مثل شارع رويال (Royal) و شارع دي لايبه (de la Paix) أو شارع ترونشيه (Tronchet) التي افتتحت في باريس في عهد نابليون الثالث والتي يبلغ عرضها عشرين متراً^(٥٥)

وأخيراً هناك دليل آخر يوضح خيارات وأساليب عمل المدير وهو أن المدينة تم وضع تصميمها قبل الشروع في بنائها . فمنذ بداية المشروع أخذ في الحسبان ازدهارها في المستقبل وأمل في تطورها لما يتميز به موقعها بالنسبة لكثير من المعاصرين . فقد " أنشئت المدينة وفقاً لتخطيط معد للوفاء بكافة الاحتياجات التي سوف تظهر يوماً ما "^(٥٦) هذا ما كتبه ليون مونيل (Léon Monteil) مسئول المعدات بالشركة . و جاءت من هنا فكرة استنساخ الوحدة أولاً بأول عند الحاجة إلى ذلك ، لأن المدينة أساسها تجمع الوحدات و أيضاً اختيار المقاييس المعطاة للشوارع .



مخطط الإسماعيلية نحو ١٨٦٨ ، تفاصيل


(تم حفرها قبل إرماد)

تم وضع برنامج للتمييز بين المخيمات في الإسماعيلية كما هو الحال في مخيمات الخليج الأخرى بحيث تظهر فعلاً على الوحدات تسمية أحياء كثيرة تشكل وحدتان مركبتان " الحي الأوروبي " بينما الوحدة الواقعة في الشرق تصور مسبقاً " الحي اليوناني " والوحدة الواقعة في الغرب تدل على أنها " الحي العربي ". بالرغم من تبنى أشكال متطابقة لكل حي من هذه الأحياء إلا أنه من المستحيل تصور ترجيح رؤية المساواة بينها . كما تستنسخ المقابر الواقعة على الأطراف التمييز بين المخيمات . وفي بور سعيد المقابر الثلاثة الكاثوليكية و اليونانية و العربية و كلها محاطة بأسوار تفصل بينها مسافة صغيرة (٥٨) .

ولقد بنيت مدينة الإسماعيلية من العدم فليس لها ماض ولا تاريخ . و ربما تعويضاً لذلك كانت المبادرة بإطلاق أسماء على الميادين والشوارع تتصل جميعها بحفر قناة السويس وذلك من أجل ترسيخ اقتران المدينة بالقناة رمزياً . (٥٩) وكان الهدف على ما يبدو هو غرس جذور وهوية لا يتيحها لها مخططها خارج الزمان والمكان .


و يشكل الحي العربي في هذه المدينة الخلاف الحقيقي والتشويه الأكبر لتنظيم المخطط الجميل ولعدم إمكانية الحفاظ على التنسيق المتوقع والانضباط المفروض (٦٠) قام فرنسوا فيدير (François Viller) رئيس قطاع الإسماعيلية ، بعمل تصميم جديد للحي في صورة تخطيط متعامد ومكون من شوارع عرضها عشرة أمتار وتحدد مربعات من ١٠٠ متر على الجوانب (٦١) . هذا التصميم رغم أنه أكثر بساطة إلا أنه يتبع نفس الأسلوب . ولم يكن من الضروري إذا الانتظار طويلاً حتى ينهار شكل المدينة الأوروبية وتنهار معه مبادئ تنظيم المكان الخاصة به (ميدان وشوارع واسعة ، تحت ضغط تأثير استخدامات أهل البلد . فقد تفكك الرسم التخطيطي الأصلي للمدينة قياساً إلى التصور المعد في البداية ولم يقاوم صدمة المواجهة مع الواقع المحلي والممارسات المصرية التقليدية لاستيعاب وإدارة المكان . ويمكن تفسير التخلي السريع نسبياً عن المشروع الأول بأنه تدارك للأسلوب الخاص بالمدينة العربية ، وأبعد من ذلك ، بأنه دليل على قبول هذا الاختلاف . وإن لم يكن المقصود على الأقل هو عدم الاهتمام . ففي كل الأحوال يتميز بناء مدينة الإسماعيلية عن النموذج الجزائري المعاصر حيث كان التدخل الاستعماري على مدينة الخزانة الموجودة أقل ترفيقاً (٦٢) ومع ذلك فإن هذا التخلي لم يكن كاملاً ، ويمكن إثبات تمسك مدير عام الأشغال الضمني برسم البداية من خلال مقارنة الخرائط المختلفة التي تصور المدينة وبخلاف سائر المخططات يمثل مخطط الإسماعيلية الذي يتضمنه أطلس فوازان وحدة الحي العربي وكأفاً مماثلة لبقية الوحدات (٦٣) . وهذا المخطط الذي لا يتناسب مع المباني الحقيقية في السنة المشار إليها (١٨٦٩) يثبت فعلاً اهتمام فوازان بمنح صورة معينة للإسماعيلية بعد عدة سنوات ويفسر تمسكه بمبدأ مخطط بناء المدينة الأول .

وتخضع تفاصيل تنسيق المدينة وتوزيع المباني لمعايير وظيفية. لذلك تم تحديد الأراضي المعدة لاستقبال المخازن المختلفة وأماكن خدمات الترانزيت (العبور) على جانب ترعة الماء العذب أي طريق وصول البضائع. أما ورش الصناعات والمذابح فتشغل أرض أساسية على الجانب الآخر لترعة الماء العذب. فلم يكن مستوجبا وجود هذا النوع من النشاط داخل المدينة . وتظهر أيضا معايير أخرى ترجع أكثر إلى أحكام أخلاقية مسبقة وإلى رغبة كامنة في التنظيم تصل إلى حد سلوك البشر. وهذا ما يبدو خاصة في الاختيارات التي تتعلق بإقامة المستخدمين بالشركة في الإسماعيلية . فقد أقامت الغالبية العظمى في وسط المدينة بالقرب من ميدان شامليون في مبان متناسقة الشكل . وخصصت المنازل حول الميدان للمستخدمين المتزوجين . أما المنازل التي تحتل الزوايا فقد أعدت خصيصاً لرؤساء إدارة الشركة .^(٦٤) وقد تم عزل المستخدمين غير المتزوجين في جزيرة صغيرة مخصوصة ومعزولة أطلقت عليها الشركة " مربع غير المتزوجين " وأطلق عليها السكان اسم أحياء المسعورين .^(٦٥) وهكذا لم يتردد فوازان في إقامة ألوان عديدة من التفرقة في مدينة الإسماعيلية .

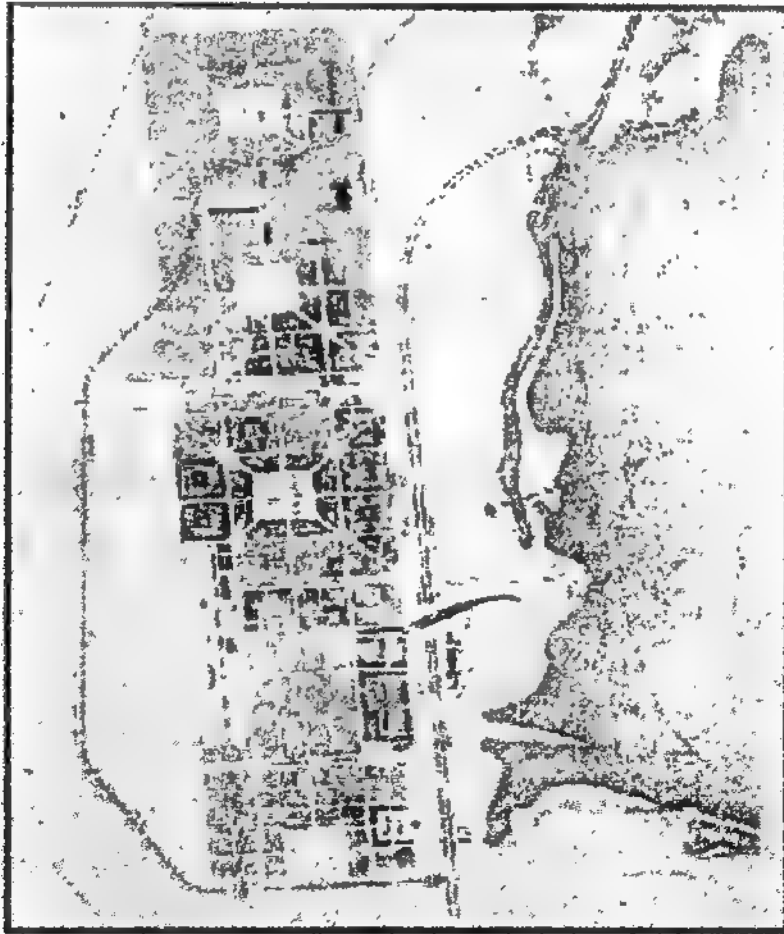

خريطة مدينة الإسماعيلية

(ل. مونيل دأ. كاساني ، في المرجع المذكور ، الأطلس لوحة ١٥ - تفاصيل)

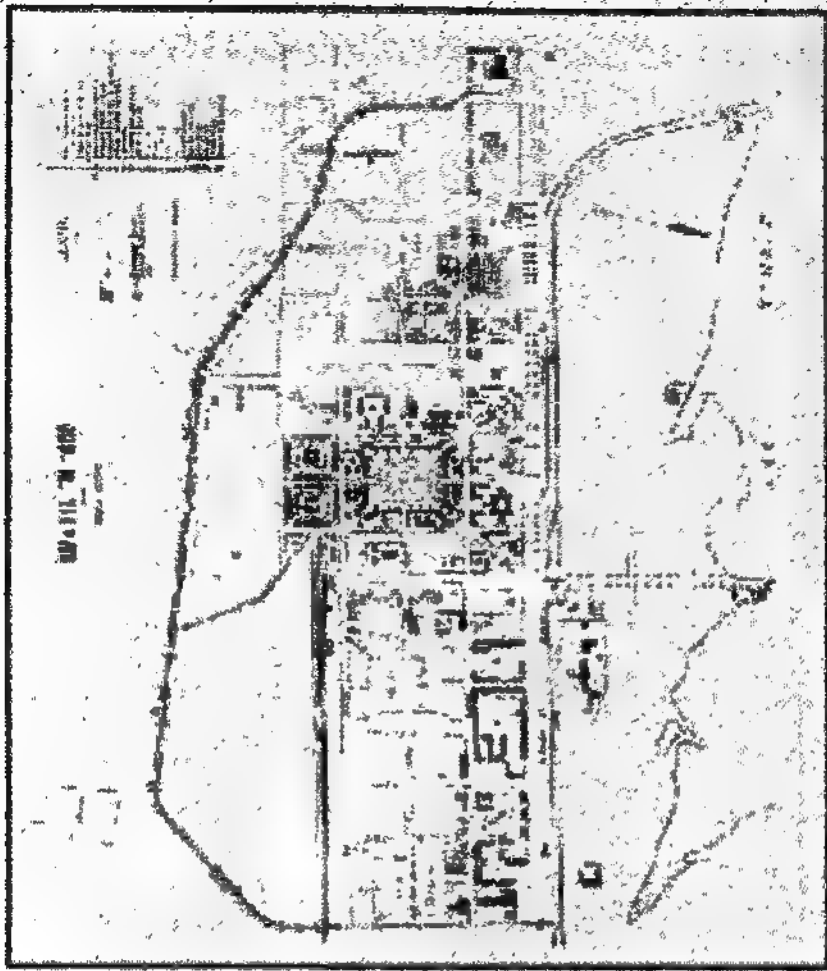

خريطة الإسماعيلية في عام ١٨٦٩

المباني سابقة التجهيز وتوحيد مقاييس الإنشاءات

علاوة على المباني العامة فإن المباني التي أعدتها الإدارة العامة للأشغال لاستعمالها الخاص في الخليج لم تفتقر إلى وضع مقترحات تتعلق بأساليب البناء التي ستبع . من بينها فكرة اقتراحها شخص يدعى جويو (Guyot) لبناء كل شيء من الحصار المنسوج^(٦٦) كما اقترح عضو من اللجنة العليا للأشغال إعداد تجارب لحيام من وبر الجمال المستعمل في تونس حسب قوله^(٦٧) بدلا من بناء أكواخ من الخشب. و لم يؤخذ بهذه الاقتراحات فقد كانت مواد البناء وأساليب المساكن التي اختيرت مرتبطة بالخبرة المكتسبة في الورشة .

ولقد أقام رواد الخليج الذين استقروا في بورسعيد تحت الحيام. وبعد ذلك شيدت لهم أكواخ من الخشب استخدمها من قبل الجيش الفرنسي أثناء حرب القرم (Crimée) على الشريط الأرضي الذي يفصل البحر المتوسط عن بحيرة المردة^(٦٨) وحلت محل الأكواخ الخشبية منازل

متنقلة وشاليهات وأكشاك من الخشب مستوردة من دار فرييه دي فيكام (Fréret de Fécamp). ولن تختفي من الخليج تماماً الخيام وهي المساكن التي أقيمت في البداية ، فقد شكلت المرحلة الأولى في المخيمات . وفي عام ١٨٦٣ عندما رغب فوازان في إنشاء خيام جديدة للمعسكرات نصح إدارة باريس بالاستفسار من وزارة الحربية عن أسماء أفضل مورديها ^(٧٩) وهو ما حدث بالفعل إذ وقع الاختيار على مؤسسة تاكونيه (Taconnet) مما يؤكد أن المهارة في هذا المجال ترجع قبل كل شيء إلى رجال الجيش .


إن المناهج المطبقة في مجال إنشاء المخيمات وتشيد المباني هي نفسها التي تطبق في قطاعات الأعمال الأخرى مثل النظام والتناسق والمتانة والاستمرارية وهي الأهداف المرجوة . ويتضح هذا بجلاء من خلال فقرتين من التقارير التي كتبها مانتو (Montaut) . تدل الفقرة الأولى على رغبته في التوفيق بين البعد الجمالي والفاعلية عندما سعى إلى إقامة النظام في الورشة: " تم ردم محلين لفريريه .. وأتاحت هذه الترتيبات الجديدة القضاء على المباني غير المتناسقة المصنوعة من الخصر والخشب والتي كانت تشوه وتحجب الورشة " ^(٨٠).

وتشدد الفقرة الثانية على ضرورة ترجيح المدى البعيد " أخذت مباني الجسر في الانتشار يوماً بعد يوم وإلى الآن لم يتم عمل سوى ما هو مؤقت ويجب صرف النظر عن ذلك . ويتنظر من محميم العتبة في الحقيقة أهمية كبرى طول مدة الأشغال . لذا فإن المتانة ضرورة أساسية " ^(٨١).

ومع ذلك ، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بسرعة ، تم التوسع في زيادة المباني المصنوعة من الخشب المستورد أو الطوب (القرميد) كما تم استخدام مواد محلية مثل الخصر المكون من البوص المجموع . وتمت تغطية حوائط المباني الخشبية من الداخل والخارج بمصائر مبطنة بتخشينة ثم من مونة الجير الخشن . ^(٨٢) كما أقيمت الإنشاءات الهامة بالبناء بل أيضاً بالطوب المحروق . ولعدم تسافر وقود اقتصادي أدخل كذلك في تشكيل بعض مباني المعسكرات ^(٨٣) الطوب الذي صنع في الورشة. أما الطوب المحروق فيأتي أحياناً من المباني القديمة المهتمة .

ولتخفيض تكاليف المباني في الإسماعيلية وبور سعيد ، وإشباع في نفس الوقت بعض المتطلبات الجمالية ، حددت الشركة في عام ١٨٦٥ " أنماطاً " خاصة للمباني السكنية للعمال والمستخدمين. ومع تحديد واستعمال الأنماط تم إتباع أسلوب المباني النمطية التي تتكرر وأما بالنسبة للمباني الأكثر تعقيداً فقد اتبع أسلوب المخيمات العسكرية . وعندما استقرت شركة بوريل ولافالي وشركاؤهما في الخليج استفادت من التجربة وأقامت بدورها نماذج لمساكن مستخدميهما تختلف قليلاً عن نماذج الشركة ^(٨٤) .

ويتناسب الدجوة إلى النمطية أيضاً مع بعض الأفكار المتعلقة بالتنسيق الجمالي للمدينة التي يلتقي فيها فكر المدير مع مانع وهي مرتبطة أساساً بتنسيق وتوحيد المباني . بخلاف المباني التابعة للشركة تم أيضاً فرض شروط على استخدام أشكال ومواد البناء الأخرى ^(٧٥) ولنذكر على سبيل المثال "النموذج الذي فرضته الشركة على أصحاب امتياز الأراضي المحيطة بطريق أطلق عليه اسم الإمبراطورة" ^(٧٦) واستنداً إلى تصريحات البناء حرص فوازان على العناية بشكل المدينة . وعندما طلب يني جريجوريو (Yanni Gregorio) ملكية أرض لعمل بناء واجهته على رصيف محمد علي ، أرسل مدير عام الأشغال إلى فيلر (Viller) الرأي التالي : " لا أوافق على هذا المكان وقررت عدم التنازل عن الأراضي الممتدة على طول رصيف محمد علي و يجب حفظ هذه الأرض لإقامة مباني برجوازية فاخرة فيما بعد " ^(٧٧)

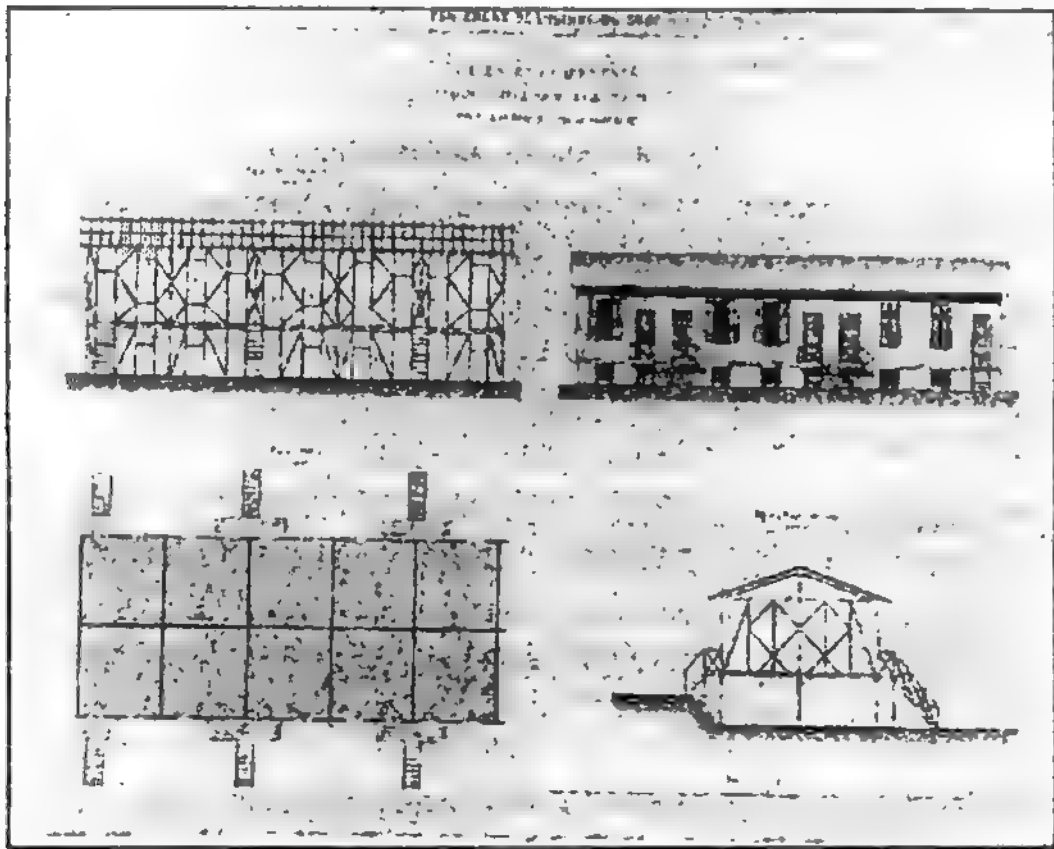

مساكن العمال والموظفين في بور سعيد

(ل. مونيل ، و. أ. كاساني ، في المرجع المذكور ، أطلس لوحة ٥ تفاصيل)

وقد أدت أيضاً احتياجات الورشة إلى لجوء الشركة إلى المساكن سابقة التجهيز ، بحيث تصنع هياكل البناء من الخشب والجدران والقواطع الخشبية للمنازل في بورسعيد حيث يزل الخشب في ورش النجارة وينقل بعد ذلك إلى مخيمات الخليج المختلفة . وقد بنيت منازل الإسماعيلية خاصة

بمذه الطريقة. كما اتبع نفس الأسلوب في استخدام المنازل المتقلة الجاهزة والتي تم تركيبها وفكها عدة مرات في بعض المخيمات .

وإذا كان التطبيق المباشر لقواعد الحرب قد لا يبدو احتمالاً وارداً إلا أنه في المقابل تمت الاستفادة من خبرة الجيش عن طريق اختيار الموردين واستخدام الأكواخ المستعملة أثناء حرب القرم . علاوة على ذلك تعرف مهندسو الشركة أثناء إقامة نماذج لبعض المباني واللجوء إلى المباني سابقة التجهيز على طرق العمل التي نصح الجنود باستعمالها دون أن نستطيع أن نؤكد بسبب ذلك أنهم قللوا مباشرة .


إدارة الأراضي ومحاولات المضاربة

علاوة على الشروط الخاصة باستغلال محاجر الدولة أو الإعفاء من رسوم الجمارك، قبلت الحكومة المصرية وفقاً لنصوص أول فرمان أن تترك للشركة دون أية ضرائب أو رسوم حق التمتع بأراضي كثيرة. وتخص هذه الإعفاءات الأراضي التي لا تخضع لأحكام الأفراد الخاصة سواء تقرر أنها ضرورية لبناء القناة البحرية وترعة الماء العذب أو التي قامت الشركة بريها وزراعتها .^(٧٨) علاوة على ذلك تعهدت الحكومة المصرية بتسليم أراضي الأملاك الخاصة اللازمة لتنفيذ الأشغال بشرط أن تقوم الشركة بسداد " تعويضات عادلة " لأصحابها^(٧٩) . وبالرغم من رسم خريطة توضح أراضي الملكية العامة المختلفة التي تنازلت عنها الدولة للشركة مجاناً إلا أن الشركة تمادت في استغلال الأراضي المتنازل عنها والمدرجة بوضوح في لوائحها في منطقة السويس وبدأت في زراعتها وكأنه أحد أنشطتها. وساهمت هذه العملية في إرضاء المساهمين بضمان توفير بعض الموارد المالية. وسعى مجلس إدارة الشركة إلى الاستفادة من التغيير الذي حدث بعد الري بواسطة ترعة الماء العذب إلى تحويل الأراضي المحيطة بها إلى أراضي زراعية ، بل أيضاً إلى إقامة تقسيمات الأراضي في المخيمات . ومع ذلك وفي أثر المعاهدات الجديدة تم تدريجياً تحديد بنود الامتياز الأول المتجاوزة والتي تخص الأراضي ، كما طرأت تسويات سمحت في النهاية للحكومة المصرية باستعادة مبادئها على هذا الجزء من أراضيها . ويرد الأجزاء المختلفة لترعة الماء العذب أصبحت في نفس الوقت حقوق الشركة على الأراضي المجاورة لاغية . فضلاً عن ذلك ، استنكر قرار التحكيم الذي أصدره ناهليون الثالث ادعاءات الشركة المضاربة واشترط قبل التصديق على عقد الامتياز تعيين على طول مسار القنوات حدود الأراضي اللازمة للشركة أثناء مدة الامتياز . وتم رسم خريطة حضورياً في فبراير عام ١٨٦٦ تشير إلى حدود الأراضي الممنوحة للشركة فيما يساوي مساحة إجمالية قدرها ١٠٢١٤ هكتاراً وتشمل شريط من مائتي متر على جانبي القناة بالإضافة إلى

مساحات خاصة محددة حول المخيمات ، ولما حددت الأراضي الممنوحة تم عمل اتفاقية جديدة في ٢٢ فبراير ١٨٦٦ بين الشركة والحكومة المصرية على أساسه تمنح تركيا التصديق على الانتفاع الذي أعطته الحكومة المصرية لحفر قناة عبر خليج السويس .

ولكن بقيت هناك مسألة دون حل وهي ما يمكن أن تقوم به الشركة في الأراضي التي منحت لها خاصة في مدن القناة . وبدأت الشركة في نهاية عام ١٨٦٦ تسليم ملكيات لمانيسة أي تباع الأراضي . ولم يرق ذلك للحكومة المصرية . وأراد رئيس الشركة من جانبه زيادة مساحة الأراضي الممنوحة حول المدن وهي تلك الأراضي التي ارتفعت قيمتها . وبعد مساومات جديدة تم توقيع اتفاقيتين في ٢٣ إبريل ١٨٦٩ تنص الثانية منهما على تقسيم المنّ الجديد بالتساوي إذ يجب توزيع قيمة بيع الأراضي التي زادت مساحتها بين الحكومة والشركة بنسبة ٥٠٪ من عيالي الإيراد . أما بالنسبة للاتفاقية الأولى فهي تخفض بشكل هائل الامتيازات التي استباحتها الشركة لنفسها عندما نصت صراحة على أنه ليس لها أغراض إلا استثمار وصيانة القناة ، وأنها بناء على ذلك تلتزم بالقانون العام وتتنازل عن كل استثناء أو امتياز خاص ^(٨٠) .

بعد أن كانت الورشة محصورة في البداية في نقطة واحدة هي بحيرة شاطئ بور سعيد، امتدت تدريجياً لتشمل كل الخليج . و بعد أن كان الخليج من قبل مكاناً قاحلاً ومعزولاً ولا تطرقه إلا قوافل البدو صار أرضاً آهلة بالسكان وفي نمو مستمر . وانضم إلى العمال المتحقيقين بورشة قناة السويس بعد ذلك جماعة من المقاولين والتجار والعمال من جنسيات عديدة بحثاً عن العمل .

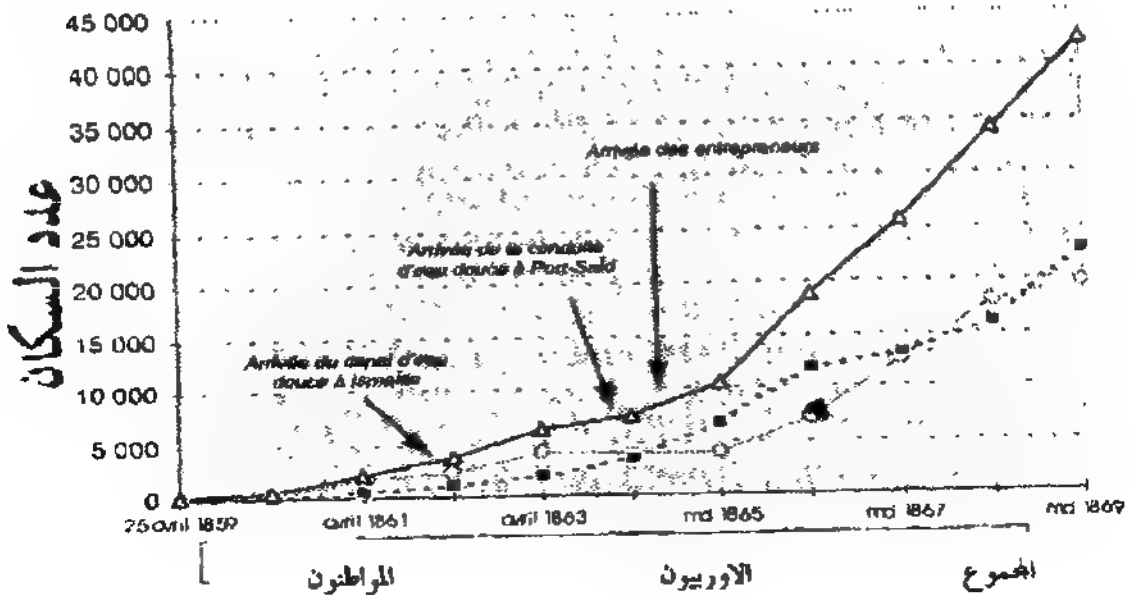

تطور سكان المدن في الخليج ^(٨١)

عمل فوازن بالاستناد إلى هيكل السلم الوظيفي القائم لخدمة الأشغال على إقامة وتنفيذ قواعد إدارية للأراضي في الخليج مستمدة من نموذج قواعد تنظيم المدن الفرنسية . وتم ملائمة قواعد الامتياز تبعاً للتسويات المتتالية التي جرت بين الشركة والحكومة المصرية .

وتم تعيين وكيل مسؤول في كل محيم للمحافظة على اتباع النظام وتسجيل طلبات الامتياز . وقد يطلب من المتقدمين لشغل أراضي على شواطئ القناة البحرية تحرير نموذج استمارة عنوانها : "امتياز مؤقت لتنفيذ الأشغال والتموين واستغلال الورش"^(٨٢) وتقع مسؤولية كتابة عقود الامتياز على رؤساء القطاعات . وتقوم إدارتهم بتحقيق الطلبات ، ويقوم يومياً رئيس القسم هنري (Henry) بضبط كشف الإقامة المؤقتة المصرح بها في معسكر الشالوفة ويتحقق من طلبات الامتيازات الجديدة . ويرسل الملف شاملاً مع إشعار تبرير وخريطة مقسمة إلى أجزاء إلى مدير عام الأشغال الذي يقرر منح التصريح . وتقوم بعد ذلك إدارة المكاتب الملحقة باستلام الإيجارات السنوية . ولضمان احترام التنظيم كلف فوازن رؤساء الأقسام صراحةً في مارس ١٨٦٧ بمهمة مراعاة عدم تجاوز ارتفاع المباني في مناطقهم دون وجه حق .

ويستخدم عقد الامتياز أيضاً كتصريح بناء . ويلتزم الملتزم عند الحصول على امتياز الأراضي أن يحترم التخطيط والتنظيم المفروض وأن يحيط الأرض بسور على طول الطريق العام بحائط مبنى أو سياج من الخشب ارتفاعه ١٥٠ متراً وألا ينفذ أية فتحة في حوائط السور ولا في المبنى الذي يحيط بالأراضي الممنوحة له وغير الملاصقة للطريق العام وألا يقيم صلة مع المباني الموجودة من قبل وتحد جانباً الأراضي الممنوحة . وينص العقد في الواقع وبوضوح فيما يخص مسائل الملكية المشتركة للجدار على " تطبيق القانون الفرنسي والأعراف في فرنسا " وعلاوة على ذلك ، يتعهد صاحب الامتياز بالشروع في بناء المبنى المرتقب خلال شهرين بعد الحصول على التصريح والانتهاء منه في مدة يحددها رئيس المقاطعة في حينه .

ويجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على امتياز أن يوضحوا عند طلبهم وصف المباني المرتقبة وكذلك الغرض المقصود منها . وهكذا ضمنت الشركة الرقابة على الأنشطة التي تستقر في الخليج عن طريق طلبات امتياز منح الأراضي . وتخضع أيضاً التغييرات العادية أو التنازلات الجزئية أو الكلية لموافقة الشركة . وفي النهاية يحظى العاملون بالشركة من خلال المهام الجديدة التي خولت لهم بامتيازات غير مألوفة بالنسبة لشركة خاصة . ولم يعتاد المهندسون والمراقبون هيئة الطرق والكباري الفرنسية الذين يشكلون غالبية العاملين في أشغال الشركة في عهد الإمبراطورية الثانية هذا النوع من المهام . ومع ذلك بعد قرن من الزمان أصبح التنظيم العمراني والعملية والتخطيط الميداني جزءاً من اختصاصاتهم^(٨٣) .

وقد توالى نظم مختلفة من الامتيازات . وكانت الامتيازات الأولى المؤقتة غير محددة المدة. (٨٤) وكان من نتيجة المضاربات المختلفة بين الشركة والحكومة المصرية والتغيرات الدورية التي أدخلتها فيما يخص المميزات التي يمكنها الحصول عليها إيقاف الإنشاءات القائمة على المبادرات الخاصة في الخليج بشكل صارخ . ولم يتحسن الوضع مع الزمن واستمر عدم الاستقرار حتى نهاية الأشغال بشأن القواعد الواجب تطبيقها في أحكام الامتياز .

أقام مدير عام الأشغال بعد الاتفاق الذي تم في ١٨٦٦ أسلوباً يتيح منح بعض الامتيازات النهائية. وأعدت تخطيطات عامة للبناء في مختلف المخيمات . وأرسلت الطلبات التي قامت الشركة بتحريرها بعد الموافقة عليها إلى الحكومة المصرية كي تعطي الحجاج (hodgets) أو عقود الملكية (٨٥) . ويتوقف ثمن شراء المتر المربع للأرض حسب الموقع وأغلاها الأراضي الواقعة في بورسعيد على طول الشاطئ والأحواض . ولكن عبرت الحكومة المصرية عن عدم موافقتها ولم تعط رداً إيجابياً على هذه الملفات. ولما كانت الشركة لا تستطيع إبقاء الوضع على ما هو عليه أوقفت الامتيازات النهائية ، وأصدرت في ١٠ إبريل ١٨٦٧ قانوناً جديداً أطلق عليه " نظام مؤقت لامتيازات أراضي البناء " . وأعطى هذا القانون الأخير امتيازات لمدة متغيرة قد تصل إلى ثلاثين عاماً. وبالتالي تقدر الأسعار حسب المدة وطبيعة المخيمات . وقد شهدت طلبات امتياز ملكية الأراضي التي قدمت في هذه السنة في بورسعيد على تنوع الاحتياجات وتطور المدينة. إذ قدمت الطلبات بغرض إقامة مطعم ومحبز وورشة نجارة وفندق ومساكن ومحل أزياء حديثة وفندق بغرف مفروشة ومحل مأكولات ومحل بيع مشروبات كحولية ومغسلة ملابس ومقهى ، وبار وورش خشب ومحل معدات ومصنع لشراب الليمون وجزارة ومجمع وصالون حلاقة وحمامات عامة ومحلات للبقالة والتبغ ومصنع للخمور وورشة أسلحة وورشة خياطة ... الخ (٨٦) وطوال الفترة التي أقيمت فيها الورشة ، استفاد المقاولون المرتبطون بعقد مع الشركة وكذلك الهيئات المدنية بمجانبة الامتيازات.

علاوة على امتياز الأراضي قامت الشركة بتأجير المباني الخاضعة لها وقامت بتحصيل الإيجارات وفي كل جهة من الخليج تم تكليف الوكيل المسؤول عن المخيم بتوزيع المساكن وإيجار المنشآت التابعة للشركة للخاصة . وشملت مدينة بورسعيد عدة منازل كبيرة مشتركة . وبناء عليه أجبرت الشركة في مارس ١٨٦٨ المنزل المحدد برقم ١٤٩ للمستأجرين الآتين : الأول السيد / جوييتش (Guibitch) عامل يسكن مع عائلته الفرقة رقم ١ وله حق الانتفاع بكوخ قش وجزء من الفناء ويدفع مقابل ذلك إيجار ٥٥,٥ فرنكاً . والثاني السيد / سيمونوفيش (Simeonowich) رجل أعمال يسكن بالحجرة رقم ٢ وكوخ قش وجزء من الفناء بإيجار سنوي قدره ٩٠ فرنكاً ومدمام / ديريفوار (Desrivoire) خياطة تقيم بالحجرة رقم ٣ وكوخ قش وجزء من الفناء بإيجار سنوي

قدره ٦٠ فرنكاً وتستأجر شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما الغرفة رقم ٤ بمبلغ ٢٥ فرنكاً . أما السيد ماتولوفيتش (Matoulowich) الذي يعمل في ورشة بوريل ولافالي وشركائهما ويسكن كوخ قش تحت الحجرة ٤ ويدفع إيجار ١٢,٥ فرنكاً^(٨٧) .

وقد وضع اتفاق إبريل ١٨٦٩ الذي أسس توزيع الأرباح بالتساوي قواعد إدارة ما سيتم تنفيذه مستقبلاً ولستوات عديدة وهي " الملكية المشتركة " الذي يشمل مجموع الأراضي الداخلة في المحيط الممنوح للشركة الفرنسية والذي لا يستغل مباشرة في أعمال القناة .

الإشراف الصحي على الورشة

العاملون والمعدات الطبية

كانت الصحة جزءاً من الاهتمامات الأولية ويشهد على ذلك وجود الدكتور / أوبار روش (Aubert - Roche) في قرز بورسعيد في يوم ٢٥ إبريل ١٨٥٩ وهو يوم بدء عمل الورشة الرسمي ، إذ كلفه رئيس الشركة بتنظيم إدارة صحية في منطقة خليج السويس وسوف يقوم بإدارتها بصفته كبيراً للأطباء حتى يونيو ١٨٦٩ .

ولا نعرف إلا القليل عن مسيرة وحياة هذا الطبيب ولا غلثك سوى عناصر متفرقة . ويتضح من شهادة معاصريه وكتابات الخاصة أنه (لويس ريمي أوبار - روش) قد سافر بين ١٨٣٤ و ١٨٣٨ إلى الشرق^(٨٨) وتوقف بعض الوقت في مصر . وهناك كان خلفاً لكلوت بك كبير الأطباء بمستشفى الإسكندرية . وربما قد يكون قد تعرف خلال هذه السنوات على فردينان دي ليسبس . ومن المؤكد على كل حال أنه اهتم بمسألة قناة السويس منذ عام ١٨٤٥^(٨٩) . وعند عودته إلى فرنسا ، ناضل من أجل إصلاح الحجر الصحي^(٩٠) وقد ظهر دوره الإيجابي أيضاً في الخفل الماسوني القرش الكبير (La Grande Loge de France)^(٩١) وبعد أن شكل محفلاً بالإسكندرية أقام آخر بالخليج في السويس والاسماعلية وبورسعيد^(٩٢) .

وأقيمت إدارة صحية بشكل رسمي منذ شهر يناير عام ١٨٦٠^(٩٣) وفقاً لأسلوب الممارسة في ذلك العصر في ورش إنشاء خطوط السكك الحديدية^(٩٤) وتم تقسيم مسارات القناة البحرية وترعة الماء العذب المعنية إلى دوائر طبية . وتطورت هذه الدوائر تبعاً لتجمع الورش^(٩٥) وجعلها كبار الأطباء ملاتمة للأشغال^(٩٦) ويرأس كل دائرة طبيب يخضع لأوامر أوبار - روش .

وتطورت الإدارة الصحية في الشركة بعد ذلك تدريجياً سواء أكانت تابعة للوكالة العليا أو للإدارة العامة للأشغال مع تصاعد الورش و بلغ عدد العاملين في عام ١٨٦٠ بالإضافة إلى كبير

الأطباء سبعة أطباء واثنين من الصيادلة . وفي عام ١٨٦٨ بالإضافة إلى كبير الأطباء وعدد وفير من صغار المرؤوسين والإداريين بلغ هذا العدد ثلاثة عشر طبيباً وستة من مساعدي الأطباء وتسعة عشر ممرضاً وخمسة وثلاثين ممرضاً عربياً وثمان صيادلة كلهم يعملون في مختلف المعسكرات (٩٧). بالإضافة إلى ذلك، نجد الإدارة الصحية للشركة في المخيمات الرئيسية مساعدة مجانية من راهبات الراعي الصالح لمدينة أنجيه (Angers) (٩٨). ويمكن لوكلاء وعمال الشركة وأيضاً الشركات المتعهدة الاستفادة من هذا العلاج الطبي والحصول على الدواء مجاناً (٩٩).

وحددت اللائحة التي تم وضعها في أكتوبر عام ١٨٦٩ أجور العمالة الطبية بالشركة (١٠٠). بحيث يتقاضى الأطباء والصيادلة نفس مرتبات معاوني المهندسين والمراقبين المستخدمين بالشركة . وأما مرتبات الممرضين الذين تم تعيينهم لمساعدة الأطباء فتتوقف على عدة عناصر منها الجنسية. ففي عتبة الجسر في عام ١٨٦٩ تقاضى على عاطف ، طالب عربي يدرس الطب مبلغ ١٧٠ فرنكاً شهرياً ، بينما الممرض الأوروبي أنطونيو باباسي (Antonio Papassi) فكان يتقاضى ١٨٠ فرنكاً وكان المرتب الشهري ٤٠ فرنكاً لكل من الممرضين الثلاثة العرب وهم على ومحمد وبشير. ويلاحظ وجود تفرقة أيضاً بين الأطباء فمثلاً لا يستطيع الأطباء العرب إلا الحصول على درجة مساعد طبيب ولا يقوموا إلا بعلاج أهل البلد و أغلبهم من المنتدبين من المصالح الحكومية المصرية (١٠١).

وكانت طبيعة الأطباء مختلفة سواء من جهة الجنسية أو السن أو الخبرات السابقة . الفرنسي ، المالطي ، اليوناني أو الصقلي اكتسب عدد كبير من بينهم خبرة من المعارك الحربية وخدم خاصة أثناء حرب القرم (١٠٢).

أما من جانب المعدات الطبية ، فقد أقيمت في المخيمات الرئيسية مستشفيات ميدانية (إسعافات) ومستوصفات في أكواخ من الخشب تشمل عشرات الأسرة. وبذلك طبقت الشركة بطريقة غير مباشرة القرار الوزاري بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٨٤٨ الذي نادى في فرنسا بإقامة مستشفيات ميدانية في الورش . أما المرضى الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفى فيتم نقلهم إلى مستشفى الإسكندرية وذلك قبل إنشاء مستشفى بورسعيد في عام ١٨٦٠ الواقع على شاطئ البحر في أقصى طرف رصيف أوجيني والمتاح لعلاج كل المستخدمين بالخليج. ويدفع العاملون في شركات المقاولات قيمة الأكل والمبيت في اليوم . ولا يقبل مع ذلك فيها النساء أو المرضى المصابين بالأمراض العقلية وبالسفلس* أو بالأمراض المزمنة والنيوية ولنلاحظ التصنيفات المذكورة والربط بين الفئات المختلفة .

* السفلس (مرض زهري معد)

و في عام ١٨٦٥ كان من الضروري زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى ، ومن هنا أخذ فوازان شخصيا هذا الأمر على عاتقه مؤكدا ضرورة توفير مبانٍ لمستشفيات تابعة للورشة تليق باسم شركة القناة . ومع زيادة وتطور ورش المقاولين كوفرييه وكذلك ورش بوريل ولافالي وشركائهما كان فوازان يخشى أن تؤدي كثرة وصول الآلات إلى الورش إلى زيادة حوادث العمل^(١٠٣). وفي ظل هذه الظروف وتأكيداً لرؤيته حول المركزية ، فكر فوازان في إقامة مستشفى كبير بالإسمايلية في وسط الخليج وذلك تنفيذاً لمبدأ وفورات الحجم هنا كما حدث في مجال آخر: "كنا نأمل بذلك إمكانية توفير و بأقل تكاليف أكبر قدر من الراحة للمرضى عند تجميع العناية والإشراف".

ولكن بعد أن تشاور الرجلان رجحت في النهاية وجهة نظر أوبار - روش فقد اقترح على العكس بناء عدة مستشفيات موزعة في الخليج بحجة صعوبة وخطورة وسائل النقل وطول المسافة بالنسبة للمرضى والجرحى . وانضم فوازان إلى هذا الرأي ووجد فيه منفعة من نوع آخر : " علاوة على ذلك من الضروري أن يمتلك كل قطاع على الأقل مستشفى رئيسياً حيث يمكن ترحيل مرضى مخيماته دون أن يغيبوا عن إشراف رؤسائهم"

لذلك أقيمت عدة مستشفيات في مخيمات الخليج المختلفة. فبالإضافة إلى المنشآت الثابتة المجهزة في كل مخيم ظلت الإسعافات المتنقلة المصنوعة من الخشب تتبع الورش^(١٠٤)

على العكس بالنسبة لمسألة المجمع فقد رجحت كفة فوازان. و تم إنشاء مجمع مركزي يعنى بالمعدات الطبية وحل محل الخدمة التموينية الموجودة بكل دائرة. و تم تخزين كل المعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة في المجمع المركزي بالإسمايلية لكي يتم إصلاحها وتوزيعها حسب الحاجة^(١٠٥). وترسل طلبات المعدات إلى المجمع المركزي بالتلغراف ، ويتم تزويد الصيادلة الذين يشغلون غالبا مهام وكيل المالية بالأدوية كل ثلاثة شهور . وتستورد الأدوية من فرنسا. وقد أبرز أوبار - روش بوضوح مهارته في مجال إدارة التوريدات اللازمة لصيديات المخيمات حين كتب : " في هذا الجزء من الخدمة رأيت ضرورة اتباع القواعد المنصوص عليها في مجموعة لوائح المستشفيات الحربية بفرنسا"^(١٠٦)

مهام غامضة

قد نعتقد بأن الشركة بإنشائها الإدارة الصحية لم تقصد سوى تقليد شركات السكك الحديدية الفرنسية والتي مثل شركة دي نور (du Nord) تزودت في عام ١٨٥٥ بإدارة طبية^(١٠٧). إلا أن الأسباب التي دفعت إلى إقامة هذه الإدارة في حالة ورشة قناة السويس كانت أكثر تعقيدا وتستحق

التفسير. ولنترك في البداية أوبار - روش لذكر لنا بدقة أهمية هذه الإدارة الصحية التي يديرها وأسباب وجودها :

"يختلف تشكيل الإدارة الصحية في الخليج كثيرا عما هو في مكان آخر. ففي فرنسا في الإدارات لا يهتم الأطباء مباشرة إلا بعلاج الأمراض وبشكل غير مباشر جدا بمشاكل الوقاية والصحة فضلاً عن ذلك عليهم انتظار حضور الناس لاستشارتهم. وينتج عن ذلك ألا يجد الأطباء لهم مصلحة معنوية في تجنب هذه الإدارة المصاريف عند اهتمامهم بالصحة العامة. علي العكس، في الخليج تهتم إدارة الصحة بالوقاية أولاً من المرض ومقاومته إذا ما ظهر. لذلك فإن من واجب الطبيب أن يهتم بمسائل الوقاية والصحة والسلامة من الأمراض. ويعمل النظام الأساسي للخدمة علي أن يقوم بكل ما يتعلق بهذه الموضوعات وتعيين واستعمال الوسائل الخاصة بالحفاظ علي الصحة العامة والخاصة وضمان سلامتهما." (١٠٨)

نفهم من ذلك أن أوبار - روش قد أوصى بالمناهج الوقائية وسعي للاهتمام بالوقاية الصحية. وقد امتلأت التقارير التي كان يقدمها سنويا إلى رئيس الشركة عن صحة سكان الخليج بخواطر قدف إلى وضع المبادئ التي أوردتها أطباء الصحة موضع الممارسة في نهاية القرن الثامن عشر. ويؤكد طلبه لشراء مجموعتين كاملتين من مجلة "حوليات الصحة" للمكتبات الطبية ببور سعيد والإسماعيلية (١٠٩) مصدر المبادئ التي استوحاها وتشهد في نفس الوقت علي رغبته في نشر هذه الأفكار. وقد حث أوبار - روش الأطباء في مختلف الدوائر علي رقابة نوعية الغذاء والسكن وظروف عمل رجال الورشة وأبدي في تقاريره مقترحات تتعلق بتنظيم المساحات - سواء بشأن الورشة والمشغل أو المخيم - أو المباني علي وجه الخصوص واتجاهاتها ونظائرها (١١٠) وترتيبها الداخلي. وأوصي بإلغاء المخيمات وأكواخ الخشب وإقامة المنازل المبنية من الطوب اللبن كما نصح بالاهتمام بالتهوية في كل مكان وتجنب التكديس والازدحام ومقاومة الرطوبة. وأوصي بتنظيف أرض المنازل وطلاء الحوائط باللون الأبيض بل وأيضا تنظيف الشوارع الخ و سره عندما علم بالنسبة للموضوع الأخير بقرار تغطية الشوارع في الإسماعيلية بالخصي (١١١) وإحاطتها بأرصفة وتكليف مقاول برشها يوميا وكذلك القيام بتفريغ آبار المراحيض (١١٢) ونجد أنه عبّر في تقاريره عن كل أقوال أطباء الصحة والتي تؤكد أن أبحرة العفونة المسببة للأمراض تُنقل بواسطة الهواء والماء ويحملها التراب. علاوة علي ذلك لاحظ أوبار - روش "التأثير المعنوي علي الجسم" (١١٣) وهي فكرة مبتكرة بالنسبة للعصر. وكان يشجع لذلك كل مبادرة من الشركة تؤدي إلى زيادة الرفاهية المعنوية للرجال العاملين في صحراء الخليج. ولم تكن هناك سوي خطوة واحدة بين الإرشادات الصحية ومراقبة العادات والسلوكيات وقد اجتازها كبير الأطباء في مواقف عدة

مقتنعا أن الصحة تنسجم مع شكل معين من السلوكيات. و بشأن بعض المشاكل مثل استهلاك الخمور ونظافة الجسم والمتنزهات و إقامة الحدائق التي توفر " نوعاً من التسلية المفيدة" للمستخدمين ويتفق في ذلك مع رأي مدير عام الأشغال . فلا يهتم الطبيب فحسب بصحة الجسد بل أيضا بالإنشاءات والحالة النفسية .

ولفهم أسباب إقامة إدارة صحية في وقت مبكر يجب أن نعرف أن عدم توافر الظروف الصحية المناسبة في خليج السويس كانت أحد الاعتراضات التي تذرع بها المعارضون لمشروع حفر القناة البحرية. لذا اضطرت الشركة بسرعة إلى إثبات أنه لا أساس من الصحة لهذه الادعاءات. وهنا تكمن بوضوح مهمة أوبار - روش. ففي الواقع يشغل كبير الأطباء مكانة غير مريحة تماماً وهو في نفس الوقت خبير فيما يتعلق بالصحة ويكفل خلو الخليج من الأمراض. وفي هذه الظروف، ندرك أنه لم يكن حراً تماماً في أقواله. وتعتبر تقاريره السنوية مزيجاً من النقد الخفي والأوامر لاحترام بعض تعليماته من جهة، ونظرات تفاؤلية فيما يتعلق بأهمية الصحة العامة لعمال الورشة من جهة أخرى. فمن الملائم إذاً أن نأخذ حذرنا من تقاريره الرسمية المنشورة في "خليج السويس"، جريدة وصل البحرين"، جهاز دعاية الشركة. أما عن تأثير إرشادات كبير الأطباء فمن الصعب تقديرها بدقة علاوة على ذلك حتى لو كان مدير الأشغال العامة يملئ القواعد المأخوذة عن مقترحات الطبيب إلا أن الشركة لا تمتلك بالفعل ولسوء حظ الرجلين وسائل لمراعتهما. وتعتبر الإدارة الصحية أثناء عمل الورشة إدارة كغيرها من الإدارات وهذا يعني أننا ننتظر منها نتائج وأيضاً يجب أن تثبت وجودها وتظهر فاعليتها. من أجل ذلك سعى أوبار - روش إلى إثبات أن إدارته ناجحة وخاصة عند توفير المصاريف التي يمكن أن تسببها العدوى والتي لا تلبث أن تظهر وتتفشى^(١١٤) في غياب التنظيم الصحي. ولم يتردد في تقديم أدلة أخرى قابلة للنقاش مثال ذلك:-

إن توفير الصحة في خليج السويس يعني تعمير الخليج وجذب العاملين والتجار والمزارعين ومضاعفة قيمة الأراضي المخصصة للبناء والأراضي المزروعة. وتعد مصلحة الشركة هي الهدف من إقامة إدارة صحية ونتيجة لتنظيمها^(١١٥). ونجد المكاسب المرتبطة بزيادة الفائدة المتوقعة من أراضي الخليج من أهم الأسباب والحجج. وإدارة الصحة من خلال خلق ظروف مواتية لجذب السكان ممن ميصبحون في القريب العاجل زبائن أراضي الشركة، تعد استثماراً مقبلاً دخليلاً لا ريب فيه.

في تقرير الصحة لعام ١٨٦١-١٨٦٢ تم جمع المعطيات المتعلقة بحفر ترعة الماء العذب الذي نفذه العمال العرب في جدول . و يجمع جدول المقارنة ^(١١٦) أرقام صدرت عن إدارة الأشغال جمعها كازو (Cazeaux) مسئول قطاع ترعة الماء العذب . وكذلك جمعت ملاحظات إدارة الصحة مثل درجات الحرارة ومعطيات عن الرطوبة و ضغط الجو واتجاه الرياح وعدد المرضى والجرحى وعدد الموتى . ولا بد من القول عرضاً أن مسئولية تسجيل الأرصاد الجوية ثلاث مرات يومياً قد أسندت إلى الأطباء حيث أن هناك إعتقاداً خفياً بأن الصحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناخ . وعلاوة على أن بعض المعطيات نفسها مثل أعداد المرضى والجرحى تعدو قابلة للجدل ، من المفيد ملاحظة عملية وضع أعمدة الأرقام هذه الواحد بجانب الآخر .

في عام ١٨٦٠، أعطيت التعليمات للمقاول العام لإخضاع كل القادمين الجدد للكشف الطبي وذلك لتجنب قبول المصابين بأمراض معدية في الورشة . ويمكن أن يساعد هذا الإجراء في نفس الوقت على استكمال سجل الحالة المدنية^(١١٧) . ويجد الطبيب نفسه في ذلك الوقت مكلفاً بمهمة إضافية يزاولها طوال مدة الورشة ، وهي حصر السكان المقيمين في الخليج وإقامة إحصاء لهم . وكان في الحقيقة من الصعب تقدير العدد الصحيح لأهالي المخيمات المختلفة . فقد قدر الدكتور ظرب (Zarb) ، المستول عن دائرة بور سعيد، متوسط عدد السكان في الفترة من أول يونيو ١٨٦٤ إلى أول يونيو ١٨٦٥ قائلًا : " أنه طبقاً للمعلومات التي استطعت الحصول عليها في اثني عشر شهراً يبلغ متوسط عدد السكان ستة آلاف نسمة (٦٠٠٠) علي الأرجح " ^(١١٨) . ولم يمنع ذلك أوبار - روش من نشر إحصائية رسمية للأهالي تكاد تكون مقاربة

النشرة الصحية

تعتبر الأمراض الأكثر انتشاراً في الخليج حسب خطورتها هي التهاب الكبد والدوزونتياريا وآلام المعدة والرمم^(١١٩) . و يسجل الأطباء يوميا بانتظام الإحصائيات المتعلقة بنشاط إدارتهم . فهكذا في الفترة من يونيو ١٨٦٨ إلى مايو ١٨٦٩ تم حصر ٤٧٤٤ مريضاً ملازماً للفراش و ٦٨٨٠٦ زيارة أو استشارة^(١٢٠) . ولم ينجز الأطباء أنفسهم من الأمراض . ففي عام ١٨٦٩ توفي أربعة ومن بين أحد عشر طبيباً شاركوا في الورشة لم يبق بعد انتهاء الأشغال سوى خمسة فقط علي قيد الحياة . وانتشرت عدة أمراض وبائية في الخليج . وتم اكتشاف حالات تيفود عديدة في ١٨٦٤ بين العمال الذين تم عزلهم بسرعة "أما عدد الضحايا رسمياً فهو حوالي العشرين ولكن أعتقد فيما بيننا أن العدد كان أكبر من ذلك بكثير " ^(١٢١) هذا ما صرح به مسكوتير الإدارة المركزية أوليفيه ريت (Olivier Ritt) الذي كان من عادته البقاء كئوماً في كواليس هذه الورشة . وفي عام ١٨٦٨ طغى وباء الدوزونتياريا على ورشة الشالوفة وأصيب أساساً به أهل البلد ، فمن بين ٦٥٩٦ يعملون في الخليج توفي ٤٥٩ مواطناً ، و فقط ٤٤ من بين ٦١٢٨ أوروبياً^(١٢٢) .

ولكن ظلت هذه الأحداث قليلة الأهمية مقارنة بوباء الكوليرا الذي تفشى في عمال الورشة في صيف ١٨٦٥ ونشر الذعر مما أدى إلى تعطيل الأعمال . فقد ظهر هذا الوباء في الوقت الذي أُنهي فيه المقاولون الجدد الإنشاءات تماماً في الخليج . وكانت بداية ظهور المرض في جدة في مايو ١٨٦٥ وانتشر بسرعة في السويس مع وصول آلاف الحجاج العائدين من مكة^(١٢٣) . وسرعان ما ظهرت الكوليرا أيضاً في الإسكندرية ثم بعد قليل في الزقازيق حيث اجتاحتها بشدة . وأثرت الكارثة للمرة الأولى في داخل الخليج في ١٦ يونيو في قطاع طوسون ثم وصلت إلي ورشة سيرايوم وقضى الوباء فيها علي ٢٨ ضحية من بينها طبيب القطاع . وتم إخلاء المخيم ووصلت بعد ذلك الكوليرا إلي الإسماعيلية وانتشرت بسرعة لدرجة أن توفي ١٧٦ شخصاً في أسبوع . وأدى جهل

الأطباء بمعرفة طرق نقل العدوى إلى عدم اتخاذ علاج فعال^(١٢٤)، وترك معظم العمال الورش وفروا إلى بور سعيد ليبحروا عائدين إلى مسقط رؤوسهم . ولم يستمر الوباء سوى شهر واحد واختفت الكارثة كما جاءت . وقد تعرضت الإسماعيلية ، المركز السكاني الذي يعتبره أوبار - روش أكثر المراكز تفوقاً من الناحية الصحية في الخليج إلى أسوء النتائج ، إذ توفي ١٠٨ من ٢٠٣ وهم جملة الأوروبيين في الخليج^(١٢٥) . ولا يتوفر أي رقم موثوق به بشأن أهل البلد . وتوفت ست نساء هن من الضحايا بالإسماعيلية من بينهن زوجة مدير عام الأشغال ماثيلد فوازان (Mathilde Voisin) ولم يصرح بهذه الوفاة إلى الصحافة^(١٢٦) كي لا يتزعج الرأي العام ويتوقف المتطوعون عن المجيء في المستقبل للعمل في الورشة . فقد كان الهدف في ذلك الوقت جعل الورش التي هجرها العمال أهلة من جديد بالسكان .

ورفع ما كان يخشاه فوازان مع وصول الآلات إلى الورشة ، فقد زاد عدد الحوادث^(١٢٧) . ولا تتيح المصادر الموجودة الحصول على العدد الصحيح للحوادث ولكن من الممكن الاستعلام عن مصدرها من خلال بعض الحالات . هكذا في يونيو عام ١٨٦٦ مات غرقاً ثلاثة من العرب عند عبورهم النهر أمام مشاغل شركة المصاهر وورش البحر المتوسط على أثر غرق الزورق^(١٢٨) . وفي تاريخ لم يحدد في بداية عام ١٨٦٨ هرس جسر مائل ببري [أي رجل من أهالي النوبة] (Barbarin)^(١٢٩) في الشالوفة . وفي عام ١٨٦٥ مات عامل غمساوي مهروساً تحت عجلات آلة حفر في الجسر . وفي مايو ١٨٦٨ أصاب انفجار سخان جرافة أربعة أشخاص ومات واحد منهم . وفي ١٢ يوليو ١٨٦٨ وقع حادث خطير على ظهر جرافة تعمل في قطاع السويس وتمشمت رجل المشرف بالشركة في تروس ملفات الرفع الخلفية^(١٣٠) . وفي عام ١٨٦٩ في ورشة منارة بور سعيد الجديدة تعلق عامل يوناني في طارة الجر العليا (tourteau) لمصعد البضائع أثناء تشغيله . ومات .^(١٣١)

في عام ١٨٦٦ ، أصدر فوازان أمر إداري يحدد شروط منح المكافآت وقيمتها المستحقة للعمال في حالات الإصابة بالجروح أو المرض^(١٣٢) . وقد أخذت هذه الإجراءات عسناً منشور بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٨٤٨ متبع في ورش الأشغال العامة بفرنسا . ويبين أنه إذا نتج العجز عن العمل عن أمراض وبائية أو جروح حدثت أثناء ممارسة العمل يحفظ العمال بكامل مرتباتهم لمدة ٦ شهور وإذا كان لسبب آخر تقل الأجور إلى النصف باستثناء الأمراض التناسلية أو المشاجرات المتعمدة أو الإفراط في الشرب أو الطعام حيث لا تصرف أية أجور ويمكن علاج العمال في الحالتين الأوليتين في المستشفى . و أثناء إقامتهم بالمستشفى يخضع يومياً فرنكان من العمال الأوروبيين ، و يخضع فرنك واحد من عمال أهل البلد وذلك من جزء المرتب المخصص لهم .

وصارت القواعد المطبقة تدريجياً في الخليج مماثلة للقواعد المتبعة في باقي مصر . ومع بداية عام ١٨٦٤ ، اضطرت بور سعيد إلى تطبيق نظام الحجر الصحي أسوة بكل مدن الساحل المصري . ومنذ ذلك الوقت تم تفتيش السفن التي تصل إلى هذا الميناء قبل أن ترسو^(١٣٣) . وأخيراً ، وفقا للاتفاقية التي أبرمت بتاريخ ٢٣ إبريل ١٨٦٩ ، أخذت الحكومة المصرية على عاتقها مهمة الإدارة الصحية في الخليج كما هو الحال في أقاليم البلد الأخرى .

عدالة مستحيلة

اضطرابات عديدة

توضح الملفات المحفوظة والمتعلقة بإدارة أمن الورش التي وصلتنا وجود اضطرابات كثيرة في الخليج كما تساعد علي تقديم فكرة عن أسباب اندلاعها . وهذه فرصة للاحتكاك بورشة أقل تطهراً وأكثر إنسانية مما تصوره قراءة تقارير الأشغال . فهي تعرض في الحقيقة في ورشة قناة السويس بعض جوانب حياة العمال الممكن إدراكها .

بالرغم من التصريحات العامة المتعارضة^(١٣٤) يكاد يظهر العنف يوماً في الخليج ، إذ تعكر المشاجرات والصراعات العنيفة التي تنفجر غالباً لأسباب تافهة ، هدوء الورش والمخيمات بشكل دائم وتزيد من العداوة بين أفراد من جنسيات مختلفة . وبعد توقف إرسال قوافل عمال السخرة قام في الحقيقة خليط من الجنسيات المتعددة من العمال بتعمير ورش خليج السويس بينما كان معظم عمال الحفر من المصريين أو السوريين ، أما العمال المتخصصين من بنائين و نجارين ، و نجارين الهياكل والحدادين ، وعمال الضبط والميكانيكيين ، فقد تم اختيارهم من إيطاليا ومن شمال بحر الأدرياتيك . ويشكل اليونانيون طاقم ملاحى الجرافات والزوارق المتنوعة^(١٣٥) . وتعد اللهجة الإيطالية في جميع موانئ البحر المتوسط هي اللغة المشتركة التي تتيح التفاهم فيما بينهم . وليس نادراً أن تتحول ورش قناة السويس إلى ميادين قتال يتصارع فيها عمال من أصول مختلفة ، وهذا الوضع ليس شاذاً حيث نلاحظ أحداثاً مماثلة خلال ذلك العصر في فرنسا في ورش إقامة طرق السكك الحديدية الكبرى^(١٣٦) . ولا تحتاج النزاعات الكامنة إلا لذرّات شكلية لتنفجر ويكفى لتفجير الموقف إجابة عنيفة أو كلام قاسٍ أو تصرف مثير بعض الشيء أو أغنية وطنية أنشدت في الشارع مثلاً .

وغالباً ما تتحول المشاحنة بين فردين في لمح البصر إلى مشاجرة عامة تاركة وراءها على الأرض جرحى بل قتلى . فقد أدت مشاجرة في يومي ٣٠ و ٣١ أكتوبر في عام ١٨٦٤ بين اليونانيين والعرب إلى إصابة اثني عشر عاملاً يونانياً بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية^(١٣٧) . ومع ذلك لم تتوقف الأعمال العدائية . ومع ذلك تنظم الجماعات في المدينة وتوزع الدوريات الأمنية في المكان حيث تعيش كل جماعة من الجماعات . ولا تضعف العداوات مع الزمن . و على

العكس من ذلك تثير أحداث الخلافات السابقة الضغائن وتصون العداوة بين مختلف المجموعات. فقد اندلعت معركة حامية بين اليونانيين و" الزنوج " في نوفمبر ١٨٦٥ في ورشة التل الكبير ونتج عنها ستة جرحى من بينهم مشرف فرنسي. أما المعركة التي وقعت بين العرب ورجال من مونت نيجرو (الجبل الأسود بيوغوسلافيا) في ورشة القنطرة في إبريل ١٨٦٦ فكانت نتيجتها ثلاثة قتلى. و في عام ١٨٦٤ اندلعت أحد أكثر المشاجرات ضراوة في ورشة بقسم الإسماعيلية . وتدخل المستخدمون بالشركة لمنع مجزرة حقيقية و أدى هذا الصراع بين ثلاثين يونانياً وخمسمائة عربي إلى خمسة قتلى وخمسة وعشرين جريحاً (١٣٨).

كما وقعت أيضاً الخلافات بين أصحاب الأعمال وعمالهم . وتتابع التمرد وأدت الإضرابات إلى توقف العمل وتحولت أحياناً إلى صراع جسدي. وكانت ظروف العمل والمعيشة الصعبة وأيضاً الوعود الكاذبة هي الأسباب الرئيسية لهذه الثورات . في عام ١٨٦١ بسبب حصة بسكويت رفض العمال العرب العمل في ورشة عهد بها إلى فاليسكي (Waleski) وهو عامل بالمقطوعة في رأس العش. وفي ديسمبر من عام ١٨٦٥ تظاهر عمال من بيامون (سهل باسم منطقة بيطاليا) (Piémontais) بالشالوفة مسلحين بمقابض المعول وهاجموا مخزن المخيم . ولابد من القول بأن الرجال في هذا المخزن قد ينتظرون في بعض الأحيان دورهم لمدة ساعة حتى يحصلوا على وجباتهم ، ونتيجة لذلك قد يدق الجرس لاستئناف العمل دون أن يتناول البعض غذاءهم . وتسببت أيضاً ندرة الماء التي اجتاحت الورش في البداية في بعض الفوضى . وحدث زحام شديد وقت التوزيع . واعترف المشرف في الورشة المقامة في البحيرات المرة الصغرى أنه في يوم ١٢ أغسطس ١٨٦٦ حدث أول اشتباك منذ الساعة السابعة صباحاً وتصارع العمال بالمجرفة وأيدي المعول وكانت النتيجة خمسة جرحى. علاوة على ذلك ، تكونت التحالفات ودُبرّت الإضرابات للحصول على زيادات في الأجور أو الاعتراض على التأخير في دفع الأجور (١٣٩).

وسُجلت عدة سرقات من بين الجرائم المتكررة في الورش وفي المخيمات و أيضاً حوادث قتل. وقد ثار سكان الإسماعيلية من زيادة السرقات التي حدثت في المدينة . ففي يوم ٦ ديسمبر ١٨٦٧ اكتشف بيليه (Bellet) وكيل خدمة العبور (transit) عندما رجع إلى بيته في الساعة الحادية عشرة بعد عمله في الصباح أن موله قد نهب بالكامل . وقد تعرضت أيضاً ورش القناة إلى السرقات وكانت المعدات أكثر ما يجذب للصوص إلا أنه كانت هناك كذلك سرقات من جانب العمال . وقد ظهر من التفتيش الذي تم في القرية العربية ببور سعيد أن العمال كانوا يقومون باستمرار بسرقة آلات بسيطة . وفي أكواخ القش (القُري) اكتشفت سرقة مطارق كثيرة ومحازق ومبارد والواح معدنية ومثاقب ومبارد ومقابض وملاقط من النحاس وبراجل ومحافر وأزاميل

ومفكات ومجارف... الخ. وكانت الحالة يرثى لها في جميع المخيمات فلم تتمكن إدارة الشركة من إيجاد حل حقيقي لمشكلة اختلاس الكثير من المستخدمين المعدات والمواد لاحتياجهم الخاصة .

أما الأكثر خطورة فهو ارتكاب جرائم القتل في الورش والمخيمات دون التمكن دائما من التعرف على مرتكبيها أو معرفة الدوافع . في سنة ١٨٦٧ وحدها سُجلت على الأقل اثنتا عشرة عملية اغتيال . ففي مارس اغتيل اثنان من العرب في ضواحي طوسون ، وفي أبريل اثنان من الجبل الأسود بيوغوسلافيا على شاطئ ترعة الماء العذب ، وفي ١١ مايو مستخدم فرنسي سابق في مقاولات بوريل ولافاني شركائهما وجد ميتا بضربة سكين في الورشة رقم ٦ ، وفي ٥ أغسطس وجد غساوي قرب ماكينة الصانع لاسيرون (Lasseron) بالإسماعيلية ، . وفي أول أكتوبر خباز الشالوفة الإيطالي ، وفي ٦ أكتوبر وجد يوناني مقتولا قرب هاويس جهة المحدار النهر في الإسماعيلية، وفي اليوم التالي قتل مشرف بالشركة وزوجته في منزل كان يسكنه عند سهل السويس وفي ٢٢ أكتوبر وجد رجلٌ من مدينة كالابري (Calabrais) في مدينة عمال الإسماعيلية وأخيراً في ٣ ديسمبر قتل تاجر يوناني كان يعمل في ورشة السيد سولنييه (Saulnier). وأيضاً لم يتم هنا سرد سوى القتل الذي أمكن التعرف عليهم إذ كثيراً ما اكتشف العاملون بالشركة أو أشخاص غيرهم جثثاً مجهولة^(١٩٠) . وفيما يلي بعض المقتطفات من تقارير حررت في مثل هذه الظروف الحالية :-

في أغسطس ١٨٦٤ انتشلت جثة نوبي (Barbarin) من الماء في القصاصين وفي ٢٥ سبتمبر ١٨٦٥ انتشل مشرف من القصاصين جثة عربي ظهر له أن الوفاة كانت منذ عشرة أيام ... في ١٠ نوفمبر ١٨٦٥ اكتشفت جثة أوروبي في قطاع رمسيس في ترعة الماء العذب ... في السرايوم في ٢٨ سبتمبر ١٨٦٦ عثر على عامل عربي مذبحاً في أعلى الهويس رقم ١٦ ولم يتعرف عليه أحد ... في ٢١ فبراير ١٨٦٦ في الإسماعيلية ، عثر السيد جوجيه (Gouget) رئيس قسم بحيرة التمساح وهو يتابع دراسته للبحيرة على جثة بشرية في حالة تعفن إذ أنه لم يتم دفنها إلا في عمق بسيط، وقد أخرجت الضباع الجثة في الليلة قبل الأخيرة بعد نسيش الأرض وجرتها حوالي ثلاثين متراً . وفي ٢٥ مارس ١٨٦٧ عثر على جثة مقطوعة الرأس في الكيلو ٧٦ من ترعة الماء العذب وهي رابع جريمة وقعت في هذا المكان منذ ٦ شهور . في ٣٠ إبريل ١٨٦٧ في الكيلو ٣٨ من ترعة الإسماعيلية حدث هجوم بالأسلحة تبعته سرقة قام به عرب على زورق كان عليه ٩ أشخاص سبعة يونانيين واثنان مونتنجريين وقد عثر على الجثة الاربعة عائمة بالأمس على سطح الماء عند الكيلو ٣٨ . في ٢٨ أغسطس ١٨٦٧ عثر على جثة في الكيلو ١٤ عند ترعة الماء العذب ... في ١٢ أكتوبر ١٨٦٧ عثر على عربي مقتولا على طريق السرايوم على

بعد ربع ساعة من الإسماعيلية... في ٢٥ مايو ١٨٦٨ اكتشفت جثة مواطن في قاطرة تابعة لمقاولات كوفرو (Couvreux) في الجسر.

لم تنج من أعمال القتل أية جنسية أو رتبة حتى لو بدت فئة العمال هي الضحية الرئيسية لهذه الاغتيالات. وفي أغسطس عام ١٨٦٧ حاول المدعو ديلبار (Delbert) اغتيال المهندس جيوا لكنه لم يحقق أغراضه .

هناك سبب آخر للخلافات والصراعات وهو النساء. ولا نعرف بشكل عام إلا القليل عن وجود النساء بالخليج ولكن الإحصائيات الطبية تشير بالنسبة لعام ١٨٦٨ - ١٨٦٩ إلى أن هناك ألفي امرأة من البيض ونفس العدد من أهالي البلد أي ما يساوي ١٢% من جملة السكان^(١٤١). علاوة على ذلك ، كما هو الحال في ورش السكك الحديدية بفرنسا ، تجذب زيادة تطور الأشغال العاهرات^(١٤٢). وتزداد بيوت الدعارة في المدن والمخيمات.

وفي سبتمبر ١٨٦٤ ، كانت الاضطرابات شديدة في القرية العربية بالجسر ، وكانت المشاجرات تندلع دائما بين العرب واليونانيين و قُتل عربي ذات ليلة .وانتهى مفوض البلدية إلى أن السيدة الوحيدة التي كانت تعيش في القرية هي سبب هذا الخلاف وقرر طردها من المخيم. وعندما قامت مشاجرة في مايو ١٨٦٥ بين أوروبيين وبعض الأهالي بمخيم القنطرة كان من الصعب كشف الحقيقة من بين الأقوال المتناقضة . وسجل مفوض المخيم الذي قام بالتحقيق في تقريره أن " المشكلة اختصرت في النهاية على معرفة أن القواص (cawa) أي رجل البوليس هو عاشق العاهرة " . وقد يكون نفس هذا السبب لو صدقت شهادة صاحب المقهى الذي وقعت فيه المشاجرة هو مصدر الحادثة الأخرى : " أمس في الساعة التاسعة كنت في المقهى عندما دخلت البنت جميلة (Gémilah) مع خمسة يونانيين وطلبوا مني فرموت (نبيذ أبيض مطعم بالأفستين) ودخل القواص زيشير (Zéchir) في هذه اللحظة المقهى وطلب من المرأة أن تصحبه لأن أخوها يطلبها. واجابت المرأة أنها لا تستطيع ترك اليونانيين . فقال لها عندئذ زيشير أنهم سكارى ولن يتبها إذا تركتهم [...] وتخانقوا. وعاد زيشير بعد لحظة وأطلق عياراً على مينا (Mina) بسلاح لا أعرف ما هو وفر هارباً مباشرة " .

وفي مسألة اغتيال النمساوي في يوم ١٤ أغسطس ١٨٦٧ في مقهى إيطالي بالحي الصناعي بالإسماعيلية رأى أيضاً المحقق أن " المرأة " هي دافع الجريمة و بالرغم أن المرأة ما تكون موضوع الخلاف إلا أنها أحيانا ما تكون كذلك الضحية . في ١٢ أكتوبر ١٨٦٨ وضَّح التقرير الرسمي أن عاهرة من أصل نمساوي عمرها يقل عن ٢٥ سنة قُتلت في بيت بغاء في بور سعيد.

مساحة جديدة لتطبيق النهج

في ظل غياب المؤسسات المعنية بتنظيم الحياة الاجتماعية للرجال في خليج السويس وتحديد العلاقة فيما بينهم ، قام فوازان بسد هذا النقص عن طريق إنشاء إدارات خاصة تحت سلطته وقام بإصدار اللوائح وكانت الأوضاع السائدة في فرنسا هي مرجعه في هذا المجال أيضاً.

كانت أول فكرة وضعت لمحاولة استتباب النظام هي مشاركة السلطات الدينية . في خلال شهر فبراير عام ١٨٦١ تم تحرير إعلان لتعيين عمال من الأهالي بغرض نشره في المدن والقرى الرئيسية في مصر الوسطى والدلتا ويُعبر خاصة سكان البلد بوجود مسجد في كل قرية ^(١٤٢) بورش الخليج. ويتناسب إنشاء دور للعبادة وقطاع خدمات خاص بها مع مصلحة تدرّكها الشركة جيداً. فهي في الحقيقة وسيلة لجذب العمال واستمرارهم في الورش و أيضاً للحفاظ على النظام. ويسدل الرسم الهندسي لمباني الإدارة العامة للأشغال بالإسماعيلية على المهمة المرتقبة من الخدمات الدينية. وتوضح في الواقع تفاصيل واحدة من البنائين القامتين على جانبي المبني الرئيسي أن هناك صالة مخصصة " للموظفين المسؤولين عن الأمن والأديان" ^(١٤٣). ويشير تحديد هذه المساحة المشتركة إلى تقارب الأهداف المتواصلة .

وقد خضعت إدارة الخدمات الدينية مثلها في ذلك مثل إدارة الخدمات الصحية في السنوات الأولى للوكالة العليا والإدارة العامة للأشغال بالتناوب. ففي عام ١٨٦٥ دخلت هذه الإدارة والتي أطلق عليها أيضاً أحياناً إدارة المراسم الدينية في اختصاصات إدارة الأشغال العامة ، وقامت الشركة وعلى نفقتها ببناء مساجد وكنائس كاثوليكية ودور عبادة صغيرة أرثوذكسية في مراكز النشاط الرئيسية. وفي أول فبراير من عام ١٨٦٢ تم افتتاح كنيسة : الأولى في الجسر مهداه إلى سانت ماري دي ديزار تخليداً لمرور العائلة المقدسة عند هروبها إلى مصر ^(١٤٤). والثانية أقيمت في بور سعيد تحت رعاية سانت أوجيني ^(١٤٥) وحظيت أيضاً بالإسماعيلية بكنيسة أخرى وهي تحت شفاعته سان فرانسوا دي سال (Saint-François-de- Sales). وأثار طرازها المعماري القوطي الحديث بعض التهكم من جانب كثير من المسافرين المارين بالخليج. ولم يكن فوازان بعيداً عن هذا الاختيار العمراني فقد عدل في الواقع مشروع المهندس فيلير (Viller) عندما غيّر شكل النوافذ مقترحاً أقواساً من الطراز القوطي بدلاً من المستطيلات ^(١٤٦). ويبين هذا التغيير الأسلوب التقليدي الغالب على معظم اختيارات مدير عام الأشغال . وفي عام ١٨٦٦ ، كان يقام قداس ديني كاثوليكي في مخيمات القنطرة والجسر والإسماعيلية والشالوفة والسيرايوم كل يوم أحد ^(١٤٧). وفي مدينة السويس تم حصر سبعة مساجد وكنيسة كاثوليكية يخدم بها آباء الأرض المقدسة وكنيسة

صغيرة أنجليكانية وكنيسة يونانية^(١٤٩) كما نجد أيضاً رهبان فرانسيسكان في بور سعيد والإسماعيلية^(١٥٠).

ولم تكتف الشركة بأن تتحمل بناء وصيانة المباني بل حرصت أيضاً على مكافأة القائمين على خدمة مختلف الديانات . ففي شهر إبريل عام ١٨٦١ عينت الشركة في مقاطعة الجسر الشيوخ إبراهيم عبد العزيز إمام وقاضي وعمر مؤذن للقرى العربية . ومنحت الأول مرتباً شهرياً ١٢٥ فرنكاً و ١٣ فرنكاً للثاني^(١٥١) وقد أعطت هذه المبادرة نتائج ممتازة . فقد لاحظ مانتو فعلاً في عام ١٨٦٠ أن القرية العربية ببور سعيد ازداد عدد سكانها كثيراً منذ وصول الإمام^(١٥٢) . ويقوم الأئمة المنتمون إلى مفتي القاهرة الكبير بمهام القضاة للصلح بين الأهالي وكانوا يحررون العقود ووثائق الزواج . وحاول فوازان في داخل كل طائفة إقامة تسوية مؤقتة مع المسؤولين من رجال الدين أو الشخصيات ذات النفوذ . وفي نفس الوقت التي ازداد فيه سكان الخليج ، ازداد عدد رجال الدين الذين يتقاضون أجوراً من الشركة . ففي ١٨٦٨ شملت الخدمة الدينية بالشركة خمسة كهنة وثلاثة خدام كاثوليكين وأربعة مؤذنين وكاهنين أرثوذكسين وثلاثة خدام يونانيين وزعوا على المخيمات الرئيسية ، وكانوا يتقاضون أجورهم من الشركة .^(١٥٣) وفي هذه السنة ، تقاضى الكهنة مبلغ ٢٤٠٠ فرنكاً في السنة وخادمي الشعائر الكاثوليكين ١٢٠٠ فرنكاً ويتقاضى الكهنة الأرثوذكس ٢٤٠٠ فرنكاً وخدامهم ٩٦٠ فرنكاً ، أما المؤذنون فأجورهم ٩٠٠ فرنكاً ماعدا مؤذن بور سعيد فهو يتقاضى ١٥٠٠ فرنكاً دون معرفة سبب هذا التمييز . فلم تتعامل الشركة مع كل الديانات على قدم المساواة . ولما كانت الشركة هي التي تسدد الأجور فقد سمحت لنفسها بحق اختيارهم أو على الأقل طرد الذين لا ترضى عنهم بسبب أفكارهم أو تصرفاتهم . هكذا في يناير عام ١٨٦٤ اتخذ قراراً بطرد الكاهن نيكيتا (Nékitá) "بحجة أنه رجل يمثل خطراً حقيقياً لتأثيره السيئ على نفوس الرجال الذي كان عليه إرشادهم"^(١٥٤) . ونتج عن ذلك مظاهرة احتجاج في بور سعيد نجح رجال الشركة في قمعها .

في خلال السنوات الأولى للورشة ، حاولت الشركة تنظيم المشاكل المتعلقة بالأمن بنفسها في الخليج ، ولكن زيادة عدد السكان وزيادة الصراعات بينهم بكافة أشكالها جعلت فوازان يطلب من الحكومة المصرية مساعدته . عندئذ أصبح خليج السويس إقليماً جديداً بمصر . وبناء على اقتراح دي ليسيس^(١٥٥) تم اختيار إسماعيل [حمدي] بك ، المعروف لدى الشركة لقيامه بمهمة مفتش الوحدات في وقت السخرة والذي تم تعيينه محافظاً في عام ١٨٦٣ . ولقد كان أمل فوازان في أن يساعد وجود مندوب الخديوي في جذب العمال إلى ورش الشركة .

في نفس الوقت تم تكوين إدارة جديدة بالشركة في عام ١٨٦٤ لتقوم بشق مهام البلدية مثل إدارة " مكاتب المتدربين " ، وكُلف بها أدولف جيلر (Adolphe Geyler) رئيس مكتب الحسابات السابق في إدارة الأشغال المركزية ، واختصاصاته واسعة، إذ تشمل المسائل المتعلقة بالحالة المدنية والمسائل التجارية ودراسة المسائل التي سترد إلى مختلف القنصليات عن طريق الوكالة العليا والتحقيق وتجهيز الدعاوى القضائية والإقامة والمسائل المرتبطة بممارسة الديانات المختلفة والأمن العام والنظام العام والصحة وشؤون البلدية ومراقبة مؤسسات الصناعة الخاصة وتوزيع السكن والإجراءات المتعلقة بزيارة الأجانب والبريد والتلغراف. ونجد في وسط كل قطاع أشغال وفي المخيمات الرئيسية التابعة لمكاتب المتدربين مندوب بلدية ووكيل بريد وتلغراف^(١٥٦). وعلى أثر مشاجرة كبيرة للغاية في أحد المخيمات ، طلب فوازان بإلحاح من الحكومة المصرية أن ترسل له قوات لحفظ الأمن تكون متواجدة بشكل دائم وتم له ذلك^(١٥٧). وتم فيما بعد بناء ثكنات وجاء إلى المخيمات الرئيسية الضباط ورؤساء الشرطة وقوة بوليسية تسمى القواصة (cawas) وضباط النظام المحليين . وفي حالة عدم كفاية عددهم كان يُطلب مساعدة القواصة من الأقاليم المجاورة . وبناء عليه أصبحت مهمة حفظ الأمن تقع على عاتق إدارات الحاكم المنتخب في الخليج وإدارات الشركة معا^(١٥٨)، إلا أن هذا التعاون لم يكن على الوجه الأمثل^(١٥٩) ليكون قادراً دائماً على مواجهة كل المشاكل الأمنية لذا فقد استمرت الاضطرابات .

لذلك أصدر مدير عام الأشغال عدة قوانين خاصة بمراعاة قواعد السلوك التي يجب اتباعها في الخليج. وهذا يدل على وجود اضطرابات كثيرة و أيضاً على رغبة فوازان في استتباب الأمن والانضباط والنظام في الورش والمخيمات. ويقوم بالنيابة عنه في هذه المهمة رؤساء القطاعات الذين لهم وفقاً للأمر الإداري المؤرخ في فبراير ١٨٦٣ كل السلطات على جميع إدارات قطاعهم^(١٦٠) بما فيها إدارة الشرطة . وعلى كل المراقبين حينئذ تقديم التقارير الخاصة بالاضطرابات كما كانوا يفعلون بالنسبة للأشغال.

حاول فوازان السيطرة على التعدييات وتدارك الأخطار بواسطة الحظر. ففي ديسمبر عام ١٨٦٤ قام يونانيون بممارسة الرماية داخل مدينة الإسماعيلية^(١٦١) لذا قرر حظر استخدام السلاح في المدينة . وبعد عدة شهور كان حظر حمل السلاح (مسدسات وسكاكين ذات شكل غريب) في الخليج^(١٦٢). إلا أنه بالرغم من ذلك استمر استعمال الأسلحة النارية وكانت سبباً دائماً في وقوع ضحايا^(١٦٣). ومنذ ١٧ أغسطس ١٨٦٧ تم حظر رفع الأعلام^(١٦٤) من قبل أي شخص. وجاء هذا الحظر بعد وقوع مشاجرة عنيفة جداً في مخيم الشالوفة و يرجع أسباب هذا الصراع إلى ما يلي :- "كان صاحب مطعم (كاتنين) شركة المقاولات في المخيم قد رفع ثلاثة أعلام (فرنسية إيطالية - نمساوية) ، وهيمن العلم الفرنسي على الأعلام الأخرى"^(١٦٥) ويمكن تصور النهاية

بسهولة . لم تتوقف الاضطرابات وازدادت التحذيرات في المخيمات لدرجة إقامة نوع من حظر التجول . ولضمان الأمن ليلاً تم منذ أول نوفمبر عام ١٨٦٧ إغلاق المحال والمقاهي والمطاعم قبل الساعة الحادية عشرة مساءً بصورة إلزامية ، وكان لابد على من يريد السير بعد الساعة المحددة أن يتزود بوسيلة إضاءة (١٦٦) .

وقد رأى فوازان أن القرى العربية التي ازدهرت قرب المخيمات الأوروبية كان لها فعلاً مزايا كثيرة ولكن كان لها أيضاً عيوباً لابد من تداركها : " تعتبر قرية الجسر العربية مكاناً جيداً لسكان هذا المخيم ، فهم يجدون سوقاً مزودة بما فيه الكفاية ولكن مثل كل الأحياء المتواضعة في المدينة لها أيضاً مخاطر تتمثل في وجود نادي للقمار وبيت للدعارة . وكانت قد وصلت شكايي غايية في الحدة وأشير إلى أن عدة منازل تدار كأوكار يتردد عليها عدد كبير من الأوروبيين العاملين في المخيم لقضاء الليل وانتشرت الأمراض التناسلية بشكل مفرط بين السكان . وكان لابد من وضع قوانين لذلك وإصدار قرارات من الأمن بتحديد ساعة إغلاق المحلات والمقاهي وإجبار السيدات اللاتي تمارسن البغاء على الكشف الطبي الدوري وهذا ما تم بالفعل " (١٦٧)

ومنذ عام ١٨٦٥ ، وفي توافق تام مع مناهجه ، أصدر المدير العام تعليمات تتعلق بشرطة الآداب (١٦٨) . ويعتبر وجود هذا المنشور دليلاً على زيادة عدد أعدادهم وتلزم هذه التعليمات كل عاهرة بأن تخضع أسبوعياً لكشف طبيب ليتأكد أنها سليمة ويسلم لها بطاقة أسبوعية محددة . وتنص هذه التعليمات علاوة على ذلك على أنه من مسئولية من "يدرن هذه البيوت " مراقبة هذه الأوامر " وطرد كل بنت مريضة دون بطاقة أو انتهاء تاريخ بطاقتها" وقد اتخذ فوازان أيضاً التدابير لتنسيق الخناق على زيادة عدد الملاحم بضواحي الورش . وقد دفعه المقاولون إلى ذلك لأنهم يعتبرون هذه الأماكن فعلاً ضارة بالأشغال . وفي مايو ١٨٦٧ رأى المقاول كوفرو أن الدعارة انتشرت بشكل غير عادي . (١٦٩) ثم جاء بعد ذلك دور شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما في الشكوى من أن عدداً ضخماً من الملاحم مفتوحة طوال الليل مما يستتقي الموظفين والعمال لساعات متأخرة وينال من مدخراتهم ويجعلهم غير قادرين على العمل في اليوم التالي " (١٧٠) . وطلبوا من الشركة اتخاذ إجراءات تهدف إلى إبعاد هذه الأماكن عن مساكن العاملين.

واتخذ فوازان قراراً في عام ١٨٦٨ بإغلاق منشأة يمارس فيها لعبة الروليت معتبراً " بشكل عام أن نوادي القمار منشآت يثرى لها . ويشتد خطرها أكثر في مكان ليس في النهاية إلا ورشة عمل كبرى . إذ يوجد في ذلك تسليات مشتومة للعاملين سواء الموظفين أو العمال ، وأسباب تسلية من واجب الشركة إزالتها بكل الطرق " (١٧١)

وهناك وباء آخر استكره في نفس الوقت كبير الأطباء والمدير العام^(١٧٢) وهو الخمر الذي تم حظر بيعه. ورغم ذلك ومع تطور التجارة الحرة استمر استهلاك شراب الأفسنتين (الأيسنت) وماء الحياة بصورة كبيرة^(١٧٣). وتثير الثمالة الصراعات وتولد العنف ففي إبريل عام ١٨٦٥ قامت مشاجرة في الإسماعيلية حدثت أثناءها مواجهة بين أهالي من مدينة بريثاني بشمال غرب فرنسا (Bretons) وهم في حالة سكر ويونانيين رفض أحدهم أن يقدم لهم شرابا. ووقعت مشاجرة في مارس ١٨٦٨ أمام محل بيع مشروبات بالقرب من البحيرات المرة تدل نتائجها على شدة العنف الذي ساد في الخليج : " تلقى إيطالي رصاصة في ظهره وطعنة سكين بجانب عينه اليسرى ودخل المستشفى [..] وفقد فرنسي الشفة السفلي في معركة على أثر عضه " ولم يكن ممكنا إجراء التحريات لأن الشهود الذين استجوبهم مدير الشرطة كانوا في حالة سكر هذا ما أشار إليه الشخص المكلف بإجراء التحقيق .

وقد حالت صعوبتان دون استطاعة الشرطة حل المشاكل بطريقة مرضية . وترجع الأولى إلى تمسك الشركة بتطبيق قواعدها الخاصة والثانية مرتبطة بقوانين تفعيل العدالة في مصر. ولضمان النظام في المخيمات وفي الورش ، اعتقد فوازان أنه من الأفضل إصدار قواعد وتوجيه تحذيرات ولكن المهم العمل على تنفيذها . وقد أدرك فوازان حدود عمله. وقد صرح بما في نيته في أكتوبر عام ١٨٦٦ قائلا: " الشرطة العامة الوحيدة المعترف بها لا تخضع لنا ، وليس من المؤكد أن توافق على مساعدتنا في قمع المخالفات لنظام غير صادر عن الحكومة والذي لا يمكنها إعلانه إلا بعد مفاوضات غاية في الحساسية مع مختلف القناصل "^(١٧٤) .

وقد تعارضت أيضا مصالح الشركة مع نظام القضاء الساري في البلد. إذ لم يكن هناك في الواقع، في ذلك الوقت، أي قانون مختص بالنسبة للقضايا المختلطة أي بالنسبة لحالات النزاع بين أفراد من جنسيات مختلفة. وقد أعطى رئيس القسم بابونو (aponot P) في أغسطس عام ١٨٦٩ ، مثلا لنتائج هذا الوضع . " تم القبض على يوناني شرير وبسرعة طلبه قنصل بلده أو وكيل القنصلية (يوجد وكلاء في كل المخيمات) ، وبعد بضعة أيام شوهد هذا المجرم يتجول بحرية، ونعرف كثيراً من أمثال هذه الحوادث ونفهم منذ ذلك الحين استياء الشرفاء والمسئولون بشدة من هذه الأوضاع وأنهم إذا اقتضى الأمر سيحاولون القيام بعمل الشرطة وقد يتأرون لأنفسهم "^(١٧٥)

ولفهم هذه الظواهر المستنكرة لابد من التعرف على العادات المحلية . ففي حالات صراع المصالح بين الخاصة لابد من الفصل بين المنازعات المدنية وشئون الأمن . ولنأخذ في الاعتبار أولا

المنازعات المدنية في الخلافات بين الأوروبيين إذ لا تتدخل فيها السلطة المحلية ولا الشركة. ويجب على الشاكي أن يقيم الدعوى أمام القنصلية التي يتبعها المدافع لتسوية المشكلة. وإذا حدثت منازعات بين عربي وأوروبي فالسلطة القضائية التي تتدخل هي التي يتبعها المدافع. وفي حالة مشاكل الأمن بصفة خاصة سواء الجرح أو الجرائم ، مهما كانت جنسية مرتكبيها ، تستطيع الشرطة المحلية القبض عليهم. وإن كان المرتكب مواطناً من أهل البلد . يُلاحق ويحاكم بناء على طلب أصحاب الشكوى إذا لزم الأمر أو تلقائياً . وإذا كان المتهم أوروبياً يجب أن يسلم مباشرة إلى السلطة القنصلية فهي وحدها التي تحقق في القضية وتصدر الحكم فيها^(١٧٦). ويخضع الأجنبي لقانون بلده الأصلي و غالباً ما يكسب القضية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت قنصليته مستعدة للدفاع عنه ومساندته في كل الأحوال ، وهو ما كان يجري دائماً ، يمكن أن يجد نفسه حراً تماماً بالرغم من الجرح الخطيرة التي ارتكبها في البلد. ولما كانت القوانين غير متطابقة فيمكن بسهولة تخيل الحالات المعقدة التي تنتهي إليها ، و مثل هذه القضايا لا يمكن تسويتها في النهاية إلا بواسطة اتفاقيات دبلوماسية أو تسوية كل حالة على حدة حسب قبول القناصل .

وبالرغم من إقامة ممثلي النظام والحكومة المصرية في الخليج فقد بقي حفظ الأمن مهمة شاقة بل غير ممكنة وذلك بسبب الحصانة شبه الكاملة التي يتمتع بها الأجانب بصفة خاصة.

وقد ظهرت ملامح جديدة للعاملين الفنيين في الشركة من خلال المسائل المختلفة التي تمت دراستها . و مع ذلك إذا كانت مهامهم قد تجاوزت بشكل كبير مهام إدارة المقاولات أو سير الأشغال لتشمل مسائل الإدارة العامة والعمران والأمن وكذلك القضاء ، فإن هذا الوضع هو نتيجة ظروف استثنائية أكثر من كونه ثمرة الرغبة الأكيدة في جعل هذه الورشة مختبر لمشروع اجتماعي. فعندما يقوم المراقبون مثل مندوبو المديرين بنقل كل ما يجري في الورشة فهم يساعدون (missi dominici) المدير العام في الإشراف على كل العمليات. وعلاوة على ذلك ، يمتد النظام المفروض على العمليات الفنية التي جرت حفر القناة ليشمل تنظيم المساحات وإلى مراعاة الأخلاق . وفي شتى الميادين ، تم تطبيق الأساليب والمناهج التي نجحت في الأشغال .

ولكن قد يكون الوضع الذي استقر في الخليج مرضياً بالنسبة لاتباع مان سيمون . فماذا نلاحظ في الواقع ؟ - أولاً، إن طائفة من الرجال قد تجمعوا لهدف مشترك هو حفر قناة السويس أي تحقيق مشروع حدده بوضوح في عام ١٨٣٣ بروسير انفتان (Prosper Enfantin) ومن تبعوه إلى مصر - البلد الذي أرادوا أن يجعلوا منه أرضاً لتطبيق نظرياتهم - وكأنه منارة إبحار لبرناجهم ، ولكن أيضاً مجتمعاً يشبه بعض الشيء الذي كان يحلم به السان سيمونيون أي بدون عاطلين وتقوده صفوة فنية مؤهلة وفعالة وينظمه هيكل إداري صارم ومنظم تماماً. ولنتذكر أن النظام في الواقع هي الكلمة العظمى لمثالية السان سيمونيون وكذلك بالنسبة لفوازان طوال مدة

إقامة الورشة . لقد كان ينادي السان سيمونيون بتطوير طرق المواصلات وجعل فوازن منها آليات لخدمة الورشة. وكانوا يناضلون من أجل إلغاء الأشغال البشرية الأكثر مشقة وعمل فوازن على تحسين حالة الفلاحين. وإذا كان السان سيمونيون الذين شاركوا في ورشة سد النيل يريدون في المكان المختار بناء مدينة حديثة لتكون عاصمة جديدة لمصر تجسد بأشكالها أفكارهم (١٧٧) ، فقد قام فوازن بإنشاء مدينة الإسماعيلية ... ومع ذلك ، لا يجب أن نستخلص من هذه المقارنة نتائج سريعة لأن فوازن لم يرجع من قريب أو من بعيد إلى نظرية السان سيمونيون. بالإضافة إلى ذلك، كان تجمع الأفراد الذي تشكل في الخليج في زمن الورشة بعيداً عن بناء مجتمع حقيقي بسبب تكوينه في البداية بل أيضاً لأنه كان في حد ذاته مؤقتاً . وأخيراً يتضح أننا بعيدون تماماً بسبب طبيعة العلاقات التي نشأت في الخليج بين الأوروبيين والمصريين عن " تزاوج الشرق والغرب " الحلم الذي كان قد أعرب عنه السان سيمونيون بكل أمانهم. وتسمى العمليات التي جرت في الخليج والتي نظمها فوازن إلى هدف واحد هو إنجاز حفر القناة. وإذا لم تكن الإجراءات التي اتخذت قد نتجت عن مشروع اجتماعي كما كان يريده السان سيمونيون ، فهي في المقابل قد أعلنت عن نوع من الممارسات الإدارية التي سوف تتطور في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين فخص بها رجال من أمثال هنري فايول (Henri Fayol) . ويكفي للاقتناع بهذا التقارب قراءة الوصف الموجز الذي قدمه بيرتران جيل (Bertrand Gille) عن الفيوليسم (fayolisme) وملاحظ التشابه الكبير مع ما تم وضعه في خليج السويس: " في الواقع كان المقصود الإدارة بالمعنى الشامل للكلمة ولشركات المقاولات حيث يجب تنظيم كل شيء بدقة من المسائل التقنية إلى الحسابات ومن تدريب العاملين إلى تراتب الهيكل الوظيفي والنظام الاجتماعي. كانت وحدة الإدارة والتنسيق والرقابة في الواقع نتاج لنموذج من الديكتاتورية الصناعية بالرغم من المرونة التي أضفتها عليها الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية " (١٧٨)

* الفيوليسم :نسبة إلى هنري فايول Henri Fayol (١٨٤١-١٩٢٥) و يقصد به عقله تنظم نشاط لشركته والتميز بين وظائفها الإدارية والفنية والتجارية والمالية والمحاسبة والضمان . ويرى فايول أن الكفاءة في الإدارة هي أهم مميزات الرئيس وطالب بإنشاء المعاهد الإدارية لإعداد المديرين (المترجم) .

هوامش الفصل الرابع

دولة داخل الدولة

١) تقرير مدير عام الأشغال . AN 153AQ/1610A.

2) Narcisse Berchère, Cinq mois dans l'isthme, P. Hetzel, 1863, p. 78. .

٣) القاهرة دار الكتب -- محفظة السويس رقم ١١ إلياس الأيوبي : تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل - القاهرة ١٩٢٣ الجزء الأول ص ٣٢٥ وما يليها.

4) L'isthme de Suez.... 1856. p. 93. .

5) Frédéric Bonola Bey, L'Egypte et la géographie, sommaire historique des travaux géographiques exécutés en Egypte sous la dynastie de Mohammed Aly. Le Caire, Impr. Nationale. 1889, p. 31.

6) Lionel Wiener, L'Egypte et les chemins de fer, Bruxelles, 1932, p. 70.

7) AN 153AQ/1610A. .

— تقارير مدير عام الأشغال

٨) تقرير مدير عام الأشغال ، مارس ١٨٦١

9) L'isthme de Suez..., 1861, p. 101. .

10) O. Ritt, op. cit., p. 394. .

11) AN 153AQ/TEP 44

١٢) — AN 153AQ/1610A — هوازن حالة الأشغال في يناير وأغسطس ١٨٦٤

١٣) أقيمت هذه الأهرسة الوسطى في الكيلومتر ١٦ و ٤٢ و ٤٨ ابتداء من نفيس وقد بدأت هذه الأهرسة ١٨٦٥ وانتهت مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما في نهاية شهر فبراير ١٨٦٦ .

L. Monteil, op. cit., pp. 148-149 - في السويس يتيح الهويس الأخير توصيل مياه ترعة الماء العذب بالبحر الأحمر.

14) AN 153AQ/INJ118/D. .

15) Voisin Bey, op. cit., tome 6. 2, p. 225. .

رقم ٢١ ، بند ٢ . — أمر إداري AN 153AQ/TE142

17) AN 153AQ/TE 148

18) Voisin Bey, op. cit., tome 6. 2, p. 375.

١٩) اتفاقية ٢٢ فبراير ١٨٦٦ بند ٧.

- 20) AN 153AQ/N 411.
- 21) Frédéric Bonola Bey, op. cit, p. 106
- 22) AN 153AQ/TE142 رقم ١٤ بتاريخ ٢٦ فبراير ١٨٦١ هيئة البرق - أمر إداري
- 23) 153AQ/TE142 . - أمر إداري رقم ١٤ بتاريخ ٢٦ فبراير ١٨٦١ . هيئة البرق بند ٢
- 24) AN 153AQ/TE140 . - أمر إداري رقم ٧٠ بتاريخ ٤ مارس ١٨٦٢ بند ١
- 25) AN 153AQ/TE142. - قانون هيئة البريد في الخليج ، ١٥ مارس ١٨٦٦
- 26) (Victor Cadiat, De la situation des travaux du canal de Suez, en février 1868, P., C,p. 40. Chaix, 1868.p 40
- 27) L'isthme de Suez..., n°6, septembre 1856, p.88
- 28) Charles Edmond, L'Egypte à l'exposition universelle de 1867, P., Dentu, 1867, p. 276.
- 29) AN 153AQ/1610A . - تقرير مدير عام الأشغال بتاريخ أول أبريل ١٨٦٣
- 30) L'isthme de Suez..., n°189, 1^{er} mai 1864, p. 222.
- 31) O. Ritt, op cit., p. 308.
- 32) AN 153AQ/1610A . - تقرير مدير عام الأشغال بتاريخ أول سبتمبر ١٨٦٤
- 33) Voisin Bey, op. cit., tome 6. I, p. 242
- 34) AN 153AQ/TE109 تنظيم جديد لهيئات البريد والتلغراف يونيو ١٨٦٨
- 35) Patrice Flichy, Une histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée, P., La Découverte, 1991, p. 66.
- ٣٦) بدأ حفر القناة في عام ١٨٥٢ وافتتح في يونيو ١٨٥٨
- Vistas de las obras del canal de Isabel II fotografadas por Clifford, Madrid, J. Soto, 1988.
- 37) Voisin Bey, op. cit., tome 6. I, p. 436. .
- 38) AN 153AQ/TE109.
- 39) A. M. Augoyat, Instruction sur les campements avec tentes ou baraques, à l'usage de l'école d'application du corps royal d'état-major, P., Anselin, 1830, p. 3.
- ٤٠) يرجع تاريخ بنائه إلى بدء زراعة الوادي
- César Vimercati, L'isthme de Suez, P., Impr. De Gaittet, 1865, p. 56.
- 41) Voisin Bey, op. cit., tome 6. I, p. 144.
- 42) Eugène Tissot, Etude géologique de l'isthme de Suez, dans ses rapports avec l'exécution des travaux du canal maritime, Turin, Impr. Royale, 1865, p. 23.
- 43) Emile Guimet, Croquis égyptiens, journal d'un touriste, P., Hetzel, 1867, p. 37.

44)) « Avant-projet... », in F. de Lesseps, Percement... , op. cit., p.113.

٤٥) يمكن تفسيرها القرار كأنه دليل على أن الخديوي في ذلك الوقت لم يكن يعتقد بتأثير تنفيذ مشروع حفر قناة السويس.

46) Casimir Leconte, Promenade dans l'isthme de Suez, P., Chaix, 1864, p. 23.

47) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 52.

٤٨) المصادر : أطلس فوازان بك ، لوحة رقم ٢٦ من أطلس مونتيل والورق الشفاف الموجود في تقارير مدير عام الأشغال الشهرية. (AN 153AQ/1610A, 1610B et 1611A)

49) AN 153AQ/TE6.

50) Christian Devillers et Bernard Huet, Le Creusot : naissance et développement d'une ville industrielle(1782-1914), Seyssel, Ed. Champ Vallon, 1981, 287 p.

51) Geneviève Lemée, « Une ville née d'un chantier de constructions navales », La vie urbaine, 1936, pp. 321-331

٥٢) AN 153AQ/TE6 - تعتبر هذه الخريطة من أقدم ما حفظ في وثائق الشركة لا يوجد عليها تاريخ ولكن قد يرجع تاريخها إلى عام ١٨٦٣.

٥٣) من أجل دراسة كاملة عن تصميم وظروف إعداد هذه الخريطة أنظر - Nathalie Montel, « Ismaïlia (Egypte) : une ville d'ingénieurs », Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, n° 73-74, Figures de l'orientalisme en architecture, Edisud, 1994, pp. 245-257.

54) AN 153AQ/TE129. Colonel Lavelaine Maubeuge , Idées qui peuvent entrer dans le plan d'exécution pour le projet de percement Maubeuge de l'isthme de Suez, non paginé,Tunis,le3 décembre 1855. Voir également Xavier Malverti et Aleth Picard, « Lotissements et colonisation. La création des villes coloniales en Algérie, 1840-1860 », Villes en parallèles, n°14, juin 1989, pp. 215-237.

55)Bernard Landau, « La fabrication des rues de Paris au XIXe siècle. Un territoire d'innovation technique et politique », les Annales de la recherche urbaine, n°57-58, juin 1993, p. 27.

56)Notamment : II. Bernard, Notice géographique et historique sur l'Egypte à l'usage des écoles de l'Orient, P., Maisonneuve, 1867, p. 133. Et Drohojowska, L'Egypte et le canal de Suez, P., Laporte, S.D., p 106.

57) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 66.

58)Théodore Boehm, Six semaines dans l'isthme de Suez, P., E. Dentu, 1867, p. 46.

59) Nathalie Montel, op. cit. لزيد من الدقة انظر المؤلف تبالي مونتيل

60)AN 153AQ/TE6. . - رسالة من فيلار إلى لي تور، ٣٠ سبتمبر ١٨٦٥

٦١) رسالة من فيلير إلى فوازان ، ٢٨ سبتمبر ١٨٦٥.

62) Frederico Cresti, « Alger 1830-1860 : l'affrontement entre les « deux villes » », Urbi, n°X, Mardaga, 1986, pp. XVI-XXIV.

- 63) Ismailia en 1869, 1/5 000, in Voisin Bey, Le canal de Suez, Atlas, planche 40
- 64) Voisin Bey, op. cit., tome 6. I, p. 265.
- 65) AN 153AQ/1617B. . - التجارة . إدارة المصالح التجارية والمالية لمصر ، يونيو ١٨٧٥
- 66) AN 153AQ/TE409.
- 67) AN 153AQ/1606B .. - محضر جلسة ٤ يوليو ١٨٥٩
- 68) AN 153AQ/1610A . - تقرير الأشغال الشهري ، يوليو ١٨٥٩
- 69) AN 153AQ/TE869.
- 70) AN 153AQ/1610A - تقرير الأشغال الشهري ، أول أكتوبر ١٨٥٩
- 71) AN 153AQ/1610A . - تقرير مدير عام الأشغال ، يوليو ١٨٥٩
- 72) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 55.
- 73) AN 153AQ/1610A - تقرير مدير عام الأشغال ، أغسطس ١٨٦٢
- 74) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 62.
- 75) AN 153AQ/TE6.. رسم إغراز رقعات الأرض المجاورة للطريق ، ٢٠ أبريل ١٨٦٦
- 76) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 70.
- 77) AN 153AQ/TE6 . - رسالة من فوازان إلى فيليير ، يوليو ١٨٦٥
- ٧٨) عقد الامتياز بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٨٥٤ بند ٨٧ . عقد الامتياز بتاريخ ٥ يناير ١٨٥٦ بند ١١ و ١٢
- ٧٩) عقد الامتياز بتاريخ ٥ يناير ١٨٥٦ بند ١٢ .
- ٨٠) أول اتفاقية بتاريخ ٢٣ أبريل ١٨٦٩ بند رقم ٣.
- 81) Source : Voisin Bey, op. cit., tome 6. I, p. 452.
- 82) AN 153AQ/TE6.
- ٨٣) تم إنشاء في ١٩٦٦ وزارة المعدات عند ضم وزارتي الأشغال العمومية والبناء .
- 84) AN 153AQ/TE56
- 85) AN 153AQ/TE6
- 86) AN 153AQ/TE56.
- 87) AN 153AQ/TE409.
- 88) Dr L. R. Aubert-Roche, De la peste ou typhus d'Orient, documents et observations recueillis pendant les années 1834 à 1838, en Egypte, en Arabie, à Smyrne et à Constantinople, suivis d'un essai sur le hachisch et son emploi dans le traitement de la peste, P., J. Rouvier, 1840.

(٨٩) شارك في لجنة فكرت في مختلف أساليب الاتصالات التي يمكن إقامتها بين البحرين والتي قام بعمل تقريرها هومبار دي هل L'isthme de Suez, rapport fait à la société orientale sur différents systèmes de communication à établir entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, P., Rignoux, 1845, 24p.

90) Dr L. R. Aubert-Roche, Abolition des quarantaines de Angleterre et de l'Autriche. Pétition à la Chambre des députés sur la réforme des quarantaines françaises, P., Impr. De Lange, 1845 : et Question des quarantaines. Projet d'une ordonnance sur le régime et sur l'administration sanitaire en France, P., Impr. De Rignoux, 1845.

(٩١) لوقف بعض الافتراضات تذكر بشكل عابر بأنه على العكس من أيه ، لم يكن أبدأ من الأحوه الماسونيين مع أنه متعاطف معهم .

(٩٢) وثائق المقصورة الكبيرة للماسونيين بفرنسا .

Archives de la Grande Loge de France. Loges n° 191 à Suez : Amour et vérité, n° 192 à Port-Saïd Union des deux mers , et n° 193 à Ismaïlia : Isthme de Suez.

93) AN 153AQ 1624 قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ يناير ١٨٦٠

94) G Ribell, « Enjeux et politiques de la santé dans l'entreprise ferroviaire, des compagnies de chemin de fer à la SNCF », Prévenir, cahier XVIII, vol. 1, 1989, p 61.

(٩٥) دكتور أوبار-لأروش . تقارير عن الإدارة الصحية للعمال المستخدمين في أشغال القناة البحرية خليج السويس المقدم إلى رئيس الشركة " - Annales d'hygiène. 2^e série, tome 18, juillet 1862, p. 205.

96) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport sur l'état sanitaire et médical des travailleurs et des établissements du canal maritime de l'isthme de Suez du 1^{er} juin 1867 au 1^{er} mai 1868 , P. . Chaix, 1868, p. 14.

97) AN 153AQ/1640

98) AN 153AQ/G78.

(٩٩) كان هذا البند في الصفقات التي وقعت مع المقاولين جزءاً من نفقات والتزامات الشركة.

100) AN 153AQ/G1 - قرار مجلس الإدارة ، أكتوبر ١٨٦١

(١٠١) مكتبة مدرسة الطرق والكباري

Ms 454. Alfred Picard et Pierre Agnellet, Journal de la mission accomplie en 1867 sur les travaux de l'isthme de Suez. p. 729

102) AN 153AQ/RU15 حالة العاملين بإدارة الصحة في نهاية ١٨٦٠

103)A N 153AQ/TE409. مذكرة كتبها فوزان ، يونيو ١٨٦٥

104)AN 153AQ/1610 B تقرير مدير عام الأشغال ، نوفمبر ١٨٦٧

105)Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport sur l'état sanitaire et médical des travailleurs et des établissements du canal maritime de l'isthme de Suez du 1^{er} juin 1864 au 1^{er} juin 1865 , P. , Chaix, 1865, p. 8.

106) Dr L. R. Aubert-Roche, « Service de santé. Rapport à M. le Président de la Compagnie du canal maritime de Suez le 18 avril 1861 », L'isthme de Suez..., 1861, p. 137

107) Françoise Guitard, « Les politiques de santé des compagnies de chemin de fer dans la seconde moitié du XIXe siècle », Revue d'histoire des chemins de fer, hors-série n° 1, P., Association pour l'histoire des chemins de fer en France, 1988, p. 217.

> - جمعية تاريخ السكك الحديدية بفرنسا ١٩٨٨ ص ٢١٧

108) Ibid , p 206.

109) AN 153AQ/G78

قرار مجلس الإدارة ، يناير ١٨٦٣

110) Dr L. R. Aubert-Roche, « Rapport sur la santé des travailleurs et le personnel médical dans l'isthme de Suez, été 1860 », L'isthme de Suez..., 1860, p. 370.

111) AN 153AQ/TE57.

112) AN 153AQ/TE329.

113) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport sur l'état sanitaire et médical des travailleurs et des établissements du canal maritime de l'isthme de Suez du 1^{er} juin 1868 au 1^{er} juin 1869 , P., Chaix, 1869, p. 20.

114) Dr L. R. Aubert-Roche, « Rapport sur le service... », Annales d'hygiène, op. cit., p. 205.

115) Ibid , p 206.

116) L'isthme de Suez... n° 140, 15 avril 1862, p. 122

- المصدر : نظر الجدول التالي.

117) AN 153AQ/1610A

. تقرير رئيس مهندسي الأشغال يوليو ١٨٦٠.

118) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport ... , 1865, op. cit., p. 51.

119) Dr L. R. Aubert-Roche, « Rapport ... », Annales d'hygiène, op. cit., p. 202.

120) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport ... , op. cit., 1869, p. 14.

121) O. Ritt , op. cit., p. 225.

122) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport ... , op. cit., 1869, p. 8.

123) Dr Antoine Colucci, Procès-verbaux des séances du conseil de l'intendance générale sanitaire d'Egypte. Choléra de 1865, P., s.e., 1866, p. 57.

124) Roger Vaultier, « Le canal de Suez et la médecine », Presse médicale, n° 84, 21 novembre 1956, p. 20.

125) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport sur le choléra dans l'isthme de Suez, en juin et juillet 1865. P., Chaix, 1865, p. 16

126) J. E. Goby, « Voisin Bey (1821-1918) », Bulletin du souvenir, n° 3, avril 1982, p. 41.

127) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport sur l'état sanitaire... , 1865, op. cit., p. 20.

١٢٨) - AN 153AQ/TEP23 . الأمثلة التالية ، إذ لم يكن هناك تنويه بالعكس ، أخذت من محفظة تحتوي على الملفات الخاصة بشرطة بورس .

129) AN 153AQ/TE343.

130) AN 153AQ/1608B.

131) AN 153AQ/TEP3 تقرير الورشة ، أكتوبر ١٨٦٩

١٣٢) AN153AQ/F6 أمر إداري لترتيب أجور العمال في حالات الإصابة أو المرض وقع عليه فوازان . مايو ١٨٦٦ .

133) AN 153AQ/TE20.Juillet 1864.

١٣٤) " محاضرة بول بوريل " L'isthme de Suez..., 1867, p. 63

١٣٥) لافالي " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ في جمعية المهندسين المدنيين " L'isthme de Suez .., 1866, n°247, p. 346 . استعمال لفظ المواطنين العرب بشكل مختلف حسب الكتاب . ربما يتكلم لافالي هنا عن العمال القادمين من شبه الجزيرة العربية

136) Abel Chatelain, « La main d'œuvre et la construction des chemins de fer au XIXe siècle », Annales d'histoire économique et sociale, 1953, p. 505 et, du même auteur, Les migrants temporaires en France de 1800 à 1914, Lille, Presses universitaires de Lille, 1976, tome 2, p. 863.

137) AN 153AQ/1609B.

138) AN 153AQ/1616A.

139) AN 153AQ/1611A : تقرير مدير عام الأشغال ، يناير ١٨٦٧ .

140) AN 153AQ/TE137.

141) Dr L. R. Aubert-Roche, Rapport ... , 1869 , op. cit., p. 9.

142) Dr A. Chatelain, Les migrants..., op. cit., p. 870.

143) AN 153AQ/1611A .. إعلان للتعيين ، بند ٣

144) L. Monteil et A. Cassagnes, op cit., atlas, planche 21.

١٤٥) H. Bernard et E. Tissot, Itinéraires pour l'isthme de Suez et les grandes villes d'Egypte, P. Maisonneuve, 1869, p. 90.

146) L'isthme de Suez..., n° 137, p. 76.

147) AN 153AQ/TE409.

148) AN 153AQ/TE148.

149) François Levemay, Guide général d'Egypte. Annuaire officiel administratif, commercial et industriel, Alexandrie, Imprimerie nouvelle, 1868, p. 254.

150) Ibid., pp.270 et 274.

151) AN 153AQ/G1 قرار مجلس الإدارة ، ١١ أبريل ١٨٦١ .

152) AN 153AQ/1610A . تقرير رئيس مهندسي الأشغال ، ديسمبر ١٨٦٠ .

- 153) AN 153AQ/1640 .
- 154) AN 153AQ/TEP23.
- 155) F. de Lesseps, « Lettres à ... », op. cit. Lettre du 17 mars 1863.
- 156) AN 153AQ/TE140. . أمر إداري رقم ٨ أول أبريل ١٨٦٣.
- 157) AN 153AQ/1610A رسالة من فوزان فبراير ١٨٦٥
- 158) AN 153AQ/TE107.
- 159) AN 153AQ/TE148. . رسالة من جيلار إلى فوزان ، أبريل ١٨٦٣
- 160) 160)AN 153AQ/TE142 أمر إداري رقم ٦ فبراير ١٨٦٦
- 161) AN 153AQ/TE107.
- 162) Id لائحة نظام عام لكل المخيمات ، ١٠ يناير
- 163) AN 153AQ/TEP23.
- 164) AN 153AQ/TE107.
- 165) AN 153AQ/TEP23.AN 153AQ/TE143.
- 166) AN 153AQ/TE107- رسالة من فوزان ، ١٣ مارس ١٨٦٢
- 167) AN 153AQ/TE107 تعليمات تخص بوليس الآداب ، ١٢ مارس ١٨٦٥
- 168) AN 153AQ/TEP23. رسالة من كوفر وإلي فوزان، مايو، ١٨٦٧
- 169) AN 153AQ/TE137. . رسالة من مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما إلى فوزان ، ٢١ مايو ١٨٦٩
- 170) Ibid.
- 171) AN 153AQ/TE143.
- ١٧١) - دكتور أوبار روش " التقرير السنوي ١٨٦٢-١٨٦٣ إلى رئيس شركة قناة السويس البحرية . ١٥ أبريل ١٨٦٣ " L'isthme de Suez..., 1863, p. 174
- 172) AN 153AQ/TEP23 رسالة من كوفر وإلي فوزان ، مايو ١٨٦٧
- 173) AN 153AQ/TE137. .
- 174) AN 153AQ/TE107.
- ١٧٥) مكتبة الأرسنال وثائق أنفانتان ٧٦٦٩ ورقة رقم ٢٦ . رسالة من الأب إلى هوارت وبروسو . مارس ١٨٣٤.
- 176) Bertrand Gille, Histoire des techniques, P., Gallimard, 1978, p. 1271.

الفصل الخامس

بداية عصر الميكنة

بعد إلغاء عقد هاردون استؤنفت الأعمال بنظام الإدارة المباشرة (en régie) . ولكن لم تتأخر الشركة في اللجوء من جديد إلى المقاولين . فقد اضطرها عجزها عن تصميم آلات حفر قادرة علي تنفيذ الأشغال في المواعيد المحددة وغماً عن المحاولات العديدة والاختبارات والتجارب التي قامت بها أثناء السنوات الأولى للورشة إلى المقولة من الباطن . وبذلك تم تقسيم حجم الأمتار المكعبة التي لم يتم استخراجها بعد بين ثلاثة مقاولين : كوفرو وآتون وبوريل ولافالي وشركاؤهما . ووقعت أيضاً الشركة مع مقاولات الأخوة ديسو بمارسيليا اتفاق لبناء أرصفة بور سعيد من الكتل الصناعية من مونة الجير .

وقد ساعدت إستراتيجية الدعم والإسناد التي وضعت على استقرار شركات المقاولات في الخليج . وتعهدت شركة القناة خاصة بتوفير الماء العذب الضروري للعاملين وللآلات البخارية ، والحفاظ بقدر ما في استطاعتها على أقل عمق في القنوات و الجداول اللازمة لنقل معدات المقاولين . كما تضع ، علاوة على ذلك ، رهن إشارتهم محالاً ومساكن في المخيمات الرئيسية أو تزودهم ببعض المواد المخزنة لديها في حالة نقصها مؤقتاً . وبإيجاز تقوم بتوفير ظروف لشركات المقاولات تساعد على العمل في نفس الوقت الذي تراقب نشاطها وتنسق كل الأعمال .

وسوف تحاول شركات المقاولات إثبات جدارتها وقدرتها على التجديد كل واحدة في المجال الذي يعينها ، وإثبات كفاءتها أيضاً في التحديث والتغلب على الصعوبات وتحقيق الأهداف المقصودة واحترام مواعيد التسليم ؛ ولكي نحاول فهم عمليات التجديد سوف يكون من الضروري في كل حالة من الحالات تحليل السياق الخاص الذي يولد فيه كل ابتكار ، ووصف الأسلوب المتبع ، ودراسة عناصر تكوين الفكرة بل أيضاً المعرفة الأفضل بمساحبتها وشخصيته وتكوينه ومسيرته المهنية وحوافزه .

مختبر للتجارب

إطار ملائم للتجديد

يمكن اعتبار الإطار التقني الفرنسي في ذلك العصر ملائماً للغاية وهو عامل خارجي في تفسير آليات الابتكار . فقد اتفق ، في الواقع ، المتخصصون في تاريخ التقنيات على أن عصر الإمبراطورية الثانية هو عصر محوري تم خلاله تغيير المنهج التقني حسب المعنى الذي أعطاه له

برتران جيل (Bertand Gille). وقد تميز الأسلوب التقني الجديد خاصة بتطور المكنة . وقد ظهر ذلك بوضوح في إحصائيات المعدات ، إذ يوجد في صناعة الأقطان الفرنسية (٥٠٠٠) خمسة آلاف نول ميكانيكي في عام ١٨٣٤ و ٣١٠٠٠ في عام ١٨٤٦ و ٨٥٠٠٠ في عام ١٨٧٥ ^(١) وارتفع عدد الآلات البخارية من ١٥٠ إلى ٢٠٠ في عام ١٨١٦ وإلى حوالي ٦٠٠٠ في عام ١٨٥٠ ^(٢). ولم تتوقف زيادة أهمية الملاحة البحرية منذ باخرة الصفانة (Savannah) التي خاطرت بالإبحار في عام ١٨١٩ بنجاح إلى نيويورك . وارتفعت حمولة السفن البخارية في فرنسا من ٩٥٣٥ طن في عام ١٨٤٠ إلى ٦٨٠٢٥ طن في عام ١٨٦٠ ^(٣) وزادت أدوات المكنة لمساعدت علي بناء معدات من كل صنف وتحمت إلى درجة مهلت إمكانية صناعة الأجزاء الميكانيكية الأكثر دقة . ويرى موريس دوما (Maurice Daumas) أن انتشار المكنة يشكل ودون ادني شك الحدث الجوهري في تاريخ التقنيات في الفترة من ١٧٤٠ إلى ١٨٦٠ ^(٤). في نفس الوقت انتشر في فرنسا استخدام الطاقة البخارية في قطاعات صناعية كثيرة وزاد إنتاج الحديد والصلب وتحسنت جودة الصلب بشكل واضح . وكان نمو صناعة الحديد مذهشاً وزاد إنتاج الحديد والزرهر والصلب بفضل أساليب تقنية جديدة ، فوصل إنتاج الصلب في فرنسا من ١١٠٠٠ طناً في عام ١٨٥٠ إلى ٣٠٠٠٠ طناً في عام ١٨٦٠ و ١١٠٠٠٠ في عام ١٨٦٥ ^(٥). وأخيراً مع إنشاء خطوط السكك الحديدية في كل أوروبا ظهر في فرنسا العديد من صناع الماكينات دعموا البلد بطاقة ميكانيكية جديدة يمكن أن تعتمد عليها ورشة قناة السويس . وباختصار وفر الأسلوب التقني كل الإمكانيات لتطوير المكنة وإدخال الآلة البخارية في قطاع الأشغال العامة .

وفي الوقت الذي وصلت فيه المكنة بفرنسا إلى العديد من قطاعات الصناعة ظلت الأشغال العامة في المؤخرة . " منذ عهد بعيد كان يبدو تنفيذ الأشغال الكبرى للمنفعة العامة الصناعة الوحيدة التي بقيت علي نهجها السابق وروتينها القديم " ^(٦) كتب موجيل وموشيلي (Mougel et Mouchelet) في عام ١٨٤١ . وكذلك دافع أوبرمان (Oppermann) مهندس الطرق والكباري السابق، في عام ١٨٥٨ ، من أجل استخدام الماكينات خاصة المحركات والقاطرات في الأشغال العامة و المستثمرات الزراعية ^(٧) فقد بين بوضوح أنهما قطاعان متخلفان

وربما كان ينقص قطاع الأشغال أن تظهر حاجة حقيقية للمكنة ، وقد أبرزت ذلك الظروف الخاصة لورشة حفر قناة السويس وكميات الردم الهائلة المطلوب القيام بها وصعوبات توفير الأيدي العاملة وبعد الورشة . ولم يغيب عن الفنين في ذلك الوقت فكرة قدرة الورشة في الخارج على أن تكون عاملاً دافعاً للمكنة ^(٨). و ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن من بين الظروف التي سهلت التجديد ،

الانتشار المتزايد والسريع للمعارف الفنية وانتقال العلوم إما بطريقة غير مباشرة بواسطة الكتب والمطبوعات وإما مباشرة عن طريق مقابلة الرجال بعضهم البعض . فقد سهل تطور المواصلات الذي يميز ذلك العصر الانتقال والمقابلات ومناقشة وجهات النظر . وحدث انقسام حقيقي في فرنسا في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر أثر ، في نفس الوقت ، في حجم ووتيرة نشر المعلومات التقنية ، ونما أدب متخصص وظهرت مجلات وموسوعات وتعددت المؤلفات الفنية . وفي أعوام ١٨٤٠ - ١٨٦٠ ازدهرت خاصة المطبوعات الدورية . وفيما يلي جدول ببعض المجلات والمطبوعات التي تتناول الأشغال العامة والهندسة المدنية حسب سنة ظهورها :

سنة الظهور الأولى	عنوان المطبوعات الدورية
١٨٤٢	جريدة السكك الحديدية
١٨٤٢	جريدة السكك الحديدية والمناجم والأشغال العامة
١٨٤٧	كتاب مذكرات الهندسة البحرية
١٨٤٨	مذكرات وتقارير أشغال شركة المهندسين المدنيين
١٨٥١	الهندسة الصناعية
١٨٥٤	مجلة العمارة العامة
١٨٥٥	حوليات البناء الجديدة
١٨٥٦	الألبوم العملي في الفن الصناعي
١٨٥٦	حقبة الآلات الاقتصادية
١٨٥٨	المهندس
١٨٦٠	كتاب مذكرات الأشغال المائية للبحرية
١٨٦٢	حوليات الهندسة المدنية
١٨٦٩	حوليات الصناعة

ويمكن أن نأخذ فكرة عن الدور الذي لعبته هذه المطبوعات الدورية من خلال مقتطفات من بعض الرسائل التي كتبها موجيل . إحداها موجهة إلى المهندس الإيطالي في تورينو (turinois) أنجو كاليندري (Ungo Calindri) وتعلق بمقالة ظهرت في جريدة سكة حديد روما


(Giornale Delle strade forrate di Roma). ويقول فيها " قرأت توا في العدد التاسع من نشرتكم صفحة ٢٨١ عن وصف آلة استخراج في أرض غير ثابتة من اختراع الكونت اسكندر زيلوني (Alexandre Zeloni) [...] لذلك اسمح لنفسى بأن أجا إليكم للحصول علي كل المعلومات والرسومات الضرورية لاتخذ قرارا بشأن ميزة هذه الماكينة " ^(٩) . والرسالة الثانية موجهة إلي فوازان يقول فيها " أود منكم تسليم السيد نييفيه (Nepveu) وصف ورسومات ماكينة تصنيع الطوب الخاص بالمسيوجيلين (Julienne) الموجودة في نشرة جمعية التشجيع " ^(١٠)

وهكذا انتشرت المعلومات التقنية بفضل المطبوعات الدورية التي تعبر دون عناء حدود فرنسا . وتعتبر المعارض العالمية التي تنظم كل خمس سنوات فرصاً لانتشار المعلومات عن الابتكارات التي حدثت في بلاد أخرى وكذلك اللقاءات بين رجال من آفاق مختلفة . وللأسف غابت الشركة عن المعرض العالمي لعام ١٨٦٢ ولكن لم يفوقها المعرض التالي . واستعدت الشركة لذلك بحماس ^(١١) وأثار الاهتمام ما عرضته من تجهيزات في باريس في عام ١٨٦٧ ، وقد اخذ العديد من الفنيين بالشركة إجازتهم في هذه السنة للسفر وزيارة المعرض .

و قبل الشروع في أعمال ما مهما كان نوعها كان رجال الشركة يستعلمون عن التقنيات المستعملة . ولم يترددوا في السفر لمعاينة ما حدث ويحدث في الخارج بأنفسهم . فقبل بدء الأشغال المراد إنجازها في بور سعيد ، أرسلت الشركة مندوباً إلي مارسيليا حيث تتم أشغال موانئ لديها نقاطاً مشتركة مع ما سوف يتم إنجازها في الخليج . ورجع معه دراسة مفصلة : " وصف عام لمخططات تمهيدية ورسومات ومذكرات وملاحظات حول أشغال مارسيليا " ^(١٢) وكما يبرز العنوان نجد علي هامش التقرير بجانب الأوصاف التقنية والمواد والآلات المستخدمة رسوماً تخطيطية ، مكتملة ومصورة لأقوال المؤلف . وقد جسد هذا المستند انتشار الأفكار والعلوم والمعارف من ورشة لأخرى . وفي عام ١٨٥٨ سافر موجيل المدير الجديد بنفسه للدراسة أسباب تكوين الجرف الرملي لنهر الآدور (Adour) أمام ميناء بايون (Bayonne) وكذلك نظام الشواطئ البحرية المجاورة لكي يقارنهما بنظام شواطئ البحر المتوسط ومصر . وقد قادته ملاحظاته إلي هذه النتيجة وهي أن جرف بايون يتشكل ليس من طمي (غرين) الآدور نحو البحر ولكن بالرمال وتآكلات الشاطئ التي تجذبها الرياح والتيارات نحو مصب النهر ^(١٣) . وبالتشابه أثبت أن فرع النيل الذي يصل إلي تل الفرما (Péluse) ليس السبب في ترسيب الرمال في الميناء المقترح في هذا المكان علي عكس ما ادعاه الكابتن الإنجليزي سبرات (Spratt) . وفي إبريل عام ١٨٦٢ كان الدور علي رئيس القطاع لاروش ليرسل في مهمة لدراسة الموانئ والإنشاءات البحرية التي يمكن أن يكون التعرف عليها عن كتب ، مفيداً في أشغال الموانئ ببور سعيد . ففحص ثغر الدانوب والقنوات البحرية الهولندية وزار

مواني عدة : سيرا ومستوران وتريستا والبندقية ومارسيليا والجزائر وشيربورج وبولوني والدوفر وهوليهد . ولكن من هذه الجولة لم يأت بحلول يمكن تطبيقها في الحقيقة على واقع الأشغال المصرية . ولم تكن أشغال المواني وحدها التي حاولوا من أجلها الاستباط من الأساليب المستعملة في الخارج . إذ في سبتمبر عام ١٨٦٣ قام ممثلو الشركة ، بعد فقد الأمل في إيجاد حلول لمشكلة الجرف ، بالسفر إلى إنجلترا ليدرسوا فيها " كل الأعمال المتعلقة بالتكريك " ^(١٤) ولكن دون أن يأتوا حقا منها بحلول جاهزة مباشرة للاستعمال أيضا .

وبمجرد الإعلان عن انطلاق العمل في ورشة قناة السويس لوحظ في فرنسا تجديد أفعليا لنشاط المخترعين الذين بدءوا في دراسة الوسائل الاقتصادية لاستخراج ونقل ناتج الحفر ^(١٥) . وتؤكد دراسة الاختراعات التي سجلت لآلات الحفر والجرف أو نقل الأتربة من عام ١٨٥٥ وعام ١٨٦٩ على اهتمام المخترعين من كل نوع - ميكانيكيين ومبتكرين أو غيرهم - لهذا النموذج من الماكينات وتعملهم بتصميم آلة قادرة على أن تحل محل الرجل العامل بعربة اليد والجرفة ^(١٦) وفي هذا الصدد يعتبر زيادة عدد الاختراعات ذات معنى وسجلت ذروقا في ١٨٥٩ سنة افتتاح ورشة قناة السويس :

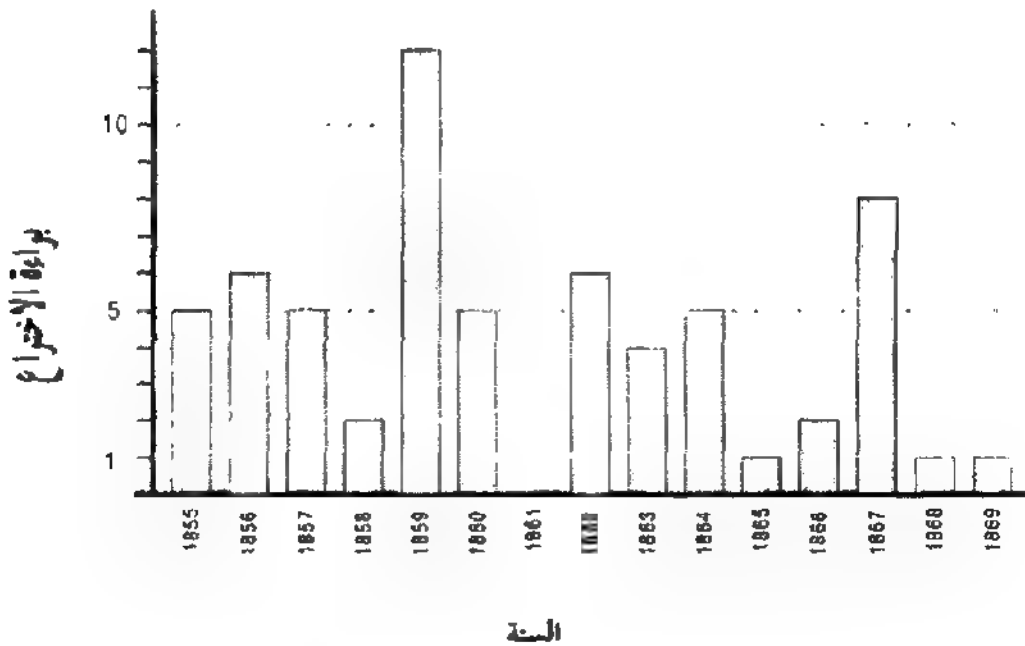

وقد وصلت بعض الاقتراحات تلقائياً للشركة وهي ذات دلالة أيضا على الاهتمام الذي أثارته الأشغال وهكذا لم يقدم بوزيا (Bozia) ، مراقب الطرق والكباري ، براءة اختراع ولكن كتب في عام ١٨٥٨ إلى بارثليمي سانت هيلير ، سكرتير عام الشركة ، ليقتراح عليه نموذج " ماكينة


للحفر" : " لقد اهتمت كثيرا مثل كل الناس بمسألة حفر خليج السويس ليس في جزئها النظري ولكن فقط من وجهة نظر تقنية البناء وأعرض على سيادة السكرتير العام إمكانياتي للتنفيذ وأقدم اقتراحات للشركة بشأن عمليات الحفر " (١٧) .

وتصور أوبيرمان مؤسس مجلة حوليات الإنشاء الجديدة ، ماكينات لتنفيذ الحفر في قناة السويس (١٨) . لقد فجر إعلان الأشغال إذاً القدرات على الإبداع حين عرض على الصناع والمخترعين في شتى الميادين ، مشكلة مادية حلها ووُلد لديهم الرغبة في التصدي للتحديات التقنية. أما بالنسبة لرئيس جمعية المهندسين المدنيين أوجين فلاشا (Eugene Flachat) فلم يتردد في إعلان مسائل " تمثل مشاكل استعمال الآلات في حفر قناة السويس بتنوع تطبيقاتها أهم برنامج دراسة في تاريخ الأشغال العامة. ومن المستحيل مشاهدة مثل هذه الجهود الضخمة والبحث عن حلول نالعة إلى هذا الحد دون أن نتجذب إلى تقديم المساعدة والمشاركة الوجدانية والفكرية " (١٩).

آلات مبتكرة ومواد جديدة

سواء أكان الأمر يتعلق عامة بالآلات أو بالمواد و يحكم تفرد الورشة والظروف الخاصة التي تحيط بها ، والقدر الهام من المخاطر التي يتحتم بالضرورة التعامل معها ، تصبح الورشة مكانا لإجراء تجارب جديدة وفرصة لاختبار تنظيم جديد أو تركيبة مادة أو جزء من آلة . إن صعوبة الظروف الخاصة بورشة قناة السويس مثل حجم الأشغال والصعوبات التي تتم فيها ، وتدرية بعض المواد مثل الخشب أو الطوب وكذلك صعوبة توظيف الأيدي العاملة سوف تشكل دون شك ضغوطاً دافعة للمبادرات .

لذلك وضعت مسألة تصور الوسائل الميكانيكية لتنفيذ الحفر في مقدمة برنامج الدراسات الضخمة . وتم تصميم عدة ماكينات خصيصاً لذلك : مثل الحفارة بقواديس التي صممها كولور (Couvreux) من جهة ، ومن جهة أخرى الجرافات الكبيرة والسيور (الممرات) والرافعات التي اخترعت تحت رعاية لافالي. ولقد قال مهندس الطرق الكباري إلفيج بود (Elphege Baude) معبراً عن إعجابه أمام النماذج الصغيرة لماكينات ورش قناة السويس المختلفة والتي عرضت في المعرض العالمي في باريس عام ١٨٦٧ " تشمل هذه المعدات اليوم أقوى الآلات وأبرعها التي لم تستخدم بعد في أشغال الحفر " (٢٠) كما سوف تصبح الحفارات والجرافات المستعملة في خليج السويس آلات رائدة لجيل غني من آلات الحفر التي استعملت بمناسبة أشغال هامة تمت في العالم خاصة في تنظيم مياه الدانوب في فيينا بين عام ١٨٧٠ أو ١٨٧٤ ، وتعديل قناة الجاند في ترنزين (Terneuzen) بلجيكا وفي ورشة بنما .

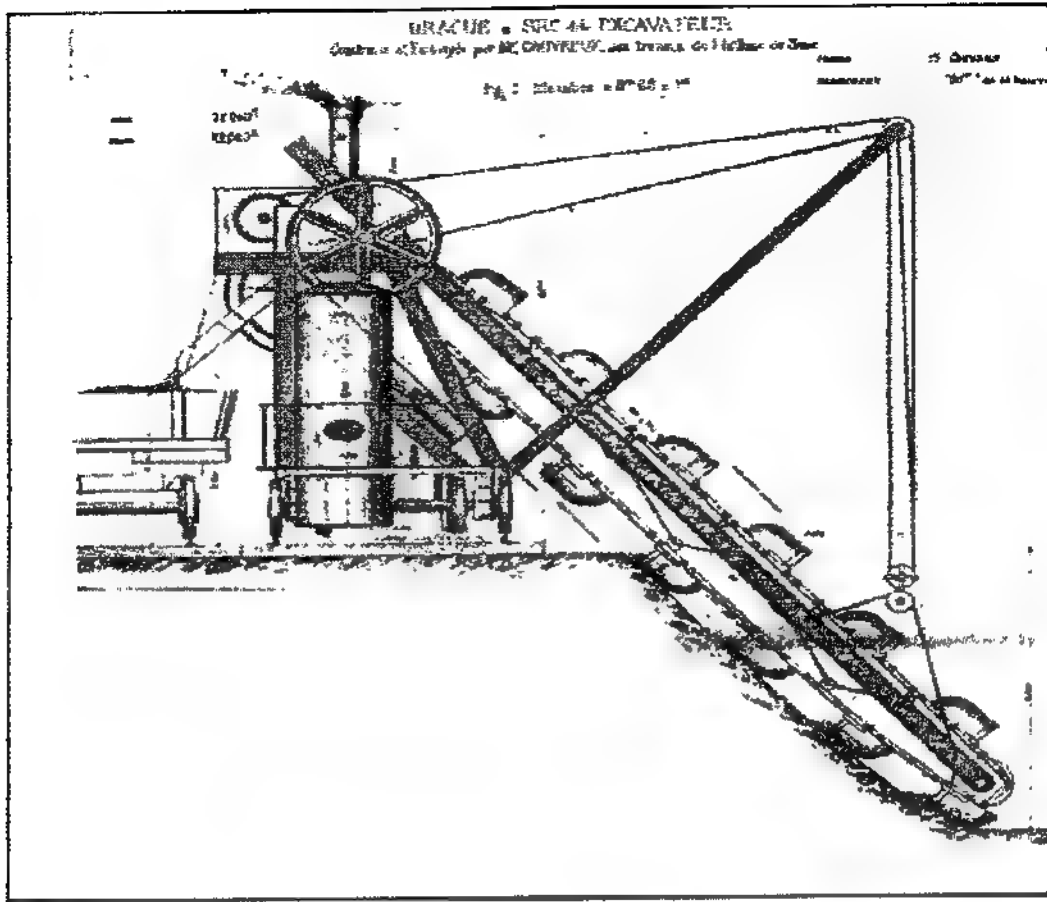

حفارة على الجاف (تصميم كوفرو)


(س.أ. أوبرمان - منظمة الماكينات الاقتصادية اكتوبر ١٨٦٦ لوحة ٤١)

أتاحت حفارة كوفرو أعمال الحفر بدون ماء وحلت محل الأساليب التقليدية لعمال الحفر بعربات اليد ، لابل حتى عربات صغيرة قلابة يجرها رجال أو خيول ^(٢١) وإذا كان المقاولون الإنجليز الذين جاءوا إلى فرنسا لبناء خطوط السكك الحديدية قد أدخلوا ، في سنوات ١٨٤٠ ، القطارات التي تجر العربات إلا أن استعمالها ظل محدودا للغاية واستمر تنفيذ الحفر يدويا في أغلب الأحيان . وتوضع الآلة التي اخترعها كوفرو و المزودة بآلة بخارية تساعد على حركتها ، على قضبان متوازية بالنسبة للحفرة المراد رفع الأتربة عنها . وهكذا تدور سلسلة بقواديس تحركها نفس الآلة حول أنبوب شفاط يتحرك رأساً على القضبان ويتم الحفر . ثم تفرغ حولة القادوس على سبيل بقلاب يحملها من العربات التي على القضبان المتوازية إلى عربات الحفارة . وأخيراً تتوجه العربات التي تجرها القاطرة لتفريغ الحمولة عندما يمتلئ القطار ويتم بعد ذلك إزاحة السكة الحديدية جانباً لتوسيع الخندق .

بالنسبة للجرف أي الحفر تحت الماء ظلت أعمال الحفر التي نفذت في جلاسجو على شواطئ كليد (Clyde) عشرات السنين من قبل ، ظلت هي المرجع المفضل في الإمبراطورية الثانية خاصة أنه استخدمت هناك أول جرافة بخارية في عام ١٨٢٤^(٢٢) وقد تمت أعمال أخرى هامة في نيوكاسل (New-Castle) على التين (Tyne) وفي لاسييزيا (Spazzi) حيث رأينا تسع جرافات تعمل في وقت واحد^(٢٣) ومع ذلك ظل استخدام الجرافة في فرنسا نادراً .

وتعتبر التجارب الأربع الأحدث عهداً هي أشغال توسيع نهر السين التي استخدمت فيها جرافة بأنبوبتين للشفط قام بتحسينها كافيه (Cave) والثانية تجربة فيز (Vaise) في ورشة إنشاء خط سكك حديد يربط (مدينة) ليون بأفينيون (Avignon) حيث استخدمت للتنقيب جرافة بأنبوب بشفط لتنفيذ قواعد جسر على نهر الرون ، أما في حوض الهافر الذي قام فيه مدير ورشة السباكة الميكانيكية نيلس (Nillus) بتصميم جرافة بخارية لحفره^(٢٤) وأخيراً تجربة شاطي طولون حيث تم استخدام خمس ماكينات حفر لعمليات الجرف^(٢٥) .

وسوف نقوم مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما في ورشة قناة السويس بشورة حقيقية في تقنيات الحفر عندما قامت بمساعدة شركتين صناعيتين هما مقاولات جوان (Gouin) وشركة مسابك الحديد وورش البحر المتوسط ، بتصنيع جرافات أكثر قوة ومصنوعة من الحديد كلفة ، تؤدي كل حركاتها بالبخار من رفع وخفض أنبوب الشفط والفرفرة والتقدم... إلخ^(٢٦) . وقد صممت أيضاً آلات مبتكرة لنقل الأتربة أطلق عليها اسم "السيور الطويلة" و"الرافعات" .

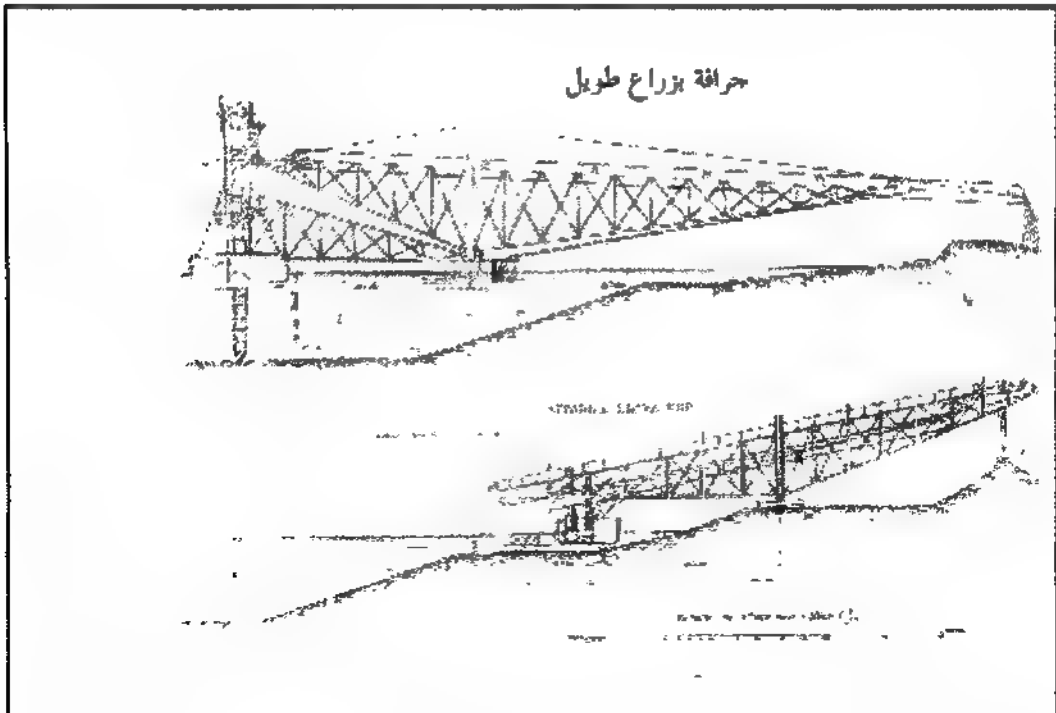

آلة رفع
جرافة بدراع طويلة وآلة رافعة

تعرض أيضا إنشاء ميناء ببور سعيد لصعوبات فنية من نوع خاص . لذا فقد كان من الضروري إنشاء ميناء يُسهل وصول المراكب وتفريغ حمولتها منذ بدايات مشروع حفر القناة . لهذا الغرض أقيم في البداية بالإسماعيلية رصيف شحن من الخشب تم دعمه فيما بعد بوضع صخور تحت الماء (جاءت به مراكب من محاجر المكس) . ثم امتد طوله بأرصفة قصيرة معدنية غطيت بأرضية من الخشب . وكانت الفكرة الأولى هي بناء أرصفة فحائية بواسطة اجتلاب حجارة من سواحل كريت وروديس ومجموعة الجزر اليونانية . ولكن نفقات النقل الباهظة أدت إلى البحث عن محاجر أكثر قربا مثل محاجر المكس الواقعة قرب الإسكندرية ومحجر جبل جنيفة في جنوب خليج السويس . ولكن في منتصف عام ١٨٦٣ ظهر أن هذين المحجرين لا يستطيعان توفير المواد اللازمة بمعدل كاف . و استغل محجر المكس مقال المقطوعة فاليت (Valette) لحساب الشركة بواسطة ميناء أبعاده صغيرة للغاية وعلاوة على ذلك غير صالح للاستعمال أثناء ثلاثة أو أربعة شهور الشتاء . أما استغلال محجر جبل جنيفة (Gebel - geneffé) فكان يتطلب لتوصيل الحجارة إلى ببور سعيد الجمع بين وسائل نقل عديدة : من ٣ إلى ٤ كيلو مترات بواسطة السكة الحديد التي أقيمت لهذا الغرض لأجل الوصول إلى ترعة الماء العذب التي يجب عبورها مسافة ٥٠ كيلو مترا قبل الإبحار عبر القناة البحرية لمسافة سبعين كيلو متر أخرى ، بالإضافة إلى تكاليف النقل ومشاكل منسوب ماء النيل (هبوط ماء النيل إلى أدنى مستوى) . فقد كان هذا الأسلوب يبنى بمحدوث مشاكل ملاحية أكثر تعقيدا مع الآلات العاملة على حفر القناة . وقد كُلف بسكال (Pascal) . عضو اللجنة الاستشارية ، بالقيام بمعاينة هذه المسألة . وقام في عام ١٨٦٣ بتصميم مشروعين للمقارنة بينهما : أحدهما من أحجار جبل جنيفة والآخر من كتل صناعية أطلق عليها أيضا " الأحجار الاصطناعية " (pierres artificielles) انتهى تقرير بسكال بإقرار مشروع الكتل الاصطناعية الذي تم اختياره أخيرا .

ولست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الكتل الاصطناعية في بناء أرصفة ميناء . إذ يرجع أصل استعمالها إلى بناء جسر بميناء الجزائر في ١٨٣٣ . ولم تستلهم التقنية المستعملة في ببور سعيد من هذه التجربة الأولى ، ولكن من تجربة أخرى بتاريخ ١٨٤٠ وهي بناء حاجز أمواج (môle) جديد امتدادا للقديم في نفس ميناء الجزائر . فقد تم بهذه المناسبة اختبار طريقة غير منتظمة لإلقاء في البحر كتل من ١٠ أمتار مكعبة من الخرسانة سبق تجهيزها على اليابسة في صديق من الخشب . وتظهر التجربة أن الكتل تظل في الموضع الذي غمرها الماء فيه ^(٢٨) . ومن ناحية أخرى ، فإنه وحتى عام ١٨٤٠ لم تكن مونة الصناء الطبيعي تستعمل البتة في الأشغال البحرية . ولكن بعد أبحاث لويس فيكا (Louis Vicat) التي أرست قواعد مبادئ الجير والأسمنت ، بدا من

الطبيعي تطبيقها على الأشغال البحرية نظراً لقلّة تكلفتها. وقد بدأت أشغال ميناء الجزائر باستخدام هذه المواد في البحر وبفضل الشهادات التي منحها مورد جير التل (Theil) بافان دي لافارج (Pavin de Lafarge) والتي امتدح فيها جودة المواد التي يعرضها، ويمكن القيام بحصر للورش التي لجأت إلى الكتل الاصطناعية المكونة من هذا النوع من المواد الأولية. وأول ورشة على ما يبدو تم استخدام هذه المواد هي عملية بناء حاجز أمواج بور-فاندر (Port-Vendre) في عام ١٨٤٤. وقد استعملت الكتل الاصطناعية في عام ١٨٥٢ في تغطية رصيف حاجز أمواج جنوه وفي ميناء الجزائر. ونجدها بعد ذلك في أرصفة مارسيليا في عام ١٨٥٥ وفي ميناء شيربورج في عام ١٨٥٧ وفي طرف الرصيف داخل بحر مارجونوجو (Margonojo) بأجاسيو في عام ١٨٦١. وفي عام ١٨٦٠ استخدمت خمسة كتل في أشغال حماية طرف جراف (Grave) في إقليم الجيروندي (Gironde) وكتلة من الأسمنت المسلح مغمورة في أشغال ميناء فيليبفيل (Philippville) في عام ١٨٦٣^(٢٩).

وقد اقترح باسكال ، مهندس الطرق والكباري وعضو اللجنة الاستشارية للأشغال ، استعمال مونة الجير بدلا من الخرسانة نظراً لعدم وجود الحصى أو الحجارة الصغيرة بالقرب من الأشغال. وكانت هذه المرة الأولى التي تجد الشركة نفسها في موقف اختبار مادة جديدة في الأشغال البحرية، وبعد بضعة سنوات وفي عام ١٨٧٣ لوحظ تكسر ما يقرب من ثلثي الكتل الظاهرة والغالبية العظمى منها قد تعرض لتحلل كيماوي، أما الكتل الغاطسة فبدأ على العكس أنها محمية بغلاف من القواقع والأعشاب^(٣٠). ومن ثم تبقى التجربة التي نفذت في ميناء ببور سعيد مثلاً لا يحثذي به^(٣١).

وسوف تجد مادة أخرى في الخليج ، ساحة جديدة للاختبار وهي خرسانة كوانيه (Béton Coignet) . كان فرانسوا كوانيه يعمل مع أخويه في مؤسسة عائلية للمنتجات الكيماوية بمدينة ليون عندما استعمل عام ١٨٥١ لأول مرة في بناء مبنى مخصص لاستقبال فرع شركة في سان ديني (Saint-Denis) مادة ستعرف اليونانيون : الخرسانة المجمعة ، وهو لم يقم في الواقع سوى بالرجوع إلى أسلوب الطوب اللبن التقليدي المستعمل في منطقة ليون مع استبدال التربة بالمونة^(٣٢). ولم تكن المادة جديدة ، ولكن كوانيه الذي لم يكن من أبناء المهنة ، رأى أن النتائج التي حصل عليها مرضية للغاية وقرر إجازة هذا الأسلوب الذي حصل على براءة الاختراع عام ١٨٥٥^(٣٣). وترك حينئذ مؤسسة المنتجات الكيماوية لأخوته ليتفرغ لتوزيع وتسويق طريقته. وأسس هذا الغرض وأدار منذ عام ١٨٦١ الشركة المركزية للكتل الخرسانية المجمعة . وكانت استعمالات هذه المادة في عصر ورشة قناة السويس نادرة ولم تكن قد استقرت بعد تقنية تشغيلها

أو تكوينها . وظل كل استخدام جديد تجربة متممة تثري المعارف بخصوص قدرة تحمل المادة . وقد استعملت خرسانة كونية في ورشة قناة السويس ثلاث مرات في خزان مياه ولبناء أهوسة على ترعة الماء العذب وكذلك لبناء منارة ببور سعيد . وإذا درسنا تركيب المواد المستعملة في كل حالة من هذه الحالات لتأكدنا أن التسمية المشتركة لخرسانة كونية تحتوي في الحقيقة على خليط من نسب مختلفة بشكل ظاهر.

نسب كمية المواد المستخدمة في تشكيل خرسانة كوانيه في إنشاءات الخليج

مواقع أعمال البناء	الجزء المختص	الرمل	جير دي تيل	أسمنت بورتلاند
أهوسة الإسماعيلية (٣٤)	كل	٤	١	٠
	في مكان آخر	٥	١	١
منارة بور سعيد (٣٥)	أساسات (أول طبقة)	٤	١	٥
	أساسات (ثاني طبقة)	٥	١	١/٤
	فوق الأرض	٤	١	١/٣
خزان الماء (٣٦)	في كل مكان	٢	٣	٢

وكانت قناعة المقاول أن متانة المادة لا ترجع إلى طبيعة المكونات قدر ما ترجع إلى طريقة تشغيلها وخليطها أي بواسطة ذلك طبقا المتتالية . ففي منارة بور سعيد " كان ذلك الخرسانة يتم بطبقات سمكها بين ٢٠ , ٢٥ , ٠ متراً وكان يتم بعناية كل صباح قبل استئناف العمل تنفير السطح الأعلى للقاعدة بعد تركه غير مكتمل باليوم السابق ورشه بالماء العذب (٣٧).

وبقراءة تفاصيل وصف أساليب تشييد البنيان نلاحظ أنه تم أيضا استعمال الحديد لربط البناء : " تم ربط أسس البناء فيما بينها بواسطة ٣٤ سلسلة من صفحة معدنية (مطلية) سمكها ٠,٠٨ , ٠ مترا وضعت أفقيا وتشكل مجموعة منظمة من ٦ إلى ١٤ مثنات الزوايا حسب الارتفاع السني وضعت فيه . وقد زاد أيضا تجانس البناء باستخدام عدد كبير من الحديد المدمج في البناء وضع بطريقة ليكون أحد جوانبها عمودياً والآخر أفقياً ولكنه موجه في أي اتجاه أيا كان . وأخيرا كفلت متانة الدعامات (impostes) بواسطة زوايا حديدية وضعت على ١٠ , متراً أو ١٥ , متراً فوق النوافذ" (٣٨) .

لم يحش كوانية ، بالرغم من أنه صناعي حذر ، من الإكثار من براءات الاختراع بغية تغطية أدنى درجات التطوير أو التطبيق لأسلوبه ^(٣٩) . ويمكن ملاحظة ^(٤٠) أنه لا توجد أية براءة تتعلق بالطريقة التي لجأ إليها باستمرار والتي تخص مزج قطع من المعدن بالخرسانة لتقويتها . وقد أدت فكرة جمع هاتين المادتين بعد عدة سنوات إلى ظهور الخرسانة المسلحة . من ثم يمكن التأكيد ، عند استعراض الماضي ، بأن المنارة بنيت من الأسمنت المسلح وهو ما يشكل في نفس الوقت ابتكاراً في تاريخ تقنيات بناء المنارات ، بل أيضاً لحظة هامة في تاريخ استخدام هذه المادة . وهذا هو السبب على كل حال الذي من أجله سوف يهتم وزير الأشغال العامة عن قرب بهذا الإنجاز في بداية سنوات ١٨٨٠ حينما طلب القيام بتحقيق للحكم على مدى تحمل هذه المادة بعد عشرة سنوات . ومع اختبارات كتل الأرصفة في الماء ومنارة بور سعيد أصبحت المونة مادة رئيسية بذاتها وهي التي لم تكن تعتبر حتى ذلك الوقت سوى مجرد مادة ثانوية لسد الفراغات .

السكة الحديد والآلة البخارية تغزوان الورشة

استخدام القضبان الحديدية ساعد على تسريع وتيرة العمل

إذا كان قد تم استعمال القضبان الخشبية في صناعة الفحم البريطانية منذ القرن السادس عشر لتسهيل انزلاق عربات الفحم ^(٤١) ، فإنه لا بد في الأشغال العامة من انتظار بناء أولى خطوط السكك الحديدية لنشهد ميلاد فكرة استخدام القضبان في الورش . لقد أعجب موجيل وموشيله (Mougél & Mouchelet) أثناء زيارتهما لإنجلترا في عام ١٨٤٠ بالتحسينات التي أدخلها إنشاء السكك الحديدية في موقع الأشغال : " بذلك تم بشكل كبير تبسيط ورش الحفر وصناعة الملاط ونقل المواد وتحقيقها بفضل إدخال القضبان المؤقتة التي ساعدت على تسريع إيقاع الأشغال في نفس الوقت الذي ساهمت في زيادة انتظام الخدمة والاقتصاد في المصاريف " ^(٤٢) .

قبلها بعدة شهور في كتابة بعنوان " مذكرات وملاحظات عن تنظيم ورش الحفر الكبرى في الأشغال المنفذة في إنجلترا وفرنسا " ، اثبت كارل أتلز (Carl Etzel) تأخر فرنسا في مجال استعمال السكك الحديدية المؤقتة . وفي عام ١٨٤٥ قام المقاولون الإنجليز الذين جاءوا إلى فرنسا لتنفيذ أشغال أول خطوط السكك الحديدية بنقل أسلوب القضبان . وفي رأي أندريس (Endres) ، مهندس الطرق والكباري ، أن الأهمية النسبية لأحجام الأشغال وضرورة الإسراع في التنفيذ المفروض عليها يفسران كيف أن التطور المسجل في أساليب الحفر ، تم بواسطة ورش إنشاء خطوط السكك الحديدية ^(٤٣) .

وفي مشروع لحفر خليج السويس في ١٨٤٦ تخيل الأديب أجيسست كولان (Colin Auguste) تطبيق مبدأ استعمال القضبان الحديدية على نطاق واسع عن طريق مد سكة حديدية من بور سعيد إلى السويس تمهيداً للقناة البحرية "كأسلوب مؤقت لتسهيل إنشاء القناة" (٤٥) وكانت هذه الفكرة أيضاً تراود فوزان بعد مدة قليلة من وصوله عندما أوصي بإقامة خدمة سكة حديد بين الزقازيق والإسماعيلية. ولكن المشروع لم ينفذ .

ثم الشروع في إقامة قضبان مؤقتة في خليج السويس عندما بدأ المقاول كوفيه في إدارة الأشغال. واستخدمت عندئذ الطرق الحديدية لتأمين مواصلات الحفارات. وتنقل هذه المعدات . في الواقع ، على خط خاص له ثلاثة قضبان يضاف إليه خط عادي لنقل إنتاج الحفر يسير عليه قطاران من ٢٠ عربة تجر كل واحد منهما قاطرة (٤٦) يقارب عرض الخطين المترين والنصف . ويتغير عرض الخط في الواقع حسب طبيعة الأرض ويتغير تبعاً لها الحناء السير الذي يستخدم لتفريغ الأتربة التي تستخرجها الآلة وتجمعها في العربات . وفي حالة التراب الصلصالي مثلاً يجب إعطاء ميل أكثر للسير أي عرض أقل للخطوط. و تعمل الحفارة جانبياً لخطها وتغفر إلى أسفل حفرة قد يصل عمقها إلى ٥ أمتار. ويمكن أيضاً أن تعمل في اتجاه معاكس ، أي توضع في عمق حفرة معدة مسبقاً ، وتنفذ تسوية السطح. في هذه الحالة كما في الأخرى ، يزاح الخط بعد كل دورة آلية إما بتقريب الخط من كتلة التراب أو لإبعادها عن الحفرة بحيث تجد القواديس جزءاً ترفعه من الأرض. وتدرجياً تحك القواديس المنحدر ، ثم يزاح الجانبان المتوازيان للشق المحفورة ويستمر العمل حتى يتم رفع سمك ٤,٥ متراً في كل عرض الحفرة


وتسير العربات التي تجرها البغال أو القاطرات على السكك الحديدية . تسهل هذه الطرق المرور والمواصلات وتتيح خاصة عندما تجر القاطرات قافلة القطارات زيادة سرعة الانتقال. ويوجد عدة أنواع من الخطوط حسب الاستخدام تتصل فيما بينها عن طريق خطوط إضافية تسمى الوصلات. وفي منطقة الجسر ، حيث مركز أشغال المقاولات ، ينتهي خط متصل بخطوط خدمة الحفارات ، من جهة ، إلى رصيف التحميل حيث يتم تفريغ المعدات ، ومن جهة أخرى . إلى ورش التركيب والإصلاحات. و يتصل بخط الشحن خط آخر مخصص لحفر ونقل التراب بشاحنة وحمول بسواعد الرجال . ثم تدخل المقطورات في نهاية اليوم إلى محطة ورش الجسر حيث تم بناء عبر حمايتها من التغيرات الجوية والسرقات والأضرار عند عدم تشغيلها. وتشبه الحركة التي تسود فيها ليل نهار النشاط الموجود في محطة الركاب . ويركب العمال العربات للعودة إلى المخيم عند انتهاء العمل .

هكذا تجوب خطوط السكك الحديدية الورش وتنظم المرور، وتساعد في نفس الوقت على نقل الرديم إلى المقالب وعلى توصيل إمدادات المياه والفحم الضرورية لتشغيل الآلات البخارية ، وتكفل الاتصال السريع والسهل بالمواقع الرئيسية الاستراتيجية وأماكن التخزين والتصليح والتفريغ في القناة البحرية . كما تسهل طرق السكك الحديدية إدارة المساحات التي تمر بها وتقلل الازدحام والتقاطعات الصعبة بل الخطرة . وهكذا تشكل القطبان العصب الحيوي لمجمل الأشغال المكلف بها المقاول كوفرو (Couvreur) . وفي سبتمبر عام ١٨٦٥ بلغت جملة الطرق المستعملة ٣٣ كيلو متراً في الطول . وزعت بالطريقة التالية (أنظر الجدول الآتي)

أطوال خطوط السكك الحديدية في ورش كوفرو

٢	تسمية أماكن الأعمال	ين		طول الخطوط العادية (بالمتر)			طول خطوط الحفارات للرديم (بالمتر)	
		كم / رقم	كم / رقم	حمولة	تفريغ	مسافة	جاف	تحت الماء
١	(٤٧) كورتير فسكي	٦٦,٧٢	٦٨	٢٥٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠		
٢	ليس	٦٨	٧٠,٤	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٨٥٠		
٣	بريتون	٧٠,٤	٧١,٤	١٦٠٠	٦٠٠	١٢٥٠		٦٠٠
٤	دانيور	٧١,٤	٧٣,٩	١٩٠٠	٥٠٠	٢٨٠٠		٥٠٠
٥	روبير	٧٣,٩	٧٥,٣	١٠٥٠	٧٠٠	٥٠٠		
٦	سمارات			٢٤٠٠	١٥٠٠		٢١٠٠	٦٠٠
٧	ورش					١٠٥٠		
٨	الطرق الإجمالي			١١٤٥٠	١٠٤٥٠	٦٢٥٠	٢١٠٠	١٧٠٠

إحدى أهم ميزات شبكة الخطوط الحديدية هذه هي تطورها الدائم . فعلاوة على صقل الخطوط بالاحتكاك أولاً بأول لتوسيع جانب الحفر ، يؤدي تغيير أماكن التفريغ باستمرار إلى تحول الطرق نتيجة لذلك . وتعطى هكذا القضبان الحيز الذي يعمل فيه المقاول كوفرو كما يتم تنظيمه يوماً بعد يوم حسب الحاجة عند الضرورة ووفقاً لتقدم الأشغال.

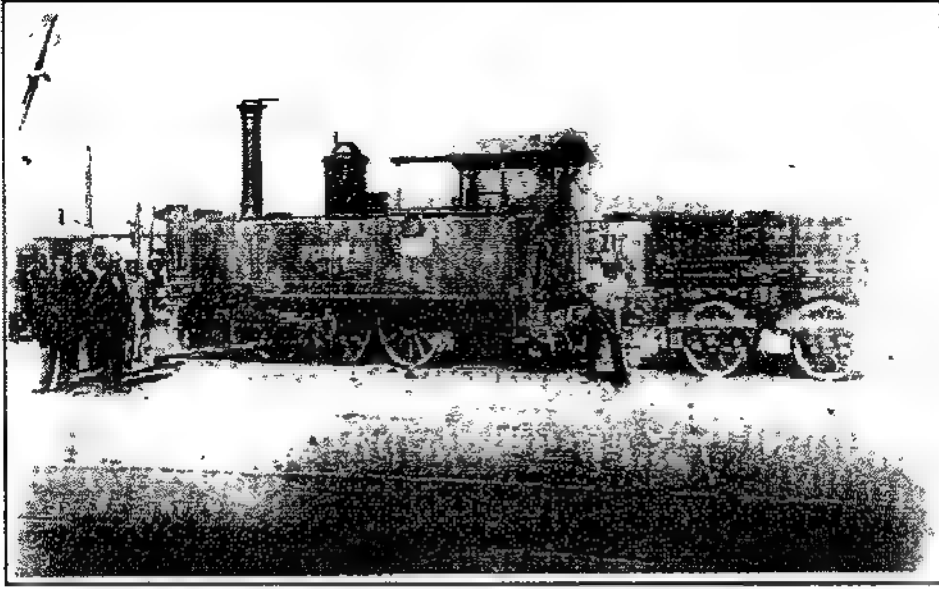

نوع من عربة ومقطورة لمقاولات كوفرو في الجسر

(صورة ل . كوفية، ٦ يونيو ١٨٦٧ - المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية)

وتلعب القضبان أيضاً دوراً هاماً في ورشة تصنيع الكتل الاصطناعية المخصصة لأرصفة بورسعيد وتساهم في تحسين تنظيم الإنتاج. وإن كان تاريخ التقنيات قد اعتبر سنة ١٨٣٣ تاريخ مرجعي لتطور فن الإنشاءات البحرية ، فإن هناك تاريخاً آخرأ يخص مشاكل التنظيم يستحق الذكر ويقصد بهذا التاريخ سنة ١٨٤٢ التي انكب فيها رجال الورشة في ميناء الجزائر بشكل خاص على مسألة تنظيم التصنيع ، فقد أوضحت ملاحظة أساليب العمل القديمة بعض جوانب الخلل التي يجدر إصلاحها . على سبيل المثال المواد الأولية التي يتم رفعها ثم إنزالها أو شحنها ثم تفريغها، وعربات اليد التي تلقى في كل الاتجاهات فتعوق بعضها بعضاً في تنقلها. وبفضل ترتيب جديد لورشة التصنيع ، تم التوصل إلى حلول مبتكرة لتسهيل المعالجات المختلفة باليد والوصول إلى "التصنيع المتصل " : "يلزم على الورشة عرض الترتيبات الآتية . بدءاً من الأسفل يُخصص الدور الأول لاستلام المسلح الجاهز [...] والدور الثاني لاستلام المونة الجاهزة والحجارة الصغيرة منقاة ومغسولة ومخلوطة بنسب ملائمة [...] في الدور الثالث يعد الملاط وتغربل الحجارة الصغيرة وتغسل وتحمل في العربات [...] أما الدور الرابع فيخصص لنقل الجير والرمل والصِّبَاء " (٤٨) وأصبح بذلك تنظيم المكان وتنظيم زمن الإنتاج مترابطين .

كان رانكور (Rancourt) ، قبل خمسة عشر عاماً أي في عام ١٨٢٨ ، قد أشار إلى أهمية ترتيب مساحة الورشة التي تجهز فيها المونة موصياً باماكن منفصلة لكل مرحلة من مراحل التصنيع (٤٩) . وتكمن الفكرة الجديدة التي طبقت في الجزائر في تغيّل ترتيب مكاني من ثلاثة أبعاد يراعي فيه ليس فحسب تقسيم مراحل التصنيع إلى عمليات أولية بل أيضاً نظام ترابطها. وقد نجحت هذه الفكرة في الصناعة. وفي ترجمة : رسالته عن اقتصاد الآلات والمصانع التي صدرت في

فرنسا في عام ١٨٣٣ طرق شارل باباج (Charles Babage) مسألة العلاقات القائمة في الصناعة بين التنظيم وتتابع عمليات التصنيع ^(٥٠) أما شارل دينويه (Denoyer Charles)، العضو في (المؤسسة الجمعية L'Institut) فقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما كتب في عام ١٨٤٥ بصدد المصنع عامة: " المهم أن يبنى المصنع بحيث تكون كل التحركات التي تجري فيه وفق نظام التغييرات التي تتم فيه وبحيث يتم التقدم في المصنع ببساطة وبسرعة وبدون جهد ضائع أو حركة غير مجدية " ^(٥١).


وسوف تحقق القضبان الحديدية إستمرارية عملية تطوير التصنيع الذي نادى به الجميع . وقد سجلت ورش المواني في مارسيليا ، في الخمسينات من القرن التاسع عشر ، تطورات جديدة في قطاع الميكنة واستخدام البخار ، بل أيضا في الربط بينهما . فقد أعجب لاتور (Latour) وجاساند (Gassend) مراقبا الطرق والكباري ، بالتناسق الكامل فيها بين تنظيم الإنتاج الورش ^(٥٢) ولاحظا أن " كل شيء يترابط ويتتابع " في ورشة الكتل الاصطناعية الكبرى ^(٥٣). وسوف تتيح ورشة بور سعيد الفرصة لتحسين طرق التنظيم وذلك بفضل استعمال سديد للقضبان. و أثناء زيارة قام بها ، في فبراير عام ١٨٦٨ ، عبر فيكتور كاديا (Victor Cadiat) ، مهندس الشركة المسئول عن إدارة باريس ، عن إعجابه قائلا : " تصل المواد الأولية من رمل وجير التل إلى موقع بالورشة وتخرج من آخر على شكل قوالب جاهزة للغطس بعد أن تعرضت لسلسلة من الإعدادات المنهجية دون ضياع أي جهد " ^(٥٤).

ولندرس بعض التفاصيل عمليات تنظيم ورشة بور سعيد . لقد قامت مؤسسة ديسو (Dussaud) بتصنيع كتل من ملاط (مونة) الجير الذي ينقل بعد ذلك وتلقى في البحر فوق أرض قريبة من شاطئ البحر تزيد مساحتها عن خمسة هكتار وضعتها الشركة تحت تصرفها للمقاولات . ولم يتم إقامة هذه المنشأة في يوم واحد ولكنها جاءت نتيجة للعمليات ضبط وتسوية متتالية . كما تم ، فوق هذه الأرض التي ترتفع مترا فوق مستوى البحر ، بناء مسطح -رصيف من الخشب طوله ٧٠ مترا وعرضه ١٢ مترا تمت إقامته على ارتفاع ٤,٥ مترا فوق سطح الأرض وهو مخصص لتحميل ماكينات طحن المونة .

ويتم الحصول على الملاط بعد خلط متر مكعب من الرمال إلى ٣٥٠ جراما من جير التل من البودرة الجافة وبعد إضافة الماء. وفي البداية وبهدف التوفير حاول المسئولون تخفيض كمية الجير إلى ٣٢٥ كيلو جراماً ، ولكن أدت اختبارات عملية على درجة مقاومة الكتل التي تم الحصول عليها من هذا الخلط ، إلى الرجوع إلى مقادير مارسيليا والجزائر . ويجي الرمل المستخدم من عمليات الجرف التي تمت في حوض الميناء الكبير . وتنقله صنادل مزودة بصناديق لحمل الركام ترسو قرب الرصيف حيث توجد شركة المقاولات .

ويتم وضع الصناديق تحت رافعات بخارية ترفعها وتفرغ محتوياتها على الرصيف . وتظل الرمال مكدسة في المكان حتى تحمل بالجرافة في عربات بصندوقين أولاً بأول حسب الحاجة ، ليتم نقلها إلى

الورشة. وقد صمم الأخوة ديسو العربات التي تنقل الرمل ، وهي ذات تفريغ جانبي . وتحفظ أكياس الجير زنة خمسين كيلو جراماً والمستوردة من فرنسا في مخزن خاص. وكان يقدر الاستهلاك الشهري في الورشة بمبلغ ٥٠ ألف كيس^(٥٥) ويصل الجير في عربات نقل ذات منصة كما يصل الرمل في مقطورات تحتوي الكمية اللازمة لعملية هرس واحدة وكان ذلك يتم بواسطة سكك حديدية أسفل سطح مائل يسهل الوصول إلى منصة الشحن . و تعلق بعد ذلك في سلسلة دائرية يحركها ملفاف رافع وتساعد قاطرة بخارية على تشغيل الآت الهرس الموجودة فوق المسطح والرافعة. ويتم خلط المواد آلياً بواسطة عشرة طاحنات متوازية يتكون كل منها من مقياس دائري وفي وسطها يدور مساعد عمودي مزود بمكشط وكلايات وعجلات تدفعها حركة دائرية .

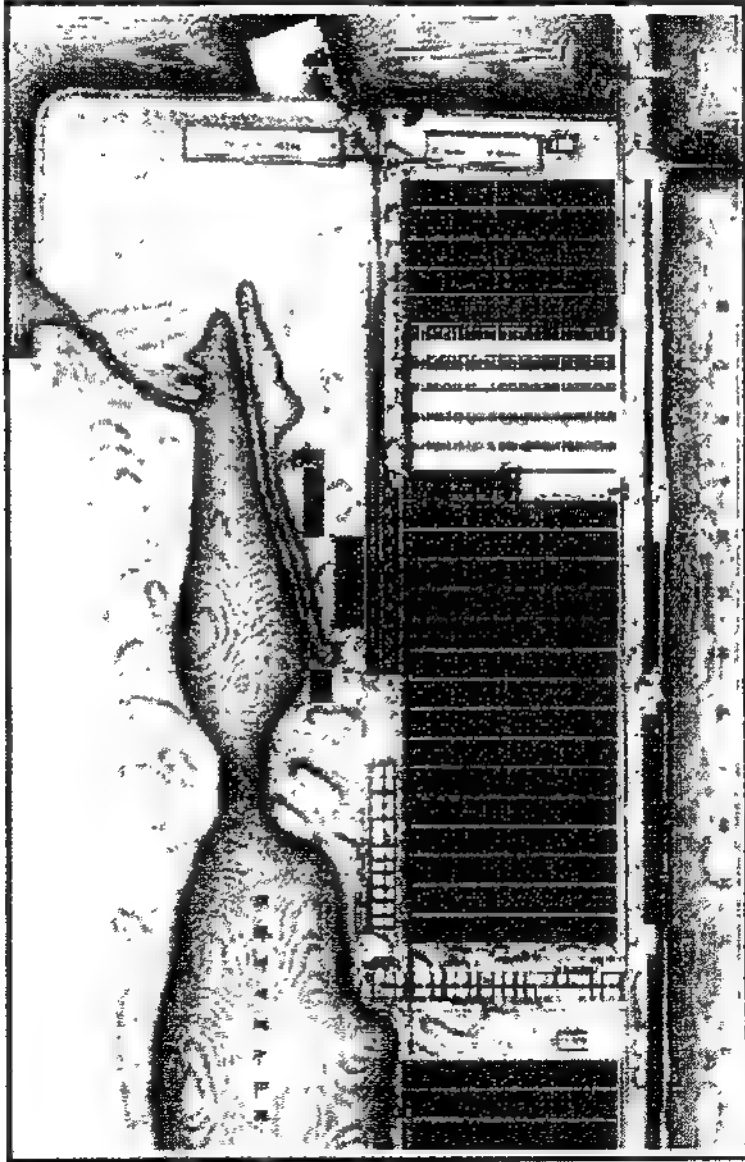


ورشة صنع الكتل الاصطناعية

(ل. مونتيل وأ. كاساني المرجع المذكور . أطلس لوحة ٧٣ ، تفاصيل)

ويتم خلط الجير المسحوق بالماء حتى يشكل عجينه ثم يضاف إليه محتوي العربة من الرمال . وبعد ذلك تفتح من جديد حنفية قذف الماء ليصبح الخليط أكثر تجانساً وتتم هذه العملية في مدة تتراوح بين ثمانية عشرة وعشرين دقيقة ^(٥٦) وتوقف كمية الماء الضرورية لكل طحن على رطوبة الرمل وهي تقارب ال ٢٣٠ لتراً . وتوجه الخبرة والتجربة حركات العامل وتساعد على تقدير اللحظة الدقيقة التي يصل فيه الملاط إلى الكثافة المطلوبة : " فهو يجب أن يكون متماسكاً جداً أي تشكل منه كرة في اليد دون أن يلتصق . وهناك وسيلة أخرى لمعرفة إن كان الملاط جاهزاً وهي تتعلق بالتأكد من أن العجلات تترك خلال دورتها قاع وعاء الخلط خالياً وراءها . ويمكن عندئذ استنتاج أن الملاط له الجودة المطلوبة لصب في قوالب ، ويجب في هذه اللحظة خفض مستوى المكشط وهي عملية دقيقة بعض الشيء بالنسبة للعامل الذي عليه فك القطعة التي كانت حتى هذه اللحظة متعلقة بحامل ويقفز عليها ليجمع الملاط ويرفعه فوق الفتحة " ^(٥٧)


ويقوم عمال آخرون من أسفل هذه الفتحة ، بتسهيل عملية سقوط الملاط بواسطة الجرففة داخل عربة من الصفيح ، لتصل إلى جزء من الخط الحديدي الموجود في نفس المستوى للخطوط القائمة فوق قوالب الصب . وتقوم بعد ذلك سيارة بجر العربات المحملة على سيارة وتجريها إلى المكان حيث تم صنف القوالب . وتترك عندئذ عربات النقل لتسير مباشرة على الخط الحديدي الموضوع فوق القوالب . ويفرغ محتوى كل عربة في قالب وتغرس المونة بانتظام وتسحق بعناية في الأركان وعلى طول جدران القوالب للحصول على كتلة متجانسة . وتوضع الصناديق الخشبية التي تستخدم كقوالب ، على خطوط متوازية مجموعات من ٤ صفوف . وبين كل مجموعة وأخرى تم ترك مسافة أكبر حتى يمكن نقل رالعة مائية تستخدم لرفع الكتل الجافة . وتشكل هذه الصناديق - القوالب كتلاً من عشرة أمتار مكعبة ، وللماء القالب تُعد أكثر من مطحنة . وتتكون الصناديق الخشبية من أربعة ألواح من الخشب مجمعة بواسطة مرفاع متحرك . ويتم تفريغ القالب بعد ستة أيام تقريباً ، ثم تترك الكتل بعد ذلك لتجف في الشمس لمدة شهرين حتى تصل إلى صلابة تعتبر كافية .

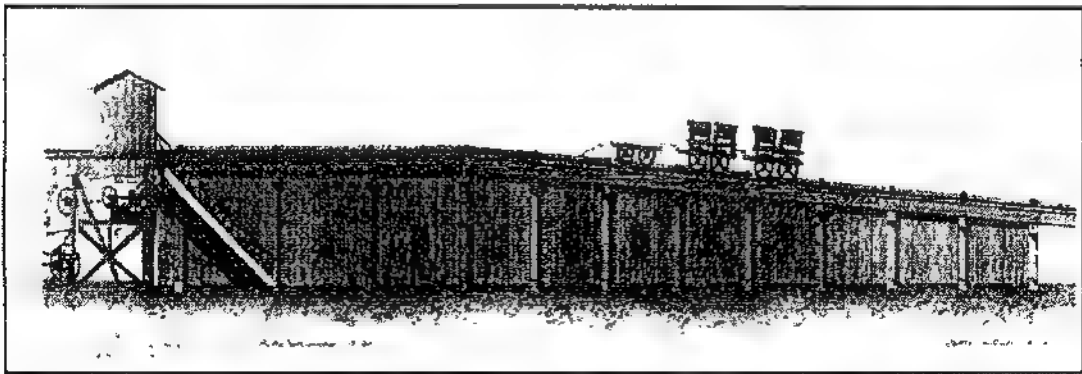

رفع الجير والرمل

(ل. مونتيل وأ. كاساني المرجع المذكور . أطلس لوحة ٧٥ ، تفاصيل)

وبعد التأكد من متانة الحجر يتم رفع الكتل بواسطة رافعة بخارية وتوضع في عربات التي يتم وضعها بدورها على عربات لنقلها إلى رصيف الشحن . عندئذ تزن كل كتلة ٢٠ طناً . الرافعة مزودة بعربة عليا يمكنها التحرك عمودياً بالنسبة لصفوف الكتل وتساعد الرافعة على رفع على التوالي كل من الكتل الأربع للأربعة صفوف المتوازية دون أن تتحرك . وتأخذ عند حاجز الشحن آلة رافعة الكتل من جديد لتضعها على صندل نقل عائم ، تتكون واجهته العليا من سطح مائل ، وينقل الصندل العائم ثلاثة كتل مشدودة ومثبتة في ميلها بواسطة سلسلة .

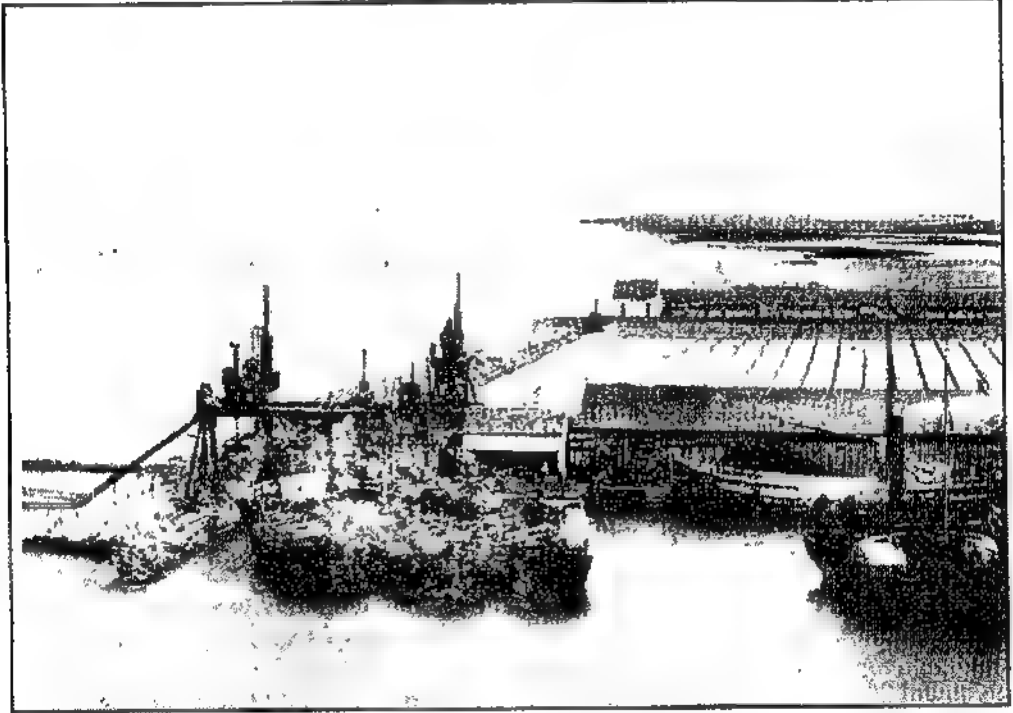


تجفيف الكتل

(صورة أ. ديزيره _ مقتنيات ديجورج الخاصة)

وتصحب المراكب التي حُملت إلى عرض البحر بواسطة قاطرة بخارية . في اللحظة التي تمر فيها الصنادل التي تحمل الكتل إلى حيث يجب إغراق الحمولة ، و تُحرك المزلاج الخشبي الذي يُوقف السلسلة وتترلق الكتل في الماء في المكان المحدد لها. ولوضع الكتل فوق الماء تستخدم صواري مركب بخارية عائمة تأخذ الكتل من سطح الجسر المائل وتضعها على رأس الرصيف . وهكذا من البداية إلى النهاية ، من المواد الخام إلى الكتل الموضوعة في مكانها النهائي ، كل شيء مترابط ، وتؤمن القضان استمرار كل العملية ، ميسرة عملية الوصل بين المراحل المختلفة . والورشة موصولة بما يقرب من أثنى كيلو مترا من الخطوط الحديدية : خط المسطح والسطح المائل وخط الارتفاعات وخطوط وضعت على الكتل وخط الشحن وخط يصل إلى مستودعات المعدات علاوة

على توفير سيولة التصنيع كما لاحظ كاديا (cadiat) : " أتاح التنسيق بين الخطوط الحديدية وسيارات النقل تركيز الأشغال فوق مساحة صغيرة " (٥٨)

وقد أنهت شركة مقاوله ديسو (Dussaut) في ٣١ يناير ١٨٦٩ الأرصفة متجاوزة الوتيرة التي حددتها الشركة ومتقدمة على الجدول الزمني المتوقع . وتم غمر ٢٥٠٠٠٠ متر مكعب من الكتل لتشكيل الرصيف الأول وطوله ٢٥٠٠ متراً والثاني ١٩٠٠ متراً. وقد حققت ورشة ميناء بورسعيد عندما أعطت للسكك الحديدية والآلة مكانة أعظم مما كان عليه الأمر في أشغال مارسيليا، مرحلة جديدة في تاريخ تصنيع الأرصفة من الكتل الاصطناعية وأثرت خبرات شركات المقاولات في مجال التنظيم أو حسب تعبير العصر نفسه "التظيم المنتج" للأشغال.

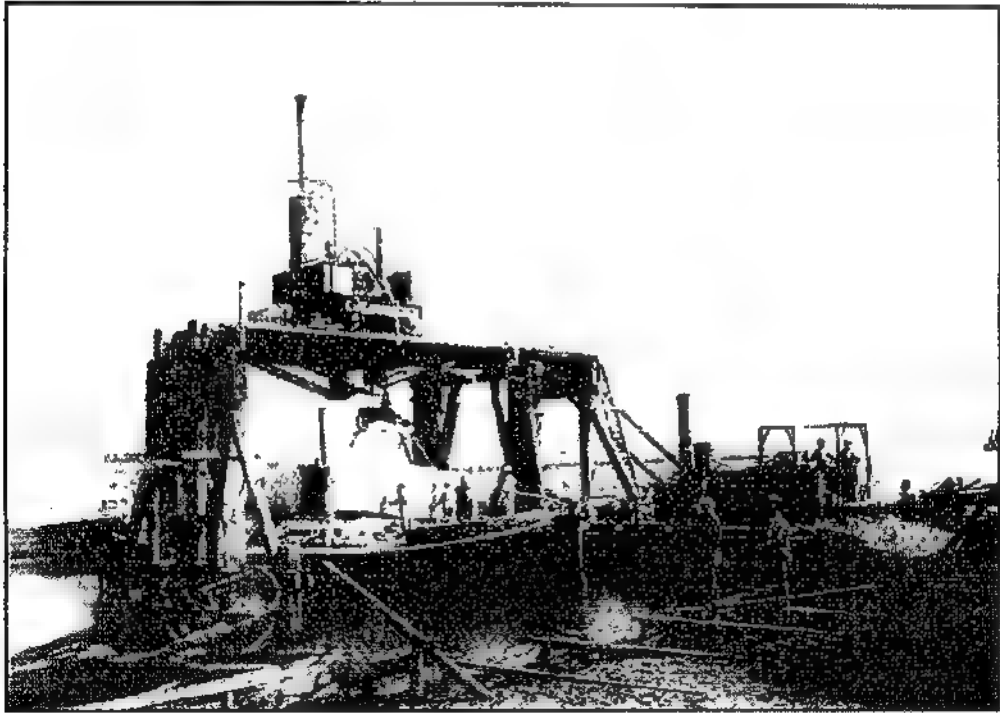

رافعة لتحميل الكتل
(صورة ل . كوفية - المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية)

لا يكمن تميز ورشة قناة السويس في الآلات الحديثة المستخدمة فحسب ، بل يعود أيضاً إلى عدد وقدرة الآليات الميكانيكية التي تم تفعيلها وخاصة الآلات البخارية . ولننظر لحظة عن اللجوء المنظم والمكثف للميكنة . في إبريل عام ١٨٦٣ في مدينة بورسعيد تم استبدال ونش الرفع الذي كانت تبلغ طاقة الرفع لديه ٤٥٠٠ كيلو جراماً برافعة عائمة يمكنها رفع ٤٠ طناً^(٥٩). وفي ورشة الكتل الاصطناعية كما رأينا من قبل تعتبر مجموعة الأدوات مهمة أيضاً : آلة بخارية تستخدم لتشغيل عشر مطاحن والقاطرة تجر عربات المونة وأخرى تحمل الكتل ونش مائي يرفعها وزوارق بخارية تستخدم لغمرها. و في ورشة بناء منارة بورسعيد يتم خلط المواد بواسطة طاحونة آلية

أقيمت أسفل المنارة وتُحركها مُتحركة إذ يرفع الأسمنت المسلح الناتج بواسطة ناقلة تحركها أيضا مُتحركة ثم يصب بين حاجزين مصنوعين من ألواح مميكة من الخشب تم وضعها على مسافة ثابتة. وفي مصنع المياه الذي أقامه بالإسماعيلية المقاول شارل لاسون (Charles Lasson) ، تدير آلات بخارية قوية مضخات ماصة ودافعة . إذ تدفع الماء تحت الضغط في ماسورتين من الزهر تمون الأولى مدينة ببور سعيد والأخرى تزود على طول نفس الخط عدة خزانات. وتم شق تحويلات وتفرعات على المسالك الرئيسية. وتزود الآلات البخارية في الإسماعيلية بالماء العذب اللازم كل الآلات البخارية التي تعمل في الجزء الشمالي من الخليج وكذلك بالماء المستعمل في صنع مونة الكتل الاصطناعية . ويجب أيضا ذكر المعدات المستخدمة في المواصلات والبريد والعبور الذي بدأ منذ ١٨٦٧ . وهي تتكون من عدة زوارق بخارية ^(٦١) وصنادل وسفن قاطرة بمروحة وجوارات السفن وقوارب من كل نوع .

فيما يخص آلات الحفر فقد تم بين عام ١٨٦٦ وعام ١٨٦٧ تشغيل ما يقارب العشرة حفارات ومن ثلاثين إلى أربعين جرافة في نفس الوقت (٦١) . ولكي نأخذ فكرة عن كمية الطاقة المبذولة والتي لم يسبق لها مثيل ، يمكن الرجوع للأرقام التي قدمها في يونيو عام ١٨٦٧ مونتيل (Monteil) مهندس المعدات بالشركة: " تعد جملة القدرة الحصانية (قوة حصان البخار) في الخدمة العاملة ١٢ ٥٨٦ حصانا واستهلاك الفحم الشهري ٨٧٠٠ طناً . وسوف تصل هذه القوة المحركة قبل نهاية العام إلى ١٧٢٧٢ حصانا وسوف يصبح الاستهلاك الشهري عندئذ ١٢٢٥٣ طناً وأخيراً غلّك في المخزن احتياطي قوة محركة من ٥٥٣ حصان مما يجعل أجمالي القوة للآلات الميكانيكية يصل إلى ١٧٨٢٥ حصانا ^(٦٢) .

على وجه الإجمال تم إنشاء ٧٨ جرافة بالبخار للورشة . سلمت الشركة لمقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما وفقا لدفتر الشروط ، معدات الجرف ونقل الرديم التي كانت تمتلكها من قبل من بينها ١٨ جرافة والمعدات التي طلبتها للأشغال التي سوف تنفذ وهي تشمل ٢٠ جرافة جديدة. علاوة على ذلك ، طلبت شركة المقاولات معدات من تصميمها : من مصنع جوان (Gouin) ١٨ جرافة جديدة خصصت لتعمل مع الرافعات و ٢٢ إضافية يجب أن تجهز بسيور طويلة من شركة مابك وورش البحر المتوسط . وكانت مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما تمتلك في النهاية معدات هائلة تشمل بالإضافة إلى الماكينات الرئيسية عدداً لا يحصى من القوارب التي تُحضر الماء و الفحم اللازم لتشغيل الآلات البخارية أو لنقل الرديم

قائمة مبسطة لمعدات مقاولات بورييل ولافالي وشركائهما

العدد	نوع المعدات
٣٧	ناقلة طين بخارية كبيرة
٤٢	مركب بصمامات القاع بخارية
٣٠	مركب بصمامات بخارية جانبية
١٨	رافعة
٩٠	صندل عوامية
٢٠	خزيرة بخارية
١٠	صندل صهريج بخاري
٥	صندل نقل بخاري
١٥٠	صندل من الحديد لنقل الفحم
١٥	قارب بخاري
٣٠	محرك مستخدم في أشغال متنوعة
٣٠	محرك تشغيل مضخات* السيور طويلة
١٩	خزيرة الجسور المائلة البخارية
٥٤٠	عربة صغيرة قلابية (في سكة حديد)

وتُلفت آلات الحفر الذي صممها شركة المقاولات النظر سواء بعددها وأحجامها وقوتها
ونتائجها القياسية .

مقارنة الأحجام الرئيسية لمختلف الحفارات (١٣)

عدد	صغيرة نموذج ١	صغيرة نموذج ٢	صغيرة نموذج ٣	صغيرة نموذج ٤	كبيرة	كبيرة + حاملات	كبيرة + رافعات	كبيرة + ذراع طويل
٢	٣	٣	٣	١٢	١٠	١٠	١٨	٢٢
المصنع	كومب	بوينتون	كومب	إرفاراد	جوان	SFCM	جوان	SFCM
طول	٢٢	٢١	٢١	٢١	٢٠	٣٠	٣٠	٣٣
عرض	٦,٤	١	١	١	٨	٨	٨	٨,٢
مستوى الماء	٠,٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١,٣٥	١,٣٥	١,٥	١,٨
طاقة لادوس قوة بالحصان	١٠٠	١٨	١٦	١٦	-٢٢٠ ٢٣٠	٢٣٠-٢٢٠	٤٠٠	٤٠٠
	٢٠				١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٥

ولم تكن المردودية العالية التي سجلتها شركة المقاولات معروفة حتى ذلك الحين ، بل لم يكن ممكناً تصورها في عام ١٨٦٨ . فقد استخرجت شركة مقاولات بوريل لافالي وشركاؤهما مليونين من الأمتار المكعبة شهريا بواسطة جرافات تضاعفت قوتها عشر مرات بالنسبة للنماذج السابقة . كما تواجدت أشكال عديدة من الربط بجرافة : الربط إما بواسطة مركبين حاملين أو اثنين أو ثلاثة مراكب شحن ، أو ذراع طويل أو أيضا بواسطة رافعتين وأربعة صنادل . ويختلف المردود حسب طبيعة الآلات التي تخدم الجرافات :

متوسط مردود الجرافات حسب نماذج نقل الرديم (١٤)

نوع نقل الرديم	العدد	متوسط المردود الشهري م٣
حاملات أو مراكب الشحن	٣٠	٢٥٠٠٠
ناقلة بذراع طويل	٢٢	٣٦٠٠٠
رافعات	٨	١٥٠٠٠

مع ذلك و علي العكس مما قد نظنه ، لم يحتف عمال الردم تماماً بوصول الآلات إلى ورش الخليج. أولاً لأن بعض أنواع التربة مثل الأراضي الصخرية تحول دون استخدام الآلات ، وأيضاً لأن استخدام الآلات يستلزم أعمالاً تمهيدية أو أعمال صيانة . لذلك لا يمكن تشغيل الآلات دون حفر خندق أولي بواسطة أساليب يدوية . وعلاوة علي ذلك يحتاج استخدام الماكينات إلى عدد كبير من العمال مثلاً عند القيام بنقل القضبان الحديدية التي تنقل عليها الحفارات وقطارات العربات .

تكوين طواقم آلات الحفر المختلفة^(٦٥)

رئيس مسئول	ميكانيكيون	مساعد ميكانيكي	سائقون	عمال	المجموع
١	١	١	٢	٨	١٣
	١		١	٢	٤
١	١		٢	٤	٨
١	٢	١	٣	١٠	١٧
	١		١	٤	٦
	١		١	٦	٨
	١		١	١٣	١٥

ويتم أيضاً استمرار تنفيذ ورش الحفر على الناشف بوسائل تقليدية . ففي عام ١٨٦٩ بجانب تشغيل ستين جرافة نحصر أيضاً عدد عشرة آلاف عامل وعدة مئات من الجمال وألف وخمسمائة حمار عاملة في ورش الحفر^(٦٦) .

وأخيراً عندما نتحدث عن الماكينات في الخليج لا يجب أن ننسى ورش الصيانة والتصليح وأهمها هي تلك التي أقامتها الشركة في بور سعيد ، فقد برزت هذه الورش بقوة حتى أنه كان يعمل بها في عام ١٨٦٣ ما يقرب من تسعمائة عاملاً موزعين بين تخصصات مختلفة منها بناء الهياكل والمناسير والنجارة والسباكة وصنع النماذج ومصاهر النحاس والضبط والطلاء^(٦٧) . ولقد

نُظمت هذه الورش على نموذج مؤسسات هيج شيمث (Hugues Schmitt) الميكانيكي السابق بورش كروزوا (Creusot) والذي عمل بها مدة اثني عشر عاماً. لذلك تستطيع هذه الورش منافسة أقوى مؤسسات الصناعات المعدنية بفرنسا. ومع ذلك فقد تم إهمالها شيئاً فشيئاً إذ رأى المدير العام للأشغال أن التوجه نحو الصناعة الخاصة أقل كلفة من الاستمرار في أعمال الصيانة. إلا أن وصول شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما التي استأجرت ابتداءً من يونيو عام ١٨٦٤ هذه الورش، أعادت لها الحياة مرة ثانية. وتساعد قائمة جرد المنشآت التي تمت بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٨٦٦^(٦٨)، على إدراك ما حظيت به من تطور جديد. وقد تم إحصاء عدة ورش متخصصة إحداها للتسوية وهو مجهزة بآلات الخروط واللولة والنقر للتلسين والتلميس والبرد ومخارط وسخانات بالبخار وآخر لصنع النماذج وورشة سباكة وورشة للقصور النحاسية ويشمل قاطرات وماكينات تقويس والتثقيب ومقارض (مقصات وخراطات) وأخرى للمصاهر وأخيراً المناشير^(٦٩). وتدار الآلات بالبخار^(٧٠) وخلاف الورش الكبيرة ببور سعيد يمتلك المقاولون عشرة ورش صغيرة للتصليح أقيمت في مختلف قطاعات الأشغال^(٧١).

لقد توافقت ظروف الورش الخاصة وحجمها غير الشائع مع وسائل ميكانيكية لم يسبق لها مثيل. فقد تجاوزت الآلات التي استعملت في ورش قناة السويس بطاقتها وعددها ومردودها كل ما أمكن مشاهدته حتى ذلك الحين. وشكلت مرحلة جديدة في تاريخ الأشغال العامة ونبين البدايات الحقيقية لميكنة الورش.

لجأ رجال ذوو خبرة

لم تنشأ الاختراعات التي ظهرت في ورشة قناة السويس مثل الماكينات الحديثة والأساليب الجديدة من فراغ فهي تشكل في أغلب الأحيان مراحل لها تاريخها في عملية التطور. أما الرجال الذين تخيلوها فقد كانوا أصحاب خبرات عظيمة. وتبرز معرفة خبرائهم السابقة استعدادهم لإيجاد حلول للمشاكل التي واجهوها في الورشة المصرية، لأن الحدس الذي هو نقطة الانطلاق لوضع الحلول الجديدة هو في أغلب الأحيان ثمرة تراكم التجارب السابقة. وسنحاول حصر صور ومسيرات المقاولين كوفرو وديسو ثم بوريل ولافالي على التوالي.

كوفرو: عصامي عنيـد

عندما بدأ يتعامل المهندس الفونس كوفرو مع شركة قناة للسويس في عام ١٨٦٣ لم تكن تلك هي أول ورشة له . ويمكن تكوين فكرة عن المهارة التي اكتسبها هذا الممارس ، بالرجوع إلى مسيرته باختصار . بدأ كوفرو كمقاول في عام ١٨٤١ وعمره ٢١ سنة في أشغال قسم السكك الحديدية بين جوفيزي (Juvisy) وشاتوروو (Chateauroux) حيث كلف بتنفيذ أعمال الحفر وإنجاز أشغال البناء^(٧٢) . وأسند إليه أشغال حفر مختلفة بعد ذلك خاصة علي خط باريس - ليون (١٨٤٨ - ١٨٤٩) أو لحساب شركة لويست (Ouest) عام ١٨٥١ . وفي عام ١٨٥٠ كُلف ببناء جسر ذي فيلار (Vélard) قرب مدينة ديجون (Dijon)^(٧٣) . وبعد سنتين تم اختياره لتنفيذ سطح من الرديم في محطة فيز (vaise) في الرون (Le Rhône) و تأني المواد اللازمة لتشكيل الردم من جرف المنفذ في السون (la Saône) التي تقوم به مؤسسة مقاولات كستور (Castor) والتي كانت تختبر في هذه المناسبة نموذجاً جديداً من الجرافات البخارية من ابتكاره . و من جانبه صمم كوفرو جسراً مائلاً علي أساس جديد يمكنه من رفع التراب إلى ارتفاع يبلغ ٢٥ متراً وهو يساعد علي إنجاز الحفر بسرعة أكبر وتكلفة أقل .

وفيما بعد تم من جديد استخدام رافعة المواد في أعمال أخرى من نفس النوع لتنفيذ أرصفة السون والرون في ليون ، وفي ورشة إنشاء خط سكة حديد يربط بين جنيف وسيسيل (Syssel) وقد زودته هذه الورش المختلفة بمعرفة جديدة ودقيقة لحاجات لم تنفذ في مجال الحفر . من ناحية أخرى وبالرغم من أنه لم يذكر الجرافة التي صممها في النص الذي حكى فيه تاريخ حفرياته^(٧٤) إلا أنه يمكننا التصور بأن مشاركته لمهندس آخر مثل مخترع آلات الأشغال العامة وهو كاستور ، عادت عليه أيضاً بالنفع . فقد جعلته هذه التجارب يطلع علي خاصيات الآلة التي ستكون بالنسبة لآلية الأكثر ملاءمة للحفر . فصمم هذه الآلة ثم نفذ منها نموذجاً مصغراً مارس تجاربه عليه والمقصود هي الجرافة التي أخذ عنها براءة الاختراع في ٥ مايو ١٨٦٠ . ولم يكن أول ولا آخر اختراع فبين ١٨٥٩ و ١٨٦٩ كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة عشر اختراعاً تخص آلات الورشة وتحسينها تشهد علي قدرته الإبداعية .

براءات الاختراع التي حصل عليها كوفرو بين عام ١٨٥٩ - ١٨٦٩ (٧٦)

التاريخ	الاسم	الرقم	العنوان
١٨٥٩/٣/١٢	كوفرو وكومب	٤٠١٥٩	مرافع بشراع متحرك
١٨٥٩/٣/١٢	كوفرو وكومب	٤٠١٦٠	جرافات مائلة
١٨٦٠/٥/٥	كوفرو	٤٤٨٩٣	حفارة حاملة لعمل الردم
١٨٦١/١٠/٢٣	كوفرو	٥١٤٩١	سقالة معدنية دوارة
١٨٦١/١٠/٢٣	كوفرو	٥١٤٩٢	آلة رافعة دوارة
١٨٦٢/١/٧	كوفرو	٥٢٤٧٠	وسادات بمشابك للسكك الحديدية
١٨٦٢/١/٢٤	كوفرو وكومب	٥٢٧٢٨	تحسين مرافع بشراع متحرك
١٨٦٢/٣/٢٧	كوفرو	٥٣٦٢٠	جهاز سمي كاسر الحجارة
١٨٦٢/٣/٢٧	كوفرو	٥٣٦٢١	جهاز طارد مخصص لقذف الحجارة
١٨٦٤/٦/١٣	كوفرو	٦٤٤٠٦	رافعة دورانية
١٨٦٤/٦/١٣	كوفرو	٦٤٤٠٧	حفارة حاملة لعمل الردم
١٨٦٤/٦/٢٤	كوفرو	٦٤٤٠٨	حفارة شاحنة بقادوس مستخرجة
١٨٦٧/٢/٢٣	كوفرو	٧٥٧٧٢	قادوس لجرافة وحفارة يقال عنه لتفريغ قروي

ويعتبر توقيع العقد مع شركة القناة بالنسبة إليه مكافأة لجهوده السابقة. و في الواقع، لقد أخذ حالما تم إعلان بدء الورشة دوره للحصول على جزء من أعمال الورشة. ففي الشهور الأولى لعام ١٨٥٩ قابل المدير، وكان في ذلك الوقت موجيل، ليعرض عليه رسومات حفارته. ولم يتردد في أن يقدم له نسخة من نموذج مصغر للآلة^(٧٧). ولكن لا يبدو أن الآلة المقترحة حصلت على موافقة موجيل الذي رأى أن باستطاعته التخلي عن هذه المساعدة الخارجية. وفي الواقع كانت توجد خلافات بين كوفرو والشركة بصدد حل مشكلة نقل الرديم. فعلى وجه الخصوص لم يكن كوفرو يثق بتاتا في استعمال الأقمشة الدوارة (Toile sans fin) وهو أسلوب يرغب في تطويره مدير عام الأشغال^(٧٨). وبالرغم من أن مقاولات هاردون كلفت كليا بالأشغال إلا أن كوفرو

ثابر في رغبته للاشتراك في حفر قناة السويس وبقي علي صلة بالشركة . وجعل مؤنسات جابر من ليون (Gabert) تصنع له الآلة التي صممها . فقد قام باستعمال حفارته في عمليات الحفر والتحميل لأول مرة في عام ١٨٦١ في أشغال جزء من سكة حديد أردنين (des Ardennes) بين سيدان (Sedan) وتيونفيل (Thionville) التي كُلف بها فاتيل (Watel) وشركاه . وقد توجه وفد من مسئولى الشركة بناءً علي دعوة كوفرو إلي الورشة الموجودة بمنطقة الأردنين (Ardennais) لكي يروا ما يمكن أن تفيد به هذه الآلة الجديدة ^(٧٩) . إلا أن الزيارة كانت بلا نتيجة . وفي يونيو عام ١٨٦٢ شارك كوفرو المهندس الصناعي كومب من مدينة ليون وأقترح الاثنان علي الشركة إنجاز حفر ثلاثة ملايين من الأمتار المكعبة من الجرف . ومع ذلك بسبب عدم التوصل إلي اتفاق مع الوكيل العام في موضوع شروط تنفيذ المهمة ، لم يحصل علي الصفقة . وبعد ستة شهور عندما علم بإلغاء العقد مع هاردون ، عاد من جديد بإلحاح وقدم عروضاً جديدة للشركة وحده في هذه المرة . ^(٨٠) حتى أنه قام برحلة إلي مصر للدراسة الأماكن والإطلاع علي طبيعة الأراضي وظروف تنفيذ الأشغال . وأخيراً في أول أكتوبر عام ١٨٦٣ تم توقيع أول صفقة تلزم كوفرو بتنفيذ أشغال رفع أنقاض القناة عند عبور عتبة الجسر مقابل ١,٦٠ فرنكاً للمتر المكعب ويلتزم بإيجاز الذي حددته الشركة في مدة ثلاث سنوات ونصف ابتداء من أول أبريل عام ١٨٦٤ سواء أشغال الحفر علي الناحف أو تحت الماء اللازمة لفتح القناة وفقاً للوصف . وتمتد هذه الأشغال علي خمسة عشر كيلومتراً وتمثل حجماً كبيراً للرديم يقدر بتسعة مليون متر مكعب .

يعتبر كوفرو عصامياً حقاً إذ يتبع حدسه ومعتقداته ، ويتفاني تماماً في مشروعاته ويمكن أن ندرك عند قراءة مراسلاته التي أرسلها للشركة تواضع شهادته الدراسية إذ أن خطابه تشوبها أخطاء في الأسلوب وغلطات إملائية . كما أنه لا يعتبر أيضاً إدارياً فطن حقاً وحتى وإن حصل علي براءات لاخترعاته فذلك لم يمنعه من أن يندفع أحياناً في مغامرات لا يقدر مسبقاً تبعاتها خاصة المالية . لذلك لم يتردد في إعداد عدة مرات دراسات للشركة أو تنظيم عروض علي نفقته دون أن يهتم بالتفاوض مسبقاً علي بعض الضمانات بأنه سوف يتلقى مقابل مالياً عن عمله ^(٨١)

ديسو : شركة مقاولات عائلية تستغل مهارتها علي شواطئ البحر المتوسط

قبلت شركة القناة في ٢٠ أكتوبر عام ١٨٦٣ عرض شركة مقاولات الأخوة ديسو بمبارسليا لبناء رصيفي بور سعيد من الكتل الاصطناعية . وتضمن صفقة الأشغال دفع ٤٠ فرنكاً للمتر المكعب ويجب بناء الرصيفين بنفس الشكل الذي يمثل رأساً عرضه خمسة أمتار يظهر منه متران فوق متوسط مستوى البحر المتوسط بانحدار يساوي ٤٥ درجة . كان فوازن متفانلاً بقبول هذا

العرض فهو يعرف أن هذه الدار اشتهرت بتنفيذ أشغال من نفس النوع في فرنسا وفي الجزائر علاوة على ذلك لها دراية بالأشغال في مصر ، فقد كلفت فعلاً منذ أبريل عام ١٨٦٢ بتنفيذ حوض إصلاح السفن بالسويس من الأسمنت لحساب الحكومة المصرية ^(٨٢) . ولقد تراكمت لديها خبرات عديدة من الجزائر إلى مارسيليا ثم بعد ذلك في بورسعيد حول البحر المتوسط تجمعت خبرة أكيدة بفضل جهود عائلة ديسو المتواصلة . ويجدر بنا استرجاع تاريخ شركة المقاولات هذه التي ساهمت بفاعلية وكان دورها حاسماً في تقنيات تنفيذ الموانئ في القرن التاسع عشر . إذ يلتقي تاريخها مع تاريخ تطور أعمال الموانئ في هذا العصر وكذلك في تاريخ حيز جغرافي متميز يحتل فيه كل من حوض البحر المتوسط ومدينة مارسيليا مكانة مرموقة .

ولكن ليس من السهل للغاية إعادة صياغة المسيرة المهنية لهذه العائلة . ولنتحدث قليلاً عن هذه الصعوبة إذ يقوم بكتابة النصوص التي تخص الأشغال والمنجزات أصحاب العمل أو وكلائهم ومعظمهم من مهندسي الطرق والكباري الذين يشرفون على الورش . وعند كتابتهم لمقالات عن الأشغال يوقعونها وينسون في أغلب الأحيان ذكر أسم وحق وجود المقاول الذي نفذ فعلاً الأشغال . بالإضافة إلى ذلك ، فهؤلاء المقاولون لا يكتبون إلا نادراً لذا ندرك أنه من الصعب غالباً وكما هو الحال هنا اقتفاء أثرهم من جديد أو تتبع مسيرتهم . ومع ذلك ، فقد أمكن تجميع بعض المعلومات . وتبدأ القصة بشخص يدعى جان ديسو (Jean Dussaud) ولد في الجيروندي (Gironde) في عام ١٧٩٧ ^(٨٣) وبعد أن مارس مهنة البناء أسقط في عام ١٨٤٦ كمقاول للأشغال العامة في مارسيليا . وعندما توفي اشترك أولاده الأربعة جان إيلي (Jean-Elie) وإليزار (Elzear) وجوزيف - لويس (Joseph-Louis) وأوجيست (Auguste) والذين ولدوا على التوالي في أعوام ١٨٢١ و ١٨٢٨ و ١٨٣٤ و ١٨٤٠ ، بعمل شركة لاستعادة مؤسسة الوالد . ومنذ ١٨٥٨ ظهرت شركة الأشغال العامة تحت تسمية الاخوة ديسو (Dussaud-Frères) مقاولون أشغال ميناء نابليون ، في الخوليات المحلية المسماة : مؤشرات مارسيليا ^(٨٤) . و عملت شركتهم في بناء الأحواض ورصيف دي لا جوليت (Joliette) الكبير وقامت بإغراق أول كتل ميناء صناعية ^(٨٥) . وفي عام ١٨٦٥ بينما كان إيلي يعمل في المقر المركزي بمارسيليا ليقوم بالحسابات وإدارة المقاولات كان اخوته في ورش بمصر . فكان إليزار يدير أشغال حوض إصلاح سفن السويس أثناء إهتمام لويس بورشة أرصفة ميناء بورسعيد ^(٨٦) وبسلاويب أخيه الصغير أوجيست على ممارسة الأشغال . وكان الأخير قد تخرج توا من المدرسة المركزية للفنون والحرف (خريج دفعة ١٨٦٤) ووجد في هذه الظروف فرصة لبدء أول تجاربه . ونجد في ابن مقاول البناء وريث المستقبل لمقاولات العائلة والذي تخرج من المدرسة المركزية ، نموذجاً لصورة شخصية

المقاول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومثلاً آخر لتتبع التاريخ التقليدي لاستراتيجية المقاولات العائلية .

أيضا استعملت الكتل الاصطناعية في الجزائر أو مارسيليا أو شيربورج ، كانت هناك مقاولات ديسو لتلعب دوراً في انتشار والتحويل إلى رأس المال بل أيضاً في تطور الخبرات في مجال بناء الأرصفة من الكتل الاصطناعية وتجد في كل ورشة فرصة جديدة لتطوير التقنية . وتعتبر ورشة أرصفة بور سعيد حلقة هامة في تاريخ هذه السلسلة .

بوريل ولافالي : الشراكة بين الإداري ومهندس الميكانيكا

تكونت مقاولات بوريل ولافالي وشركاهما في عام ٣١ ديسمبر ١٨٦٣ بمشاركة إسكندر لافالي (Alexandre Lavalley) الذي ترك لتوه شركة مقاولات جوان (Gouin) وبول بوريل (Paul Borel) الذي استقال منذ عام من سلك الطرق والكباري . وقد درس الاثنان معا عدة أعمال كبرى من بينها بناء خط السكة الحديد الذي يمر عبر مرمجل برنير (Brenner) . ولكن لم يتمكنوا من إتمام التعاقد على إثر رفض البرلمان النمساوي التصديق على المعاهدة التي أبرمها الوزير مع مقاولين أجانب ^(٨٧) . ففي ذلك الحين تقديماً بعرض لإنجاز جزء من الأشغال في خليج السويس .


ومن الضروري أن نقوم فوراً بتوضيح تقاسم الأدوار الذي تم بين الرجلين في شركة المقاولات . كان بول بوريل مقيماً في باريس وكان مسئولاً عن الأقسام الإدارية والمحاسبة والمالية الخاصة بمشروع قناة السويس ، بينما كان لافالي يدير الورش في مصر وتقع على عاتقه مسئولية الجوانب الفنية . وقد حظي بول بوريل بخبرة سابقة في مهام الإدارة عندما اشترك وعمره ٣٤ سنة مع إسكندر لافالي . لقد ترك مؤقتاً وهو المهندس بإدارة الطرق والكباري الإدارة الحكومية بعد أقل من سنة من تسلمه أول وظيفة في ابوزس (Uzès) ليلحق بشركة سكة حديد آفينيون (Avignon) بمارسيليا . ولما عاد إلى إدارات الطرق والكباري اشترك في العديد من أعمال السكك الحديدية على خطوط بوردو - تور (Bordeaux - Tours) فيرزون - بيك دالية (Vierzion Bec d Allier) ، ثم ليون - آفينيون (Lyon - Avignon) . وفي عام ١٨٥٢ أثناء أجازة مفتوحة ، عمل لحساب شركة سكة حديد ليون - مارسيليا قبل أن يلتحق بشركة مقاولات باران وشاكن وشركائهما ليشرف على انجاء خطوط السكة الحديد في شرق فرنسا بل أيضاً في مقاطعات الرون واللوار (Rhône et de La Loire) . في عام ١٨٦٠ صار مديراً - شريكاً في شركة مقاولات فيتالي وبيكار وشركائهما والذي يتركز نشاطها في انجاء السكك الحديدية في أوروبا .

لاشك في أن فوازان وبعد ما جرى من أحداث مؤسفة بينه وبين هاردون ، قد فضل أن يتعامل مع شخص مثل شخصية بوريل يشاركه مبادئه وأسلوب عمله ، وهو زميل سابق لدفعته في المدرسة متعددة التقنيات بباريس ثم في مدرسة الطرق والكباري .

يتمتع اسكندر لافالي وهو أصغر من شريكه بعام واحد ، بشخصية من نوعية مختلفسة . ودون الرجوع بالتفاصيل إلى مساره الوظيفي الطويل ^(٨٨)، من الملائم أن نذكر هنا بعض النقاط التي تفيد موضوعنا . فهو بعد أن تخرج من المدرسة متعددة التقنيات بباريس قد فضل الاستقالة على أن يعمل ويكمل مشواره في مجال الهندسة الحربية . فقد كان يميل إلى الصناعة ولم يتردد في أن يتميز عن زملائه حين قرر الذهاب إلى إنجلترا ليتعلم في ساحة العمل مهنة المهندس . وعمل خلال عامين في إحدى ورش الإنشاءات الميكانيكية الرئيسية بيري كيرلس (Bury Curtis) وكينيدي (Kennedy) في ليفربول ثم في بيرمينجهام حيث بدأ كسائق قبل أن يصبح عاملاً بسيطاً، وعمل بورش مختلفة ، تقوم من صهر الحديد إلى التركيب ، وقيادة الآلات مكتسباً في أثر ذلك خبرة عملية غير مألوفة بالنسبة لخريج المدرسة متعددة التقنيات بباريس . وعند عودته إلى فرنسا لم يقض سوي بضعة شهور في شركة سكك حديد دي نور (الشمال) قبل أن يسافر ليدرس تحت إشراف لي شاتيلية (Le Chatelier) المردود التجاري والآثار الاقتصادية لمختلف أجزاء الخط الحديدي من باريس إلى مارسيليا . وترك هذا العمل في عام ١٨٤٦ ليتحق بالشركة التي كونها توا اريست جوان (Ernest Gouin) . ومنذ هذه السنة ارتبطت حياته بتاريخ هذه الشركة لمدة سبعة عشر عاماً . إذ صار مساعداً لجوان ، وهو شاب خريج المدرسة متعددة التقنيات بباريس يدير شركة التوصية بالأسهم ومقرها في باتينيول (Batignoles) . وفي بادئ الأمر اتجهت هذه الشركة إلى تصنيع ماكينات القاطرات ثم نوعت إنتاجها بتوجهها نحو إنشاء الكباري المعدنية مستعينة في ذلك بالخبرة التي اكتسبها لافالي . ويجب القول أن هذا الأخير لم يتردد في الذهاب وراء الماش إلى إنجلترا لكي يدرس هناك الأساليب المتبعة ثم يستوردها ويقوم بتحسينها ويصبح مروجاً لها في فرنسا ^(٨٩) . وفي المعرض العالمي في عام ١٨٥٥ حصل لافالي على جائزة بناء كبرى آنبار (Asnières) المعدني ^(٩٠) وساعدته الشهرة التي تتمتع بها شركته جوان في الحصول على طلبات من الخارج أولاً من المجر ثم من روسيا . وفي عام ١٨٥٩ كُلفت هذه الشركة بالقيام بكل الأعمال المعدنية لحساب شركة خطوط الحديد الروسية الكبرى ثم رعى عليها المزداد للالتزام بالإعمال في بولندا وإيطاليا . وقامت شركته بإغجاز المنارات على البحر الأسود وعلى البحر البلطقي وصنعت جرافات لحفر موانئ في روميا وشقت نفقا في ليتوانيا (Lituanie) . وقام لافالي بإدارة كل هذه الأشغال بالخارج وكان الصانع الأول لنجاحات شركة مقاولات جوان ^(٩١) وشارك بعد ذلك في

دراسات خطوط السكك الحديدية في إسبانيا ثم استقال ليعمل لحسابه معتمداً علي خبرته في إدارة الورش الكبرى في الخارج والإنشاءات المعدنية واستعمال الآلات البخارية . فالرجل الذي تعهد لتنفيذ جزء من أعمال قناة السويس هو دون شك شخص متمرس أكتسب خبرة عظيمة وبرهن علي كفاءته من قبل . وما كان في استطاعة شركة مقاولات جوان التي أخذت أيضا دورها للحصول علي تعهد أشغال الحفر في السويس إلا أن تنسحب عندما رأت المنافسة التي يمثلها مساعدوها السابق . وهذا لن يمنع لافالي من الاستمرار في طلب شراء ماكينات من مقاولات جوان كما كانت تعمل الشركة والاستفادة من معرفته الكبيرة بها.

وأخيراً لن تكتمل دورة معرفة المقاولين الموجودين في ورشة قناة السويس إذا تجاهلنا ذكر اسم شارل لاسيرون (Charles Lasseron) . فقبل أن يتعاقد مع الشركة لإنجاز الأعمال الضرورية لتوزيع الماء العذب بين الإسماعيلية وبور سعيد ، كان وهو خريج المدرسة المركزية . يدير مياه الإسكندرية لحساب شركة مقاولات كورديه (Cordier).

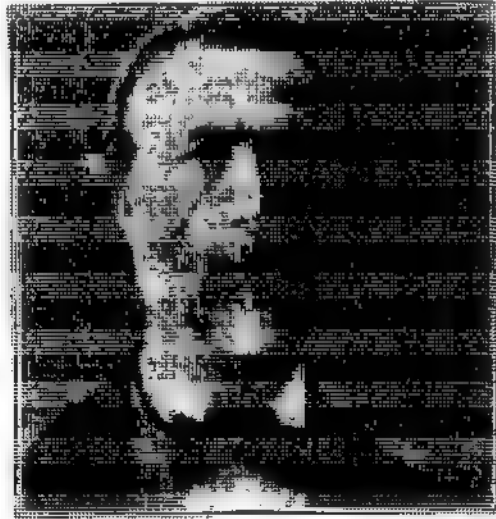

شارل لاسيرون

(صورة عن ج شارل رو : الخليج وقناة السويس الجزء الأول ص ٣٦٣)

بالرغم من أن تأهيل المقاولين كان في الأصل متنوعا ، إلا أننا نجد بين هؤلاء بعض العصاميين مثل كواليه وكوفرو ، خريجي المدرسة المركزية مثل لاسيرون (Lasseron) انتهى (Dussaud) ومهندس سابق للطرق والكباري مثل بورييل (Borel) وخريج المدرسة متعددة التقنيات مثل لافالي (Lavalley) إلا أن المقاولين في ورشة قناة السويس يجمع بينهم عامل مشترك وهو أنهم رجال اعتادوا علي الصعاب ولهم خبرة قوية بالأشغال .

عناصر تكوين الابتكارات

تتفق الاختراعات المختلفة التي رأت النور في قناة السويس في أنها لم تنشأ في يوم وليلة ولكنها كانت نتيجة لتحسينات تمت خطوة بخطوة ولعملية إصلاح وضبط وتكييف وتدرجية أملتها الخبرة والتجربة وسارت بحسب الظروف المحلية .


إحكام الطلبات

في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم الحلول ، فإن الطلبات هي التي تتغير بحسب الخبرة المكتسبة . فنحن نلاحظ بالفعل عملية تكييف مستمر للطلبات مع بيئة متغيرة و مع المخاطر التي قد تطرأ . و أول مثال على ذلك أرصفة بالإسماعيلية التي سوف تقصر أطوالها بالنسبة لما تم تقديره في المشاريع وذلك لأنها سوف تأخذ تدريجياً شكلاً مختلفاً تماماً عن الأشكال المقترحة . (أنظر التصميم في الفصل التالي) .

وقد تطور أيضاً التوزيع الأول لأشغال الحفر ليأخذ في الاعتبار قدرات وكفاءات شركات المقاولات وأفضل معرفة يتم اكتسابها عن الأراضي التي تعبرها . وسوف تتم عدة صفقات بين شركة القناة ومقاولات بوريل ولافالي وشركائهما ^(٩٢) والتي تستأثر تدريجياً بنصيب الأسد في تنفيذ أشغال الحفر في الخليج . وبمجرد التأكد من وقف إرسال فرق السخرة نهائياً ، وقعت الشركة في ٢٦ مارس ١٨٦٤ عقداً مع مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما . ويصل تقريباً إلى ٢٤,٥ مليون متر مكعب من حجم الانقاض الذي كُلفت المقاولات به . وكان الهدف هو تنفيذ الحفر بواسطة الجرف فقط . وعند إلغاء العقد مع أيتون (Aiton) في نوفمبر ١٨٦٤ ضمت مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما حصة المقاولات الإسكتلندية إلى ما قد كانت كلفت بإيجازه من قبل ^(٩٣) أي استخراج حجم إضافي بقدر ٢١,٧ مليون متر مكعب بين البحر المتوسط والطرف الجنوبي لبحيرات البلاح . و في مارس عام ١٨٦٥ نزع جزء من الأشغال التي سلمت لمقاولات كوفرو المكلفة بحفر القناة عند عبور عتبة الجسر ، ليكلف بها في أول الأمر بوريل ولافالي وشركائهما قبل أن تنفذها الشركة أخيراً بالإدارة المباشرة . قد أدت الصعوبات التي قابلها كوفرو في تحقيق لأهداف الإنتاج المحددة سابقاً ، في الواقع ، بعد أقل من سنة على توقيع أول عقد الشركة . إلى مراجعة شروطها ^(٩٤) وكانت الحصة الجديدة التي خصصت له أقل أهمية إلا أنها تتناسب أكثر مع إمكانياته وأيضاً طبيعة المعدات التي يمتلكها . وقد كانت نتائج الاستطلاعات المتزايدة يأتاحتها لمعرفة أفضل للأراضي التي يجب أن تحرقها القناة أيضاً سبباً في التعديلات الجديدة التي أدخلت على المواصفات التي تم الاتفاق عليها في البداية بين الشركة ومقاولات بوريل ولافالي وشركائهما . ومن بين التغيرات التي أدخلت على المواصفات الأولية ، نلاحظ في البداية تغيير شكل القناة البحرية الحالي .

إذ حدد عرضها في البداية عند خط الماء بثمانية وخمسين متراً و اتسع العرض عند خط الماء الذي حدد في البداية إلى مائة واثنين متراً في كل الأجزاء التي تقع فيها الأرض بطبيعتها أقل من مترين فوق سطح البحر . ومن هنا جاءت زيادة حجم الحفر المقدرة تقريبا ب ٩ ملايين متر مكعب . وفي خلال شهر مارس عام ١٨٦٧ تم تعديل العقد من جديد لمراعاة ضرورة عرفت في هذه الأثناء بتنفيذ علي الناشف الجزء الأكبر من الأشغال التي حسب الصفقات الأولية كان لابد من تنفيذها بواسطة جرافات علي جزء القناة الممتد من البحيرات المرة حتى طرف شمال سهل السويس (بين الكيلو متر ١١٤ و ١٤٢) بسبب صلابة الأراضي .

وعند كل صفقة جديدة ، تتم مراجعة أسعار وحدات الأمتار المكعبة للحفر المتفق عليه لمراعاة التغيرات التي أدخلت علي أسلوب وشروط تنفيذ مختلف أجزاء القناة ، وتتراوح الأسعار بين ١,٤٠ فرنكا للمتر المكعب لجرافات حوض بالإسماعيلية و ٦,٢٠ فرنكا لإنجاز حفر في التشكيلات الصخرية لعتبة الشالوفة . وأعيد أيضا تقدير المواعيد و تم تأجيل انتهاء الأشغال أخيرا إلى أول أكتوبر عام ١٨٦٩ . وفي حالة الانتهاء من الأشغال في هذا التاريخ تم الاتفاق علي منح المقاولين بوريل ولافالي مكافأة قدرها ٢٨٠٠٠٠٠ فرنكا (اثنين مليون وثمانمائة ألف فرنكا) وسوف يخصم من هذه القيمة مبلغ قدره ٥٠٠٠٠ فرنكا عن تأخير كل شهر . وتأخذ العقود الإضافية للعقد الأول أيضا في الاعتبار المصاريف غير المتوقعة في البداية مثل تراكم الرمال بواسطة الرياح أو إعادة تقدير أهمية ظاهرة زيادة الأثرية ^(٩٥) والتي استهين بمجموعها بشكل واسع . وبالتدريج كلفت مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما ^(٩٦) بالجزء الأكبر من أشغال الورشة . وفي ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ يوم الافتتاح كان قد تم إنجاز ما يزيد عن ٧٤ مليون متر مكعب من الحفر ، قامت مؤسسة المقاولات هذه بإنجاز أكثر من ثلاثة أرباعها ٤/٣ .

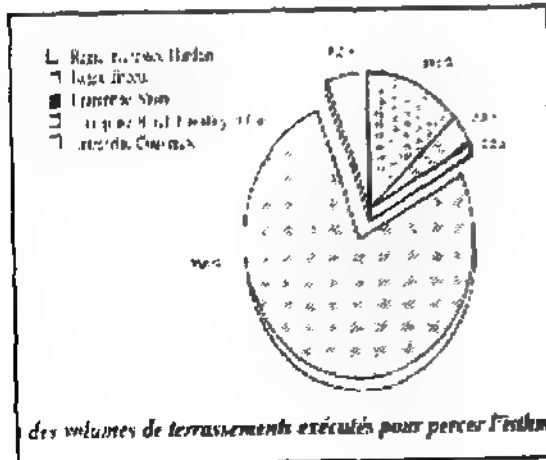

- هاردون الادارة ١٣,٤%

- الإدارة المباشرة ٣,٥%

- مقاولات آيتون ٠,٢%

- مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما ٧٦,٦%

- مؤسسة كورفو ٦,٢%

توزيع أحجام تنفيذ الحفر لشق خليج السويس

تتيح متابعة الكميات المستخرجة مع الزمن تقيماً أفضل لإنجاز مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما .

رسم بياني

تطور مجموع أحجام الحفر المنفذة


ابتداءً من عام ١٨٦٥ تنحرف الرسوم البيانية للمنحنيات بوضوح مينة الإيقاع الجديد الذي غلب على الأشغال. فقد أمكن في أول يناير عام ١٨٦٣، تاريخ فسخ عقد هاردون ، تقدير حجم الرديم المنفذ تحت الماء بنحو ٥٥٠.٠٠٠ م^٣ مقابل ٥٦٥.٠٠٠ م^٣ تم استخراجها على اليابس وقد نفذت جزءاً كبيراً منها فصائل السخرة. ومع مد المنحنيات التي حصل عليها حتى عام ١٨٦٤ ، من الممكن تحديد عدد السنوات اللازمة لحفر خليج السويس ولو افترضنا بقاء نفس أسلوب تنفيذ الأشغال بالسخرة ومن المحتمل ألا يقل عددها عن العشرين عاماً. وقد حققت مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما في خمس سنوات ثلاثة أرباع مجموع الحفر والجرف وقد تم تنفيذ نصفها في السنتين الأخيرتين .


وحقئ تكون أشد دقة يجب القول مع ذلك أنه لم يكن قد تم إنجاز القناة بالكامل عند الافتتاح ! ففي ٢٠ ديسمبر ١٨٦٩ ، تاريخ إلغاء عقد بوريل ولافالي وشركاؤهما، كان لا يزال أكثر بقليل من اثنين مليون متر مكعب للحصول على الشكل المرتقب في كل مكان^(٩٧). ولئن تعتبر الأشغال المنتهية بالفعل إلا في ١٥ إبريل عام ١٨٧١ . ولو كانت الشركة قد فرضت على شركة المقاولات أن تنهي بسرعة حفر القناة لكان ذلك دون شك على حساب توقف الملاحة وتأجيل تاريخ الافتتاح الذي أعلنه بدعاية ضخمة رئيس الشركة . ولتجنب هذا العائق تم تخيل حل مبتكر وهو تكليف لافالي بتنظيم قسم للصيانة واستغلال القناة في نفس الوقت الذي يقوم فيه بإتمام إنهاء الأشغال بحيث لا يتوقف عبور السفن ولو ليوم واحد . وعندما حان وقت تحديد قيمة المكافأة الممنوحة للشركة المقاوله في يونيو عام ١٨٧٠ اعتبر أن التأخير بالنسبة للتاريخ المتوقع لن يكن سوى شهرين وهو الزمن اللازم لإنهاء الأشغال بنفس الإيقاع الجاري . وبناء عليه تم تحديد المكافأة بمبلغ ١٨٠.٠٠٠ فرنكا . ولكن لافالي لم يبق مدة طويلة في خدمة الشركة مفضلاً البدء في مشروعات جديدة . وعندما عاد إلى فرنسا في عام ١٨٧٠ قدم عرض مشروع مترو باريس على المجلس العام للسين^(٩٨). قبل أن يقدم عروضاً للنفق تحت المانش^(٩٩) ثم في بداية من عام ١٨٧٩ لإدارة أشغال السكك الحديدية والمواني الشاقة للغاية في جزيرة لارينيون (la Réunion) أما شريكه بوريل فقد كان قد توفى قبل افتتاح القناة بشهر فقط .

حلول مناسبة لكل نوع من المشاكل

بالموازاة مع تطور طلبات الشركة ، كان يقوم المقاولون بإدخال تحسينات على المعدات التي اخترعوها. فقد رأى كوفرو من الضروري اختبار تشغيل الحفارات بنفسه قبل أن يسلمها لعماله . فأدخل على الآلة التي صممها تعديلات تتعلق بشكل القواديس وشكل قارئة الأعمدة وحنقات السلسلة^(١٠٠) وكانت هذه التحسينات ناتجة عن الممارسة ومستخلصة من محاولات ضبط وتعديل متتالية .

عندما لاحظ المسئولون بالشركة تشغيل حفارة المقاول كوفرو لم يقتنعوا كثيراً بالمجازات الآلة المستعملة في عمليات الحفر على الناحف واعتبروا في الواقع أن الطريقة المستخدمة غير اقتصادية ، إذ أنها تستلزم استعمال آلتين بخاريتين - واحدة للقاطرة التي تجرها العربات والأخرى للحفارة - كما أنها تتطلب إنشاء عطين متلاصقين من القضبان يجب على العمال باستمرار إزاحتها . وشجعوا عندئذ كوفرو على استعمال الآلة التي ابتكرها للجرف في الماء (١٠١) . وقد أعيدت صياغة العقد الذي يربط المقاول بالشركة في هذا الاتجاه . وبناء عليه أنطلق كوفرو في القيام بسلسلة من الاختبارات الجديدة لتعديل ماكنته وتكييفها مع هذه المتطلبات . ويتم تفريغ الآتربة مباشرة على الأرض ثم تأخذ ثانية بالمجرفة وتُحمل في عربات تُصحب إلى القلب .

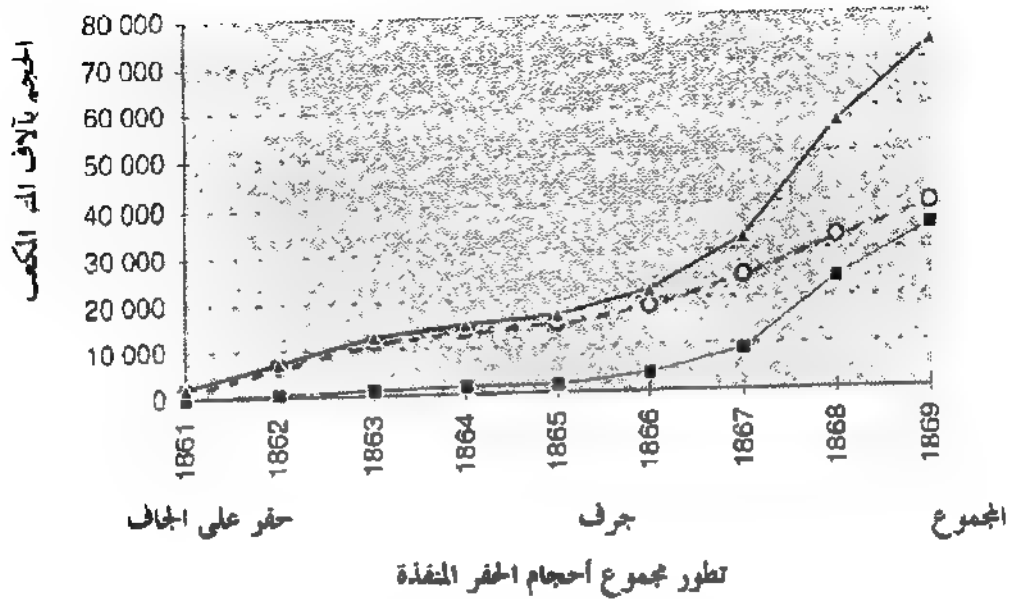

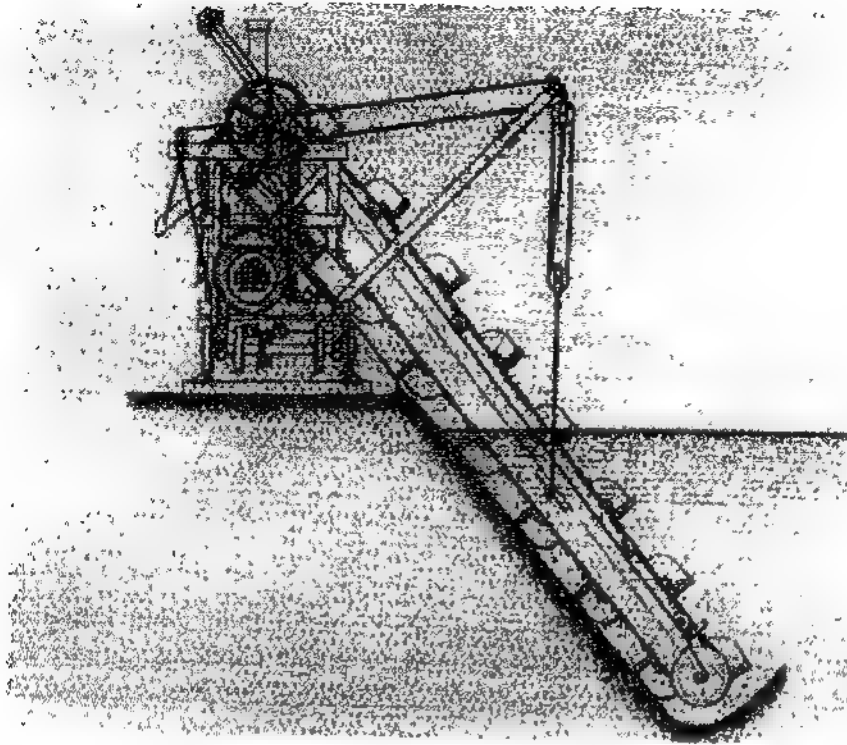


حفارة مائية

(أطلس فوازان لوحة ٣٨)


لاحظ المقاول أن المواد التي تستخرجها الحفارة مكونة أساساً من الرمل الناعم وتنفصل بسهولة عن القادوس وتزلق دون صعوبة في المجرى المائل ولكن جزءاً كبيراً من الأتربة يسقط مع ذلك من جديد في البحر . ورأى أن شكل القواديس (godets) هو السبب رغم أنه قد أدخل تحسينات عليها خاصة بإلغاء حركة الجانب الداخلي الخلفي . وللتخلص من هذا العائق الجديد أو على الأقل تخفيف آثاره ، شرع خلال يونيو ١٨٦٥ في تجويد كل سلسلة الجرافة لحفارته ^(١٠٢) . وثمت تصليحات المعدات وتحسينات بعض أجزائها في ورش أقامها المقاول في الجسر ^(١٠٣) . بمساحتها التي تبلغ أكثر من ألف متر مربع بقليل ، تشمل هذه الورشة علاوة على ورشة خاصة لإصلاح العربات ورشاً للنجارة وللتسوية وللسباكة وكذلك مخزناً لإيداع المواد وكل أنواع الأدوات المخصصة للأشغال ^(١٠٤) . وقد كانت نتائج الآلة الحديثة مقنعة للغاية لدرجة أن الشركة قررت في مايو ١٨٦٥ استخدامها للأشغال التي تنفذها بنظام الإدارة المباشرة قرب الفردان . وطلبت عندئذ خمس حفارات كوفرو من مؤسسة الإخوة جابار في ليون بشأن هذه الطلبات بدأت مناقشات في الخليج لتحديد التعديلات الواجب إدخالها على الماكينات بالنظر إلى الخبرة المكتسبة في الورشة . وقد شارك في هذه المناقشات ، علاوة على المدير ، رؤساء القطاعات ومهندس المعدات بالشركة والمقاولان كوفرو ولافالي . ويدل وجود هؤلاء القاعلين حول نفس المائدة على الجهد الجماعي الذي نتجت عنه هذه التحسينات . ويخص التعديلات الأساسية اللذان أدخلوا : وضع

حديد بشكل T مزدوج محل خشب بناء هيكل الجهاز ، وكذلك تعلية نقطة تفريغ الأتربة (١١٥). بعد أن قدم كوفرو براءات آلاته ، منحتة الشركة مكافأة حددت قيمتها بعد استشارة خبير بألف فرنك عن كل حفارة . لم تنجم إذا التحسينات المتتالية وكذلك أيضاً الفكرة الأولى للحفارة عن نظريات علمية ولا عن حسابات ولكن نتجت عن مسعى تجريبي أساسه الملاحظة التي تثيرها الخبرة والمهارة .

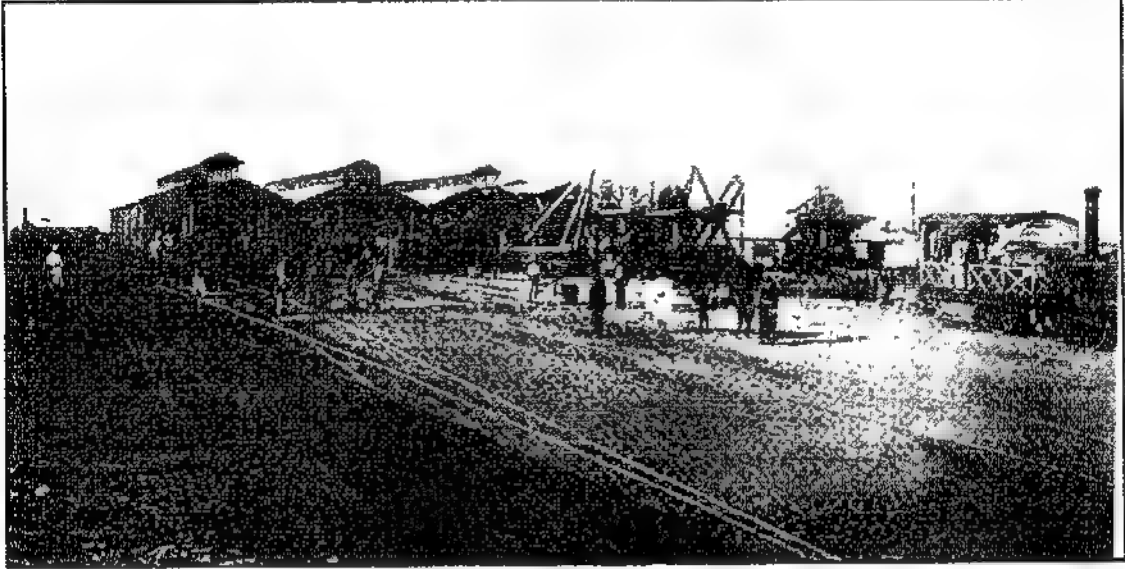

ورش كوفرو بالجسر

(صورة ل . كوفية . المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية)

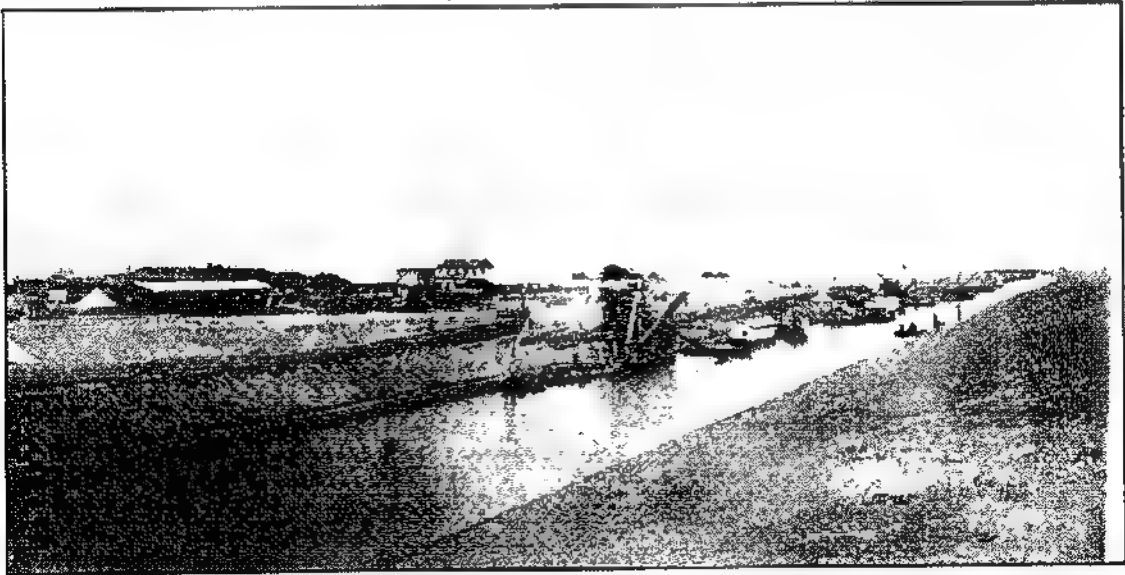

جرافات في ورشة الفردان

(صورة ل . كوفية ، ٢٥ نوفمبر ١٨٦٦ ، المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية)

عندما اقترح لافالي إنجاز أعمال الردم في الجزء الجنوبي من الخليج بطريقة الجرف فقط وخصوصاً في المنخفضات المنخفضة التي كانت من قبل بحيرات ، كان يهدف إلى تطبيق فكرة بسيطة ولكن مبتكرة لم تكن قد خطرت ببال أحد من قبل . كان يأمل سد المنخفضات كاملاً ثم يوصل إليها ماء النيل عن طريق فرع ترعة الماء العذب وبذلك تستطيع الجرافات العمل في هذه المنخفضات المليئة بالماء .

وإن كانت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما قد استطاعت طبع مثل هذا الإيقاع على أعمال الجرف فهي مدينة في ذلك لاختراع آلات ميكانيكية ذات مردودية عالية جداً . وتعتبر المداخلات التي قدمها لافالي أمام أعضاء جمعية المهندسين المدنيين في الفترة بين ١٨٦٧ و ٨٦٩ . مفيدة لمعرفة كيفية خلق هذه الابتكارات الميكانيكية . ونقترح أن نتابع التفسيرات التي عرضها للظروف التي قادته إلى تصميم وضبط مختلف الاختراعات الميكانيكية ، ونوضح أن الهدف في كل مرة هو تقديم حل لمشكلة حددت بوضوح وبدقة .


في أول الأمر ، بدلا من البحث عن آلة مثالية لتشغيلها في كل مكان ، صمم الماويل على إيجاد حلول متميزة تناسب طبيعة الأراضي المجتازة .

واستخدمت الجرافات الصغيرة في عمليات جرف حوض بالإسماعيلية . وكان لابد من تصور أساليب مختلفة بعض الشيء لأصل الأتربة على الخمسة عشر كيلو مترا الأولى من ممر القناة انطلاقا من الإسماعيلية . وليست المسألة هنا على عكس الأشغال التي تمت بالقرب من البحر تفريغ الأتربة المحروقة في زوارق أطلق عليها " مراكب حاملة الأتربة " والمفرغة في عرض البحر . وكانت المسافة الواجب قطعها من الآن فصاعدا في غاية الطول . ويجب إذن وضع الأتربة على الضفاف وهو ما يبدو متاحاً في هذا الجزء من الخليج عند عبور بحيرة المولة حيث الأرض لا تعلو إلا قليلا عن منسوب الماء . ولعمل ذلك ألصقت بالجرافات ملحقات يقال عنها مصارف تُسهل وضع الأتربة مباشرة على الشاطئ . وتم تدريجيا إطالة هذه المصارف حتى وصلت إلى ثمانية عشر مترا وأصبحت ناقلات بذراع . وحتى يمكن صرف الأتربة المكونة أساسا من الماء والرمل والطين في هذا الجزء من الخليج بسهولة تم الحفاظ على ميل المصارف في مستوى عشرة سنتيمترات لكل متر (١٠٦) ويهدف قصر الاهتزازات المتوقعة للجرافة المزودة بمصرف أو ناقل بذراع وضعت أثقال لموازنتها .

وكانت نوعية التربة في أقصى الجنوب صلصالية أكثر وضافها أعلى بقليل . لذا تمت زيادة الذراع من ٢٠ إلى ٢٢ متراً وفُرض عليه ميل أقل من ٦ إلى ٨% (١٠٧) وتبين ضرورة تكيف المعدات مع طبيعة الأرض المراد استخراج الأتربة منها ، الطابع الفريد لكل ورشة . عندما عرض

لافالي الترتيبات التي اتخذت في قناة السويس أوصى الحاضرين من جمعية المهندسين المدنيين " ألا ينسوا أن أبسط الظروف يمكن أن تغير النتائج التي حصل عليها " وكان أحدها حجم الرمل المستخرج (١٠٨)

وقد قادت الخبرة المقاولين إلى أن يقترحوا على الشركة زيادة عرض للقناة في الأراضي الموحلة وميل أخف للمنحدرات . وهو ما فعلته . وكان من نتيجة ذلك زيادة المسافة بين الجرافة والصفة وحجم الأتربة في الوقت نفسه . ولمواجهة هذه المشكلة الجديدة ، خطر للافالي أن يزود الجرافة بذراع طوله سبعون متراً . وتكمن المهارة هنا في تنفيذ الفكرة وفي تطبيقها العملي . لأنه لا يمكن أن تتحمل نفس الجرافات سيراً ذراعاً أطول " وشرح للافالي " أنه لا يمكن الحفاظ حتى لو تجاوزنا الحد ، على التجهيزات التي ولت بحاجة السيور الصغيرة " إذ لا يمكن أن يفي تغيير المقياس على أحجام الماكينات القديمة . لذا فإنه توجب إعادة تصميم الجرافة ذات الذراع بالكامل . ولتطبيق الترتيبات الجديدة وجد للافالي مساعدة مهندس الهندسة البحرية لويس لويكوانتر (Louis Lecointre) المعين بوظيفة رئيس المهندسين في شركة مسابك وورش البحر المتوسط التي طلب منها تزويد شركة للافالي عشرين جرافة مزودة بذراع . قدم للافالي براءة اختراع لهذا الذراع الطويل (١٠٩) الذي يشكل مقطعه نصف قطع ناقص (إهليلجي) عمقه ٦٠ سم وعرضه متر وخمسون (سنتيمتراً) . ويحفظ توازنه وثباته ، هيكلاً من سلك معدني ويستند حوالي ثلث طول الذراع إلى صندل من الحديد . وعند الالتقاء بالجرافة تساعد مفصلة أفقية على تغيير الميل وتكفل حركة السير عندما يتلامس من طرف إلى آخر الذراع وقاع المصرف ، يتم إحكام سد الاتصال بقطعة من الجلد مثبتة على المصرف ومشدودة بشريط معدني . فوق الصندل مكبسان مائيان صغيران يعملان يدوياً يساعدان على رفع الذراع وتوصيله إلى الارتفاع المطلوب . وتصبح الجرافة والصندل مترابطين أفقياً بواسطة دعائم وسلاسل وعمودياً بواسطة هياكل من الحديد . ويظهر الجميع أي الذراع والصندل والشبك الذين يراقبونها على شكل جسر معدني ولا عجب من هذا التشابه إذا تذكرنا أعمال للافالي السابقة .

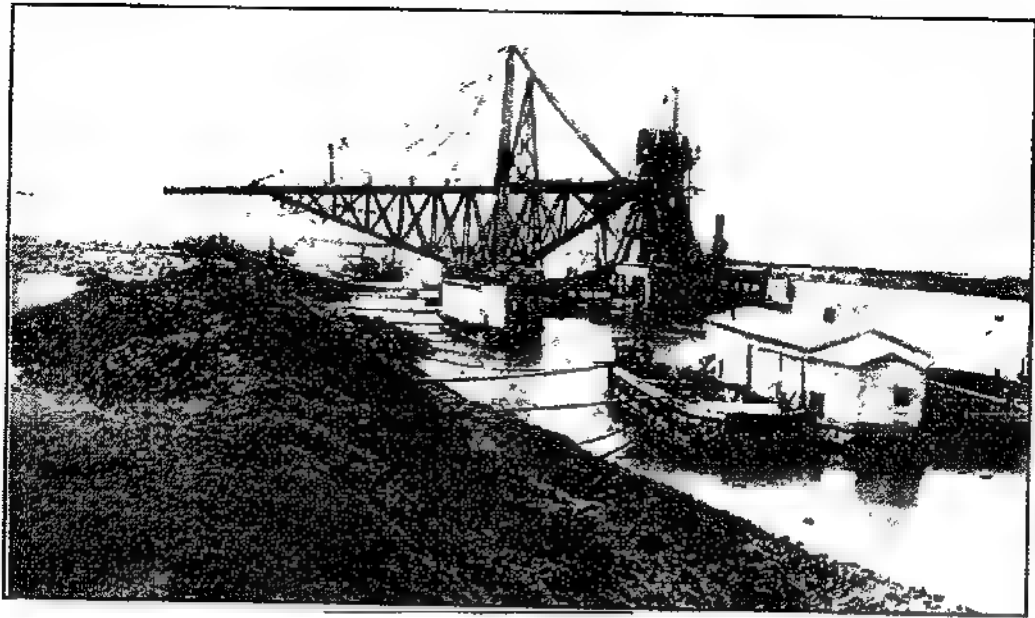

جراثة بذراع طويل


(صورة زانجاكي - متحف البحرية - باريس)

مهما بدا ذلك بديهياً بعد فإن حل الذراع الطويل (قناة التصريف) لم يكن هو الوحيد المعروض قبل وصول شركة مقاولات بورييل ولافاي وشركاؤهما . فقد قامت شركة قناة السويس في الواقع بدراسات لجوانب أخرى و اتجهت خاصة نحو استخدام الرافعات وقدمت طلبات شراء المعدات . وعندما تم التمهيد بأخذ معدات الشركة حاول المقاول الاستفادة من هذه الرافعات ورغم ذلك قرر بعد عدة شهور أن يتخلى بلا قيد ولا شروط عن استعمالها . فقد بدا أنه في الواقع أن هذه المعدات لا تناسب في الحقيقة مع ظروف الخليج . وظهر أن مزايا الجرافة ذات الذراع الطويل أفضل بكثير : " وألغى فجأة الأرناش والصناديق والجسور العائمة للإنزال والعربات والقضبان الخ . وأكد الثقة في نجاح العربة في نقل الأتربة الموحلة والطين البتل والمتفكك بفعل القواديس فذراع الجرافة عضو جامد بلا اهتزاز لا يتأثر بخلل ولا تعرض الجرافة المزودة به للعطب نتيجة انكسار المحور وخروج القطار عن الخط أو عن التأخير في تنظيف القضيب . ومع وجود صنادل يجب إرساؤها يكون العمل ليلاً مستحيلاً . أما مع الذراع الطويل فيصبح العمل سهلاً على ضوء بعض المصابيح وتعمل الجرافة بشكل جيد بالليل كما بالنهار " .^(١١٠)

وفي أجزاء القناة التي كانت الضفاف فيها أكثر ارتفاعاً لم يخاطر المقاول بزيادة ارتفاع الجرافات وفضل البحث عن حل آخر، وطرح المشكلة المراد حلها بهذا الأسلوب " حاولنا تركيب جهاز متحرك في الاتجاه الطولي وثابت في الاتجاه العرضي يمكن أن يحتوي مكعب بسهولة تراب يعادل نصف المكعب المستخرج بالتر الطولي للقناة الموسعة حسب آخر شكل معتمد بدون الحاجة إلى

تكرار العمل ولا النقل بالعربة ويكفي عندئذ استعمال جهاز على كل ضفة ^(١١١) . قام لافالي الذي ساعده فوازان هذه المرة على تصميم الآلة الجديدة بابتكار الرافعة وهي تتكون من كمرتين من الحديد ترتكز علي الضفة وتوضع رأسيًا علي القناة وتحمل هذه الكمرات المصنعة علي هيئة شبكة بفتحات واسعة مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة دعائم منحرفة خطأً حديدياً مائلاً . وتستند في وسطها بشكل مواز لمحور القناة علي عربة وترتكز الكمرات إلي أسفل علي صندل والجزء الأعلي منها بارز . وعلي الخط الحديدي المائل تسير عربة بعجلات خارج هيكل المعدة ويمتد جبل معدني متصل بالخريرة علي طول الجسر المائل ويساعد علي رفع العربة . وتحرك الخريرة بواسطة آلة بخارية مزودة بغلايات توضع فوق الصندل . وعندما يصل المركب حاملاً حاويات مملئة سعة كل منها ٣ متر مكعب من الأتربة ، تتعلق الحاوية بالحبل المعدني الذي يرفعها إلي أعلى السطح المنحني فيتم التفريغ آلياً .

ولقد أخذ في الاعتبار عند ضبط مختلف المعدات ظروف الورشة وخاصة بعد الأشغال عن أماكن تركيب هذه المعدات كما درست جزئيات المعدات بحيث يسهل نقلها ليس فقط بين ورش فرنسا ومصر ولكن أيضاً من بور سعيد حتى المواقع حيث يجب تشغيلها فيها دون الإضرار إلي فكها بالكامل وهذا أمر صعب للغاية ^(١١٢) وقد اتخذ لافالي الخطة بتزويد كل جرافة برافعتين وضعت وجهها لوجه علي الضفتين .

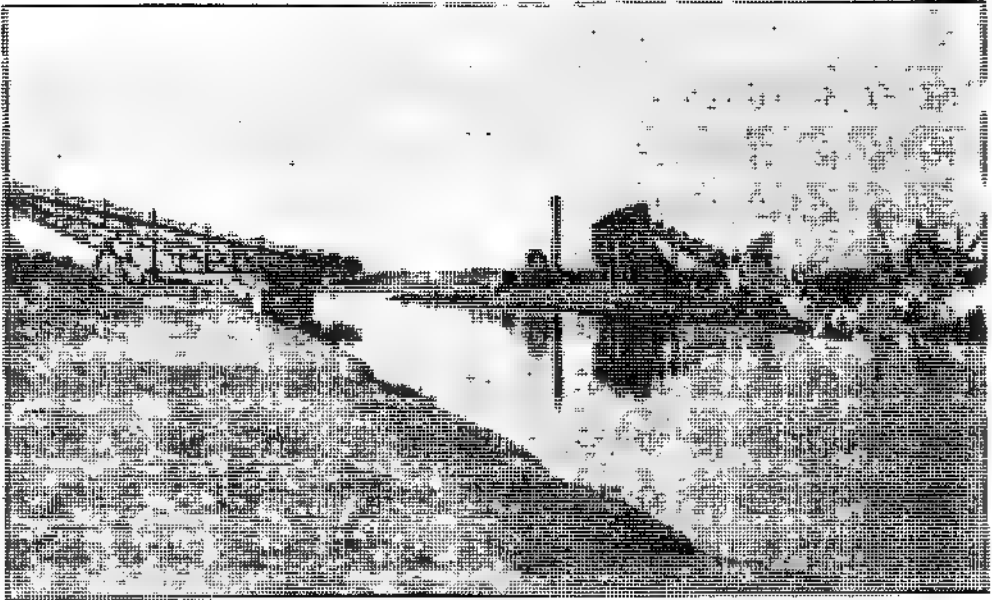

رافعة

(صورة أ. ديريرة - مقتنيات ديجوريغ الخاصة)



تسع كل حاوية ثلاثة أمتار مكعبة . ولنقل حاويات الأتربة تم تطوير " صنادل عائمة " خصيصاً وتم طلب توريدها من شركة جوان . فقد كانت الصنادل المستخدمة فيما سبق لها عيوب كبيرة

فقد كان الماء يتسرب إلى الحاويات من تحت سير ذراع الجرافة عند التعينة وأثناء الحركات الانتقالية . وقد تفادت الصنادل العائمة الجديدة هذا العيب . وقد أظهرت الممارسة هكذا عيوباً من الصعب اكتشافها مبدئياً . وصممت أيضاً صنادل جديدة لتقل إنتاج الجرف في قطاعات قليلة العمق وحلت صنادل بصمامات (clapets) جانبية صنعها جيبير (Guibert) مدير ورش شركة جوان بمدينة نانت (Nantes) محل الصنادل القديمة بصمامات غاطسة ^(١١٣) والمقصود هنا تعديل جديد للمعدات حسب تضاريس الموقع .

وقد تمثل مسعى لا فالي إذاً وهو يحاول توحيد أسلوب العمل - كانت فرضيته في البداية هي أن معظم الحفر يمكن أن ينفذ بطريقة الجرف - في تقسيم الموضوع الرئيسي إلى عدة موضوعات ثانوية . وبقيت الصعوبة الأساسية هي إخلاء الأتربة وأن طبيعة وشكل قاع القناة التي تمر عليها الصنادل هي التي تحدد كلاً من هذه الموضوعات الثانوية . وقد اعتمدت فكرة الحل على ثلاثة عوامل : تحديد واضح ودقيق للأهداف الواجب بلوغها . وملاحظات الميدانية والدروس المستخلصة من التجارب السابقة . وأخيراً فإنه تم ضبط واستكمال التفاصيل في مختلف المعدات مبتكرة بالتعاون الوثيق مع الأطقم التي تعمل عند الصانع - شركة المسابك ورش البحر المتوسط بالنسبة للجرافات الطاردة والآلات الرافعة ، وشركة جوان بخصوص جرافات التفريغ والصنادل العائمة والصنادل ذات الصمامات الجانبية وشركة مقاولات هندرسون وكولبورن وشركاؤهما (Henderson, Coulborn et Cie) وتوماس بولين سيتس (Thomas Bollen Seath) واختيار مقاولات آيتون بالنسبة لمراكب حمل الأتربة .


مركب حامل بصمامات بالقاع للبحيرات والاحواض العميقة — مركب حامل بصمامات بالقاع جانبية للبحيرات والاحواض الضحلة

العميقة



Balais porteur allent à la mer

مركب حامل في البحر

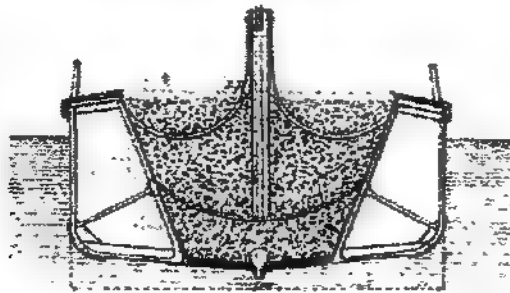

مراكب - حاملات الأتربة


(هوازان : بك الأطلس لوحة ٣٨)

تحسينات ناتجة عن التجربة

بملاحظة العمل وكيف تم القيام به وتحديد الوقت الضائع ومحاولة وضع حد له وبالجهد لفهم أسباب الحوادث عندما تقع ولتجنب تكرارها ، تمكن المقاول بمساعدة موظفيه من مضاعفة المردودية في مختلف العمليات وبصفة معتبرة . وأثناء محاضراته الثانية أمام جمعية المهندسين المدنيين في ٢٦ يوليو ١٨٦٧ لم يُخف لافالي دور التجربة في عملية التحديث "لقد انتهى التعثر الذي كان يسببه دائما تشغيل الآلات الجديدة وخاصة آلات الحفر [...] وقد أظهرت لنا الخبرة الطويلة إلى حد ما هي نقاط الضعف في معدتنا وأوحت لنا ببعض التعديلات" ^(١١٤) شكلت الشهور الأولى لتشغيل الجرارات الطائرة فترة تجريبية . وأوحت الممارسة على الطبيعة بتعديلات كثيرة . ولمعالجة العيوب التي لوحظت عند التشغيل على أرض الواقع ، أضيفت تجهيزات جديدة للمعدات التي وردها المصنعون .


ولأنه قد لوحظ أن انزلاق الأتربة في الأراضي الطينية لا يتم بسهولة في الذراع لذا صممت سلسلة (دون نهاية) دائرية الشكل زودت بهالتات تحميل من الخشب ثم من الحديد . وضعت داخل الذراع و تقوم بتشغيلها آلة الجرافة البخارية . وأيضا لتيسر انزلاق الأتربة على الذراع ، ابتكر جهازاً لتوصيل الماء إليها . وضعت على الصندل آلة تحرك مضخة دافعة للماء في أنبوب مثقوب بكامل طوله بشكل منظم وضع داخل الذراع . و في الأراضي الصعبة تم التحكم في كمية الماء المرسلة إلى الذراع بدقة لأن كثرة الماء ثقله وقد تفصله عن الجرافة ^(١١٥) .

وكان لابد من الإبقاء على نفس الميل تقريبا ليسهل التفريغ في نفس الوقت الذي يتم فيه مد السيور وكان لابد من زيادة ارتفاع الجرافات . وقد أدى حذر الشركة إلى توجيه تعليمات تدريجية . إذ كانت الأربع جرافات الأولى أطول بثلاثة أمتار أي أطول من الجرافات القديمة . وبما أن هذه المعدات قد أعطت عند تشغيلها نتائج طيبة ، فقد تمت زيادة ثلاثة أمتار أخرى في ارتفاع المعدات التي تلتها لتصل عندئذ إلى ١٤,٧ متر فوق سطح الماء ^(١١٦) . فقد ساعدت إذاً الآلات الأولى المصنعة على توفير المعلومات المفيدة للآلات اللاحقة ويوضح هذا المثل أسوة بأمثلة أخرى كثيرة ، طبيعة مسيرة الإبداع . وعلاوة على ذلك ، فإن المقاول أدرك تماما ضرورة حفظ التوازن من جهة بين الوقت والمال اللازمين للتصميم وتنفيذ التجهيزات الجديدة ، وبين العائد الاقتصادي من استعمالها من جهة أخرى ^(١١٧) .

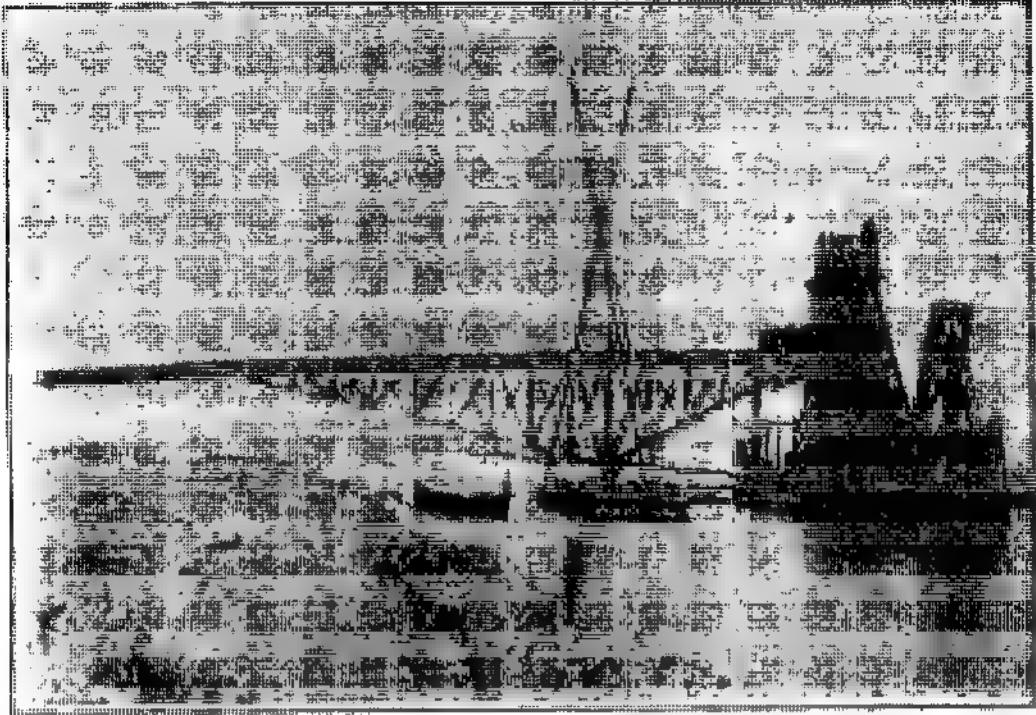

أول جيل من جرافات بليراع طويل

(صورة ل - كوفية ، ١٠ أغسطس ١٨٦٦ ، المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية)

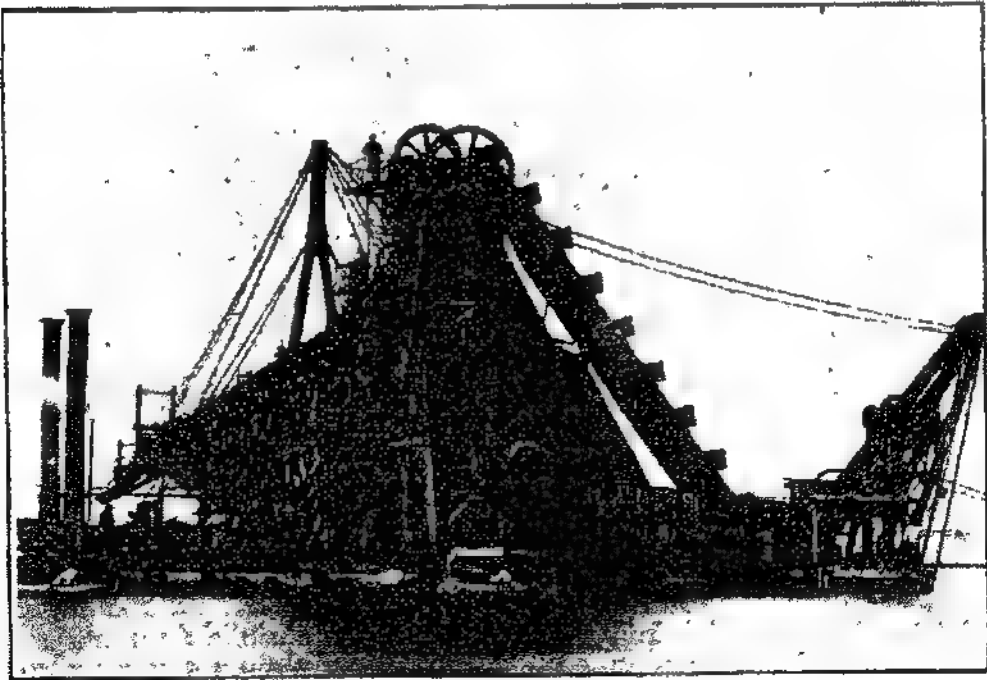

آخر جيل من الجرافات بليراع طويل

(صورة غير معروفة)

لقد أدت الأحداث المؤسفة والحوادث إلى اتخاذ التدابير وأوضحت التجارب خاصة أنه لا بد من تدعيم جزئيات كثيرة لمواجهة الأراضي الصلبة والتي تُبدي مقاومة شديدة فلا بد من تقوية المعدات في النقاط التي تظهر ضعيفة عند الاستعمال . هكذا بدلا من أن يربط الصندل العائم الذي يحمل الذراع الطويل بالجرافة بواسطة كمرتين من الخشب وسلسلتين للجدر أضيفت إليه شبكة من زوايا حديدية بهدف تجنب الانكسار الذي حدث أثناء تشغيل الآلة . كذلك طريقة تعليق الذراع الكبير المكون في البداية من رافعة قوية من الخشب حل محلها كمرة قوية مقوسة من المعدن تشكل إطاراً وتحيط الذراع^(١١٨) .

خلال الشهور الأولى لاستعمال المعدات التي خرجت حديثا من الورش ظهرت عيوب متكررة أثناء العمل في الورشة وكانت الآلات كثيراً ما تتعرض للكسر وهو ما كان يجعلها تقضي في التصليح وقتاً أطول من الوقت الذي كانت تقضيه في الخدمة في الورشة ولم تستن الرافعات ، فقد كانت حبال الجر المعدنية وسلاسل تعليق الحاويات تتحطم وأنايب تزويد الغلايات تذوب بتأثير اهتزازات صندل التحميل والمنحدر الداخلي الحامل لرواسب الجرف الذي ينهار فوق عربة الرافعة الخ^(١١٩) لمواجهة كل هذه المشاكل الصغيرة جاءت شركة المقاولات بحلول طيبة الأمر الذي دعم قطع الآلات الأكثر استخداما وبمضاعفة أحجامها أو باستعمال مواد أكثر مقاومة . وكان من نتيجة الصدمات العنيفة التي تتعرض لها الآلات تحطم التروس وتشقق أوتاد صرة العجلة وتكسر المحاور وكان لا بد حينئذ من استبدال القطع المستهلكة بقطع جديدة أو تصليحها من جديد^(١٢٠) .

تدور السلاسل الجرافة حول قطع تسمى قارنات أعمدة (Tourteaux) . تصنع قارنات الأعمدة العليا والسفلى من الزهر وهي مجهزة في الأصل بزوايا قائمة من الصلب تتحمل جهد الزريدة (حلقة صغيرة) . وقد ظهر في الورشة أن قارنات الأعمدة تمثل أجزاء حساسة جدا . لقد لوحظ تلف كبير للزوايا وأيضاً انفصالها أثناء بعض العمليات وعندئذ تحل إعطاء القارنات أشكالاً جديدة :

" لاستبدالها لا بد من ثقب زوايا جديدة وتثبيتها بمسامير ويحتاج هذا الاستبدال غالباً إلى ثلاثة أو أربعة أيام وكان هذا الوقت الضائع يتكرر مرتين في الشهر . وعندئذ تم صنع قارنات حلت بدلا من الزوايا ، فيها قضبان بمقاطع مربعة من الفولاذ الصلب أدخلت في ثقب بنفس الشكل تم تشكيله في المسبك الذي يصب القارنات وبهذا أصبح التلف قليلا وعندما تضعف الزاوية يكفى سحب القضيب لوضعه مكانه من جديد بعد القيام برقع لفة (بخرطة) . وتستند الحلقات بين القضبان المربعة على صفائح من الفولاذ ثبتت فقط بمسامير برومة على قارنات الأعمدة واستعمل الحديد عامة من أجل القارنات العليا : ولذا فقد أمكن بسهولة استبدال النموذج الأول . وقد تم ترك القارنات

السفلى كما هي في الجرافات الأولى لأن التغيير أدى إلى تعديل الأنبوب الشفط . وفي الجرافات الجديدة زادت العناية كثيراً بالقيام بكل الترتيبات لاستعمال مقصور على القارنات المجودة دون غيرها « (١٢١) » .

خضعت قواديس الجرافات أيضا لتعديلات هامة . وتم ثقب أول قواديس الجرافات الكبيرة في القاع وفي الجدران الجانبية حتى تسهل تسرب الماء . ولكن أثبتت التجربة أن هذا الإجراء يمثل عيوباً أكثر من المزايا وتم سد معظم الثقوب بواسطة خوابير من الخشب . وتم صنع القواديس الجديدة من لوح معدني ملئ سمك ١٢ ملليمتر على كل الواجهة وزود بمسكة من الصلب سمك ٣٠ ملليمتر . علاوة على ذلك، زادت سعة الجرافة من جيل إلى آخر إلى أن وصلت في ١٨٦٦ إلى سعة أربعمائة لترا .

لم يكف المقاول عن تحسين الآلات التي يستعملها . فالظروف الخاصة لهذه الورشة والتفكير في مقتصد دفعاه إلى ذلك : " عامة في فرنسا وفي إنجلترا تُصنع الجرافات قرب ورش التشيد وتتوفر كل الوسائل الممكنة للصيانة ويمكن أثناء توقف الآلات تسريح الطواقم التي من الممكن دائماً إعادة تشكيلها من جديد . لذا لم يكن ضرورياً بالنسبة للمقاولين تخفيض مصاريف صيانة الجرافات على أدنى حد . أما نحن فظروفنا مختلفة ، فالعمال الذين يعملون على جرافاتنا لا نستطيع تسريحهم وإن فعلنا لا يمكننا استرجاعهم . ولم يكن لدينا سوى وقت محدود جداً لإنجاز العمل . وتضاف كل يوم نفقات ضخمة لاستهلاك الآلات لذلك يجب ألا نتوقف جرافاتنا مهما كان الثمن . لذا نفحص بكل اهتمام أجزاء الجرافات الأكثر تلفاً ونحاول تحسينها دون انقطاع ، مدركين أن كل تحسين سيعود علينا مضاعفة مائة مرة المصاريف التي صرفت عليه « (١٢٢) » .

وعلى سبيل المثال يشرح المقاول بوضوح حالة المسامير اللولبية رغم بساطتها : " أول الجرافات التي وصلت لشركة القناة لها مسامير رباط دعم سلسلة القواديس بعضها من الحديد والآخر من الصلب الطري . وكان المسامير الذي سمكه ٥ سنتيمتراً يستهلك بسرعة في رسال بورسعيد وكنا نستمر إلى أن ينكسر أول مسامير لولب لينبها إلى ضرورة التوقف لأنه لو المسامير الثاني المقابل انكسر لوقعت السلسلة في الماء . وتصل إلى الهلاك كل المسامير تماماً بعد ١٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ متر مكعب وبالرغم من المهارة التي اكتسبها رجالنا كان يلزم ثلاثة أو أربعة أيام لتبديل هذه المسامير ، بيد أن ثلاثة أيام تمثل لنا انقفاً من ٩٠ فرنكاً أي مائة فرنك يومياً للعاملين بطاقم الجرافة علاوة على مبلغ يبدأ من ١٢٠ فرنك إلى ١٥٠ فرنك لعمال نقل الطين فكان يضع من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ فرنكاً في اليوم كأجور فقط ويمثل الاستهلاك ضعف المبلغ فخلال الأيام الثلاثة المعطلة كان يمكن للجرافة إنجاز على الأقل ٣٠٠٠ متر مكعب . وكان لابد تقليل هذا


التلف مهما كان الثمن وقد بدلنا كل سلاسل الجرافات القديمة بوضع حلقات أقوى ومسامير أضخم وأقوى وقواديس أكبر ، واستبدلنا المسامير من الحديد بمسامير من الصلب الأكثر متانة ممكنة . محيط المسامير ٧ سم ستيمتر ورؤوسها مثلثة والفتحات يتم وضع تثقيب لها ويدخل فيها رأس المسامير ويحدث من جراء ذلك انفخاخ للفتحة التي وضعنا عليها ورد معدنية أردنا أن تكون متينة لتلافي ذلك العيب . لاحظوا أن هذه المسامير لا تلف إلا في جزء من محيطها بقدر الثلث تقريبا وبعد هذا التلف المعين تلك المسامير ونعيدها إلى مكانها بعد أن نخرطها ثلث لفة وبذلك استطعنا استعمال نفس كمية المسامير دون تغييرها لتنفيذ ٣٧٠٠٠ متر مكعب . ونأمل تحسين الكمية .^(١٢٣)

كذلك اتضح ضعف معظم حاملات الأتربة والمفصلات والرزات (مسمار أجوف الرأس) بحيث لزم استبدالها بقطع أكثر متانة^(١٢٤) وساهم المستخدمون وطواقم الجرافات بملاحظاتهم وغيرهم في تحسين المعدات .

و لم يؤخذ في الاعتبار عند دراسة ظاهرة التلف هذه أن هناك عاملاً آخر ألا وهو الرمل . لقد أحدث بنوعه القسوى في بعض أجزاء الآلات أثر احتكاك يشبه الصنفرة^(١٢٥) بالإضافة إلى ذلك ، لوحظ ضرر آخر وهو أنه له القدرة على الانزلاق من كل الثغرات ومن هنا صعوبة ضمان إحكام أبواب حاملات الأتربة . وقد غطت المفاصل بشرائط من الجلد أو المطاط لتجنب الخسائر التي تحدث^(١٢٦) .

علاوة على إدخال التحسينات فقد كان تنفيذها في خليج السويس هو الذي يثير مشكلة للمقاولين . إذ يتطلب القيام بتعديلات علي الماكينات بوجود ورش ميكانيكية حقيقية مجهزة بالآلات ومنظمة وكما يتطلب تعيين متخصصين بما فيه الكفاية وذوي خبرة . ويجب أن تتم التصليحات بسرعة لأنها تعطل الآلات . ومع التجربة عرفت شركة المقاولات تدبر احتياجاتها المستقبلية من قطع غيار بشكل جيد لكي تزود بها مخازنها ، بينما يكتسب العاملون بالضبط والتركيب خبرة تمكنهم من العمل بسرعة أكثر وأفضل^(١٢٧) في ورش بوسعيد التي يديرها إدمون لافالي (Edmond Lavally)^(١٢٨) أخو اسكندر ، الذي شخصت ككاساً واسعاً لإصلاح قواديس الجرافات وتطلبت هذه المهمة وحدها في عام ١٨٦٨ أكثر من ٤٠٠ رجلاً .

لقد تطلب الأمر ما يقرب من متين من المحاولات والتكيف لتشتت شكل الآلات المختلفة وتمكين شركة المقاولات من الوصول إلى مردودية التي لم تكن تتخيلها قبل بضع سنوات . فقد نتجت الآلات الحديثة إذاً عن مسيرة بطيئة ومتوالية بل أيضاً عن عمل جماعي فقد تم إعدادها تدريجياً على الر ملاحظات دقيقة وتبادل وجهات نظر شارك فيها مصممون وصناع ومستخدمون .

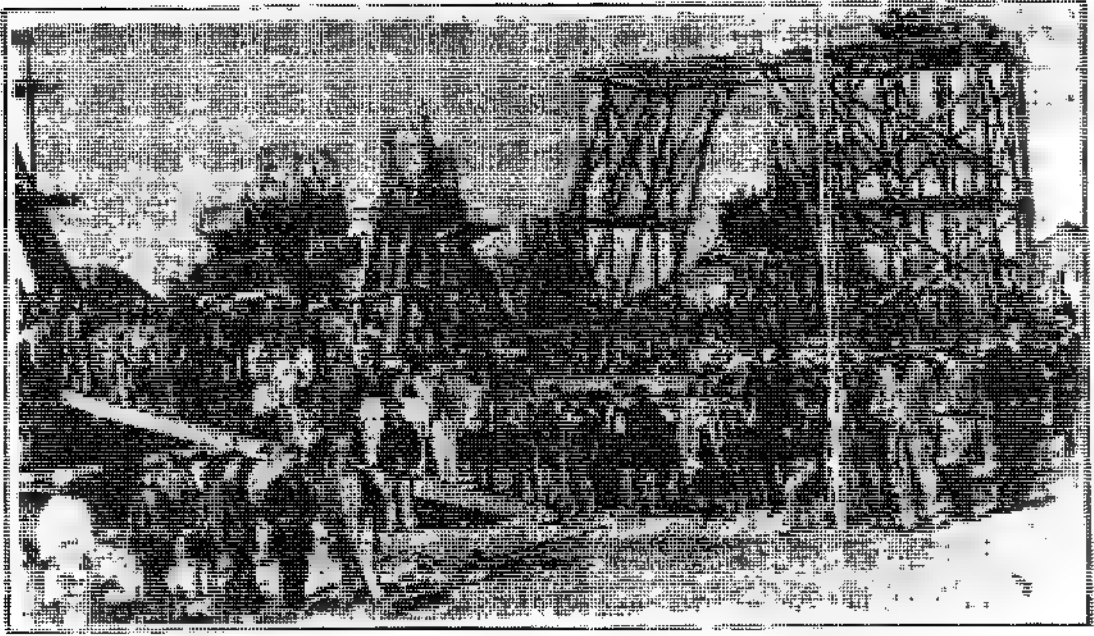


ورش بور سعيد

(صورة ج. كورلوفسكي - مقتنيات أ. فيتش الخاصة)

فقد كان ذلك كله نتيجة لدراسة إشباع الاحتياجات وتصويب الملاحظات الدقيقة لسوء التشغيل وإثراء ممارسات طويلة سابقة للميكانيكا دون أن يكون هناك في البدء عنصر ثوري أو اختراع مهم فالتحسينات التي قدمها لافالي في تشغيل الجرافات ترجع إلى التكيف مع ظروف خليج السويس وإيجاد الحلول العبقريّة لحل المشاكل التي ظهرت في الورشة وصفاته كرئيس فرقة ضبط المعدات كل هذا جعل من لافالي بطل الاختراعات الميكانيكية في هذه الورشة . وقد قدرت أكاديمية العلوم هذا الدور عندما منحتة جائزة مونترون (Montyon) للميكانيكا في عام ١٨٦٨ (١٢٩) .

هل كان من الضروري اللجوء إلى الآلات ؟ لقد اتفق الفاعلون وكذلك المفسرون لأشغال ورشة قناة السويس في القول إن بعد رحيل عمال السخرة كانت الميكنة هي الحل الوحيد المحتمل لإتاحة استمرار الأشغال . ولم يتفق إلا واحد على الأقل مع هذا الرأي وهو شارل كوتارد (Charles Cotard) الذي ساعد لافالي في الأشغال أثناء ورشة القناة على طول الخط . وحسب رأيه فإنه وإن كانت الحلول التي تبناها لافالي متميزة ببراعتها فإنها مع ذلك لم تكن الأكثر اقتصادية والأكثر ضمانا (١٣٠) ولكي يدعم هذا الاقتناع ذكر بصدد الجزء الجنوبي من الخليج أنه ألح حتى لا تفرق الأراضي وكي تنظم ورش الحفر بمناهج أكثر تقليدية . واستطاع أن يبرر أفكاره وأقام ورشا من عربات اليد (بدولاب واحد) والقفف والجمال والعربات الصغيرة التي تجرها البغال . وثبت أنه على حق حين أثبت العثور في مرحلة لاحقة على أراضي صخرية وتم تعميم هذه الأساليب حتى سهل السويس . فماذا كان سيحدث لو أغرقت هذه الأراضي بالماء والتي كان

مستحيلاً أن تعمل فيها الجرافات ؟ " الخلاصة أن حفر القناة تم تنفيذها على الناشف في كل الجزء الجنوبي كما أمكن القيام به في السرايوم وفي مواقع أخرى دون معدات باهظة الثمن ودون عمل متخصصين " (١٣١) أما بالنسبة للأيدي العاملة فقد أوضح أنها لم تقل عن التدفق عندما علم العمال أنهم سيحصلون على أجورهم بدلاً من السخرة . وإن كانت الميكة قد تطورت في ورشة قناة السويس فهي إذاً في نظره لأن الفكرة الخاطئة بعدم إمكانية توظيف الأيدي العاملة قد فرضت نفسها وأن ميكانيكياً مثل لافالي قد تفنن في إيجاد حلول للمشكلة . وتؤدي التفسيرات التي قدمها كوتار (Cotard) إلى توضيح الفكرة القائلة بأن الحتمية الاقتصادية كانت الدافع الوحيد للابتكار . في الحقيقة إن كان لافالي قد صمم وجوّد المعدات الميكانيكية الجديدة فلأنه كان يعتقد بأنه ليس لديه حل آخر وليس لسبب اقتصادي محض . ففي الواقع، لم تكن قد تمت أي دراسة مقارنة لحساب العائد بالنسبة لطرق العمل المختلفة . وبكل بساطة اكتسب لافالي خبرة في مجال الميكانيكا وهي التي استخدمها للتغلب على الصعوبات .

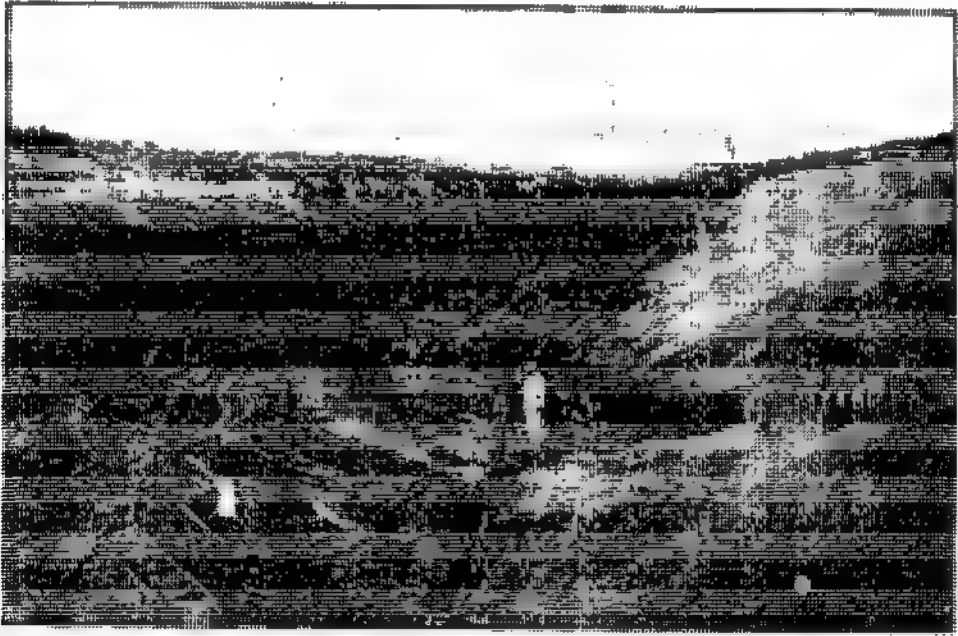

ورشة حفر بعربات صغيرة وبغال وجمال

(صورة أ. ديزيره - مقتنيات دييجوريج الخاصة)

إن الابتكارات التي برزت للوجود في ورشة قناة السويس إذاً تتعلق خاصة باستعمالات حديثة لبعض المواد ولكن أيضاً بالتنظيم المكاني وبميكة الورش . أما عنصر تكرار الحفر والفرض غياب الأيدي العاملة فقد مكن من عملية دخول الآلة فعلاً إلى قطاع الأشغال العامة . كما أن الظروف الخاصة لهذه الورشة وخاصة الأتربة الضخمة دفعت المقاولين إلى إحكام وضبط طرق قديمة وتحسين ماكينات موجودة بل أيضاً خلق أجهزة غير معروفة تماماً بل والقيام بأضخم تركيز لمعدات الحفر التي لم يعرفها العصر وكذلك تصميم استخدام البخار والمعدن من حديد وزهر وصلب .

هواش الفصل الخامس

بداية عصر الميكنة

- 1) Fernand Braudel et Eugène Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, 1976, rééd. Puf/Quadrige, 1994, p. 496.
- 2) Ibid , p. 497.
- 3) Henri Silvestre, L'isthme de Suez (1854-1869), P., Librairie internationale, 1869, p. 250.
- 4) Maurice Daumas (sous la direction de), Histoire générale des techniques, tome 3 : L'expansion du machinisme, P., Puf, 1968, 884 p.
- 5) Denis Woronoff, Histoire de l'industrie en France du XVIe siècle à nos jours, P., Seuil, 1994, p. 319.
- 6) E. Mougel et A. mouchelet, op. cit., préface.
- 7) C. A. Oppermann, op. cit., p. 135. Proposition n° 105, décembre 1858.
- 8) Notamment E. Flachet et L. Molinos, « Notes sur le rapport de la commission internationale pour le percement de l'isthme de Suez », MCSIC, 1857, p. 45.
- علي الأخص ١. فلاشا ول. مولينوس " مذكرات عن تقرير اللجنة الدولية من أجل حفر خليج السويس". MCSIC, 1857, p. 45.
- 9) AN 153AQ/1609. Lettre de Mougel à Ungo Calindri, ingénieur à Turin, via San Filippo n°6, 23 mai 1859.
- 10) AN 153AQ/1608A رسالة من موجيل إلى فوزان ، فبراير ١٨٦١
- 11) AN 153AQ/INJ121 . تكبدت الشركة مصاريف وصرفت ١٥٠.٠٠٠ فرنكاً لتصنيع الماذج فحسب.
- 12) AN 153AQ/TE129.
- ١٣) - أوجين موجيل " دراسة عن تراكم الرمال على الشواطئ وخاصة شاطئ بايون مقارنة بإيقاع شاطئ تل القرم "
- in de Lesseps, Percement..., op. cit., 5^e série, 1860, pp.305-341
- 14) AN 153AQ/1678A.
- 15) AN 153AQ/TE129.
- ١٦) - المصدر : المعهد القومي لحماية الصناعة . تم عمل هذا الهيكل بناء على نتائج فرز منظم لقوائم السراءات السنوية الخاصة بآلات الحفر ونقل الردم في فرنسا في الفترة بين ١٨٥٥ و ١٨٦٩ . وقد أخذ في الأسلوب عند الفرز الكلمات الرئيسية التالية : حفارة ، الردم ، جرافة ، آلة جرف ، جهاز جرف الردم .
- 17) AN 153AQ/TEP18.
- 18) C. A. Oppermann, op. cit., p. 80. Proposition n° 44, janvier 1858.
- ١٩) - أوجين فلاشا : " تقرير جلسة ٧ أقيمت ١٨٦٤ "
- MCSIC, 1864, p. 189-

20) Elphège Baude, Percement de l'isthme de Suez. Exposition universelle de Paris, 1867. Extrait des rapports du jury international publiés sous la direction de Michel Chevalier, P., Dupont, 1867, p. 196.

(٢١) لاحظ استعمال طارئ لحفارة عرفت تحت اسم « machine à bottes » « آلة بأرجل وقد نشر أحيانا الرسم ومعه مؤلفات التقنية ولكن لم تثبت فاعليتها عند الاستخدام

22) M. Benazzé, « Compte rendu d'une mission en Angleterre », Mémorial du génie maritime, 1866. Date confirmée par Armengaud Aîné dans publication industrielle des

23) AN 153AQ/1619A. Rapport de stage Agnellet et Picard, 1867.

24) Armengaud Aîné, loc. cit.

25) AN 153AQ/1619A. Rapport de stage Agnellet et Picard.

(٢٦) يقصد بكلمة الفرفة كل التحركات البسيطة التي يؤديها السائق بالحفارة بواسطة أربعة سلاسل لتظل الآلة في وضع ما لكي تحفر بالتعاقب كل عرض مقطع القناة .

(٢٧) لآفالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ في جمعية المهندسين المدنيين "

L'isthme de Suez..., 1866, n° 247, p. 327

28) Charles Poiré, Mémoire sur les travaux de la mer comprenant l'historique des ouvrages exécutés au port d'Alger et l'exposé complet et détaillé d'un système de fondations à la mer, au moyen de blocs de béton, P., Carilian, 1841, 152 p.

29) Pavin de Lafarge, Notice sur les chaux éminemment hydrauliques de Lafarge, P., Dupont, 1878, 54 p.

(٣٠) - مكتبة ENPC مدرسة الطرق والكباري مخطوط ملف Q تقرير عن حالة كتل أرضية بور سعيد ٣ ١٨٧

31) A. Debaube, Manuel de l'ingénieur des ponts et chaussées, 19^e fascicule : « Des eaux comme moyen de transport », P., Dunod, 1878, p. 597.

32) Cyrille Simonnet, « Le béton Coignet - Stratégie commerciale et déconvenue architecturale », Les cahiers de la recherche architecturale, n° 15, 1992, p. 17.

(٣٣) - تحت اسم المونة الاقتصادية . براءة بتاريخ ٢٩ مارس ١٨٥٥ . رقم ٢٢٩٥٩

34) AN 153AQ/1610A.

35) AN 153AQ/TEP3.

36) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 116.

37) AN 153AQ/TEP3 - تقرير قدمه مهندسو الشركة العالمية لقناة السويس البحرية بوزارة الأشغال العامة عن ثبات بناء المنارة. ١٨٨٠

38) AN 153AQ/TEP3.

(٣٩) - أخذ البراءات لاستخدام المونة على التوالي في الصوامع لتخزين الحبوب والطوب الصناعي والأشغال في البحر والمواسير في المدن .

- ٤٠) مع آخرين وخاصة سيمونية op. cit., p. 20.
- ٤١) في هذا المجال أيضاً كان هناك من سبق كوانيه انظر بصدد هذا الموضوع Peter rs Collins, Concrete The vision of new architecture - A study of Auguste Perret and his precursors, chapter one : Béton, London, Faber and Faber, 1953, p. 29. Traduction française : Spendeur du béton, P., Ed. Hazan, 1995.
- ٤٢) انظر صورة مطبوعة على حفر أعاد نشرها فيرنان بروديل
- Civilisation matérielle, économie et capitalisme, Xve-XVIIe siècle, tome 1 : Les structures du quotidien, P., Armand Colin, 1979, p. 337.
- 43) E. Mougel et A. Mouchélet, op. cit., 3^e livraison.
- 44) Ernest Endrès, Manuel du conducteur des ponts et chaussées, P., Mallet-Bachelier, 1859, p. 175.
- 45) Auguste Colin, Compagnie de l'isthme de Suez, P., Impr. Renouard, 1846, p. 4.
- ٤٦) - قامت مؤسسة جالبار في ليون بتصنيع حفارات كوفر و العربات بمصانع لوازين وتوشان بباريس وجاءت القاطرات من كروزو
- ٤٧) المقصود أسماء عمال المقطوعة الذي كلفوا بمختلف الورش التي تشمل حصة كوفر.
- 48) M. Krantz, « Sur divers procédés employés pour la fabrication du mortier et du béton sur les chantiers du port d'Alger », APC, 1844, tome 2, p. 304.
- 49) Raucourt de Charleville, Traité sur l'art de faire de bons mortiers et d'en bien diriger l'emploi, ou méthode générale et pratique pour fabriquer en tous pays la chaux, les ciments et les mortiers les meilleurs et les plus économiques, P., Malher, 1828.
- 50) Charles Babbage, Traité sur l'économie des machines et des manufactures, P., Bachelier, 1833, p. 278.
- 51) Charles Denoyer, Liberté au travail, 1845, tome 2, p. 378.
- 52) Latour et Gassend, travaux hydrauliques maritimes, Marseille, Impr. Barile, 1860, pp.5-6
- 53) Ibid., p. 96.
- 54) Victor Cadiat, de la situation des travaux du canal de Suez en février 1868, P., Chaix, 1868, p. 16
- 55) AN 153AQ/1610B. الحالة العامة للأشغال في ١١ مارس ١٨٦٥
- 56) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 195.
- 57) Ibid., p. 197.
- 58) V. Cadiat, loc. cit.
- 59) AN 153AQ/1623B.
- ٦٠) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p. 234. بمناسبة الزيارة التي قام بها في خليج السويس في ١٨٦٣ قدم الأمير نابليون مركب بخاري هدية لفوزان " الذبابة " هذا القارب الذي صنعه

مازيلين في الماهر هو أول مركب بحاري . وسوف يكون موضع دراسة سوف تؤثر في اختيار المعدات التي ستطلبها الشركة فيما بعد لنقل العاملين والمسافرين.

تقارير مدير عام الأشغال الشهرية. مايو ١٨٦٦ إلى ديسمبر ١٨٦٧ AN 153AQ/1610B 61)

تقرير ل مونتي - AN 153AQ/TE1 62)

٦٣) مصدر : AN 153AQ/N279 . عرض وطول منسوب الماء بالمتر وطاقة القواديس بالتر والطاقة بحصان بحاري .

٦٤) - ألافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٨٦٨ جمعية المهندسين المدنيين

L'isthme de Suez..., 1869, p. 81

٦٥) -N 153AQ/1619A - تقرير أنجليه ويكار ص ٣٨٧ - ٤٩٩

٦٦) - AN 153AQ/1611A . - تقارير مدير عام الأشغال الشهرية سنة ١٨٦٩

٦٧) AN 153AQ/1610A.

٦٨) AN 153AQ/TE129.

٦٩) Lobnitz, Lecture faite à Glasgow de la situation des travaux du canal de Suez et sur l'avenir de l'entreprise, P. , Chaix, 1868, p. 10 .

٧٠) L'isthme de Suez..., n° 282, p. 124.

٧١) - ألافالي " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ ". op. cit., p. 347.

٧٢) Jules Fleury, « Notice nécrologique sur M. Alphonse Couvreur », MCSIC, juillet 1890. Tiré à part, 2 p.

٧٣) Alphonse Couvreur, Excavateur pour grands travaux de terrassements, ponts, canaux, tranchées, etc., P., Blot, 1878, p. 3

٧٤) Ibid.

٧٥) A. Castor, Recueil des machines à draguer et appareils élévatoires, 1^{ère} édition 1856, 19 p. et A. Castor, RRecueil d'appareils à vapeur employés pour travaux de navigation et de chemins de fer, 1860, 127 p.

٧٦) Source : INPI.

٧٧) AN 153AQ/1618B رسالة من كوفرو ، أغسطس ١٨٧١

٧٨) AN 153AQ/1609.

٧٩) AN 153AQ/TE145.

٨٠) AN 153AQ/1618B.

٨١) AN 153AQ/TE142 . - رسالة من كوفرو إلى ليسبس ، مايو ١٨٦٣

٨٢) AN 153AQ/1610B . تقرير شهري للأشغال ، أكتوبر ١٨٦٣

(٨٣) محفوظات مديرية كورتيزون.

(٨٤) تقدم بالشكر ل محفوظات غرفة التجارة بمرسيليا التي أتاحت لي الإطلاع على هذه المعلومات

85) Dussaud et Rabattu, Ville de marseille, port de Prado et tunnels de communication avec la ville et la banlieue sud, Marseille, 1881, p. 8.

86) AN Dossier LH 877/73.

(٨٧) إدمون لافالي : " إسكندر لافالي . مذكرة عن حياته وأعماله " Edmond Lavalley, « Alexandre Lavalley. Note sur sa vie et ses travaux (1821-1892) », MCSIC, 1892, tome 2, p. 1002.

(٨٨) لمزيد من المعلومات يرجع إلى نتالي مونتيل : " إسكندر لافالي . المهنة مهندس مدني "

Nathalie Montel, « Alexandre Lavalley. Profession : ingénieur civil », Histoire, économie et société, 2^e trimestre 1995, pp. 215-228.

89) L. Molinos et C. Pronnier, Traité théorique et pratique de la construction des ponts métalliques, P., A. Morel, 1857, p. 124.

(٩٠) - المعرض العالمي لسنة ١٨٥٥ . تقارير هيئة التحكم الدولية المختلطة . ١٨٥٦ ص . ٨٣٨ .

(٩١) AN 89AQ . محضر الجمعية العامة لمقاولات أ . جوان وشركائه ١٠ يناير ١٨٦٣ .

92) AN153AQ/INJ21.

93) Voisin Bey, op. cit., tome 5, p. 12.

(٩٤) تم حصر اشغال المقاول كورفو التي شملت في البداية المواقع في الكيلومترات ٦٠,٥ و ٧٥,٥ بعد ذلك على الجزء بين مواقع ٦٦,٧٢ و ٧٥,٤٠ . وقد كان حجم الحفر المراد تنفيذه عندئذ أكثر من أربعة مليون متر مكعب ينفذ على الجفاف ومائتي متر مكعب رفع الانقراض تحت الماء .

(٩٥) لم يكن الحجم بعد تسوية الأراضي نفس ما كان في البداية . حسب ما يؤخذ أحجام الأراضي من مكافئ الأصلي أو بعد الردم نحصل على أرقام مختلفة . بالنسبة للنقل فإن حجم التراب المزاح هو ما يؤخذ في الأسلوب . تحسب الشركة من جانبها الكميات التي حققتها الشركة المقاتلة حسب اختلاف مقياس الخندق قبل وبعد الأشغال . النسبة المتروكة للانتفاش التي قدرت في الأصل بنسبة ١٠ ٪ و رفعت بعقد إضافي حديد إلى ٢٠ ٪ .

(٩٦) غير ذلك بالإضافة إلى أشغال الحفر والجرف ، كلفت هذه الشركة للمقاولات كذلك بعمليات إضافية مثل ملء البحيرات المرة وبناء ثلاثة هواويس من البناء في فرع السويس من ترعة الماء العذب التي نكتفي بذكر أهمها .

97) AN 153AQ/TE147.

98) A. Lavalley et A. Rostand, Des chemins de fer métropolitains, P., G. jousset, 1870, 14 p

99) A. Lavalley, « Percement d'un tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre », Bulletin de la Société d'encouragement de l'industrie nationale, t. 74, 1875, pp. 185
196, A. Lavalley, « Communication sur les recherches et les sondages sous-marins

exécutés dans le détroit du Pas de Calais, en 1875, en vue du tunnel entre la France et l'Angleterre », MCSIC, 1875, p. 84 et pp. 765 – 777 et A. Lavalley et al., Rapports de la commission géologique pour les études du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, P., P. Dupont, 1877, 15 p.

- 100) AN 153AQ/1610B. - تقارير شهرية للأشغال لعامي ١٨٦٥ و١٨٦٦
- 101) AN 153AQ/TE145.
- 102) AN 153AQ/1610B. . تقرير المدير العام للأشغال . ١٧ يونيو ١٨٦٥
- 103) AN 153 AQ/TE129
- 104) AN 153AQ/1618B تقرير المدير العام للأشغال . ١٧ ١٩ سبتمبر ١٨٦٥
- (١٠٥) تقرير مهندسي الشركة في ٢ سبتمبر ١٨٦٥ . in Voisin Bey, op. cit., tome 6.2, p. 144. .
- (١٠٦) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ " . . op. cit., p. 327. "
- 107) Ibid., p 328.
- 108) Ibid., p. 329.
- 109) INPl. Brevet n° 72 614, 16 août 1866.
- (١١٠) - إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ " . . op. cit., p. 338 "
- 111) Id.
- 112) A. Morin, « Rapport sur le concours de l'année 1868 », Compte rendu de l'Académie des sciences, tome 68, p. 1347.
- (١١٣) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ " . . op. cit., p. 343 "
- (١١٤) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢ يوليو ١٨٦٧ " . . أمام جمعية المهندسين المدنيين.
- L'isthme de Suez..., 1867, p. 265.
- (١١٥) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ " . . op. cit., p. 338 "
- 116) Paul Borel, Note sur les dragues à vapeur employées au creusement du canal de Suez, P., renou et Haulde, 1867, p. 4
- (١١٧) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ " . . op. cit., p. 338 "
- 118) AN 153AQ/1610B. . تقرير المدير العام للأشغال أبريل ١٨٦٧
- 119) AN 153AQ/1610B . تقرير رئيس قطاع بحيرات البلاح يونيو ١٨٦٧
- (١٢٠) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٨٦٧ " . . op. cit., p. 277.. "
- (١٢١) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٨٦٨ " . . op. cit., p. 82.
- (١٢٢) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٨٦٨ " . . op. cit., p. 82

- (١٢٣) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ .
op. cit., p. 351 "
- (١٢٤) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٨٦٧
op. cit , p. 267..
- 125) AN 153AQ/TE148.
op. cit , p. 270 " (١٢٦) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٨٦٧
- (١٢٧) إ. لافالي : " مداخلة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٨٦٧ "
op. cit , p. 270.
- (١٢٨) أصغر من أخيه الوحيد بخمس سنوات، لم يكن إدمون ، حسب علمنا ، حاصلاً على أي مؤهل دراسي .
129) A. Morin, op. cit., p. 1348.
- 130) Charles Cotard, Lettre à M. Félix Paponot, au sujet de sa brochure : « Panama canal à niveau, son achèvement possible en cinq ans... », 10 octobre 1892. Tiré à part, extrait de l'Union républicaine de la Nièvre, P. T. Chamerot et Renouard, 1892, p. 1.
- 131) Charles Cotard, Lettre à M. Félix Paponot, au sujet de sa brochure : « Panama canal à niveau, son achèvement possible en cinq ans... », 10 octobre 1892, p. 3.

الفصل السادس

التحديث التقني : عمل المقاولين

إن كانت شركة القناة قد لجأت إلى المقاولين فذلك لأن تجربة الإدارة العامة المباشرة أثبتت لها عدم قدرتها على أن تأخذ على عاتقها مباشرة إنجاز الأشغال . وكان هذا العجز له صفة كبيرة وجزئياً في بعض الحالات بتطبيق طرق التقنية الحديثة . وظهرت أول إشارة إلى ذلك في أشغال ضخ المياه بواسطة أنابيب من الزهر وأشغال الآلات البخارية التي كان لابد من تكليف المقاول شارل لسيرون (Charles Lasseron) بإنجازها في يوليو عام ١٨٦٢ . وتقدم أشغال ميناء بورسعيد مثلاً آخر فقد تم اتخاذ قرار تنفيذ أرصفة الميناء ليس وفق الطريقة التقليدية ولكن باللجوء إلى الكتل المصنعة سابقة التجهيز ، وقد أدى ذلك في الواقع إلى أن تسند الشركة أعمال ورشة ميناء بورسعيد إلى شركة مقاولات الأخوة ديسو . ولكن بدت الظاهرة أكثر وضوحاً مع أعمال الحفر . وفي الحقيقة تبين عند توقف إرسال الفلاحين أن استعمال الآلات ضرورة لا مفر منها ، واضطرت الشركة بعد فشل المحاولات العديدة التي قامت بها لتصميم ماكينات حديثة إلى إسناد الأمر إلى المقاولين الذين قبلوا التحدي سواء في حالة تنفيذ الكتل المصنعة سابقة التجهيز أو تصميم الآلات . وتساعد الدراسة الخاصة بفشل الشركة ونجاح المقاولين على إدراك أفضل لعمليات التحديث التقني في الأشغال العامة وحوافزها ومعوقاتها .

وقد بدا لنا ممكناً تقديم عدة عوامل إيضاحية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتصرفات وبسمات ثقافية وبذهنيات تجاوز تأثيرها حالة ورشة قناة السويس الخاصة بكثير . وإن كان لابد من إسناد عدم مقدرة الشركة عن التحديث إلى أعضائها وعلى رأسهم مديرها العام ، فيجب أيضاً اعتبار أن هذا العجز يرجع بصفة خاصة لظاهرة أكثر عموماً وهو الدور المتواضع الذي لعبته إدارة الطرق والكباري الفرنسية في مجال تحديث الأساليب الفنية في منتصف القرن التاسع عشر .

ففي الواقع ظهرت سلوكيات مرتبطة بثقافة مهندس الطرق والكباري في الإمبراطورية الثانية كمعوقات لمسيرة التحديث ومنها على سبيل المثال العلاقة بينه وبين ممارسته للعمل من جهة وفهمه لتنظيم العمل من جهة أخرى . وإن الدور الحاسم الذي كانت غالباً ما تلعبه الملاحظات على أرض الواقع في مجال التحديث في ذلك العصر ، ومراعاة البعد الجماعي في تطبيق المنهج يتعارضان وبشكل واضح مع الممارسات اليومية لمهندسي الدولة . إذ أن نظام الهيكل التدريجي الصارم في

الإدارات وكذلك غياب حرية المبادرة للمرؤوسين لا يساعدان على خلق البيئة الملائمة . وأخيراً فإن طبيعة الابتكارات ذاتها وهي ميكانيكية يمكنها أن تقدم تفسيراً جزئياً، لأسباب فشل الشركة ، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إدارة الطرق والكباري الفرنسية ومهندسيها في ذلك العصر ظلوا بعيدين عن التطورات التي تمت في هذا المجال.

و قد بدا لنا في مرحلة لاحقة ضرورة إيضاح الدور الذي لعبته بالفعل المعارف العلمية سواء في الممارسات اليومية للفني المتخصص في مجال الأشغال العامة أو في ضبط الأساليب الحديثة . وقد تكون الإقتناعات العميقة و اليقنيات المكتسبة رادعة فعلاً في هذا المجال من المشتطات . سوف نثبت على وجه الخصوص أنه على عكس ما نجد في الأحاديث الشاملة والمزاعم الموجهة ضد الشباب المتخرج من المدرسة العليا متعددة التقنيات لم تقدم المعارف العملية في ذلك العصر أي عون للممارسين .

و سوف نساهم بفضل هذه التحليلات في تقديم بعض التفسيرات للتخلف الفرنسي الذي لوحظ في الأشغال العامة في مجال ميكنة الورش واستعمال الآلات البخارية .

سلوكيات وممارسات متعارضة

ويمكن إيضاح الاختلافات الهامة بين شركة السويس وشركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما في السلوك والتي تتعلق بالتصور الموجود عند كل واحدة منهما عن العمل وبشكل أدق ، فإن الاختلاف يبدو بجلاء في العلاقات بين التصميم والتنفيذ من جهة ، والنظرية والتطبيق من جهة أخرى . ويبدو الاختلاف واضحاً أيضاً في اختيار أماكن التعيين . فإن بدت الممارسات والمناهج وتنظيم الإدارة الفرنسية للطرق والكباري التي طبقها شركة القناة ملائمة لتنظيم عملية حفر خليج السويس ، إلا أنها على العكس شكلت بعض العقبات أمام التحديث الذي يحس أساليب التقنية نفسها .

التصميم والتنفيذ : ممارسات متشابكة

كان فكر مهندسي الطرق والكباري متأثراً بفكرة أن هناك وقتاً يكرس للتصميم قبل تنفيذ الأشغال أما الورشة فهي مجرد عمل تنفيذي . وقد أيدت المقايسة (الكشف التقديري) وهي جزء من المشروع وجهة النظر هذه . و على اثر برنار فورست بيليدور (Bernard Forest Bélidor)، امتدح فاريني (Varaigne) المقايسة بقوله : "يجب أن تُقدم المقايسة في الوقت نفسه وصفاً منهجياً و مدروساً لكل الأعمال التي تشكل المشروع الفني وتشير إلى أنواع المواد المستخدمة في

هذه الأعمال كلها وكذا أماكن استخراجها ونوعية كل منها وطريقة هينة وجميع بعضها وإعداد البعض الآخر وفي النهاية استعمالها كلها [...] ويجب أن تتوقع المقايضة كل صعوبات التنفيذ وتوصي بالنظام الواجب اتباعه في كل أجزاء البناء كي تكون كل الحركات والعمليات متناسقة . ليس الهدف من المقايضة أن يستعملها المقاول الذي سوف يقوم بتنفيذ الأشغال الموضحة كدليل وقاعدة فحسب ولكن الهدف منه هو أيضاً تحديد الالتزامات المتبادلة [...] ويلتزم من جانبه من تقع عليه المناقضة بتنفيذ المقايضة بدقة وتوفير الأيدي العاملة والمشتريات والمواصلات ما يجذب أن ينفذ بدقة شديدة الشروط العامة والخاصة التي فرضت عليه" (١) .

و يهدف مثل هذا الوصف إلى تأكيد قضية الفصل التام بين التصميم والتنفيذ وقصر مهمة المقاول على مجرد دور المنفذ ياتباع طريقة تصورها المصمم مهندس الدولة . وفي الحقيقة مثلما أن المشروع في الغالب ليس إلا تخيلاً مسبقاً للتنفيذ فإن المقايضة بعيدة كل البعد عن التنبؤ بكل شيء وعن حل المشاكل التي سوف تتعرض لها الورشة لاحقاً .

ولا تتناسب هذه الطريقة لرؤية العملية الإنتاجية مع ما هو موجود عملياً . وعلى عكس الصناعة التي بدأت في ذلك العصر الذي ندرسه ، وهي صناعة الأشياء على نسق واحد (الإنتاج الكمي) ، فإن كبرى ورش الأشغال العامة قد احتفظت في الواقع بخصوصية تقديم حالة فريدة في كل مرة . فالظروف المتطابقة في حالة إنتاج مادة مصنعة ، تكاد تكون متغيرة في مجال الأشغال العامة الذي يهمننا . و علاوة على ذلك ، تعتبر حصة المخاطر في غاية الأهمية . وأخيراً ، قد تتدخل في مجال التقنية الاعتبارات السياسية والتي هي خارجة عن طبيعة الأعمال نفسها بصورة أكبر بالنسبة للقطاعات الأخرى . ومن ثم استحالة التوقع المسبق والتفصيلي لطريقة تطور العمل ، فمن الروم أن نعتقد أن طريقة تنظيم الأشغال التي تعرضها المقايضة تتفق مع ما تم تنفيذه .

وتعتبر المقايضة ممارسة تتسم بالمنهج التحليلي الذي يصعب أن يخضع له تشعب الواقع . وهذا هو رأي فيكا (Vicat) الذي حذر زملاءه في عام ١٨٣٥ قائلاً : " توجد جملة ظروف تغيب عن كل التوقعات ولا يمكن معرفة إمكانية ضمها إلى هذه العناصر ومن ثم توجد أسعار كما بعض الظواهر لا تستطيع بعض الصيغ عرضها بأمانة " (٢) .

وتبين دراسة المقايضات الحقيقية أنه لا ينبغي الوقوع في الخطأ ، ويؤكد تاريخ ورشة قناة السويس أنه في الإمكان تحديد التأثير النسبي لمثل هذه الممارسة بصورة شبه كاملة . وأنه يوجد وقت للتصميم ثم بعد ذلك وقت للتنفيذ ، ولكن يتداخل العنصران أثناء عمل الورشة . وقد كان موجيل (Mougel) الذي صاغ المقايضة الملحقه بالمشروع التمهيدي ، أول من التزم الحذر تجاه هذه

الوثيقة التي تقوم مقام دفتر الشروط حين كتب : " يتطلب دفتر الشروط [...] مواداً يستحيل العثور عليها [...]] يجب الاعتراف بأنه لا الطبيعة ولا الفن قادران على إنتاج مواد كهذه و لذلك يجب علينا ألا نلتزم حرفياً بدفتر شروط مستحيل وأن نقبل كلية وبشكل بساطة ، المواد التي تؤدي الفرض المطلوب منها " (٣) .

إن الخبرة التي اكتسبتها الشركة عند التعامل مع المقاولين الجدد قادتها في عام ١٨٦٣ إلى التخلي عن نظام المقايسة واللجوء إلى عقود عمل بالمقولة (بالقطعة forfait) يتم فيها تحديد طبيعة الأهداف المراد تحقيقها وجدولها الزمني . وبناء عليه كان المطلوب هو النتائج لا الوسائل ، وترك عندئذ للمقاولين اختيار أساليب التنفيذ ودورهم معروف ضمناً في التصميم .

و قد نُظهر المقارنة مع التنفيذ وكان المقايسة مجرد رسم تخطيطي أو كأقصى حد مجرد تدريب شكلي فقط . ففي حالة قناة السويس تم إدخال تعديلات كثيرة أثناء التنفيذ أثرت في نفس الوقت على تصميم خصائص القناة البحرية (خط السير والمقطع الطولي والمقاطع العرضية ومحطات التقاطع) وعلى خصائص المواني وأيضاً ترعة الماء العذب . يقدم التنفيذ تكديماً واضحاً لكل العناصر المكونة للمقايسة سواء تعلق الأمر بالوصف التفصيلي لأجزاء العمل التي يجب إنجازها أو بتحديد المواد أو بأساليب التنفيذ وتطبيقها . وإن لم يكن ممكناً الوثوق بتفاصيل المقايسة فعلى الأقل يمكن أن نرى فيها طريقة تسمح بعرض تقديرات إجمالية . ولكن لا تعتبر المقايسة من وجهة النظر هذه مقنعة . فهي تعرض في الحقيقة دائماً لإعادة تقديرات معايير أساسية مثل مدة الأشغال وتكلفتها .

مرحلة التقدير	تكلفة الأشغال الإجمالية (مليون فرنك)	مدة الأشغال بالسنوات
المشروع التمهيدي لبنان / موجدل (١٨٥٥) - مقايسة	١٦٢	٦
اللجنة الدولية (١٨٥٦)	٢٠٠	-
جمعية المهندسين المدنيين (١٨٥٧) (٤)	٣٠٠	-
تقرير هاوكاشو (١٨٦٣) (٥)	٢٥٠	٩
الافتتاح (١٧-٢١ نوفمبر ١٨٦٩)	٤١٦ (فعلي) (٦)	١٠
النهاية الفعلية لأعمال الحفر والردم (١٥ إبريل ١٨٧١)	٤٢٦ (فعلي)	١١

بذلك بلغت التكلفة الحقيقية للأشغال أكثر من مرتين ونصف التكلفة المتوقعة في البداية ، ومدة الأشغال ضعف المدة المقدرة أصلاً . وهذا الأمر ليس ظاهرة خاصة بورشة قناة السويس كذلك فإننا نلاحظ فيما يتعلق ببناء خطوط السكة الحديد أيضاً نسبة تتراوح بين مرة ونصف وثلاثة أضعاف نتيجة المقارنة بين التكاليف المتوقعة والمصاريف الفعلية .

تبين إذا متابعة ورشة معينة في أول الأمر أنه من الملائم اعتبار المقايضة علي أنها أنه نقطة انطلاق الأشغال و تصورها . و بجانب المشروع تعتبر المقايضة الخطوة الأولى نحو التنفيذ والتعبير عن نية ولكن في الواقع لا تنبئ حقا بالتنفيذ: " بمجرد أن يشرع الرسام في إنجاز لوحة ما، يضطر إلي إعادة تشكيل ما يعالجه في كل لحظة " (٧) هذا ما كتبه ميخائيل باكساندال (Michael Baxandall) وتصلح نفس الجملة أيضاً بالنسبة للفني وللأعمال الفنية التي يقوم بإنجازها . فلا يتابع رسمن التصميم وزمن الإنجاز ولكن يتشابهان أثناء مدة عمل الورشة و يعتبر التصميم عملية مستمرة تبدأ مع المشروع والمقايضة ولكن لا تنتهي إلا بانتهاء الورشة .

وتوضح دراسة الممارسات الفعلية فكرة أخرى خاطئة وهي اعتبار المقاول وكأنه مجرد منفذ للتعليمات التي وضعها مهندس الدولة . فالوقائع التي تجري في ورشة قناة السويس تكذب تماماً هذه الرؤية لتوزيع العمل، حيث أن المبادرات في الأفكار والأساليب بشأن تنظيم العمل وكذلك المقترحات المتعلقة بإعطاء مقاييس لعرض القناة تصدر كلها عن المقاولين .

وأخيراً نلاحظ أن المقايضة بالنظر إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها يتعارض بشكل ما مع التحديث ، بالفعل فإن المقايضة كما وصفها فاراني (Varaigne) قد لا تترك للمقاول أي هامش للمناورة وكل فكرة تحديث قد تتولد في الورشة قد يحكم عليها بالموت بتحقيقها على الفور . ولما كانت المقايضة تستند إلي تجارب سابقة فإن الالتزام بها يحول دون إدخال أي جديد . لذلك لا يمكن أن يشكل تعميم تطبيق المقايضة التي صممت بهذا الأسلوب إلا حائلاً لكل ابتكار تقني .

علاقات من نوع آخر

أتاحت خاصيات التنظيم المطبقة في شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما وكذلك العلاقات الموجودة بين مختلف الرتب ظروفًا مواتية للتحديث. وتُظهر المقارنة بينها وبين العلاقات القائمة في إدارات الطرق والكباري أنها تختلف عنها إختلافًا جوهرياً . فقد واجهت شركة المقاولات السلم الإداري الخائق بلا مركزية صناعة القرار لتشجع المبادرة الفردية .

فقد كثرت الانتقادات تجاه التنظيم التدريجي المبالغ فيه الذي تعتمده هيئة الطرق والكباري. وقد رأي الكثيرون أن بطء المؤسسة يشل العمل ويخفق الأفكار الجديدة. ويخضع مهندسو الطرق والكباري خاصة في بداية مسيرتهم إلي القيود التي تفرضها عليهم إدارتهم ويعانون من قلة قدرتهم

على المبادرة . وقد أشتكى كثيرٌ منهم من هذا الوضع الذي انتقده على الملاً جوزيف كورديه (Joseph Cordier) قائلاً " قبل امتحانات القبول بالمدارس المتخصصة يهتم طلاب المدرسة العليا متعددة التقنيات فقط بدراسة العلوم الدقيقة وتطبيقها في مجال الأشغال العامة وبعد ذلك يستسلمون للمركزية الإدارية التي تأخذ على عاتقها كما يبدو مهمة إحباط عناصر قادرة للغاية على رخاء وعظمة هذا الوطن " (٨)

وقد استنكر بلزاك (Balzac) بدوره بعنف هذا الهيكل التدريجي الثقيل والمشبوط للهمة في شخصية جريجوار جيرار (Grégoire Gérard) التي قد يكون الهمة إياها عديله سرفيل (Surville) مهندس الطرق والكباري حين كتب : " في مثل هذه الهيئات يُخضع التسلسل التدريجي الوظيفي القدرات الجديدة الفعالة لقدرات سابقة وخامدة التي باقتناعها بعمل الأفضل تضعف وتشوه عادة الأفكار والتصورات التي تطرح عليها ربما بهدف واحد ألا وهو عدم طرح وجودها على بساط البحث إذ يبدو لي أنه التأثير الوحيد الذي يمارسه ، في فرنسا ، المجلس العام للطرق والكباري " (٩)

ويدفع هذا الوضع بمهندسين لامعين إلى الرحيل والعمل في شركات خاصة. واجتهد البعض في إبراز ما قدمه مهندسو الطرق والكباري من ابتكارات بناءة في القرن التاسع عشر (١٠). ويؤدي طرح الابتكارات التي حدثت في ورشة قناة السويس إلى التشكيك في هذه النتيجة ، بل أكثر من ذلك ، يمكن إثبات أن جماعة هيئة الطرق والكباري قد أظهرت في ذلك الوقت مقاومة سلبية شديدة أمام قوى التحديث في قطاع الأشغال العامة في مجمله . ففي الواقع لم يقتصر هذا التنظيم المحكم البناء على كبح إرادة أعضائه الشبان وأيضاً مبادرات فئات أخرى من العاملين في هذه الإدارة ، بل كان يمارس ضغطاً لبقاء الوسط المهني بأكمله على لا يكتبون . ولم تكن هذه الفكرة جديدة إذ نقرأ في عام ١٨٤٨ التصريح التالي في " ملاحظات قدمتها الجمعية المركزية للمهندسين المدنيين إلى لجنة الأشغال العامة للجمعية الوطنية ، : " تأخر كثيراً تطور مهارات المهندس في فرنسا بسبب غياب الحافز نتيجة التنظيم ذاته هيئة الطرق والكباري نفسها " (١١) .

ويعصف هذا الحكم حالة حقيقية فعلاً. ويكفي للتأكد من صدق ذلك إثارة الموقف العام الذي انتقده مهندسو الطرق والكباري تجاه إدخال السكة الحديدية في فرنسا والتي كانت تمثل تكنولوجيا حديثة جاءت من ما وراء بحر المانش . فقد قبلوا على مضض بل رفضوا السكة الحديد خوفاً من احتمال خلخلة سيطرتهم على قطاع الأشغال العامة (١٢) . وكان التحديث قد يؤدي إلى إعادة النظر في المكاسب . وهو بالضبط ما اعترض عليه طاقم هيئة الطرق والكباري الذي خشى ، في

حالة حدوث ثورات تقنية ، أن يعمل ذلك على زعزعة صلاحياته . ولم يكن هناك أيضاً تشجيع على إدخال عنصر الحديد في بناء الكباري ^(١٣) : " كان يُظهر واضعو نظريات إدارة الأشغال العامة ازدياداً صريحاً تجاه صناعة الحديد الإنجليزية التي كانت تزعم إحلال صفحات الصفيح الرفيع محل البناء الضخم الهائل من الدبش أو الحجر المنحوت " ^(١٤) ولقد ساهم المهندسون المدنيون بأنفسهم في تطوير استخدام الحديد في أشغال البناء الفني . علاوة على ذلك ، لم تقم هيئة الطرق والكباري بنشر الابتكارات الهامة التي ظهرت أثناء هذه الفترة . ومن العبث محاولة البحث في حوليات الطرق والكباري عن آثار مبكرة لظهور المعدن في البناء أو معلومات عن ورشة قناة السويس ، فقد اقتضت في الواقع هذه المجلة علي تسويق بشكل يكاد يكون حصرياً أفكار وأعمال أعضاء الهيئة أو إعادة نشر الآراء والأقوال المؤيدة لها .

وقد وجد مقاولو الأشغال العامة أمام هذا الفكر المحافظ صعوبة كبيرة في تحرير أفكارهم أو إسماع صوqهم ، أو أكثر من ذلك الاعتراف بكفاءتهم و دورهم الفعلي في مجال التحديث .

وفي نفس الوقت الذي نقلت فيه الشركة عن الإدارة الفرنسية للطرق والكباري هياكلها وأسلوب توزيع الأدوار فيها ، أخذت كذلك عيوب آثار تنظيمها السيئة . لذا لم يكن ممكناً تجسيد بعض المبادرات الواعدة مثل مبادرة بادوا (Badois) التي أجهضت بسبب عدم وجود البيئة المناسبة لتقبلها . وبالفعل فإنه لم يكن ينقص الشركة المهارات الميكانيكية . فقد عُيِّن إدمون بادوا (Edmond Badois) في وظيفة مراقب أشغال في عام ١٨٦٣ وهو صاحب فكرة تجهيز الجرافات بجسور رفع لنقل الأتربة . فبعد أن اختبر جسور رفع من الخشب الثقيل طوله بين ٦ أو سبعة أمتار وضعت بشكل مائل وبارز على الجرافة ، قام هذا الشاب خريج المدرسة المركزية بتصميم وتصنيع عدد أقل منها وزناً من الصفيح وطولها اثنا عشر متراً لتلقي نتاج الجرف مباشرة على الشاطئ . و علاوة على ذلك، ثبت بنجاح على جرافة صغيرة جر رفع طوله ثمانية عشر متراً . بعد ذلك طبق نفس التجهيز على جرافتين صغيرتين أخريين . وأوعز إلي فوازان بإمكانية تجهيز الجرافات التي تم طلبها توا من شركة المسابك وورش البحر المتوسط بجسور رفع طولها يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين متراً بميل قدره ١٠/١ . و تسحب عليها المواد بواسطة الماء المندفَع من مضخة خاصة . ولأثبات هذه النظريات كتب بادوا مذكرة عنوانها : دراسة عن الوسائل الميكانيكية المستخدمة في أشغال قناة السويس والواجب استعمالها في عبور بحيرات المنزل والبلاخ ^(١٥) . وتهدف هذه الدراسة إلى إثبات أن استخدام جسور الرفع الطويلة من المعدن التي تلقي مباشرة المواد والأتربة الناتجة عن عمليات الجرف على الضفة تعتبر أكثر بساطة ووفرة لحفر القناة في منطقة البحيرات . ولكن الشركة فضلت رفض الطريقة لصالح تقنية وضع الأتربة على الأرض

بواسطة الرافعات . وقد جاءت عروض بادوا (Badois) متأخرة أو مبكرة جداً ١٠٠٠ فقد كانت شركة القناة قد سمعت من أجراء التجارب وقررت البحث في الخارج عن كفاءات يمكن أن تجد حلاً لمشاكلها لدرجة أنها لم توفر لبادوا (Badois) الوسائل لتنفيذ مشروعه ولم تقيم بعروضه . وفضل بادوا (Badois) عندئذ الاستقالة وعينه المقاول كاستور (Castor) . وعند تقديم أول مداخلة أعدها لافالي إلى جمعية المهندسين المدنيين لم يستطع بادوا أن يحسك نفسه عن أخذ الكلمة ليطلب الاعتراف بأنه مبتكر الفكرة . واستبعد الرئيس فلاشاه (Flachat) شكواه التي تعبر بكل تأكيد عن مرارة رجل لم يستطع تقرير وجهة نظر سوف يأخذ بها بعدها بعامين ويتم تطويرها بنجاح . من الواضح أن هذه الشكوى تكشف عن وسط غير قادر علي إفساح المجال لتوليد الأفكار الجيدة .

ويمكن أن نكون فكرة عن جود الهيكل الوظيفي القائم في الشركة بسرد الواقعة المؤسفة التي حدثت لليكونت (Lecomte) ، رئيس قسم رمسيس الذي طلب شراء جرافيتين ذات أذرع مصنوعة في فرنسا في مارس ١٨٦٤ ، رغم رفض الإدارة العامة لطلبه وظهرت على الطبيعة بشكل خاص فاعلية هذه المعدات المستخدمة في صيانة ترعة الماء العذب ، إلا أن لجنة الإدارة علمت بالأمر وكاد أن يفصل لعدم الانصياع للنظام^(١٦) . ولم تكن هذه الظروف مواتية للمبادرة والابتكار كما أشار إلى ذلك هانيت - كليري (Hanet-Clery) عندما حذر فوازان (Voisin) من عواقب المركزية المبالغ فيها .

أما داخل مؤسسة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما وبالرغم من أن التنظيم متشابه في الظاهر فهو يتضمن رؤساء قطاعات ورؤساء أقسام للأشغال ، إلا أنه يختلف جوهرياً عن تنظيم شركة قناة السويس بفعل العلاقات القائمة بين مختلف الدرجات والمسؤوليات المكلف بها كل فرد . ويفيدنا أوليفي ريت (Olivier Ritt) عن مدى ما يتمتع بها رئيس قسم في مؤسسة المقاولات بوريل ولافالي وشركائهما من حرية في المبادرة وعن اللامركزية وأخذ القرار علي مستوى القسم: " كان لكل رئيس قسم أن يحصل على معدات من الجرافات والرافعات والصنادل العائمة والصنادل وآلات ميكانيكية أخرى حسب احتياجاته وبقيمة محددة يتم تدوينها في الجرد الخاص بقسمه . وكان يسجل عليه أيضاً تحمل عبء قيمة استهلاك المنازل وكل المنشآت التي شيدت له وكل أنواع المؤن التي توفرها له الشركة . وكان لابد أن ينجز بهذه الموارد عملاً محدداً من قبل والذي يجب أن يغطي ثمنه المدفوع لشركة المقاولات بمقتضى صفقاتها كافة المصروفات المذكورة سلفاً بالإضافة إلى أجور العمال والمصاريف العامة . وفضل توفيق الحسابات كانت تخضع الورقات التي يحققها كل عامل مهتم زيادة عن هذا الثمن إلى توزيع نسبة متفق عليها سابقاً .

وبفضل هذا التشجيع الحافز، كان كل عامل يدرس تنظيم عمله ويكرس له كل جهوده " (١٧) وكانت تلك الممارسة على حد معرفتنا غير مألوفة. فمن المحتمل أن يكون لافالي (Lavalley) الذي كان خبيراً بالحرف البسيطة لأنه قد مارسها بعض الوقت، هو مصدر هذا الأسلوب الفريد المتعلق بانتفاع رؤساء الأقسام من الشركة .

كما يهتم العمال أيضاً بأداء الآلات التي يعملون عليها ، وقد ذكر لافالي (Lavalley) بالتفصيل النظام المطبق للمكافأة أمام الحاضرين من جمعية المهندسين المدنيين: " كي يهتم العمال بكمية الإنتاج ، حددنا حداً أدنى شهرياً لكل جرافة ، وعند تجاوز هذا الحد نمنح لكل عامل من الطاقم عن كل ألف متر مكعب زيادة مكافأة تتناسب مع مركزه. و عندما تزيد إنتاجية قسم أو طاقم على الآخرين تضاعف مكافأته بنسبة ٥٠ ٪ ويحصل التحميل الذي تعدي في مؤسستا كل مؤسسات المقاولات الأخرى على مكافأة جديدة أخرى وبذلك نحث على منافسة كبيرة جداً" (١٨) .

ولقد مكّن من تحقيق هذه المنافسة مدى أهمية الورشة والعدد الهائل من الماكينات المستخدمة فيها في نفس الوقت . وبأخذه قرار ترك مجال للمبادرة مهم نسبياً لأطقم الجرافات ، فإن لافالي (Lavalley) يناشد مهارتهم ويعترف بخبرتهم . فقد علمته تجاربه أن يثق في العبقورية التي تدفع العمال إلى تحسين آلاهم وفي قدرتهم على تكييف ممارستهم باستمرار والاستفادة من دروس التجربة لتحقيق مردودية أفضل. وتشجع الحوافز المالية العمال و تُشركهم بالأخص في عملية التحديث . واستفاد لافالي (Lavalley) من هذا المسلك بوقوف بعض المستخدمين بإخلاص إلى جانبه فقد تبعه كثيرون لمدة عشرين عاماً ليس فحسب في أماكن مختلفة بفرنسا أنجز فيها أعمالاً ولكن أيضاً في أسبانيا ورومانيا وإيطاليا (١٩) .

وقد لفت أسلوب لافالي في ورشة قناة السويس انتباه رئيس ورشة يعمل معه في نفس المؤسسة حين قال : " كان يصل الاثنان [لافالي وكوتار] كل على ظهر حصان وينظران وكان من حق كل واحد أن يخاطبهما ويعرض عليهما ملاحظاته التي يقوم مسيو كوتار بكتابتها . أما السيد لافالي فيستمع حتى النهاية ويجيب على الفور " (٢٠) .

ورغم أن وصف وضع الورشة بهذا الأسلوب قد يبدو طريفاً في الظاهر إلا أنه يستحق أن نقف عنده لأنه يساعد دون شك على تفسير جزء من نجاح مؤسسة المقاولات . فرؤساء مؤسسة المقاولات موجودون على أرض الواقع ، يلاحظون ويسمعون هذا ما قاله لنا رئيس الورشة وهنا يكمن سر الما قول . فقد رأينا فعلاً أهمية الملاحظة في عمليات الابتكار . أما الاستماع فهو ضروري بصورة واضحة كي تصل الأفكار التي عبر عنها العاملون الأقرب إلى مسرح الأحداث إلى صاحب

القرار لكي نجد إجابات لأسئلتهم ، وتؤخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار . فقد عمل لافالي (Lavalley) على إقامة حوار مع رجال الورشة وهو ما يشكل بجلاء ممارسة نادرة في ذلك الوقت . " كان لكل شخص الحق في أن يخاطبهما " هذا ما لاحظته أيضاً رئيس الورشة مشيراً في نفس الوقت إلى العوائق المتبعة التي عادة ما تفصل بين درجات السلم التدريجي المختلفة و سلوك لافالي الفريد والتميز .

مصادر مختلفة للتعين

وقد تساهم الدورات التدريبية التي حصل عليها مختلف العاملين في تفسير تصرفاتهم المختلفة . ويتضح بالمقارنة بينها أن التعليم المدرسي الذي حصل عليه العاملون الفنيون الذين انتقتهم شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما يختلف كثيراً عن التعليم الذي استفاد منه مستخدمو وعمال شركة القناة :

التدريبات الأولية وأصحاب العمل في ورشة قناة السويس

صاحب العمل	هاردون	بوريل لافالي وشركاؤهما	شركة القناة	المجموع
المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس (بوليتكنيك) فقط	٠	٧	٠	٧
المدرسة العليا متعددة التقنيات + هيئة الدولة	١	٣	١١	١٥
مدرسة المناجم	١	١	١	٣
المدرسة المركزية للفنون والصناعة	٣	١٥	٩	٢٦
مدرسة الفنون والحرف	٥	١٨	٣	٢٦
المدارس الأجنبية	٤	١٤	٤	٢٢
مدارس فرنسية أخرى	٠	٠	٥	٥
تدريب في هيئات الطرق والكباري	٢	٢	٤٣	٤٧
مؤهل مجهول أو بدون مؤهل	٨	٠	٢٨	٣٦
المجموع	٢٣	٦٠	١٠٤	١٨٧

ويتميز الرجال الذين قامت بتعيينهم شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما أنهم تخرجوا خاصة من المدارس التالية : المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس فقط والمدرسة المركزية ومدارس الفنون والحرف أو من المؤسسات الأجنبية للتعليم الفني .

ويمكن إعداد جدول للعاملين بشركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما يوضح الوظائف المشغولة مشابه للجدول الذي وضع للفنيين بشركة القناة. وبالتالي نلاحظ أن رؤساء الأقسام والقطاعات في هذه المقاولات هم قبل كل شيء من خريجي المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس . أما خريجو المدرسة المركزية فهم يشغلون مناصب مراقبين أي مسيري الأشغال ورؤساء الأقسام. ويتم تعيين مسيري الأشغال أيضاً الرسامين من بين قدامى خريجي مدارس الفنون والحرف ويأتي معظم المراقبين (conducteurs) من خريجي المدارس الأجنبية .

تقاطع المؤهلات والوظائف المشغولة في شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما

الوظيفة ^(٢١) *	٠	١	٢	٣	٤	٥	المجموع
العامل							
المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس (البوليكنيك) فقط				٣	٣	١	٧
المدرسة متعددة التقنيات + هيئة الدولة			١	١	٠	١	٣
مدرسة المناجم				١			١
المدرسة المركزية للفنون والصناعة	١	٠	٨	٦			١٥
مدرسة الفنون والحرف		٥	١٠	٣			١٨
المدارس الأجنبية		٨	٣	٢	١		١٤
مدارس فرنسية أخرى							٠
التدريب في هيئات الطرق والكباري			٢				٢
المجموع	١	١٣	٢٤	١٦	٤	٢	٦٠


وكانت النتيجة غير المتوقعة للدراسة التي تمت عن تأهيلات المدارس الفنية ، هي اكتشاف وجود ٢٣ عاملاً من الخريجين القدامى للمدارس الأجنبية ^(٢٢) بورشة قناة السويس وهو ما يمثل

* الرموز : ٠ (عامل) ، ١ (رسام) ، ٢ (مراقب أشغال أو مسير أعمال) ، ٣ (رئيس قسم) ، ٤ (مهندس و رئيس قطاع) ، ٥ (مدير).

نفس عدد خريجي المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس (Polytechnique) العاملين بالورشة ذاتها. وتوجد هذه المدارس بسويسرا وفي الولايات الألمانية وفي بيمون (Piémont) بشمال إيطاليا وفي النمسا .

توزيع قدامى الطلاب خريجي المدارس الأجنبية (٢٣)

اسم المدرسة	المجموع	شركة القناة	هارون	بوريل لافالي وشركاهما
مدرسة زيورخ	١٠			١٠
مدرسة لوزان المتخصصة	١	١		
مدرسة فينا	١	١		
مدرسة كالمرو (ألمانيا)	٢			٢
مدرسة ميننجن ونيرمبرج	١			١
مدرسة ميونخ	٢	١	١	
مدرسة هانوفر	٢			٢
مدرسة تورينو	٤	١	٣	
المجموع	٢٣	٤	٤	١٥

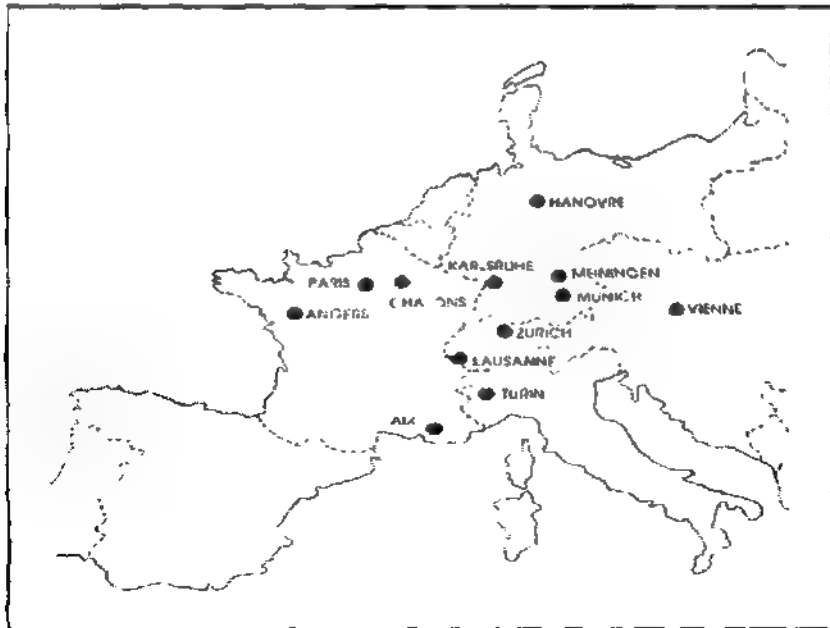

المدارس العلمية والفنية وورشة قناة السويس

غالباً ما اهتم بالوضع في فرنسا وغيل إلى تجاهل وجود مدارس في البلاد المجاورة ، ونسبتهين بعدد تنقلات الفنيين بين دول أوروبا المختلفة ^(٢٤) . فقد شجع حجم الأشغال التي تقوم بتنفيذها الشركات الفرنسية والظروف السياسية غير المستقرة في بعض هذه البلاد ، الحاصلين على الشهادات الأجنبية على الانجاء للعمل في فرنسا أو لدى شركات المقاولات الفرنسية . وقد تم هنا حصر المدارس الأجنبية في الواقع في البلاد المجاورة لفرنسا لسهولة عرض الموضوع و لا نسدعي بهذا الحصر أن نوع الدراسات التي توفرها هذه المؤسسات متشابه بطبيعتها حيث أننا لا ندرى في حالات كثيرة شروط التعيين الحقيقية و نوع التعليم المتوفر .

كذلك نجد بين قدامى خريجي المدرسة المركزية للفنون والصناعة سواء من عينتهم شركة المقاولات أو شركة القناة ، ممثلين لكل التخصصات المنصوص عليها في برنامج الدراسة : سبعة ميكانيكيين وأثنى عشر صانعاً وثلاثة كيميائيين وثلاثة يعملون في صناعة التعدين ، وخريجاً واحداً تخصصه غير معروف . ويبرز وجود الكيميائيين أن التخصص لم يكن له أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل المهني لخريجي المدرسة المركزية فيما بعد . وحتى لو حصل خريجو المدرسة المركزية على تدريبات أكثر تعمقاً في واحد من المجالات الأربعة المذكورة فإنهم يحصلون ، وهذا ما يميزهم ، على تأهيل في شامل ومتعدد المواد ويجعلهم قادرين على التكيف في وظائف متنوعة في العديد من مجالات الأنشطة وهو الأمر الذي يتيح لهم باختصار أن يكونوا مثل خريجي المدرسة متعددة التقنيات بالمعنى الدقيق . ويرى جون فايس (John Weiss) أنهم رجال تكنولوجيا من أعلى درجة (technical men) ^(٢٥) . ويمثل أيضاً هذا التدريب متعدد الكفاءات ميزة الجمع بين معارف نظرية وخبرات تقنية متخصصة . وتسمى هذه المدرسة إلى تخريج مديري المصانع ورؤساء الورش الصناعية والمهندسين المدنيين والبناءين باختصار وحسب وصف شارل ديوان (Charles Dupin) " المدرسة متعددة التقنيات للصناعات المدنية " ^(٢٦) ويعطينا المقاولان شارل لاسيرون (Charles Lasseron) وأجيسست ديسو (Auguste Dussaud) صورة جديدة ليل خريجي المدرسة المركزية إلى خلق مؤسسات المقاولات وإلى الابتكار ^(٢٧)

وتخرج من بين قدامى طلاب مدارس الفنون والحرف الذين شاركوا في ورشة قناة السويس أربعة عشر من مدرسة شالون / سور / مارن (Châlons – sur – Marne) وتخرج أحد عشر من أنجيه (Angers) وستة من أكس – آن بورفانس (Aix en Provence) ^(٢٨) وتعد هذه المدارس أشخاصاً ممن اكتسبوا من قبل خبرات مهنية أولية ليصبحوا رؤساء ورش و مسيرين للأشغال وعمال متعلمين ومهرة ^(٢٩) . و يجدر توضيح نوعين من التخصصات من بين أنواع التدريب في ذلك العصر . ونعني من جهة ، الخبرة المكتسبة من استخدام الآلات و التي يحضر لها

قضاء سبع ساعات يوميا في الورش^(٣٠) وهو ما لا يحظى بها خريجو المدارس الأخرى ، ومن جهة أخرى ، التعليم المكثف للرسم بشق أشكاله - الرسم الهندسي والرسم الطولي والرسم الزخرفي والرسم التخطيطي والرسم المائي ورسم الآلات البسيطة والمعقدة والرسومات البيانية^(٣١) . وقد كانت كفاءات قدامى خريجي مدارس الفنون والحرف تحظى بتقدير كبير في الوسط الصناعي في عصر الإمبراطورية الفرنسية الثانية . وتسعى خصوصاً شركات السكك الحديدية وصناعة القاطرات إلى البحث عنهم . ويؤكد أوبارمان (Oppermann) على حسهم العملي المتطور : " إنهم هم من بين خريجي المدارس المتخصصة الذين يتمتعون بدرجة أكبر بحس عملي سريع الحاضر من ناحية التنفيذ المادي للأشغال [...] . فالعود على ترجمة الفكرة إلى الرسم وخاصة كترجمة الرسم إلى يد عاملة يعطيهم إحساسا خاصاً يدركون به مدى سهولة أو صعوبة التنفيذ وتعتبر هذه الميزة شرطاً جوهريا للعمل في المشاغل والورش"^(٣٢) وقد لعبوا دوراً قيادياً في ميكنة الصناعة الفرنسية في ذلك العصر ولذلك ليس من الغريب أن تجدهم من جديدي في ورشة قناة السويس.

و بمقارنة التدريبات التي يتلقاها الفنيون العاملون بمقاولات بوريل ولافالي وشركائهما من جهة، والعاملون بشركة قناة السويس من جهة أخرى ، تظهر في الحالة الأولى ميزة التنوع يقابلها عدم التجانس الذي يظهر في الحالة الثانية . ومن المحتمل أن يكون لأفكار وخبرة لافالي الشخصية تأثير كبير في الاختيارات التي تمت . خاصة أن شركته لم تتردد في توظيف مؤهلين أجانب . ولأنه عمل في ورش كبرى خارج فرنسا ، فقد جرب لافالي بكل تأكيد من قبل مزايا التعاون بين الفنيين القادمين من آفاق مختلفة . علاوة على ذلك ، فقد كان بلا شك مقتعاً بجدوى مثل هذه المقابلة . وتتفق التأهيلات التي فضلها هذا المقاول باستثناء حالة المدارس الأجنبية في أنها متعددة الجوانب وخاصة أنها لا تقتصر على الإعداد للعمل في قطاع الأشغال العامة . وقد اعتبر لافالي تعداد الكفاءات ورقة رابحة وضرورة وهو ما سوف يؤكد بعد ذلك ببضع سنوات . وتلتقى أيضا هذه التدريبات ، باستثناء هذه المرة تكوين المدرسة متعددة التقنيات ، في أنها تركز مكانة كبيرة لتدريس المهن عملياً . فهو يرى في الحقيقة - وهي وجهة نظر على عكس وجهة نظر الذين يشكلون هيئات الدولة - أن الدراسة بداية لا نهاية وأن التعليم مسيرة مستمرة وضرورة سواء على المستوى النظري أو العملي وفي نهاية الأمر فإن مرور الوقت يقضي على عدم التساوي فيما يتعلق بالتدريب الأولي^(٣٣) . ومن خلال تنوع نماذج الأشخاص الذين عينهم لافالي نتاح لنا رؤية التشكيلة الكاملة لأنواع التدريب في أوروبا في ذلك العصر.

وبتفضيله لمصدر معين آخر يشمل قدامى إدارة الطرق والكباري أساساً يكون فوازان قد قام باختيار مختلف عن ذلك الذي قامت به المؤسسة . فقد اختار التجانس وعلاوة على ذلك ، فإن قراره كان بأن يضم إليه رجالاً مثله اعتادوا دائماً على تكليف آخرين بالعمل بدلاً من تنفيذه بأنفسهم وعلى استعمال أساليب معروفة بدلاً من ابتكار أساليب جديدة . وحرّم نفسه ، في الوقت نفسه ، من كفاءات متنوعة بينما سعت محاولات أخرى لتطويرها . لذلك وبكل تأكيد لم يخلق الظروف الملائمة للابتكارات . والسؤال : هل قتر فعلاً نتائج اختياراته في مجال التوظيف ؟

المقاربة البراجماتية والمعرفة الكتيبة

ودائماً في مجال الاختلاف التي لوحظت بين شركة المقاولات وشركة القناة ، ينبغي إبراز السلوكيات الخاصة بالقيادات . فبينما كان من الممكن اعتبار المسؤولين عن إدارة شركة المقاولات على أنهم مثل " رجال في مهب الريح " كان قادة شركة القناة أساساً " رجال ديوان " بمعنى " محبون للمطالعة " وهي استعارة لإحدى التعبيرات الرائجة في القرن الثامن عشر . وتتعارض الملاحظات التي يجريها المقاولون على الطبيعة مع المعارف النظرية المستقاة من مطالعة الكتب لمديري الأشغال ورؤساء القطاعات بشركة القناة . وهو ما يفسر بعض الشئ فشلها في مجال التحديث . و يساهم في ذلك بُعد هيئة الطرق والكباري عن المسائل التي لها علاقة بالميكانيكا أو الآلات البخارية .

وكان لافالي (Lavalley) دائم التواجد بالورشة سواء لتوجيه الإرشادات وتقييم مدى تقدم الأشغال أو إعطاء التعليمات الضرورية للعمليات الدقيقة . وقد شهد شاهد من الورشة أن " السيد لافالي كان يشرف بنفسه على ملء البحيرات الاصطناعية كعادته في كل ما يخص العمليات الهامة الأخرى " (٣٥) وأضاف قائلاً " كان مركب لافالي البخاري جيليان (Julien) ، يسير دائماً بسرعة ٢٥ كيلو متراً في الساعة ويمر وكأنه محطاف البحر وسط حركة (الجرافات) تارة مليئاً بالزوار وتارة أخرى لافالي وحده ومعه كوتار (Cotard) حاملاً أوراقه تحت ذراعه و يتجه الاثنان لمراقبة الأشغال والتحقق من كل شيء بأنفسهم " (٣٦) .

لذلك كان لافالي دائماً و أبداً مطلعاً على الأشغال الجارية ومدى الصعاب التي يواجهها رجاله .

أما عادات رجال شركة قناة السويس القادمون من الإدارة فهي مختلفة تماماً ، فلا تربطهم بالممارسة سوى علاقة غير مباشرة . وقد تكون هذه الهوة إذا ما تجاوزت الحد مصدراً للفشل . ويوضح ذلك كارثة تعرض لها موجيل (Mougel) وتعلق بالمشروع التمهيدي لحفر خليج السويس الذي كان قد صاغه على أساس معلومات عملية أخذها عن لينان (Linant) . ويتميز

شكل هذا المشروع بأنه نموذج لأعمال مشابهة يرجع الفضل فيه إلى مهندسي الطرق والكباري في ذلك العصر . فقد أخذ شكل دراسة بلاغية تستند البيانات فيها إلى أمثلة سابقة وبعض الآراء والبراهين . فقد ذكر فيها عدداً من الكتاب مجموعهم سبعة وعشرون و من بينهم ثلاثة مؤرخين وستة مهندسين وستة ضباط وثلاثة أعضاء من شركة الهند . وإن كانت قائمة الكتب والمؤلفين المذكورة في مخطط المشروع تتيح إعادة تأسيس جزء من مكتبة موجد ، فهي تؤكد خاصةً عن معرفة كتابية بالمشروع المدروس وبالتقنيات بصفة عامة وتبين طريقة العمل في المكتب والمقتصرة على الإطلاع على المؤلفات . ويوضح هذا الأسلوب حقيقة مهندس الإدارة الذي يكفي بالتعرف على التقنية وممارستها بطريقة غير مباشرة دون احتكاك حقيقي بأرض الواقع أو الأساليب المطبقة فعلاً .

وتعتبر المزاعم التي تضمنها المشروع التمهيدي ارتجالية ومبهمة بل وحتى خاطئة ، فحيث يبدو لنا أننا قد نجد إجابات واضحة للمشاكل المطروحة ، نقرأ صيغاً بلاغية تساعد على التهرب من الأسئلة . ويكفي كشف بسيط عن المفردات المستعملة للاقتناع بذلك : " توقف تكوم الرمال البحرية منذ مدة طويلة وهذه حقيقة يمكن تفسيرها إذا ما سلمنا بأن تدمير الشواطئ في المغرب والجزائر وكاندي (Candie) وفي مواني أخرى قد تباطأ لسبب ما نقول ونكرر بأن هذا التدمير وحده هو الذي يجلب الرواسب البحرية ، [...] و سوف يتم بناء الأرصفة بسهولة أكثر وحيث أن المواد وجدت بشكل ما جاهزة فإن إقامتها لن تمثل أية صعوبة [...] . كان الشط الرملي الذي يفصل حوض البحيرات المرة الفسيح عن البحر الأحمر ، دون أدنى شك ، معبراً ارتفع بسبب أمواج الأعماق التي تعلق مع تيارات المد والجزر محملة بالرمال . وقد كونت بالتأكيد أمواج القمر اليوم المعبر إلى السريس [...] أما عن الإمكانية ، فهي غير مشكوك فيها لأن الحكومة الهولندية قامت منذ أكثر من قرن ببناء رصيف طوله ثمانية كيلومترات في خليج دي ليون (Lion) [...] فلا شك بناءً عليه إن ظهر أن شق الخليج مفيداً ، أن يكون من السهل التغلب على كل الصعوبات" (٣٧) . بوجه الإجمال فإنه تم التأكيد على إمكانية إنجاز المشروع أكثر مما تم التدليل عليها .

ولقد كان شاهد معاصر لم يقتنع المشروع التمهيدي شديد السرور بإبراز ما يتضمنه من أخطاء . وركز هجومه بوجه خاص على إقامة ميناء عند منفذ القناة على البحر المتوسط . وقد رأى عدة مهندسين وعلى رأسهم جاك ماري لير (Jacques - Marie - Lepère) الذي وضع هذه المسألة في تقريره الذي ضم إلى كتاب وصف مصر أنه لا يمكن تصور قبة ميناء على هذا الشاطئ الوحش . وقد سار مخطط المشروع عكس وجهة النظر هذه وتوقع بناء رصيفين طويلين يصلان إلى أعماق كبيرة تسمح لرسو المراكب بكل أمان . وتعزيزاً لإمكانية تنفيذ مشروع الميناء لوج موجد

بالإشارة إلى رصيف له أحجام ضخمة . ولم يكن معارض المشروع لطيفاً مع مهندسي الخديوي وقال لهما الحقيقة كلها " لكي يطمئن الناس بشأن الصعوبات التي قد تنجم عن مثل هذا البناء الضخم تحت البحر والقضاء على كل الشكوك بشأن إمكانية إنجازها ، كتب لينان بك وموجيل بك إلى فردينان دي ليسبس الذي ردّد ذلك على الملأ : " أما بالنسبة لإمكانية الإنجاز فلا شك فيها ، لأنه منذ أكثر من قرن قامت الحكومة الهولندية بعمل بناء رصيف من ٨٠٠٠ (ثمانية آلاف) متر في خليج ليون بالقرب من الكاب (Cap) في أعماق تزيد على ١٦٠٠ (ألف وستمائة) متراً . يبدو أن الاستدلال غير قابل للنقاش . ولكن ينقصه شيء ما وهو أنه لم يقدّم بتاتاً هولنديون ولا الإنجليز بتنفيذ رصيف طوله ٨٠٠٠ متراً في رأس الرجاء الصالح في خليج ليون الذي لا وجود له [...] .. لقد أخذ لينان بك وموجيل بك مشروعاً لم يتم إنجازها على أنه عمل تحقق وبعبارة أخرى حسب الأصداف ذُروا " (٣٨) .

وقد كان أول من أبرز هذا الخطأ صحفي بمجلة أيديمبورج . ولم يحرم الإنجليز أنفسهم بعد ذلك من استغلال الأمر . و عندما بحث جبل بارتيلمي سانت هيلير (Jules Barthélemy Saint-Hilaire) عن كيفية وقوع مثل هذا الخطأ اكتشف أن المرجع المطعون فيه مأخوذ عن مادة "موانئ البحرية " التي يُدرّسها مهندس الطرق والكباري فريسار (Frissard) حيث كتب فعلاً " إن أكبر رصيف داخل البحر هو حاجز أمواج رأس الرجاء الصالح . وقد نفذه الهولنديون ويبلغ طوله ثمانية آلاف متر وعرضه مائتا متراً في القمة " (٣٩) . ولم يكف فريسار بتقديم وصف أدبي للعمل وألحق به رسماً تخطيطياً يبين شكل المرسى وميدان جبل ليون وموقع الحاجز الذي يمتد على خط مستقيم من أسفل الجبل ليتكا على جزيرة روبين (Roben) (٤٠) وتفصيل كهذه كوفر وعلى اختراعها . عندما واصل بارتيلمي سانت هيلير التحقيق قدماً ، اكتشف أن فريسار أخذ بنفسه المثل عن بيليدو (Bélidor) الذي اعتبر عملاً أتم الهولنديون إنجازها تماماً ما هو إلا ذكرى لمشروع تم التخلي عنه . هكذا اختلط الأمر على فريسار وموجيل بين المشروع والتنفيذ وخدعتهم المعرفة المأخوذة عن الكتب ... ويبرز هذا المثل بوضوح مدى قصور هذا المنهج .

للم يكن فوازان رجل ميدان أكثر من موجيل . بالنسبة "لرجل يتواجد في مكان العمل" مثل فرنكلان مرتان (Franklin Martin) يبدو فوازان دون لبس وكأنه " طاووي ورقية وإداري و ٢١ على ٣١ " (٤١) وترجع هذه التسمية إلى شكل السورق الإداري، المستعمل آنذاك ٢١ مستمتر على ٣١ مستمتر .

وكان رد الفعل الذي تم ترسيخه في ذهن مهندسي الطرق والكباري هو الاعتماد على الحلول التي اختبرت وتقليد النماذج القديمة . فإذا قمنا بدراسة مادة الأعمال البحرية التي يُدرّسها بيسر


فريسار (Pierre Frissard) إلى طلاب مدرسة الطرق والكباري ، نلاحظ الغياب التام للنظريات المتعلقة بالمفاهيم العامة التي توجه المادة ^(٤٢) . ويشمل الدرس استعراض مجموعة من الحالات العملية مع الإشارة إذا اقتضى الأمر إلى الدروس المستخلصة من حوادث مؤسفة وقعت في الماضي القريب نوعاً ما . فالدرس هو عبارة عن فهرس لخلول ممكنة قد اختبرت وتشكل أساس التعليم ، ومجموعة من المراجع تستخدم كنقطة معالم تساعد على تدريب المهندسين الجدد . و في الحقيقة يحضر الطلاب درساً في تاريخ تقنيات المواني ويدونون مجموعة إرشادات أثبتت كفاءتها وكأنها عقبات يجب تجنبها . إن تشكيل التعليم بهذه الطريقة يبدو غير ملائم لدفع مشاعر المهندسين المبتدئين نحو التحديث . وأن الاكتفاء باقتراح وصفات ومناهج تم اختبارها وكذلك إبراز المخاطر الواجب تجنبها لا يمت إلا على استمرار الممارسات السابقة .

ويشارك جماعة مهندسي الطرق والكباري بشكل واسع ، وجهة نظر فريسار (Frissard) بشأن ضرورة إعادة مجموع الإرشادات الذي أثبت الزمن فاعليتها. إضافة إلى ذلك ، كلما كانت التجربة قديمة كلما حظيت بمزيد من الثقة . وبناء عليه خصص ج.ج. ليموين (J.J Lemoyne) كبير مهندسي الطرق والكباري والمستول عن أشغال ميناء سيت (Sète) ، مقالات طويلة على غير المعتاد نشرت في "حوليات الطرق والكباري" بين عام ١٨٣٢ - ١٨٣٩ (٤٣) ليرهن، مستنداً في ذلك على حواجز أمواج يرجع تاريخها إلى القدم ، "كم كان متفوقاً أسلوب القدامى في بناء المواني" ^(٤٤)

وقد تم تطبيق نفس المنهج عند بدء ورشة قناة السويس . لذلك كشف المشروع التمهيدي لموجيل ولينان بشأن بناء المواني في طرفي القناة البحرية عن التفكير التالي : " في رأينا يجب أن يترك جانباً كل الصراض نظري في مشروع هام مثل هذا ولا تتبع إلا تجربة الأشغال المماثلة التي تم إنجازها ، وهذا ما قمنا به عند اتباع طريقة بناء الأحجار الفارقة (pierres perdues) كما استعملت بنجاح :-

- (١) في سد شيربورج طوله ٧٦٨ ٣ متر في أعماق ماء ١٤,٨٠ متر .
- (٢) في رصيف بليموت (Plymouth) طوله ١,٣٦٤ متراً في عمق ماء ١١ متر وأكثر .
- (٣) سد في خليج الديلاور (Delaware) طوله ١٢٠٠ متر في أعماق تبلغ ١٤ متراً .
- (٤) في سد خليج (شرم) الليون طوله ٨٠٠٠٠ متر في أعماق أكثر من ١٦,٠٠ متراً (٤٥) .

و ظهر بجلاء أن مثل هذا الأسلوب الذي من المفترض فيه أن يكفل الأمان هو في حقيقة الأمر ضد التحديث. لأن التحديث غالباً ما يكون مرادفاً للمخاطرة ، مخاطرة تتصور أن الإدارات قليلاً ما تميل إلى تحمل مسؤولياتها . ويتعارض اليقين الذي يسعى المهندسون بالدولة الوصول إليه مع أخذ المخاطر بحذر عند المقاولين . وهناك مثل يبرز تماماً الشجاعة التي تميز بها لافالي . ويخص المنزل الذي بناه وأقام فيه بالنسبة . فقد تم بناء هذا المنزل كاملاً من خرسانة "كوانية Coignet" . ويعتبر هذا الاختيار ذو دلالة على تميز لافالي صاحب المنزل لأفكار معينة . كما يدل على اهتمامه بالابتكارات ويبين عدم تردده في المساهمة في نشرها حتى لو لم يكن رائدها . ويعتبر بناء هذا المنزل بداية استعمال هذه المادة إلى مصر . وبعد زمن قليل اختارت مقاولات بورييل ولافالي وشركاؤهما خرسانة كوانية في تنفيذ هويسين بترعة الماء العذب . وهكذا تم دخول هذه المادة إلى مصر بفضل لافالي ومن المحتمل أن تكون قد لعبت هذه التجارب الأولى في النهاية دوراً في اختيار هذه المادة لمنارة بورسعيد والذي كان متوقفاً بناؤها من الحديد منذ زمن طويل.

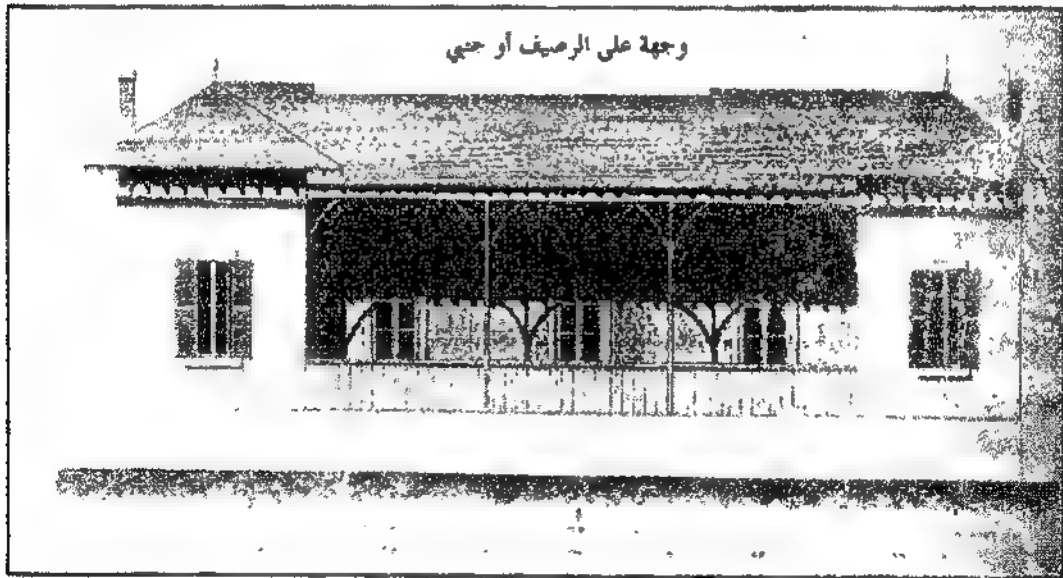

مسكن السيد لافالي

(ل مونتيل وأ. كاساني - أطلس لوحة ١٠ ، تفاصيل)

يلو أن المقاربة البرجماتية التي هي مصدر تقدم إنجلترا على فرنسا في الصناعة و في قطاع الأشغال العامة والذي طبقه لافالي والمهندسون المدنيون ، لم تزل الثقة دائماً من جانب مهندسي الهيئات الحكومية الذين كانوا يعتقدون أن النظرية لابد أن تقود الممارسة . ففي ورشة قناة السويس أساء المقاول لا سيرون (Lasseron) من تصرف رئيس القطاع لاروش الذي عبر عن تفضيله لنوع آخر من المواسير بخالف لمواصفات الصفقة التي توصي باستعمال مواسير مثل التي استعملتها

مدينة باريس في مد القنوات. و بالرغم من إصرار الشركة التي سعت إلى الرجوع إلى المشروع الأصلي ، أصر بعزم إرادته على استعمال مواسير أخرى متعهداً بأن يتحمل مسؤولية كل ضرر أو تأخير قد يسببه هذا التغيير . وكتب رداً على الحجج التي عارضته " فيما يخصني لا أنكر بتاتاَ المزايا النظرية للتشبيك الصغير ولكن الأمر هنا لا يتعلق تماماً بتشبيك نظري وما يهم إدراكه هو إن كانت التوصيلات المنفذة بدرجة كبيرة من العناية كما يتم القيام به عادة عملياً يمكن أن تقاوم هي بهذا السمك الصغير . ومن جهة النظر هذه ، يعتبر إقرار التجربة أفضل بكثير من كل الحجج"^(٤٦) ويبدو هنا واضحاً التناقض بين المنهجين .

وقد سارت أمثلة أخرى في نفس هذا الاتجاه. ففي عام ١٨٦١ ، تقليداً للممارسات الجارية في فرنسا وإنجلترا ، تم تصور أن يستعمل الفلاحون أسلوباً من تصميمهم ليجمع بين عربات اليد بدولاب واحد " البرووتة " والجراف والحبال والأواح سمكة من الخشب وبكرات و سطوح مائلة . و ينتظر من هذا الجهاز الذي أعد على الورق أن يحقق حفر القناة في ثلاث مراحل . المرحلة الأولى تخص استخراج القشرة السطحية للأرض - على عمق ثلاثة أمتار - ويلزم فيها استخدام "عربات اليد النقالة " أو " أجهزة بالان (Blland) ، والمرحلة الثانية - تتعلق برفع شريحة ستة أمتار من الأرض - تتم بواسطة "عربات تجر بالحبل" وأخيراً فيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة كان متوقفاً استعمال "قماش طويل بلا نهاية (دائري) في النقل " (أنظر اللوحة التالية) . وتم طلب الأدوات اللازمة وتم تجهيز بعض المعدات . وقد قامت عدة مجلات دورية ومؤلفات موجهة إلى المهندسين بنشر الجهاز من جديد على أنه هو الأسلوب المستعمل^(٤٧) . ولكن في الحقيقة لم تستطع هذه المعدات أن تعمل في ورش قناة السويس لأن استخدام عربات اليد (brouette) الشائع في أوروبا كان غير معروف في مصر^(٤٨) . ولم يستطع فوازان الذي من المحتمل أن يكون قد أسرته عبقرتهم مقاومة الرغبة في نشر تصميمات هذه الأجهزة من جديد^(٤٩) . ويدعو هذا المثل للتأمل في الفارق الذي يفصل بين تصميم العمل المُعد في المكتب قبل التجربة والممارسة الفعلية للأشغال . ويحسب أيضاً على عدم اعتبار الأجهزة المرسومة في المؤلفات والموجهة إلى المهندسين على أنها بالضرورة انعكاس للممارسة الفعلية .

" كفاية آلات ا "

وترجع أيضاً الصعوبات التي واجهتها الشركة في إحكام وضبط آلات الحفر إلى عدم كفاءة مهندسي الطرق والكباري في مجال الميكانيكا

يجب معرفة في أول الأمر أن المهندسين في الطرق والكباري لا يدرسون مادة الميكانيكا أثناء دراستهم كعلم تصنيع وتشغيل الآلات هذا دون الحديث عن الآلات البخارية . فالخاضرات التي تخص هذا الموضوع والتي جاء لإلقائها كوريوليس (Coriolis) منذ عام ١٨٣٠ هي مداخلات قصيرة بقيت هامشية للغاية في إطار إعداد طالب الهندسة . ووجب انتظار عام ١٨٥١ ليتم تكليف بينواه كلا بيرون (Benoît Clapeyron) بإعداد مادة تدريس حقيقية . و تبدو البحرية على هذا الصعيد أكثر تقدماً ، فقد ألف مبكراً مهندمو الهندسة البحرية هذه الطاقة الجديدة وتردد العديد منهم على ورش الميكانيكا ^(٥٠) .

وفيما يتعلق بتنظيم المصالح المختلفة - وقد ذكرنا ذلك - قرر فوازان في بداية عام ١٨٦٣ منح رئيس القسم كل الصلاحيات في منطقته وينطبق ذلك على كل قطاعات الأشغال ويقصد بذلك الإدارات المسنولة عن المعدات . ولما كانت الورش الرئيسية واقعة في بورسعيد فقد وجد المهندس شميت (Schmitt) رئيس المعدات ، نفسه خاضعاً لنفوذ لاروش ، رئيس القطاع . وقد حدّ هذا القرار التعسفي فعلاً من السلطات التي مُنحت إلى شميت من قبل وهو الذي اعتبر منذ ذلك الحين أنه غير قادر على القيام بمهامه ومن ثمّ قدم استقالته وفي تعقيب على القرار الإداري الجديد قال :- " لقد انتزع مني كل السلطة ولم أعد قادراً على فعل أي شيء فلا أستطيع توجيه اللوم أو أخذ قرارات تأديبية حازمة دون أن أعرض إلى إهانة ، وكيف يمكنني إدارة قسمي إن كان في استطاعة السيد لاروش وقف الموظفين عن العمل وتسريح عمالي . لقد أضعف القرار الإداري معنويات العاملين معي ولا أريد أن أتحمّل مسؤولية هذا الأمر . فلم أسيطر على الموظفين والعمال إلا بعد جهود جبارة فأنتم تعرفون كيف كان حال الإدارة قبل وصولي ، فلم أحصل عليها إلا بفضل طريقة تصرفي ولأني عرفت كيف أقودهم واليوم قد أعطيت السلطات المطلقة إلى غيري أما بالنسبة للسلطة المعنية فهي لا تخضع للإدارة . وعندما تم الاندماج كنت أعتقد أن إدارتي سوف تبقى مستقلة [...] ولعلكم تقدرون التماس تغيير حيث أنني لا أستطيع البقاء في بورسعيد" ^(٥١) .

نجد في ذلك مثلاً آخر لنوع من العلاقات التي استقرت داخل الشركة . ففقد قسم سيمما (Sciamma) كبير المهندسين ، بالدفاع عن شميت رفيقه القديم في شركة مقاولات هاردون . و معي في الدفاع عن قضيته أمام فوازان إلى توضيح طبيعة وظيفة مهندس المعدات وثبات فاندقم . و شرح خاصة و بكل صراحة الأسباب التي يرى أنه لا ينبغي من أجلها وضع الورش تحت مسؤولية لاروش قائلاً : " تمتلك الشركة أكثر من أربعين آله بخارية وسوف يصل العدد بعد فترة إلى ستين أو ثمانين . ألا يحتاج وجود هذا العدد الهائل من المعدات إلى تنظيم رقابة فنية ؟ إن مهندسي القطاع مهما

كانوا أصحاب الكفاءات العالية في مجال الأشغال والحفر والبناء وفي دراسة المشاكل الكبرى التي قد يثيرها حفر قناة السويس ، لا يمتلكون بكل تأكيد الكفاءة والخبرة المطلوبة للاعتراف بأن ميكانيكياً عهد إليه بآلة يقوم وبكل العناية التي تتطلبها مصالحي هذه، بالاعتناء بها ومراقبتها والتنبه إلى التلف الذي قد يطرأ عليها والواجب إصلاحها على وجه السرعة. غالباً ما يحدث أن يظهر عند تركيب آلة ما عيب بسيط من السهل إصلاحه وعلى العكس إذا ترك العيب ففسد يتطلب الأمر بعد أيام قليلة تغيير الآلة . هل مهندس القطاع سيترف بوجود الخلل ويوقف مؤقتاً عمل الآلة لضبط الأمور قبل قوات الأوان ؟ لا بكل تأكيد . لأن مهندس القطاع يقوم بعدة مهام تتعارض نفسها مع أن يخصص الوقت اللازم لملاحظة الآلات المستخدمة كما أننا نرى مرور الكرام على الأشياء التي لا دراية كافية لنا بها و مهما كانت الجهود التي يبذلها فمهندس الطرق والكباري ليس مهندساً متخصصاً في المعدات . وقد كان لنا مثل واضح في شركة ميدي (الجنوب midi) . إن إلغاء الرقابة الفنية على الآلات التي كان يقوم بها المهندس المتخصص يعني قبول خضوع عمر الآلات إلى حد ما لعناية الميكانيكيين المسئولين عنها^(٥٢) .

وأشار بعد ذلك بقليل وبدون موارد إلى : " عدم كفاءة مهندس القطاع الأول فيما يتعلق بأشغال المعادن " . وكشف سيما بصراحة ، وهذه حالة نادرة للغاية وتستحق الذكر ، عن كفاءة مهندسي الطرق والكباري المحدودة . ولقد زاد تدليلاته قوة ، كونه من خريجي هذه الهيئة . وعلاوة على الحالات الخاصة التي استند إليها، فقد قدمت رؤيته أسباب - التي كان من الممكن تخيلها على كل حال - الغياب الطويل لمهندسي الطرق والكباري عن التطورات الكبرى التي أثرت في قطاع الأشغال العامة في ذلك العصر . فقد تركوا في ذلك الوقت المجال فسيحاً أمام المهندسين المدنيين الذين أظهروا مهاراتهم ومواهبهم في مجالات الميكانيكا والآلات البخارية والإنشاءات المعدنية و أتاحوا لقطاع الأشغال العامة بفرنسا تجاوز التخلف بالنسبة لإنجلترا والولايات المتحدة و لا نذكر هنا إلا البلاد التي درست جيداً .

ولم يكن لدى مهندسي الطرق والكباري في منتصف القرن التاسع عشر الكفاءات المطلوبة ، لذلك لم يدركوا مدى أهمية استخدام الآلات في الورشة . ويبدو تصريح موجيل وموشيليه بهذا الصدد صريحاً وواضحاً : " كنا نخشى من استخدام الماكينات لأن الماكينات التي كنا نستعملها كانت معقدة للغاية وكثيرة التكلفة وغير اقتصادية . لذلك لم يكن يعتقد المهندسون أن في استطاعتهم ، عند ما يجدون العمل سيئاً، إلا قول العبارة التالية : كفاية آلات!^(٥٣)

لم يكن يجمع المهندسون بشركة القناة الصفات التي تجعلهم رجالاً مبدعين إذ أنهم كانوا بعيدين عن موقع العمل وحريصين أكثر على استدعاء النظرية بدلاً من التجربة على استخدام

الأساليب الجديدة في التقنية ، كما أنهم كانوا حريصين على خضوع مرءوسيههم لهم . وكانوا كذلك غير أكفاء في مجال الميكانيكا إذ أنهم اعتادوا القيام بالمهام لإدارية أكثر من المهام الفنية البحتة المرسومة برؤية محددة للعمل . علاوة على ذلك ، لم يساعد التنظيم الهرمي الصارم ولا توظيف العاملين القادمين من قطاع إداري من غط مماثل على خلق الظروف الملائمة لنجاح التحديث التقني . أما في مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما فقد تمت تعبئة كفاءات أخرى وتطوير مفهوم مختلف عن الهيكل الهرمي وإفساح مجال للحوار بين مختلف المستويات ومنحت جزءاً كبيراً من الاستقلال الذاتي للمستولين . ويهتم العمال بإنتاجية الآلات التي يعملون عليها ويتواجد المدير شخصياً في الورشة . و تساعد هذه الاختلافات ، دون شك ، على تفسير عثرات شركة القناة .

علوم نادرة التطبيق

ما هي المكانة التي أحلتها العلم في ممارسة العامل الفني في الأشغال العامة في عصر الإمبراطورية الثانية ؟ هل يدين التحديث للعلم بشيء ما ؟ تشكل هذه التساؤلات المتكررة جزءاً من الموضوعات التقليدية للبحوث في تاريخ التقنيات . وقد وجه شارل جيليسي (Charles Gillespi) بمناسبة مؤتمر العيد الثوي الثاني للمدرسة متعددة التقنيات السزال فعلاً بطريقة هزلية ولكن مباشرة وبهذا الأسلوب : " كم من المهندسين استخدموا عملياً الجزء التحليلي لسبروني (Prony) أو للطبعات التي قدمها نافيه (Navier) عن بيليدو (Bélidor) ؟ " (٥٤)

وقد عرضت من قبل إجابات على هذه التساؤلات العامة . ولكن ينبغي الملاحظة أن معظم التحليلات التي تضمنتها استندت إلى أقوال العصر . و نقترح فيما يخصنا محاولة الإجابة عن طريق دراسة الممارسات التي تتم في الورشة . ومعرفة مدى تدخل العلم في الورشة ؟ وكيف أرشد العلم الممارسة أو ساعد على توجيه اتخاذ القرارات . ؟ وكيف استطاعت على سبيل المثال المعارف العلمية التي اكتسبت في المدرسة متعددة التقنيات التأثير على الممارسات ؟

لقد درسنا ثلاث حالات تخص ثلاث مسائل فنية طرحت نفسها على ورشة حفر خليج السويس على فترات متباعدة . وسوف نفحص في كل حالة أن كانت قد تمت الاستعانة بنظرية ما ، وفي حالة الرد بالإيجاب يكون التساؤل : بأية طريقة تم ذلك ؟ . وقد تم فحص النظريات والعلوم التطبيقية التالية : ميكانيكا التربة ومقاومة المواد والطاقة المائية أي المواد الثلاثة التعليمية التي تشكل أساس المعارف التي يدرسها مهندسو الطرق والكباري .

ميكانيكا التربة وتحديد ميل المنحدرات

تسعى ميكانيكا التربة إلى فهم و تصميم نماذج لتحولات التربة وحركتها كي تستطيع التنبؤ بها. ويُعد ذلك مقيداً للغاية في بعض الحالات الخاصة مثلاً عندما تصبح التربة قاعدة لبناء أو عندما يقصد بناء حائط لحجز الأتربة. ماذا تقدم نظريات ميكانيكا التربة المطبقة حينئذ للمعملين ؟

فقد ذكر جان كريزل (Jean Kérisel) أن مادة ميكانيكا التربة قد تطورت تطوراً مذهلاً بعد البحث الذي عرضه كولومب (Coulomb) أمام أكاديمية العلوم الملكية في عام ١٧٧٣^(٥٥)، وأن نظرية ضغط الأتربة بدأت تتضح تدريجياً بفضل العالم الإنجليزي رانكين (Rankin) (١٨٥٧) ثم العلماء الفرنسيين موريس ليفي (Maurice Lévy) (١٨٦٧) وارمان كونسيدير (Armand Considère) (١٨٧٠) وجوزيف بوسينسك (Boussinesque) (١٨٨٢) . وعلاوة على ذلك ، حدث تطور هائل في الخمسينات من القرن التاسع عشر . فقد سعى رجال وفي مقدمتهم الكسندر كولان (Alexandre Collin) إلى تطوير ميكانيكا التربة مستنداً إلى التجربة العملية ، بعد التجارب غير المنتظمة التي تمت في نهاية القرن ١٩ وبداية القرن ٢٠ والتي نشأ عنها نظريات غير قابلة للتطبيق إلا نادراً وفي الحالات الخاصة التي هي ناتجة عنها من جهة وبعد نظريات مستمدة من حسابات ومبادئ فيزيائية ليس لها مجالات تطبيق من جهة أخرى .

والسؤال : ما هو التأثير الحقيقي لهذه الدراسات المختلفة ؟ كانت مشكلة تحريك أراضي خليج السويس موضوعاً تم مناقشته مبكراً . ففي الواقع يؤثر ثبات الأرض مباشرة على تحديد عرض القناة. فقد أقرت اللجنة الدولية أنه بفضل حماية المنحدرات عند خط الماء بواسطة تحصينات صخرية سوف تبقى هذه المنحدرات حتى قاع القناة بميل أساسي يُقدر بـ ٢ للقاعدة مقابل ١ للارتفاع . وبعد تجربة حفر مجرى خلال بحيرات المترلة والبلاح ظهر بعض الشك فيما يتعلق ببقاء هذا الميل واقترح البعض تخفيف الانحدار وإتباع الميول بنسبة القاعدة إلى الارتفاع ١ : ٣ . ومع هذا ففي غياب نتائج مرضية ، بقيت الميول المنصوص عليها في البداية على حالها . ومع ازدياد الأشغال تضاعف استخدام الضفاف التي ما لبث أن تدهورت تحت تأثير الطبقية وموجات التيار العكسي الذي تسببه المعدات التي تمر في القناة . وأمام استحالة وضع الصخور التي قد تساعد على الحفاظ على الضفاف تقرر تغيير الميل المحدد وقبول الميل تحت الماء بنسبة ١ : ٥^(٥٦) . ولم يكس هذا الميل الجديد نتيجة لتطبيق قوانين ثبات الميول العامة على طبيعة أراضي الخليج . ولكنه نتج عن الملاحظة لأنه يتناسب مع الميل الذي يأخذه المنحدر طبيعياً في المكان الذي يتعرض فيه للتآكل .

حسب علمنا لم تطرح في أية لحظة أثناء هذه الورشة فكرة اللجوء إلى النظرية لحل هذه المسألة. فمنذ بداية الأشغال تم السعي لتحديد ميل منحدرات التراب انطلاقاً فعلاً من ملاحظة " ميلها الطبيعي". وقد طرح المدير العام ، في نوفمبر ١٨٦٠ ، الفكرة أنه بالإضافة إلى الأشغال التي قام الفلاحون بتنفيذها في عتبة الجسر قائلاً " يمكن تكوين فكرة دقيقة عن طريقة تحرك منحدرات القناة" ^(٥٧) ولم يتصور أيضاً أعضاء اللجنة الاستشارية شيئاً آخر سوى الرجوع إلى التجربة لحل المسألة والاكتفاء بالوقائع التي رصدت بشأن الميل التي اتخذتها المنحدرات ^(٥٨). و أشاروا في إحدى الجلسات إلى " أن المنحدرات سوف تأخذ بنفسها الميل الذي يلائم طبيعتها حسب الظروف التي تمت إقامتها فيها" ^(٥٩) وقد تقرر إذاً في النهاية تحديد الميل بنسبة حصة إلى واحد . وقد شرح لافالي بدوره في مداخلاته أمام جمعية المهندسين المدنيين كيف أدت به التجربة وحدها ، إلى اقتراح تهيئات على ميل المنحدرات وعلى عرض القناة أيضاً : " في أكثر من موقع لا تحتفظ منحدرات حوض القناة كاملاً بالميل المرصود بنسبة ٢ للقاعدة إلى ارتفاع واحد وتنخفض هذه المنحدرات إلى ٢,٥ أو ٣ لذلك كان لابد من توسيع سطح الماء أو تقليل عرض القاع . وكنا نلاحظ في نفس الوقت أن عبور القوارب وخاصة القوارب البخارية تصدم بشدة الضفاف القائمة بميل ٢ إلى واحد وتسبب في تهديمها [...] وحددت التجربة إذاً التعديلات الواجب إدخالها على المشاريع التمهيدية. وأكدت ضرورة توسيع إنقاص الرواسب حتى يمكن تخفيض ليس فقط منحدرات قاع القناة دون أن يؤدي ذلك إلى انخيار الضفاف والأنقاض ولكن أيضاً كي يمكن تكوين شاطئ حول خط الماء مائلاً قليلاً وممتد بما فيه الكفاية . " ^(٦٠)


ولابد من القول في النهاية إنه لم يتم الاستعانة في أي وقت بمبادئ ميكانيكا التربة وأن التجارب على الطبيعة وحدها هي التي وجهت الممارسة .

مقاومة المواد وأشغال الموانئ

ويُعد تاريخ أشغال الموانئ التي تم إنجازها في بور سعيد والتي شملت ، من جهة ، إقامة رصيفين داخل البحر ، ومن جهة أخرى ، بناء منارة ، هو المثل الثاني الذي اخترناه لتوضيح طبيعة الصلة بين النظرية والتطبيق . والاختصاص المعني هذه المرة هي مقاومة المواد .

لم تقدم النظريات مساعدة تذكر لتنفيذ العمل بشأن اختيار الموقع الدقيق لإقامة الميناء أو شكل لأرصفت السفن الممتدة في البحر. ورجحت كفة التجربة وحدها ، واعتبر استشعار تأثيرات المد والجزر والتيارات وظواهر الأمواج وكأنها عوامل حاسمة في مسائل الإنشاءات البحرية ، ولكن

هذه الظواهر معقدة للغاية ولم يستطع العلماء توضيحها بعد ، ومن ثم فإن تأثيرها على أشغال الحناء لا يتم تقديره إلا بشكل تقريبي .

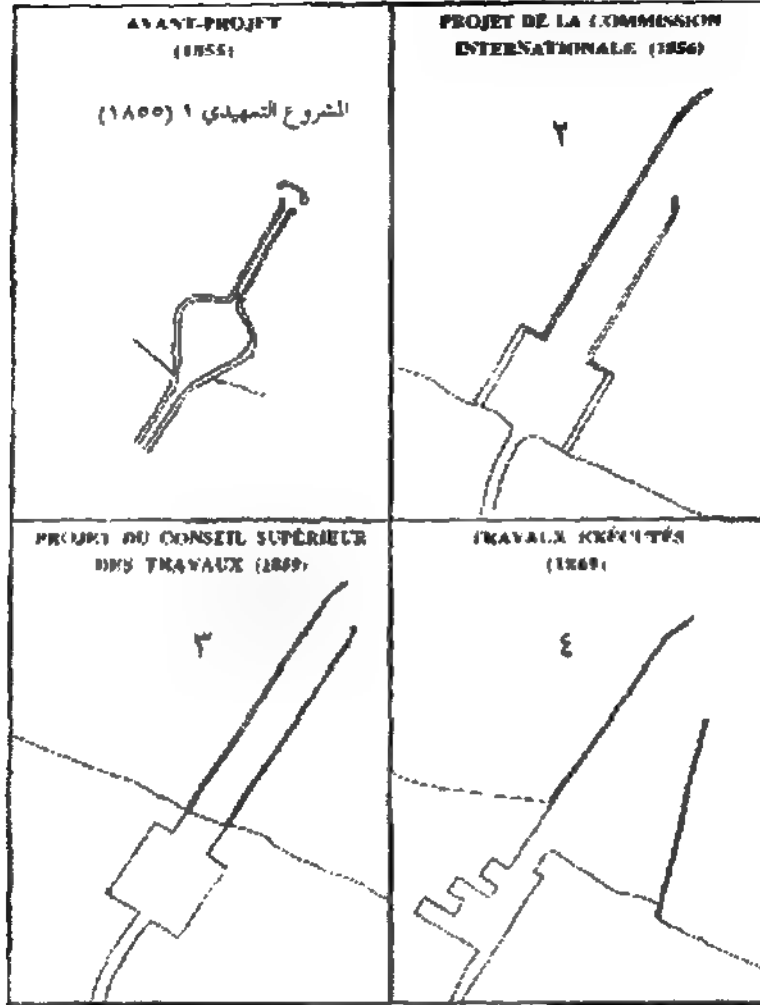

١ - المشروع التمهيدي (١٨٥٥)

٢ - مشروع اللجنة الدولية (١٨٥٦)

٣ - مشروع المجلس الأعلى للأشغال (١٨٥٩)

٤ - الأشغال المنجزة (١٨٦٩)

حواجز أمواج بور سعيد : المشروعات والأشغال المنجزة

(عن فوزان بك : قناة السويس ، أطلس لوحة ١٣ ، ١٩)

وظلت معرفة تفاعل المواد مثل الخرسانة المسلحة والملاط (المونة) مع ماء البحر مشكوكاً فيها . وقد أشار فوزان في الكتاب الذي ألفه في عام ١٨٧٩ عن شواطئ البحر ، أنه يتذكر بأن الاهتمام بتفكك المونة في المباني المستخدمة في البحر خلال الأعوام ١٨٤٠ - ١٨٥٠ قد تزايد وهي الفترة التي تمزت بلهجة قوية لأشغال تحسين المواني . وقد وصل التفكك لدرجة أن كثيراً من

أشغال البناء الجارية ظهرت مهددة بالانهيار القريب نوعاً ما^(١١). وكذلك تم إعلان تفكك الملاط المستعمل في الإنشاءات البحرية في عدة موانئ مثل لوهافر (Le Havre) ولاروشيل (La Rochelle) وهو ما أثار القلق الشديد عند المتخصصين^(١٢). وقد حاول الكثير منهم إيجاد تفسيرات للظواهر التي تم رصدها. فقد رأى مينار (Minard)، مهندس الطرق والكباري، أن البحث عن سبب الحوادث يكمن في البحث في كون أن النتائج الطيبة التي تم الحصول عليها باستعمال الجير المصنع الذي صممه فيكا (Vicat) في الماء العذب، تمت الاستفادة منها في ماء البحر دون حذر^(١٣). وقد أوصى من جانبه بالعودة إلى الطرق السابقة التي تتضمن الرجوع إلى الجير المائي التقليدي والصنء وهو التراب البركاني الإيطالي (Pouzzoulane) ومع ذلك اضطر للاعتراف بعد فترة قصيرة حتى مع استعمال المواد التقليدية فإن النتائج تظل غير مضمونة.

والسؤال: هل يقاوم ماء البحر ملاط الجير الغليظ (الصلصالي) أو المائي وصنء (pouzzoulanc) روما البركاني أم لا؟^(١٤) وكان رده: نعم في بعض الحالات. ولكن "لا يستطيع العلم الراهن إلقاء الضوء على ذلك"^(١٥) وقد أثار فيكا الاقتراح بالعودة من جديد إلى أساليب العمل السابقة وتطور الجدل بين الرجلين ونُشر في حوليات الطرق والكباري^(١٦) وواصل فيكا أبحاثه حول تأثير ماء البحر على ملاط تراب البركان الصناعي وعلى الخرسانات وعرض بعض التفسيرات عن ظاهري التحليل والتفقق التي تصيب الكتل المغمورة في ماء البحر. وقد قام بنشر نتائج أبحاثه عام ١٨٥٧ في كتاب عنوانه "أبحاث في الأسباب الكيميائية لتدهور العناصر المائية بواسطة ماء البحر وعن أساليب تقدير مدى مقاومتها". واستمر الجدل عندما أنتقده مينار (Minard) لإجرائه تجارب في المعمل، بينما يرى هو أن إجراء التجارب في البحر وبالبحر الطبيعي قد تكون هي وحدها القاطعة^(١٧). وتدخل في الحوار مهندسان آخرون: ريفو (Rivot) مهندس المناجم وشاتوني (Chatoney)، مهندس الطرق والكباري، وقام الاثنان بدورهما على إثر التجارب التي أجريت في مدرسة المناجم بنشر ملخص نتائجها^(١٨) واعترفا عند تقديمهما افتراضات موضحة للمشاكل المطروحة "إن كان بعض الحوادث المشار إليها في الإنشاءات الحديثة يرجع إلى عيب في الرقابة عند اختيار وإعداد و استعمال المواد، فإنه يجب تفسير أغلب حالات تحلل الملاط بمعرفة لا تزال ناقصة للتكوين الكيماوي والطريقة الخاصة لتشغيل كل نوع من المواد المستعملة"^(١٩) وقد جدد هذا المطبوع الجديد النقاش ودفع فيكا إلى تدوين ملاحظات جديدة نشرها حوليات الطرق والكباري^(٢٠).

في عام ١٨٥٩ وهو عام بدء عمل ورشة قناة السويس، كانت ظواهر كثيرة مازالت مجهولة. ولم يكن ممكناً التوصل إلى قانون عام ناتج عن مختلف التجارب التي أجريت. وقد لاحظ المراقبون

تفاعل الكتل المغمورة في ماء البحر و اختلاف تفاعل نفس المادة حسب استعمالها في البحر المتوسط أو في المحيط. فقد نجح جيم مائي "التل لا فارج" في البحر المتوسط . أما في المحيط فقد فشل المهندسون استعمال أسمنت بورتلاند (Portland) في الخرسانات المخصصة لتوضع في ماء البحر . علاوة على ذلك ، انتشرت عندئذ فكرة أنه كلما تماسكت المونة بسرعة كلما زادت قدرتها على المقاومة . ومع ذلك كانت نظريات المختبر التي ظهرت في حوليات الطرق والكباري دون فائدة بالنسبة للممارسين الذين من شأنهم اتخاذ القرارات . وتم مع ذلك بناء حواجز أمواج بور سعيد من الأسمنت دون استطاعة التنبؤ بكيفية مقاومتها.

كما كان اختيار خرسانة "كوانية " موضعاً لنفس القدر من الشك لعمل منارة بور سعيد . وكان لاروش رئيس قطاع بور سعيد مسئولاً عن تشييد البناء الواقع في نطاق اختصاصاته . ويعتبر بناء برج المنارة من خرسانة كوانية سابقة أولى لم يكن الزمن قد أثبت صلاحيتها بل كانت أول مرة استعماله في هذا النوع من المباني

لقد كانت الأشغال قد بدأت فعلاً عندما عبر لاروش عن قلقه بالنسبة للأحجام التي قررهما المقال كأساس لهذا المبني : " يثير مجرّد فحص الأساس الجديد بعض الشكوك في صلابته . وقد حاولنا أن نوضح هذا الشعور . وكان لابد لذلك من حساب مقاومة أحادي حجر الأساس (الاعمدة أو المسلات المنحوتة في كتلة حجر واحدة) . وقد تم دراسة المسألة من عدة جوانب ولكن لم يتم التوصل لإيجاد الحل . ولم تكن أكثر توفيقاً عند محاولة تحديد المقطع الأقل مقاومة . ولم تتمكن بالاستدلال المنطقي ولا بالأمثلة من تحديد موقع وشكل ومقاومة المقطع . وأمام هذه العقبة فكرنا ما يلي أي : " لو كان الأساس متيناً بما فيه الكفاية لا يمكن أن يتعرض مقطع ما إلى جهود مفرطة " (٧١) .

وقاده تفكيره في أول رد فعل نتيجة دراسته في المدرسة العليا متعددة التقنيات وفي مدرسة الطرق والكباري بعد ذلك إلى البحث عن حل من الأمثلة السابقة وعند قصورها لجأ إلى علم الحساب . ولا تهدف إلى الدخول في تفاصيل الحسابات التي قام بها لاروش ولكن علي العكس يهمننا عرض الملاحظات التي صحتها . فقد كتب لاروش إلى رئيسه فوازن ليعرض عليه الصعوبة التي واجهها للتوصل إلى نظرية يمكن تطبيقها " تحدثت في المراسلات التي تشرفت بتقديمها لكم بشأن منارة بور سعيد عن الصعوبات التي قابلتها في دراسة الأساس . وقد اضطررت لتحديد سمك اللوح الجداري حسب تقدير الجهود القصوى التي سوف تؤثر علي مختلف أجزاء الأساسات . وقد كانت هذه الحسابات غير أكيدة أولاً لأنها تستند علي فروض قد تكون بعيدة عن التعبير الدقيق للحقيقة وثانياً لأن الأساليب التي استعارتها عن نظرية مقاومة المواد لا يمكن تطبيقها بدقة علي الظروف التي تم استخدامها فيها " (٧٢) .

وتأتي بعد ذلك حسابات تدخل فيها مفاهيم الفيزياء المتاحة لعدد قليل من المتخصصين والتي تملأ عدة صفحات . ولكنه اتضح له بعد قليل الطابع الوهمي للمساعدة التي يمكن أن تقدمها فعلاً هذه الحسابات . فلم تكن نظرية مقاومة المواد قد تقدمت بما فيه الكفاية بعد حتى يمكن تطبيقها في الحالة التي قمه و ظلت الحسابات غير قادرة علي تقديم أية مساعدة للمُنْغذ العملي . وقد اقترح لاروش عندئذٍ منهجاً آخرأ : " من المفيد جداً إجراء تجارب مباشرة علي الخرسانة المستعملة وفي أشكال قاعدة المنارة نفسها . وأود تنفيذ نموذجاً من القوالب الطوب لقاعدة المنارة ١/٢٠ وأخضعه إلى حمولة لدرجة أن الضغط الكلي علي قاعدة النموذج يكون وزن المنارة الكلي في نسبة المساحة السفلي لسطح أساس المنارة . وأقدر تكاليف هذه التجربة بحوالي ألف فرنك " .

وفي نهاية الأمر اتجه إذاً رئيس قطاع بور سعيد إلي طريقة النموذج المصغر التي استعملتها من قبل أجيال من البنّاءين . و يعتبر الافتراض الضمني لاستعمال النموذج المصغر أن ملاحظة الظواهر

تعتمد على حجم الصنع وليس على أبعاده المطلقة (مبدأ التشابه والتماثل في حساب الميكانيكا).
و عبر مدير عام الأشغال في رده على لاروش عن شكوكه بشأن النتائج المنتظرة من الطريقة
المقترحة وأشار إلى تقدم الأشغال كي لا يوافق على الطلب : " لن تؤدي التجربة المصغرة في رأيي
إلى نتائج قاطعة إلا بصعوبة بالغة ، لأنه بصرف النظر عن اختلافات التجانس لا يمكن القول بدقة
كيف تغير كتلة أساس المنارة . وبافتراض أن التجارب قد أثبتت عدم كفاية الأساسات لستم على
يقين من أنه قد يكون ثمة إمكانية لتقوية هذه الأساسات مرة أخرى . لهذه الأسباب لا أوافق على
صرف تكاليف التجربة " (٧٣) .

مع ذلك فإنه لم يبق غير مبال بالمعلومات القوية المستفادة من تلك التجربة و اضاف قائلا : " لما
كان مع ذلك من المهم معرفة درجة مقاومة قوالب الطوب كما يتم تنفيذها فمن الأفضل إيجاد
وسيلة لاستخراج مكعبات صغيرة من كتلة نفس القاعدة لتحديد مقاومتها ضد التهشم " .

وبين هذا المثل ، في ذات الوقت ، عدم نضج نظريات مقاومة المواد وأن طبيعة تفكير المهندسين
خارجي المدرسة متعددة التقنيات يدفعهم إلى اللجوء إلى النظرية . علاوة على ذلك ، يوضح هذا
المثل بجلاء المخاطر التي يتعرض لها المقاول الذي لا يتردد في الإقدام على بناء غير متأكد مسبقاً من
السيطرة على تقنيته .

نظرية هندسة المياه (الهيدرولية) ومناسبة إقامة الأهوسة

ظلت معارف علم المياه بصدد سيلان الماء المنتظم ، في منتصف القرن التاسع عشر ، مقتصرة
على قوانين كل من شيزي (Chézy) (١٧٧٥) و دوبوا (Dubuat) وبروني (Prony*) .
وتم تعيين هنري - أميل بازان (Henry - Emile - Bazin) في مدينة ديجون في عام ١٨٥٤ مع
دارسي (Darcy) في البداية ثم بمفرده حيث أتمك في دراسات أصبحت بعدها مصدراً
لتطورات جديدة في هذه المادة التعليمية. ولكن ماذا فعل رجال الورشة بقوانين علم المياه
(الهيدرولية) التي كانت تحت تصرفهم ؟

عند ما نقبنا في تقارير الأشغال الشهيرة مثل البحوث المختلفة المتعلقة بالمسائل التقنية التي
طرحت في ورشة قناة السويس ، بحثنا عن أثر تطبيق النظريات وحاولنا خاصة ولكن دون جدوى
إخراج المثل المضاد من مكمته ، الأمر الذي كان يمكن أن يساعد على تأكيد رأينا والإيجاء بأنه في
بعض الحالات قد تم تطبيق النظريات العامة التي درست في الكتب أو في مدرجات المدرسة متعددة
التقنيات . ولكن على العكس لقد تضاعفت الأمثلة و تعددت ولكن دائماً في نفس الاتجاه وهو
قيام التجربة وحدها بتوجيه الممارسين . وفي الحالات النادرة التي أشير فيها إلى قانون كان

استخدام هذا القانون لتبرير اختيارات ناتجة عن التجربة والتحقق سلفاً المقاربة . ولكنه لا يروشد إلى صنع القرار . وذلك ما تم استنتاجه علي وجه الخصوص من الوصف الذي قدمه لنا مونتيل (Monteil) عن طريقة تحديد الضغط في أنبوب المياه الذي يوصل الماء إلى بور سعيد : " لقد تم إجراء تجربة أنبوب للمياه لمعرفة تدفق الماء إلى بورسعيد بواسطة آلة ضخمة بسرعة تتراوح بين ١٦ و ١٨ دورة في الثانية ، وقد أضر المهندسين المسئول عن هذه التجربة إلى وقف التجارب حتى لا يفسد الأنبوب نظراً لشدة الضغط . أضف أنه بتطبيق قانون بروني (Prony) نجد أنه لا بد من أن يكون الضغط الجوي من ١١ إلى ١٢ وحدة لتوصيل كمية الماء التي ترفعها الآلة الضخمة إلى بور سعيد ، و لضمان أمان شبكة القنوات تم اتخاذ القرار بإلا يتعدى الضغط في الأنابيب علي ٤ وحدات ضغط جوي^(٧٤) .

ويساعد هنا قانون بروني على بلوغ الحد الأقصى والتحقق فيما بعد من قيمة تم تحديدها بالتجربة . كما يتيح الحساب تقدير النتيجة التي حصل عليها المفاول من التجربة . وبناءً عليه لا تروشد نتائج تطبيق النظريات فعلاً ممارسة الرجال علي أرض الواقع . ومن الأصح القول أنها تؤكد وأحياناً تطمئن بتقديم قيم تقريبية نحن نسعى إلى تقديرها . ولكن في معظم الحالات يظل اللجوء علي التقريب غير كافٍ ولا يمكن بناء عليه القيام بأي اختيار بالافتصار علي نتائج استنبطت من النظريات . وهو ما توضحه الواقعة التالية المتعلقة بضرورة إقامة أهوسة في أقاصي قناة السويس .

وكان أحد أبطال هذه الواقعة هو شارل - أنطوان بواريه (Charles Antoine Poirée) مهندس الطرق والكباري الذي أشتهر في الأربعينيات من القرن التاسع عشر بفضل تصميمه نموذجاً لسد متحرك . وكان يتم استشارته دائماً بعد هذا النجاح في كل مسألة لها صلة بمشاكل الملاحة . وقد تمت ترفيته مراقباً عاماً للطرق والكباري . و كان متقاعداً حينما بدأ يهتم بالأشغال التي تتم في خليج السويس . و أقنع بسرعة كبيرة أن الأهوسة ضرورية في القناة البحرية . ولم تكن مسألة معرفة إن كان من الضروري أم لا تزويد قناة السويس بالأهوسة جديدة . فعندما ناقشت اللجنة الدولية البرنامج العام لتنفيذ أشغال حفر خليج السويس أثرت المسألة ونوقشت : " هل سوف يتم تزويد القناة بأهوسة أم سوف تصبح "مضيقاً" (بومفوراً) ؟ ^(٧٥) وقد أعطت اللجنة أغلبية الأصوات لصالح الحل الأخير مستندة خاصة إلى الحسابات التي أثبت بواسطتها ليو (Lieussou) أن السرعة الناتجة عن مد وجزر البحر الأحمر في مضيق البوسفور تكاد تتجاوز عقدتين *بحريتين وهي نسبة معقولة تماماً وفوق ذلك فإن هذا لا

* العقدة : هي وحدة سرعة بحرية تساوي ١٨٥٢ متراً في الساعة

يتم إلا في الظروف القصوى. و في نفس الوقت كان ماك لين (Mac Lean) الإنجليزي الجنسية والعضو في اللجنة مناصراً متحمساً لبناء قناة فوق مستوى البحر بماء النيل ، أي قناة تشكل خزاناً دائماً تبنى في أقصاه أهوسة في مياه مواني البحر المتوسط والبحر الأحمر العميقة . وبعد عدة سنوات قام بوريه (Poirée) كذلك بإجراء حسابات انتهت إلى سرعة أعلي من تلك التي حددها ليسو (Lieussou) و أقرّ أن مثل هذه السرعة تتطلب إقامة أهوسة في القناة . وفي شركة القناة قام فيكتور كاديا ، رئيس إدارة باريس ، بدراسة المسألة في عام ١٨٦٤ . معتمداً على افتراضات ليسو نفسها ولكن مستخدماً نظريات أخرى فقد ف. كاديا (V.Cadiat) أن سرعة الماء في طرلي القناة سوف تكون أعلي من التي حددها ليسو إلا أنها تظل غير كافية لقرض إقامة الأهوسة.

وفي نفس السنة عينت اللجنة الاستشارية فيكتوران شيفاليه (Victorin Chevallier) للبت في هذه المسألة . وبالرغم من أن الأشغال كانت قد بدأت منذ خمس سنوات ، فإن النقاش فيما يتعلق بضرورة إقامة أهوسة قد استمر . وقد رأى رجال الورشة من جانبهم بصورة بديهية بأن الأهوسة ليست ضرورية ولكن يجب إيجاد أجوبة علي اعتراضات بوريه الذي أعلن علي الملأ أنه لا غني عنها . وعرض شيفاليه في تقريره بوضوح الآراء الثلاثة المطروقة : "كان يريد البعض حرية حركة المرور بالمضيق كملك الموجودة بمضيق السفور وقد يفضل آخرون الخضوع للأهوسة وفي نفس الوقت التأكد من النجاح الذي تضمنه . وأخيراً يخشى البعض التأثير المعنوي الذي قد يتعرض له مشروع القناة لو ظهر في بداية الاستعمال أن أنه مضيق متعذر التنفيذ . وبناء عليه طلبوا بسرعة بناء الأهوسة شريطة أن تترك مفتوحة مادامت التيارات الشديدة لم تلزم بإغلاقها" (٧٦)

وكان من رأيه شخصياً استبعاد الحل الوسط وأنصاف الحلول غير المرضية تماماً . وصرح بأنه يجب " الاختيار بصراحة بين مضيق بأهوسة مع تشغيلها بصفة دائمة أو مضيق بدون أهوسة" (٧٧) . ويتميز اختيار حل المضيق بتوفير التفتحات المترتبة عن إنشاء الأحواض (بين هويسين عند مدخل المرفأ) إفساح المجال أمام السفن التي تعبر القناة البحرية . علاوة على ذلك ، يُتيح هذا الحل إمكانية توسيع وتعميق الممر فيما بعد حسب الاحتياجات المستقبلية . الأمر الوحيد الذي يمكن أن نخشى حدوثه عندما يقع اختيارنا على هذا الحل هو ظهور تيارات قد تكون عنيفة لدرجة تعوق حركة السفن وتؤدي إلى تدهور ضفاف القناة . و تعود مشكلة الأهوسة إلى مسألة أكثر بساطة ألا وهي تأثير التيارات على القناة .

وقد جمع شيفاليه نتائج حساب سرعة التيارات في قناة المستقبل التي توصل إليها علي التوالى لیسو وبواريه وكاديا في الجدول التالي^(٧٨)

نتائج تقديرات حساب سرعة التيارات ، أعطيت بالتر في الثانية، في قناة السويس

فرضية	فرق مستوي البحرين	عرض القناة على السطح	الكاتب		
			كاديا	بوريه	ليسو
بقاء البحيرات المرة	٠,٨٦ متر	٤٤ متر	١,١٤	١,٥١	١,١٦
	٠,٠٠ متر	٤٤ متر	١,٠٧		
	٠,٨٦ متر	٢٢ متر	١,٦٨		
	٠,٠٠ متر	٢٢ متر	١,٥٩		
تجنب البحيرات المرة	٠,٨٦ متر	٤٤ متر		١,٣٩	١,٠١
	٠,٨٦ متر	٢٤ متر		١,٣٩	
	٠,٨٦ متر	٢٢ متر	٢,٦٩		
	٠,٠٠ متر		٢,٥٨		

وظل فيكتوران شيفاليه ، أول دفعة المدرسة متعددة التقنيات سابقا، يشك في صحة هذه الحسابات. وتدل الصفات التي أستعملها عن تحفظه حيال مختلف محاولات التقدير النظرية ، فيشير إلى "حسابات إلي حد ما صحيحة " وإلى " حسابات ليسو المتسامية " ^(٧٩) أو إلى " البحث العلمي الجهد" لكاديا ^(٨٠). ويرى أن مختلف المؤلفين لم يُقدروا مدى تشعب المشكلة المراد حلها. وفي رأيه أنهم " أقاموا حساباتهم علي فرضيات مشكوك في صحتها بل أنهم لم يأخذوا في الاعتبار إلا جانب واحد من هذه المشكلة الهامة" ^(٨١) عندما أخذوا فقط في الاعتبار التيارات الناتجة عن المد والجزر في طرفي القناة . ويرى بشكل أكثر عموما أنه من المستحيل الجمع في بعض المعادلات كل الحالات التي تدخل في حساب الظواهر المعنية . وهذا السبب طلب شيفاليه في نهاية تقريره ، مستبعداً كل الحسابات ، أن يقوم رجال الورشة باختبارات لتحديد سرعة الماء في القناة بالتجربة ^(٨٢)

ولم يسمح هذا التقرير بإثناء الجدل وعاد من جديد شارل بواريه ، معتمد أ علي اعتقاده الراسخ، ليخوض حملة تساند إقامة الأهوسة. ولكن افتتاح القناة وحده هو الذي أوقف هذا الإلحاح . ولإدراك مدى إصراره نُذكر بالتسلسل الزمني لمداخلاته و أولها " ملاحظات عن مشروع

حفر خليج السويس الجاري تنفيذه " بتاريخ ٨ إبريل ١٨٦٤ . وبعد أربعة أيام أرسل الملاحظات إلي بيهك (Béhic) وزير الزراعة والتجارة والأشغال العامة، طالبا منه قيام خبراء من إدارته بمعاينة الأمر . وقد ذكر الرد الذي وصله بتاريخ ١٩ أبريل أن قسم الأشغال العامة لم تكلف رسمياً بدراسة مشاريع شركة القناة . و دون أن يضيع وقته قام بواريه بإرسال ملاحظاته لرئيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية . ولم يرضه جواب دي لسبس المؤرخ في ١٤ مايو التالي والمتخلص والملئ بالتسويق وأخ ليحصل من مدير عام الأشغال علي تفسيرات شفوية . وفي يوم ١٩ حوّل دي لسبس المسألة إلي فوازان الذي قبل المواجهة المطلوبة . وأثناء ذلك الوقت ، قام فيكتوران شيفاليه بكتابة تقريره عن هذا الموضوع . وفي ٢٧ يونيو أخبر دي لسبس شارل بواريه بأن دراسات وملاحظات إضافية سوف تجري بناءً علي نتائج تقرير شيفاليه . وسارع بواريه في اليوم التالي بالرد وأخ في الإشارة إلي آخر ملاحظة في التقرير بشأن إطلاق حرية العاملين بالورش للقيام باختبارات قائلاً " أنه من الضروري القيام بملاحظات متزامنة ومباشرة ومقارنة في كل من السويس وبور سعيد والتمساح " ^(٨٣) ولم يرضه كثيراً ما عرض عليه من إجابات و قرر عندئذ اتباع إستراتيجية جديدة لإسماع صوته ؛ وطرح المناظرة في الساحة العامة عندما نشر الرسائل التي تبادلها مع شركة القناة ^(٨٤) . وبعد مضي عام كان مازال غير راض عن عدم إضافة إنشاء الأهوسة ضمن برنامج الأشغال و عاد إلي الكتابة ليشرح ملاحظاته الجديدة ^(٨٥) .

تعتبر مسألة الأهوسة النقطة الرئيسية التي يختلف عليها بواريه (Poirée) مع القرارات التي اتخذت ولكنها ليست الوحيدة . فقد كان يرى أن القناة يجب أن تتجنب البحيرات المرة ولا تعبرها وأن أقل عرض لها يجب أن يكون أربعة وأربعين متراً علي السطح وليس اثنين وعشرين متراً . وأخيراً يجب إلغاء العقد المبرم مع شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما ^(٨٦) وذلك " من أجل اللجوء إلى أسلوب عمل أقل تكلفة من استعمال الآلات " . علاوة على نفور مهندس الطرق والكباري من استخدام الآلات وهو الذي نجده هنا أيضاً ، نرى أن الأسلوب الذي استعمله بواريه هو أقرب إلى الإنذار منه إلى النصيحة الودية أو الموعظة . فلماذا هذا الإلحاح في إغداق الأوامر بشأن ورشة لا تعنيه أولياً ؟ كانت في الواقع حوافزه المعترف بها مزدوجة " لأني مهندس فرنسي أرغب في ألا تتعرض قناة السويس البحرية والتي سوف تعتبر علي الدوام عملاً فرنسياً إلي أي فشل في اللحظة الأولى لاستغلالها . الأمر يتعلق بشرفنا القومي وبصفتي مساهماً رأيت أن من واجبي الدفاع عن ١٩٤٢٤ مساهماً من بين ٢١٢٩٩ مكتباً فرنسياً ليس في استطاعتهم المشاركة في مداورات الجمعيات العمومية بما أنهم يمتلكون أقل من ٢٥ سهماً " ^(٨٧) .

ومهما كان ذلك يبدو مدهشاً اليوم ، فإنه يمكن إثبات بأنه لم يتم التوصل في العصر الذي تم فيه حفر القناة لأي رأي قاطع يتيح الحزم بإعفاء هذه القناة من إقامة الأهوسة ففي الحقيقة لم يكن هناك من يستطيع تقديم إجابة مُبصرة : " لا يمكن حل هذه المسألة إلا عندما نعرف نظام المد والجزر في هذا الجزء من القناة وتستطيع التجربة وحدها الحكم بصدد هذا الموضوع " (٨٨) وتلخص هذه الملاحظة التي نشرت في خليج السويس جريدة وصل البحرين وهي لسان حال الشركة ، بطريقة جيدة الإحساس العام للفنيين.


علم الهندسة والجسور المائلة

إذ لم تتم فعلاً الاستعانة بأي نظرية فيزيائية فقد تم على العكس من ذلك اللجوء عدة مرات إلى علم الحساب البسيط والهندسة اللذان ساهما في أغلب الأحيان في توجيه الممارسات . والدليل الأوضح نجده في ورش المسطحات المائلة حيث تدخلت الاعتبارات الهندسية في ترتيب الورشة ويستخدم التقرير الذي كتبه المراقب دانيال بالا (Daniel Palaa) كمصدر رئيسي لدراسة هذه الورشة الخاصة . (٨٩)

لنرجع في بادئ الأمر إلى ظروف سير ورشة " المسطحات المائلة " وإلى بعض خصائصها. ففي البداية رأت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما، المسئولة عن الأشغال في أقسام الشالوفة، تنفيذ الحفر بواسطة الجرافات على أن يدخل ماء ترعة الماء العذب في هذه المنطقة عن طريق ترعة تحويل كما تم عمل ذلك في قسم آخر يقع في الشمال قليلاً . ولكن العثور على الصخور أدى بالمقاولين إلى العدول عن هذا المشروع وتكفلت الشركة بانتزاع تلك الصخور . ومن أجل هذا العمل الخاص المنفذ بنظام الإدارة المباشرة تمت إقامة جسور مائلة وضعت عمودياً على محور القناة سميت بالمسطحات العمودية وأقيمت على حاجز صخري وحوله . وترفع كميات الأتربة بواسطة هذه المسطحات من فوق الحاجز الصخري ثم ترفع الصخور وأخيراً كمية التراب السفلي حتى مستوى سطح القناة . وقررت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما بخصوص الردم المكلفة به في هذه المنطقة، الاقتصار على تنفيذ الأسلوب الذي اختبره من قبل وكلاء شركة القناة وهو استعمال الجسور المائلة أيضاً.

وكان نظام الإدارة المباشرة بمثابة مرجعهم في تنفيذ بقية الأشغال في قسم الشالوفة والتي كانت فرصة لتحسينات جديدة لأساليب سوف تستفيد منها ورش القطاع التالي أي قسم سهل السويس. وبذلك تحسنت المهارات من قطاع لآخر والعملية مستمرة : كانت تستخدم التحسينات التي تتم في ورشة كمنطلق لتنظيم الورش التالية.

ولتشغيل الجسر المائل أقيمت خطوط حديدية في قاع الحُفر تسير عليها عربات يملأها عمال الردم بالحجرفة وتقوم البغال بجرها . وتحرك آلة بخارية وضعت أعلى الجسر جزيراً ملفوف حوله سلسلة مرتبطة بعربات . وترفع العربات المملوءة فوق إحدى خطوط السكة الحديد أثناء نزول العربات الفارغة على الخط الآخر . وعند ما تصل العربات مملوءة إلى أعلى تجرها البغال حتى المقلب ثم ترجع بها بعد تفريغها. وأحد مميزات هذا الأسلوب هو إشراك أنواع مختلفة من القوى المحركة في نفس الورشة بطريقة مُكملة لبعضها : الإنسان والحيوان والآلة البخارية .

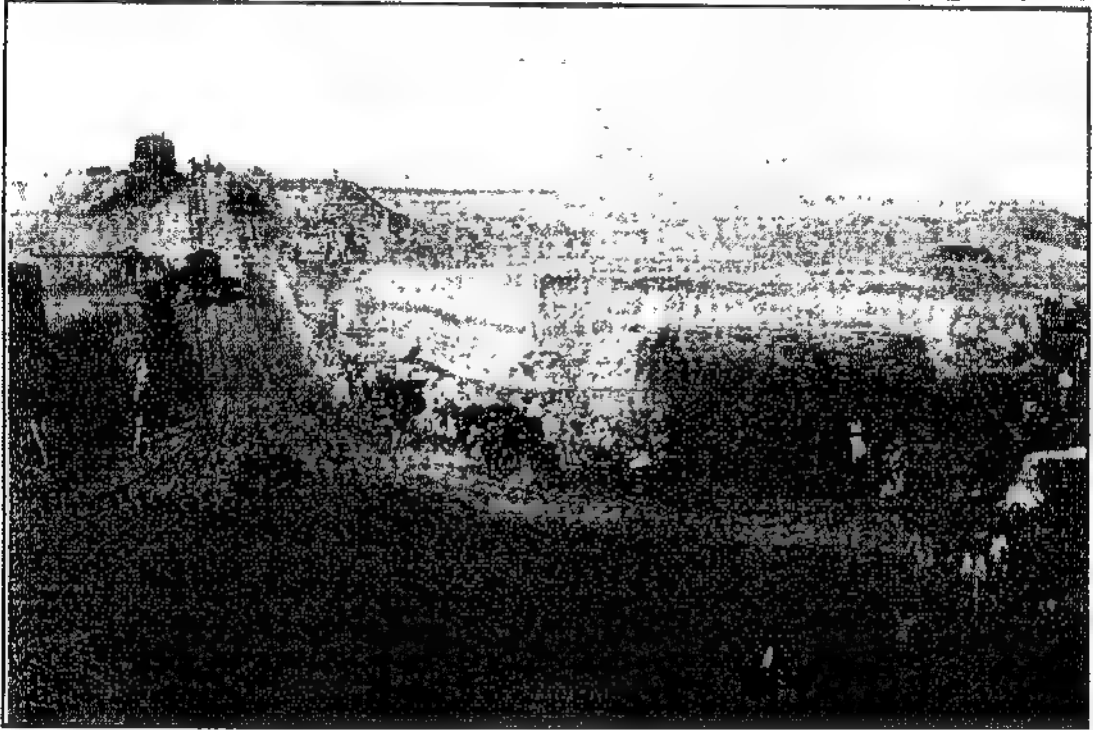

الجسر المائل بالشالوفة

(صورة ل. كوفية المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية)


ومنذ نهاية القرن الثامن عشر ، سمي مهندسو الدولة في ورش الحفر لقياس الزمن والأحجام وإقامة المعدلات والبحث عن وسائل لزيادة الإنتاج . ومع ذلك لا يعتمد المقاول بنائاً عندما يقوم بتنظيم ورشة على هذه المعدلات . والتمارين التي قام بها المهندسون هي أمثلة أخرى لعقلنة لاحقة . ويقوم المقاول بتنظيم الورش بالتدرج عن طريق التجارب والتعديلات المتتالية حتى يحصل على أفضل تنظيم يبدو له . وتسمى كل التعديلات التي تُجرى على أسلوب قديم إلى نفس الهدف ، أي خفض التكاليف وهو ما يرجع غالباً إلى تقليص زمن التنفيذ : " يجب حتى لا تتوقف الآلة زيادة ضخمة في عدد رجال التحميل حتى يصبح زمن التحميل أقصر وقت ممكن . وكان أدنى عدد أنبته التجربة هو ٢٥ رجلاً لكل خط " .

ويرجع الفضل في التحسينات التي أدخلت على الطريقة وبدرجة كبيرة إلى الملاحظات التي تمت في الورش الأولى . وفي حالة الجسور الأولى التي أقيمت لتنفيذ الحفر في قسم الشالوفة على الناشف ، كانت ترفع العربات في بادئ الأمر الواحدة تلو الأخرى ثم الثتان باثنتين . وعلاوة على ذلك ، تم التغيير من الجسور المائلة العادية إلى الجسور المائلة بمنحدر خفيف . وقد لوحظ فعلاً أن هذه التعديلات الجديدة تمثل مزايا: " يساعد الميل من ٧ إلى ١ بدلاً من ٥ إلى ١ الذي طبق في الجسور المستوية على صعود العربات ذات الحمولة الكبيرة بجهد أقل بكثير بالنسبة للأسطح العمودية ويقلل أيضاً تحطم السلاسل . فبينما تستهلك السلسلة في السطح العمودي بعد خمسة عشر يوماً يمكن استعمالها طوال شهر بالجسور المائلة . وتستطيع الآلات رفع أحمال أكثر وزناً (حيث وضعت مرافع على العربات) . و بهذا الأسلوب يعمل على كل سطح ٣٠٠ عربة في اليوم" .


وتعتبر مقارنة النتائج التي تم الوصول إليها هي المعيار الحاسم لتقدير مدى تفوق طريقة على أخرى : " كان معدل الإنتاج للمسطح ١٠٠٠٠ م^٣ بينما لم تعط المسطحات العادية إلا ٨٠٠٠ م^٣ .. " وتعالج الحلول المتبعة تدريجياً عيوب التشغيل التي تم ملاحظتها : " كنا عند المرحلة الثانية في غاية الارتباك فكان صغر شعاع المنحنيات الحديدية يسبب خروج القطار باستمرار عن الخط ، وقد أدى ذلك إلى التفكير في المسطحات الموازية التي يمكن بسهولة وصلها بخطوط التحميل عندما تكون زاوية التقاطع زاوية حادة جداً " .

وإستخدمت قضبان سكة الحديد في هذه الورشة مرة أخرى وبشكل واسع لتسهيل التنقلات . وتم ابتكار تجهيزات خاصة لرفع المردود . فوضعت قضبان سكة الحديد على شكل نصف دائرة حتى يمكن تخزين عدد من العربات إلى خط جانبي في مواقع محددة أثناء سير العربات الأخرى . وقد ضاعف هذا الترتيب الجديد بشكل ملحوظ من مردود الجسور إذ تم تفريغ ٤٠٠ عربة في اليوم بدلاً من ثلاثين عربة في البداية . وتم التفكير في إقامة خط تقاطع على شكل S (أنظر الشكل المقابل) على نفس منحدر السطح " لأنه في الواقع عندما كان يدخل الحفرة والعربة محملة لو العربة الأخرى في أعلى المنحدر كان لابد لكي تتمكن من الزول صعود العربة المحملة . وكان ينتج عن هذه العملية ضياع وقت هائل بالنسبة لفريق العمل الذي ينتظر بعربات فارغة " .

وقد أتاحت هذه التحسينات مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات وتمت ملاحقة الوقت الضائع والقضاء على ضياع الوقت في كل مكان بأحدث الطرق المتكررة . وكان آخر ابتكار هو الذي أطلق عليه خط التفهقر أي الرجوع إلى الخلف . عندما لوحظ إن الآلة تتعطل في انتظار صعود الرديم وأن هناك أربعة طرق حديدية أنشأت من قبل -وهو أقصى حد نظراً للمساحة المتاحة - تم تنظيم "مباشرة العمل خلف المسطح" عن طريق خطوط التفهقر أو الرجوع إلى الخلف .

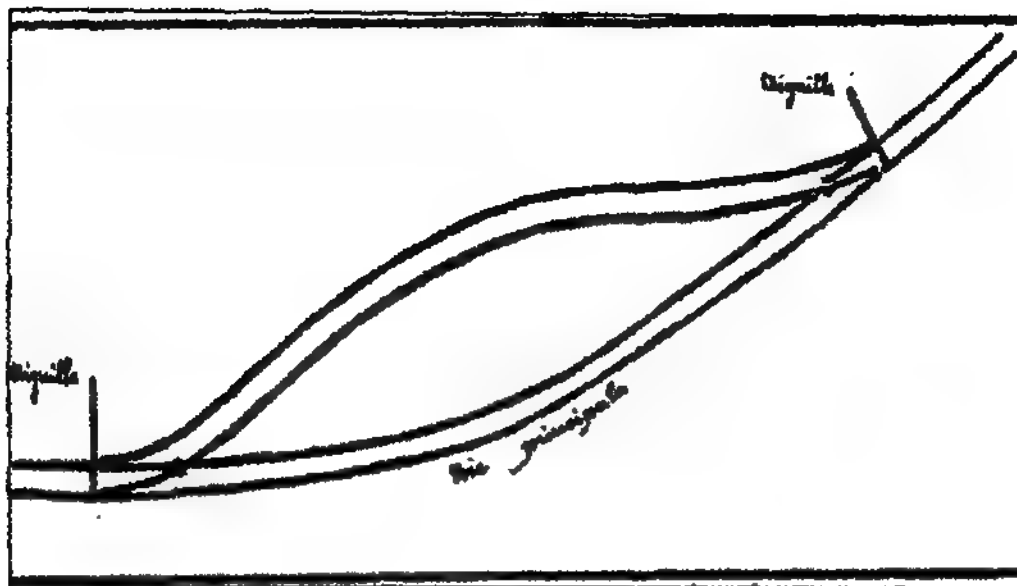


شكل ١ : وضع خطوط نصف قمرية

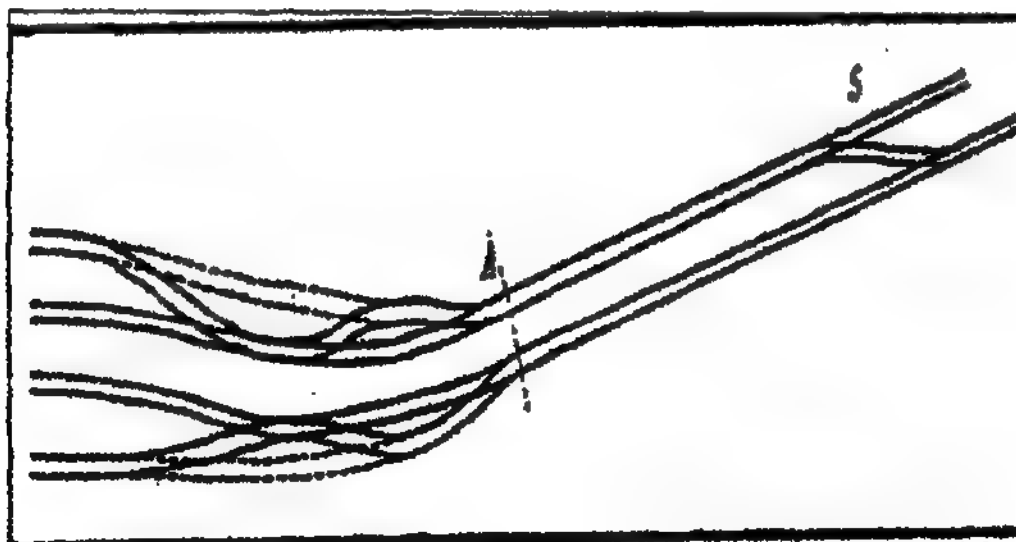

شكل ٢ : A - نقطة انطلاق تقاطعات نصف قمرية اليمت في أسفل السطح

S - وضع على شكل حرف S خط تقاطع اليم على منحدر

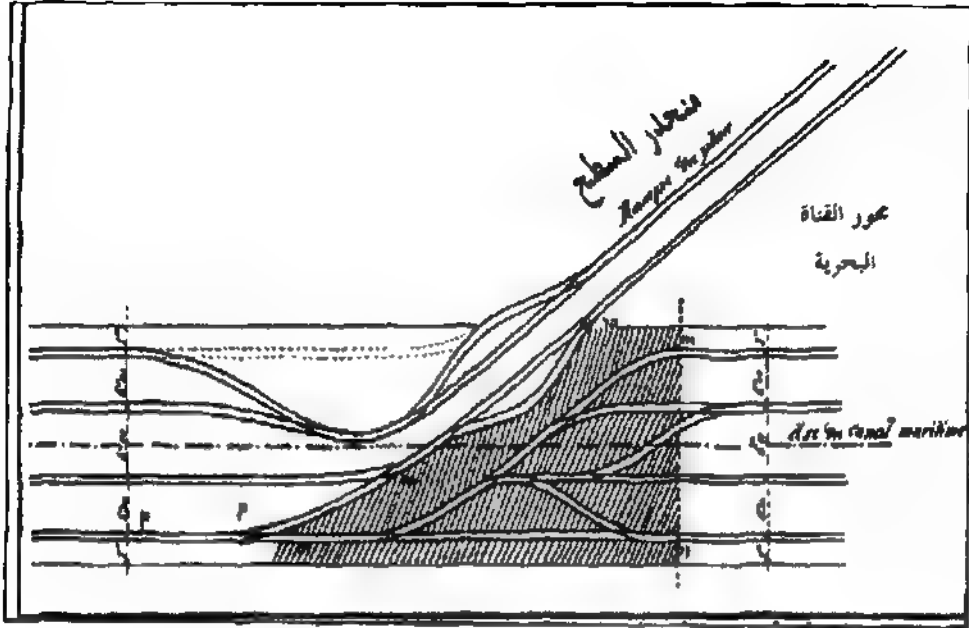


شكل ٣: تنظيم خط الرجوع إلى الخلف في القطاع المظلل

رسم تخطيطية في مذكرات عن مسطحات الشالوفة وسهل السويس

ويرجع الفضل في إدخال بعض التحسينات إلى اكتساب المزيد من المعرفة الهندسية . فبدلاً من إقامة المنحدرات حسب الخط الأكثر ميلاً ، كما تم تحقيقه في قطاع الشالوفة ، تم وضعها في سهل السويس بانحراف زاويته ٣١° على محور القناة . ويفسر بالا (Palaa) كيف تم تحديد قيمة هذه الزاوية : "تعتبر هذه الزاوية نتيجة عدة شروط : أول شرط هو ضرورة أن يستند أحد أطراف المنحدر على جانب القناة ويوفر بهذه الطريقة أقل قدر يجب استخراجه من الرديم عندما يراد إزالة المنحدر ، بعد ذلك أتاح التطور السهل للمنحنيات أسفل نفس السطح ولكي يتم الحصول على أقل كمية ممكنة من أتربة في داخل خط الانقراض الواقع على ارتفاع مستوى ٢٠,٥٠ وعلى ٥٦ متراً من المحور. وقد أعطت كل هذه الشروط عند رسمها بياناً الزاوية ٣١° "


وقد تمت ترجمة الشروط اللازمة بياناً على نفس الرسم وتم حل المسألة المطروحة التي عرضت عن طريق علم الهندسة . وتستجيب الزاوية ٣١° للتوفيق بين القيود التي أتاح الرسم تطبيقها . وقد ساعدت الملاحظات التي تمت في ظروف الورشة على تحديد أفضل التقديرات تقريباً : " فقد وجد أن المكعب المراد استخراجه بواسطة مسطح ولكي يفي الشروط المواتية لأقصى سرعة بواسطة البغال التي تقود العربات الصغيرة القلابة إلى القلب يجب وضعه في قطاع قطره ١١٥ متراً" (٩٠)

ونظراً لهذه المسافة تم البحث عن أفضل محاولة لتنظيم طرق التفريغ . وشرح بالا (Palaa) بالتفصيل المنطق الذي تم اتباعه " يتم صقل الطرق باغتك يمينا وشمالاً ويتطلب كل مرة إعادة تشييد جزء من منحنيات الوصول . وقد كان هذا العمل مكلفاً وكان يستغرق وقتاً طويلاً وتم التفكير في إمكانية تجنبه جزئياً بوضع الرديم في قطاع يتم تزويده فوراً بأنصاف أقطار قصوي يفترض أن تُملأ بالتفريغ بصقل على التوالي الطرق التي تتبع مماس المنحنيات القائمة باستمرار دون ضرورة إصلاح الأجزاء تم بناؤها سابقاً . وعندما يتم معرفة التشكيل الأسرع ، كان يكفي في كل حالة تحديد أبعاد القطاع الذي يستطيع استيعاب كل الرديم . وبعد ذلك يتم تحديد الحدود القصوى بالطريقة التالية للاتجاه المطلوب لكل من السدود الثلاثة الأولى المراد تشييدها ، ولابد من الملء تدريجياً بتقدم طرق التفريغ القائمة بواسطة الصقل باغتك : اثنان على السد المركزي وواحدة على كل من الاثنان الآخرين . وبعد الحصول على اتجاه الطريق الأول بواسطة اتجاه المسطح حتى النقطة التي أقيمت فيها المحولات (أنظر المخطط التمهيدي التالي لتنظيم التفريغ) يتم عند هذه النقطة رسم منحنيان نصف قطرها الأدنى الذي كان استخدامه ممكناً (نصف قطره ٣٠ متراً) . ويعطي متوازيان لمحور القناة البحرية واصلة بطريق مماسيه لكل من المنحنيات أنصاف أقطار قصوى للتفريغ . و يعطي الخط المتوازي الأقرب لمركز القناة والأكثر عمودياً على المتواز المماس للمنحني المقابل ، المحور لكل من السدود الأولية المراد إنشاؤها . و من نقطة التقاء الأعمدة ترسم عندئذ دائرة قطرها ١١٥ متراً نحصل على القطاع الذي يستطيع استيعاب كل الرديم الذي رفعه المسطح . و بعد ذلك عند تقسيم محيط دائرة القطاع إلى جزئين متساويين يعد اتجاه AB هو المحور الأول للطريقين (للخطين) .

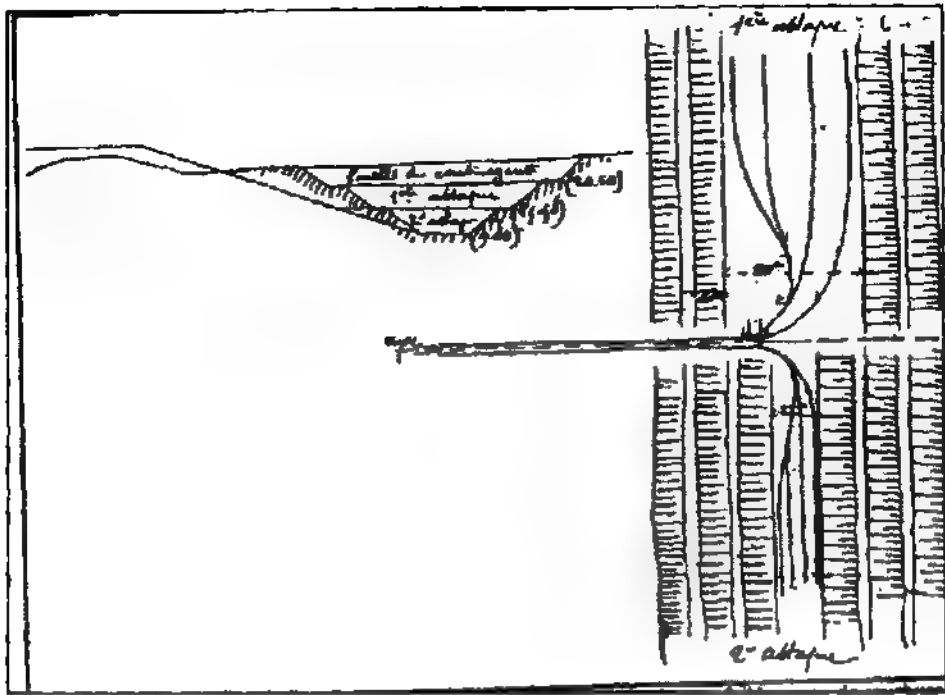

شكل ٤

كان ضعف الانحناء يضيق عملية انقضاخ ويسبب الخروج عن القضيان باستمرار

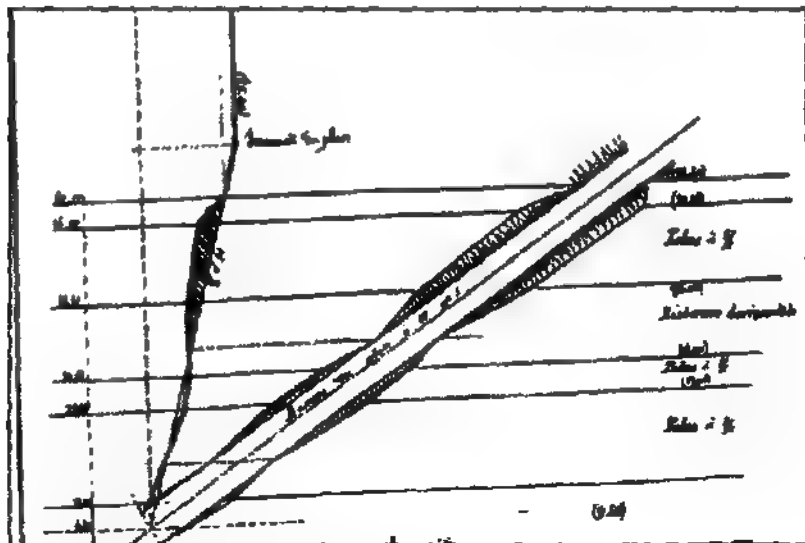

شكل ٥

مخططان ضمن المذكرات عن مسطحات الشالوفة وسهل السويس .

وهكذا أتاح الرسم الهندسي على الورق تحقيق أكبر استفادة من العمل وإيضاح حدود المكان الذي يجب تكديس الرديم فيه . كما ساعد التمثيل البياني ثم استعمال أدوات الرياضيات الأولية وقبل كل شيء استخدام علم الحساب والهندسة في حل المسألة المطروحة أو على الأقل تعيين بعض الحدود التي يمكن أن تحل بداخلها.

علوم وتقنيات : طرق متوازية

سواء تعلق الأمر بممارسة رجال الورشة العادية أو بالتحديث فإننا قد أثبتنا بأن المعارف العلمية لم تكن مفيدة.

ويجب توخي الحذر في الحقيقة عند البحث عن العلاقات التي تربط التقنية بالعلوم . و المهم في البداية ألا نخلط بين الميول أو النية والاستعمال الفعلي. فليس من الغريب أن يحاول بعض الأشخاص الذين درسوا في المدرسة متعددة التقنيات بباريس البحث عن إجابة لمسألة طرحت عليهم عن طريق تطبيق نظرية ما وذلك لأن التعليم الذي تقدمه هذه المدرسة تشبع هذا المنطق . وقد رأينا في حالة ورشة قناة السويس أن لاروش وكاديا ولييسو قد أقحموا أنفسهم في الحسابات ولكن في الحقيقة لم تستطع هذه الحسابات أن تؤدي فعلاً إلى اتخاذ القرار .

ويجب أيضاً أن نتجنب خلطاً آخر ونأخذ ما يأتي من التجربة على أنها تطبيقات علمية لمشاكل عملية . فهكذا تحدث أحيانا زلات لا يمكن مقاومتها بين عدة مسائل : تاريخ الأفكار وتاريخ النظريات وتاريخ التعليم وتاريخ الممارسات فكلها تواريخ لها مفاهيم زمانية خاصة . فوجود نظرية لا يعني تطبيقها بالضرورة وبشكل فوري وأن يسخر تعليم ما للجانب النظري لا يعني أن الممارسة ستمنحه المكانة نفسها . وغالباً ما تسير النظريات والتطبيقات اليوم جنباً إلى جنب حسب تعبير بيير فرانكاستيل (Pierre Francastel)^(٩١) . بيد أنه من الممل تكرار ذلك ولم يكن الحال هكذا دائماً . ومع ذلك انطلاقاً من الموضوعات التي قد تأخذها هذه التواريخ المختلفة كقاسم مشترك لها ، يبقى الإغراء كبيراً لعمل استنتاجات خاطئة ومقارنات خادعة .

وكان الخطاب العام الأكثر تداولاً في النصف الأول من القرن التاسع عشر هو أن التقنية تستند إلى العلوم . وهو القاعدة الأساسية التي توجه التعليم في المدرسة متعددة التقنيات . ويقودنا الفرق بين مضمون الخطاب والممارسة اليومية فيما يتعلق بقطاع الأشغال العامة إلى محاولة دراسة هذه الأقوال وفحص مضمونها عن كثب من جهة ، و معرفة أصحابها والتساؤل عن دوافعهم من جهة أخرى . ففي منتصف القرن التاسع عشر عندما يؤكد الرجل العام أن السكك الحديدية والقنوات هم نتائج العلوم يمكن أن ننسب هذا النموذج من الزعم إلى حساب الجهل ونرجعه إلى

مختصرات أو إلى تأثيرات لفظية . وعلى العكس حينما يدعي ذلك الرجل الفني فإن قوله يشير فضولاً أكثر .

وتتضمن جماعة مهندسي الدولة في بداية القرن التاسع عشر بين خريجي المدرسة المتعددة التقنيات السابقين وخاصة مهندسي الطرق والكباري و يمكن تميز ثلاثة نماذج واضحة وهم العالم والإداري والفني (ونستخدم هنا كلمة فني بمعنى من مارس بالفعل التقنية) وعلى أساس هذه التصنيف الموجز فحسبنا مضمون الأقوال التي تخص كل منهم . وقد بدا لنا عندئذ أنه لا يوجد في هيئة الطرق والكباري مهندسا ينتمي إلى الفئة الثالثة أي الذي له صلة مباشرة بالأشغال ويقدم خطابه بهدف جعل التقنية تطبيقاً للعلم . وعلى العكس ، نلاحظ أن مثل هذه الأقوال تصدر كلها فعلاً عن أفراد ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية . وإن كان قد طالب رجل مثل فيكا بالمقاربة البرجماتية للتقنية ^(٩٧) . فهذا في رأينا له علاقة بأنه قد عمل من قبل في ورش ولم يكتف بالحديث عنها من مكتبه . و يمكن إقامة صلة بين موقف يدافع عنه شخص بشأن مسألة العلاقة الموجودة بين العلم والتقنية ولزومها في الممارسة التقنية . و لا يدعي أحد فعلاً من بين هؤلاء الذين قاربوا في ذلك العصر تنفيذ الأشغال ضرورة اعتبار الآن التقنية بمثابة تطبيق للعلم . فقد دفع من خاطروا في هذا المجال الثمن من نفقاتهم . ووجد من جانبهم المهندسون الذين كان مسارهم علمياً بالأحرى في هذا النوع من التأكيد تبريراً لبحوثهم . أما بالنسبة للمهندسين الإداريين فهم يميلون إلى اللحاق بوجهة نظر العلماء تحت تأثير حالة الانتماء إلى العلم . و يستحق هذا الافتراض بالطبع أن يكون موضوعاً لدراسة أكثر منهجية قد تتقابل مع القضايا التي طرحت عن مسألة العلاقة بين التقنية والعلم في مجال الأشغال العامة ونمط المهنة المختارة . قد شعر الجميع أن نظريات الفيزياء سوف تساعد الممارسين في القريب العاجل على حل المشاكل الفنية التي يعرضوا لها . ولكن يمكن إثبات أنه لم يكن هكذا الحال في السنوات الستين الأولى من القرن التاسع عشر والسبب الأرجح أن نظريات الفيزياء القادرة على قيمة التطبيقات لم تكن قد تطورت بما فيه الكفاية .

ورغم كل ذلك لم تكن النظريات غير متوافرة . وسوف يتيح بعضها في نهاية القرن حل مسائل ملموسة ، ولكن تعرض معظمها في الماضي لتكذيب صريح . ولم يحل ذلك دون تكرار الأقوال التي تظهر الدور البارز للعلم في تطوير التقنيات . كيف نفسر هذا الغموض وهذا النوع من سوء الفهم الدائم بين الأقوال وما يمكن ملاحظته في الممارسة ؟ كل ذلك يحدث وكأننا أمام حوار صُم حقيقي بين العمليين من جهة ورجال العلم من جهة أخرى ، كل فريق يتمسك بمواقفه . وسوف يتطور الوضع بفضل أول من قاموا بالاختبارات فهم أصحاب الخبرة العملية الذين أقدموا على اختبارات نفذت بنظام ومنهج ودقة . هل يمكن استنباط المبادئ التي توجه وضع تطبيق قانون

واحد أو عدة قوانين عامة ؟ هل كان القانون العام الذي يمكن تسميته "علم التركيب" (synthèse) معروفاً من قبل أو حتى اقترب منه ؟ يميل المتمسكون بنظرية كل شئ ممكن إلى الإجابة بالإثبات . أما العمليون فلا يستطيعون الامتناع عن ملاحظة أن عدداً من التجارب تتعارض مع معظم النظريات الواردة .

وعند البحث في حالة التقنيات الخاصة بالأشغال العامة عن مناطق أو مواقع قد يتم فيها اللقاء بين النظرية والتطبيق ، لاحظنا أنهما يتخذان مسارات تظل بثبات متوازية بالرغم من المحاولات لتجاوز مساحتها . وإذا كان الحساب البسيط والهندسة هما الآليات اليومية التي لا غنى عنها فعلى العكس لم يساهم علم المياه ولا مقاومة المواد ولا نظريات ميكانيكا التربة في تقدم ورشة قناة السويس . فقد ظلت هذه المواد التعليمية تنتظر ، في ذلك الوقت ، أن توفر العلوم لها نظريات يمكن تطبيقها حقاً . فلم يحن الوقت بعد الذي يستخدم فيه المهندسون نظريات عامة ناتجة عن العلم لحل المشاكل الخاصة التي تشغلهم . وتتيح دراسة الورشة رؤية الفارق الذي يوجد بين " هذيان " واضعي النظريات والتطبيقات وليست الحسابات الناتجة عنها في أغلب الأحيان إلا حجاج بلاغية استناداً إلى التجربة . إن وضع العلم في مستوى الابتكار والتطورات التقنية هي فكرة حاول مهندسو الدولة الوصول إليها وذلك منذ نهاية القرن الثامن عشر . ومع ذلك في معظم القطاعات الفنية و مرة أخرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، الأمر يتعلق بعرض هدف يراد تحقيقه وأمنية وليس بعرض قاعدة تكون برهنت من قبل على كفاءتها .

وأمام عجز العلوم أو الحالة الفنية في توجيه الممارسة لزم على المهندس أن يرتجل وأن يخاطر . وفي أغلب الأحيان يقوم المقاتلون بهذه المخاطر ويكون أحياناً التحديث نتيجة هذا الارتجال . والمهم في النهاية أن نبرز غموض لفظ " العلوم التطبيقية " التي انتشرت في ذلك العصر . إذ يستعمل هذا اللفظ أحياناً ليحدد نظريات وأحياناً تقنيات وكذلك مهارات بشكل عام . ونسحدث أيضاً عن " علوم المهندس " بيد أن هذه الألفاظ لا يجب أن نخدع أحداً : فقد أخذت هذه العلوم التطبيقية وكذلك ما يدعي " علم " المهندس ، في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، قليلاً جداً من المعارف الرياضية المتقدمة أو قوانين الفيزياء . وفي الخاتمة ، لم تكن العلوم التطبيقية تطبيقات للعلم أو غير ممكن تطبيقها !

إن لم يكن هناك تطبيقات عملية للعلوم في مجال تقنيات الأشغال العامة وإن لم تكن العلوم مصدراً للتطورات التي سجلتها المادة العلمية فعلى العكس تعطي لمن لم يهابوا متابعتها أثناء دراستهم لائحة مهنية ومكانة اجتماعية مستديرة .

هوامش الفصل السادس

التحديث التقني :عمل المقاولين

- 1). Bibliothèque de l'ENPC, Ms 233. Varaigne in Bruyère, Etat des divers mémoires, rapports et dessins relatifs à l'art de l'ingénieur, tome 9.
 - 2) Louis Vicat, « Expériences sur la main - d'œuvre et les faux-frais dépendants du service des ponts et chaussées », APC, 1835, tome 1, p. 34.
 - 3) AN 153 AQ/1608A رسالة من موجيل إلى مانتو ، مارس ١٨٦٠
 - 4) E. Flachet et L. Molinos, op. cit., pp.44-47.
 - 5) John Hawkshaw, Rapport sur les travaux du canal de Suez, suivi des observations de M. Voisin, P., Plon, 1863, p. 74.
 - ٦) قد بلغت مصاريف الأشغال ثلاثمائة مليون فرنك في ذلك الوقت. وبإضافة الأعباء الاجتماعية والمصاريف الإدارية والمصاريف المختلفة أي ما يعادل جملة ١٢٠ مليون ، وصلت تكلفة قناة السويس سنة ١٨٦٩ : ٤٢٠ مليوناً من الفرنكات
 - 7) Michael Baxandall , Les formes de l'invention, Nîmes, Ed. Jacqueline Chambon, 1991, édition originale : Yale university, 1985, p. 128.
 - 8) Joseph Cordier, Mémoires sur les Travaux Publics de la France, P., Garilian-Goeury, 1841, tome 1, p. 29.
 - 9) Honoré de Balzac, Le curé de village, P., Ed. Gallimard, coll. « Folio », rééd. 1975, p. 231.
 - 10) Antoine Picon, L'invention de l'ingénieur moderne, P., Presses des Ponts et Chaussées, voir le chapitre intitulé « De l'invention à l'innovation », pp. 363-388.
 - 11) Observations présentées au Comité des travaux publics de l'Assemblée nationale par la Société centrale des ingénieurs civils, 1848, p. 9.
 - ١٢) أنظر عن هذا الموضوع : Georges Ribeill, in Techniques, territoires et sociétés, n° 27 : « Acteurs privés et acteurs publics : une histoire du partage des rôles », MELT, DRAST, juin 1994, p. 37.
- سوف يحدث نفس السيناريو عند القيام بعد ذلك بقرن بإنشاء الطرق السريعة في فرنسا.
- 13) Bertrand Lemoine dans « L'origine des ponts métalliques en France », APC, numéro spécial, 1981, p. 46 écrit :Le réalisme peut - être excessif de Perronet, pourtant un des éléments les plus novateurs du corps des ponts et chaussées, fait donc avorter les trois premiers projets de construction de pont en fer en France.
 - 14) Léon Malo, « Eugène Flachet », BSIC, 1873, cité par Bernard Marrey dans Les ponts modernes, P., Picard, 1990, p. 166.
 - 15) AN 153 AQ/TE139.Edmond Badois, Etude sur les moyens mécaniques à employer aux travaux du canal de Suez dans la traversée des lacs Menzaleh et Ballah, et description de l'excavateur ou drague à pivot pour les terrassements à sec, construite par MM. Frey fils

et A. Sayn, P., Noblet et Baudry, 1865, 30 p. Ce mémoire est également publié dans MCSIC, 4 novembre 1864.

- 16) AN 153 AQ/G1 ١٨٦٤ قرار مجلس الإدارة ، مارس .
- 17) O. Ritt, op. cit., p.387.
- 18) A. Lavalley, "Communication du 27 juillet 1867...", L'isthme de Suez ..., 1867, p.278.
- 19) L'isthme de Suez..., 1868, p. 325.
- 20) Erckmann-Chatrian, « Un chef de chantier à l'isthme de Suez », Contes et romans nationaux et populaires, vol. 9, réed. , P., J.-J. Pauvert, 1988, p. 307.
- ٢١) رموز . ٥ (عامل) ، ١ (رسام) ، ٢ (مسير أعمال) ، ٣ (رئيس قسم) ، ٤ (مهلس رئيس قطاع) و ٥ (مدير) .
- ٢٢) إذا أضفنا أيضاً مونتالتي خريج المدرسة المركزية في هذه الفئة
- 23) AN 153 AQ/1678A.
- ٢٤) عين هاردون إدواردو جيويلا لأنه كان قد ارتبط أثناء إقامته في باريس ١٨٥٩ مع المقاول شارل نيفيه الذي بدأ عنده جيساف إيفل وكان بشكل عابر المهندس المستشار لأول مقبول للشركة للإعداد آلات احفر .
- « Eduardo Gioia.Commemorazione fatta dall'Ingegnere comm. Antonio Ferruci »,estrato dagli Annali della Societa degli Ingenereri et degli Architetti Italiani, V. Roma, Tipolithographia del genio civile, 1902
- 25) John Hubbel Weiss, The making of technological man, The social origins of French engineering education, MIT Press, 1982, p. 226.
- 26) Ibid., p. 239.
- 27) Sur ce thème, voir Georges Ribeill, « Entreprendre hier et aujourd'hui : la contribution des ingénieurs », Culture technique, n°12, pp. 77-90.
- عن هذا الموضوع انظر
- Georges Ribeill, « Entreprendre hier et aujourd'hui : la contribution des ingénieurs », Culture technique, n°12, pp 77-90.
- 28) Sont comptés ici les anciens élèves des écoles d'arts et métiers, devenus conducteurs des ponts et chaussées.
- تم حصر هنا قدامي خريجي مدارس الفنون والحرف الذي أصبحوا مراقبين بالطرق والكباري.
- 29) A. Guettier, Histoire des écoles impériales d'arts et métiers, P., Impr. de P. Trenel, 1865, p. 50.
- 30) Arthur Morin, Résumé de l'enquête sur l'enseignement professionnel, P., 1865, p. 6.
- 31) A. Guettier, De l'organisation de l'enseignement industriel, P., Impr. de P. Trenel, 1864, pp. 151-152.
- 32) C.A. Oppermann, op. cit., p. 206.
- 33) MCSIC, 1875, p. 76.

- 34) MCSIC, 1875, p. 76.
- 35) Erckmann Chatrian, op. cit., p. 314.
- 36) Erckmann-Chatrian, op. cit., p. 347.
- 37) « Avant-projet... », in F. de Lesseps, Percement..., p. 115.
- 38) Frédéric De Coninck, Lettres sur le percement de l'isthme de Suez, Le Havre, Lemale, 1858, pp. 10-11.
- 39) Jules Barthélémy Saint-Hilaire, Percement de l'isthme de Suez, P., Hennuyer, 1856, p.10.
- 40) Ibid., p. 11.
- 41) A. Monti, op. cit., pp. 387-388, Lettre de Franklin Martin à Gioia.
رسالة من فرانكلان مارتان إلى جيوييا .
- 42) Bibliothèque de l'ENPC. P. F. Frissard, Notes prises au cours de Ports de mer, session 1848-1849, p. 4.
- 43) J.-J. Lemoyne, « Extrait de l'ouvrage de M. Giuliano de Fazio », APC, 1832, tome 1, pp. 32-51, J.-J. Lemoyne « De l'ouvrage de M. Giuliano de Fazio, sur le meilleur système de construction des ports, imprimé à Naples en 1828 », APC, 1837, tome 1, pp. 182-232, et J.-J. Lemoyne, « Extrait de l'ouvrage de M. Giuliano de Fazio », APC, 1839, tome 1, pp. 316-345.
- 44) J.-J. Lemoyne « De l'ouvrage... », op. cit., p. 183.
- 45) « Avant-projet... », in F. de Lesseps, Percement..., op. cit., p. 121.
- 46) AN 153 AQ/INJ 295 .
كما يوضع خط تحت التعميرات
- 47) Notamment :Nouvelles annales de la construction, janvier 1862, pp. 6-12, et A Debaue, Procédés et matériaux de construction, P. Vve Ch. Dunod et P. Vicq, 1894, tome 1, pp. 200-202. Mais également de manière plus prévisible dans : L'Isthme de Suez, journal de l'union des deux mers, n° 114, mars 1861, p. 89.
- ٤٨) - انظر نتالي مونتييل . "تنظيم العمل في ورش الحفر -
- 145 .Culture technique, n° 26, 1992, pp. 135
- 49) Voisin Bey, Le canal de Suez, Atlas, planche XXXVI: Modes d'exécution primitivement projetés.
- 50) Dominique Brisou, Accueil, introduction et développement de l'énergie vapeur dans la Marine militaire française au XIXe siècle, DEA, sous la direction de François Caron, CNAM, septembre 1994, 2 vol., 268 p.
- 51) AN 153 AQ/CX 147 .
- رسالة من شحيت إلى سيما . ١٤ يونيو ١٨٦٣
- 52) AN 153 AQ/CX 147
- رسالة من سيما إلى فوزان . ١٢ يوليو ١٨٦٣
- 53) E. Mougel et A. Mouchelet, op. cit., préface.

54) Charles Gillispie, « Un enseignement hégémonique : les mathématiques » in Coll., La formation polytechnicienne, 1794-1994, P., Dunod, 1994, p. 36.

55) Jean Kérisel, « Historique de la mécanique des sols en France jusqu'au XX siècle », Géotechnique, 1955, p. 153.

56) AN 153 AQ/TE 1.

57) AN 153 AQ/1610A . تقرير مدير عام الأشغال الشهري ، نوفمبر ١٨٦٠

58) AN 153 AQ/1610A . محضر اجتماع اللجنة الاستشارية للأشغال رقم ٨٢ عام ١٨٦٦

59) AN 153 AQ/TE 1.

٦٠) - ! لا فالي : " مداخلة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٦٦ .." op. cit., p. 331.

61) Voisin Bey, « Ports de mer », in Léonce Reynaud, Les travaux publics de la France, tome 4, P., J. Rothschild, 1879, p. 51.

62) Pierre Gourdin, « Historique des ciments pour constructions en eau de mer », Actes du 107^e congrès national des sociétés savantes, Brest, 1982, sciences, fasc. IV, p. 401.

63) Charles Minard, « Note sur les mortiers exposés à la mer », APC, 1853, tome 1, pp. 187-188.

64) Charles Minard, Du mortier marin de pouzzolane, P., Thunot, 1859, p. 1.

65) Ibid., p.2.

٦٦) (فقرة من رسالة وجهها فيكا إلى وزير الأشغال العامة " - APC, 1853, tome 1, pp. 196-198

مذكرة عن المقارنة بين الجير المائي الصناعي مضاعف الغليان ونفس الجير ذو الغليان البسيط المحصص لأشغال البحر. APC, 1853, tome 1, pp. 220-221.

67) Minard, « D'un nouveau mode d'essai des mortiers marins dans le laboratoire proposé par M. Vicat », APC, 1858, tome 1, pp. 115-120.

68) Rivot et Chatoney, Considérations générales sur les matériaux employés dans les constructions à la mer. Tiré à part, extrait des Annales des mines, 1856, 193 p.

69) Ibid., p. 7.

٧٠) شاتوني : " رد على مذكرة فيكا التي عنوانها فحص بعض الاقتراحات المذكورة في الدراسة التي نشرها جديداً السيدان ريفو وشاتوني عن المواد المستعملة في الإنشاءات في البحر. " APC, 1858, tome 2, pp. 39-48. وفيكا " بعض الأفكار عن ملائمة بعض المواد للأشغال في البحر. " APC, 1858, tome 2, pp. 39-48.

70) AN 153 AQ/TEP3. . بريد وقعه لاروش في يونيو ١٨٦٩

71) Ibid.. AN 153 AQ/TEP3. Réponse de Voisin à Laroche, juin 1869.

72) AN 153 AQ/TEP3. . رد فوازان على لاروش ، يونيو ١٨٦٩

73) L. Monteil et A. Cassagnes, op. cit., p 104.

٧٤) استعمال في ذلك العصر الكلمة كأسم بمعنى مضيق .

- 75) Victorin Chevallier, Percement de l'isthme de Suez. Du mode d'exploitation du canal de l'isthme de Suez avec ou sans écluse, P., Plon, 1864, p. 8.
- 76) Victorin Chevallier, op cit , p 9.
- 77) Ibid., p. 11.
- 78) Ibid , p. 5.
- 79) Ibid., p. 6.
- 80) Ibid., op. cit., p. 7.
- 81) Ibid., p. 31.
- 82) Charles Poirée, Mémoire sur les travaux du percement de l'isthme de Suez, P., Dunod, 1865, 49 p
- 83) V. Chevallier, op. cit., p. 9.
- 84) Premier supplément au mémoire du 15 janvier 1865 sur les travaux du percement de l'isthme de Suez, 1866, 23 p. Deuxième supplément, 6 mars 1866, 1866, 11 p. Troisième supplément, 19 mai 1866, 1866, 10 p. Quatrième supplément, 1^{er} juillet 1866, 1866, 14 p.
- 85) C. Poirée, Deuxième supplément, p. 10.
- 86) Ibid , p 7.
- 87) L'isthme de Suez..., n° 297, p. 404.
- AN 153 AQ/1618A(٨٨) . ملاحظات على المسطحات العادية والجسور المائلة بانحدار لورش الشالوفة وسهل السويس دون ترقيم . الشواهد التالية اقتطفت منها .
- AN 153 AQ/1618A(٨٩) لقد قمنا بإبراز الكلمات بوضع خطوط تحتها . لم نحدد الطريقة التي "وجد" بها طول القطر .
- 90) Picrre Francastel, L'art et la technique aux XIXe et XXe siècles, rééd., P., Gallimard, 1988, p. 66.
- 91) Antoine Picon, op. cit., p. 385.

الختاتمة

بالرغم من تراكم التحفظات التي تفرض نفسها على من يحاول ان يتقصى موضوعا تاريخيا والتي قد تحول بينه وبين الأمانة التاريخية إلا انه يبقى له شرف المحاولة والبحث ولذة حب الإطلاع والإكتشاف بالمصادفة وخوض المغامرة الكبرى لكشف الترابط بين الأحداث^(١)

لقد تم افتتاح قناة السويس في احتفال مهيب استمر من ١٧ إلى ٢١ نوفمبر عام ١٨٦٩ وقد عبرت المنفذ المائي الجديد في البداية باخرة الإمبراطورة أوجيني تتبعها خمس وحسون سفينة تحمل على متنها ملوك أوروبا احتفالا بهذا الحدث التاريخي . وبعد هذا العبور بمثابة الإعلان الرسمي إن لم يكن الفعلي^(٢) لانتهاء العمل في مشروع قناة السويس . ويعتبر هذا الافتتاح تخليداً لنجاح حفر قناة السويس وترويجا لجهود أحد عشر عاما من العمل الدؤوب .

لقد حاولنا عند عرض تاريخ ورشة قناة السويس دراسة التقنيات والإبداعات في قطاع الأشغال العامة في منتصف القرن التاسع عشر وذلك من خلال ارتباطها الوثيق بممارسات العاملين في هذا المجال ، الأمر الذي أتاح لنا ، في نهاية هذا البحث ، استخلاص عدة نتائج .

ولقد أوضحنا في بداية الأمر ضرورة توافر شرطين أساسيين لنجاح تنفيذ مشروع قناة السويس . الشرط الأول يحس تنظيم العمل والثاني يتعلق بالابتكار التقني وقد أثبتنا أيضا أن الفصل بين هذين الجانبين للمشروع كان صائبا لتحديد اختصاص العاملين الفنيين في قطاع الأشغال : فمهندسا الدولة هم قبل كل شيء إداريون ولا بد من البحث عن أصحاب الخبرة والمبدعين في مجال الميكانيكا بين المقاولين والمراقبين . وفضلا عن ذلك ، ومن وجهة نظر تاريخ تطور التقنيات ، فقد بدأت ورشة قناة السويس عصرا جديدا ألا وهو عصر ميكنة الأشغال العامة .

لقد سعينا جاهدين على مستوى المنهجية لكي نبرهن ، بالنسبة لتاريخ التقنيات ، على خصوصية مقارنة تعتمد على تحليل الممارسات الفعلية . وقد أتاح لنا المقاربة التي تم دراستها كشف الوجه المستتر من الإنجازات التقنية الكبرى وهو جانب التنظيم، وتجنب الوقوع في فخ التعبيرات المتداولة والمسميات المألوفة لفئة مثل فئة المهندس وكذلك فهم أفضل لآليات وحركة الإبداع .

إن ابتكار أي منتج تقني له وجهان : وجه فني بالمعنى اللفظي وهو الأكثر ظهوراً ويشير إلى تقنيات بنائه ووجه آخر " تنظيمي " وهو مستر عادةً إلا أن له علاقة وثيقة بكافة الروابط والشروط اللازمة لإنتاجه. وفي حالة مشروع حفر قناة السويس، ظهر التباين بين هذين الوجهين بشكل بالغ الوضوح لدرجة أن كلا منهما شكل تحدياً بذاته.

الجانب التنظيمي للورشة هو السابق زمنياً، فقد شهدت الستتان الأولتان ارتباكاً كبيراً . وتراكت الصعوبات وتشابكت واختلطت المشاكل التي لها صلة مباشرة بالأشغال بمشاكل أخرى مثل الإقامة في الصحراء وفي بلد أجنبي ، وإرسال المؤن ، ونقص الأيدي العاملة ، وأيضا التقلبات الدبلوماسية وعدم توافر الكفاءات وكذلك الاختلاسات التي كان يقوم بها بعض المتعهدين. وقد أدى عناد رئيس الشركة وعدم تراجعه عن مبادراته الأولى إلى بقاء الحالة على ما هي عليه إلى أن اتخذ بنفسه قراراً بتسليم أمور الورشة إلى فوزان (Voisin) مهندس الطرق والكباري . ولقد جمع هذا الأخير بين يديه أهم السلطات الخاصة باتخاذ القرار ، وثابر على تنظيم العمل في الورشة . وأخذت مشاكل نقص المياه العذبة ، والمؤن و الطرق و المواصلات وإقامة المخيمات وكذلك مشاكل الصحة والأمن طريقها إلى الحل بعد أن تولّى أمرها.

وحيث أن ورشة حفر قناة السويس تتم في مصر وهي بلد أقل تطوراً فنياً من فرنسا ومختلفة عنها ثقافياً علاوة على أن عملية الحفر كانت في مكان غير أهل بالسكان ، فقد برزت بمجلاء الظاهرة التي قدمها لوسيان فيبر (Lucien Febvre) وهي أن المنتج التقني لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن الظروف المحيطة به سواء الفنية منها أو الاجتماعية . ولقد أبرز تاريخ هذا الإنجاز الضخم فعلاً مرحلة أولية تمثلت تحديداً في خلق الظروف الإنتاجية . ومن ثم فإن ما أراد فوزان (Voisin) القيام به هو إعادة تشكيل بيئة في خليج السويس تشبه إلى حد كبير البيئة الموجودة بفرنسا. وقد كانت أعمال المدير العام على تنوعها تسمى كلها إلى تحقيق هذا الهدف، وكان يحاول جاهداً وبشئ الطرق نقل نموذج الإدارة الفرنسية برمته إلى مصر. ومن هنا نلاحظ أن مبادئ تنظيم العمل الإداري تم تطبيقها بشكل موسع في إدارة الإقليم وفي الحياة الاجتماعية ، كما تم إدخال القواعد والنصوص الفرنسية على أرض مصر وكذلك أدى فراغ الموقع وخاصة غياب المؤسسات إلى أن تستأثر الشركة بامتيازات لا اعتيادية بالنسبة لمؤسسة خاصة في بلد أجنبي.

ويقوم العاملون في الشركة بإدارة أعمال الشركة وكذلك بإدارة منطقة الخليج. أما المنهج المطبق في هذه الإدارة فيشمل بعض المقومات منها : التنظيم التراتبي ، وتقسيم الأنشطة، وتوزيع العمل و المركزية ، والإشراف ، ومراقبة الأعمال والنشآت وأيضا السلوكيات . وقد ظهر ذلك

جليا في تقسيم موقع العمل إلى قطاعات وأقسام ، وإلى مجموعات عمل ، بل أيضا في إقامة مدينة في وسط الخليج حسب رسم تخطيطي يمكن تعديله ، و القيام بتخطيط المخيمات وإقامة فواصل .

لقد ساد الاهتمام بالتنظيم والأسلوب التحليلي الذي ظهر بوضوح في نظام الحسابات المعتمد والقائم أساسا على مجموعة مصطلحات مقسمة إلى فصول وبنود ، كما قامت آليات ووسائل لتسيير الإدارة على الملاحظات و البيانات والتقارير وأوامر الخدمة و الإحصاءات ، ومجموعة من الصيغ ، والجداول ، وكراسات الشروط ، والإجراءات ، والسجلات والمفكرات . وكانت المعلومات تنتقل إلى أماكن العمل المختلفة وأيضا إلى باريس عبر شبكات الاتصال الموجودة (النقل والبريد والتلغراف) . وقد أظهر هذا النوع الخاص من التنظيم فاعليته في إدارة ورشة ذات أهمية استثنائية ؟ وهل فرض هذا التنظيم نفسه للتغلب على الفوضى الأولية ؟ للإجابة على ذلك ، لابد من القيام بمقارنات بين أسلوب العمل المتبع في المشروع وأساليب عمل أخرى مثل أسلوب العسكريين أو الإنجليز عندما كانوا يشيدون في نفس الفترة تقريبا خطوط السكك الحديدية أو المنشآت ولا سيما في الهند .

وقد بدا بعد فترة أن التنظيم بأشكاله الإدارية والميدانية أو الاجتماعية وباعتباره شرطا ضروريا لنجاح مشروع حفر القناة ، غير كاف وبناء على ذلك ، رأى الفنيون العاملون بالورشة والمشرفون عليها ، منذ ذلك الحين ، أن لا غنى عن الإبداع التقني وقد فشلت جهود الشركة في هذا المجال ووجدت نفسها مضطرة في محاولة لاحترام المواعيد التي حددتها أن تسلم زمام الأمر إلى مقاولين متخصصين في أعمال الموانئ وكذلك في حفر القناة. وقد ظهرت عدة عوامل لتفسير هذا العجز : أحدها يتعلق بأسلوب التنظيم التراتبي والذي يعوق مبادرات الرؤوسين ، والآخر يرتبط بفكرة وجود فاصل صارم بين تصميم العمل وإنجازه خاصة لو اقتصر ذلك العمل على مجرد التنفيذ. ويؤخذ أيضا في الاعتبار طبيعة الكفاءات التي تمت تعبئتها والآراء المسبقة عن دور النظرية والمعارف العلمية في التطبيق التقني والإبداع. وهكذا بدت الأفكار والمناهج التي طبقت بنجاح في تنظيم إدارة الورشة وكأنها عوائق تحدد من الإبداع.

وفي أغسطس ١٨٦٨ حصل كل من فوزان (Voisin) ولافالي (Lavallay) على وسام جوقة الشرف برتبة ضابط ويعتبر هذا التقدير تويجا لأثنين من المهندسين : مهندس دولة و "مهندس مدني". ولكن ما هو القاسم المشترك بينهما سوى دراسة عامين بالمدرسة العليا متعددة التقنيات ؟ وما الذي يجعل كل منهما مهندسين؟ يوجد بفرنسا سوء فهم دائم حول لقب مهندس وربما يكون هناك إصرار أيضا على استمرار قيام هذا الوضع. فالإشارة إلى لقب مهندسين فرنسيين تجدها

متكررة في القرن التاسع عشر . ومع أن مثل هذه التسمية قد يكون لها دلالة واضحة نسبيا في بلد آخر . و لكن في حالة فرنسا ، يجب أن نعرف صراحة بأن هناك غموضاً مفرطاً حول لقب مهندس سواء أطلق على مجموع الأشخاص المعنيين أو طبيعة الكفاءات المقصودة . ولا نستطيع في الواقع تقديم أي تفسير لهذا الوضع امتنادا إلى معايير^(٣) موضوعية . فنحن بصدد كلمة تشتمل على خصائص متباينة إذ أنها تشير وفقا للظروف إلى شهادة أو إلى رتبة ضمن السلم التراتبي أو إلى وظيفة يصعب علينا حتى تحديد ماهيتها . كما أن هناك صعوبة أخرى ترجع إلى أن هذه الكلمة ، كما يحدث في كافة الفئات ، يصعب ترحيل مدلولها عبر الزمن . ويتضح مما سبق أن استخدام هذا المصطلح يعتبر إذاً جد دقيق ومع ذلك فإستعمالنا له فيه مخاطرة كبيرة وهي أننا نطبق على أوضاع سابقة أثناء تحليلها وقائع خاصة بفترة أخرى كما نطلق العنان لألوان من الملاحظات المسهية . في هذه الحالة ، يبدو لنا لقب المهندس بدون تحديد التخصص وكأنه يقصد به فئة قليلة الفاعلية أو فئة تعوق عملية التحليل التاريخي وأيضا مبعث غموض ومصدر تفسيرات خاطئة . لهذا السبب فضلنا في مجمل نص هذه الدراسة استبعاد ألفاظ مثل " مهندسين " أو "المهندس فلان" أو " مهندسي الشركة" ، كل هذه التسميات التي لا تعني بمفردها شيئا دقيقا .

ولا شك ، إن المنهج الذي يعطي الأولوية لدراسة الممارسات يتيح لنا التخلص من غموض الإلتواءات غير المريحة التي يفرضها استعمال لفظ يجب أن يوضح معناه كل مرة وأيضا تجنب الوقوع في فخ إيضاحات تنطوي على مغالطات تاريخية . إن هذا المنهج يركز على تحديد ماهية الأفراد انطلاقاً من عملهم الفعلي والمهام التي يزاوئونها بغير استباق الحكم بناء على ما يحملون^(٤) من ألقاب أو لا يحملون . بل أيضا بناء على ما حصلوا عليه من شهادات أو لم يحصلوا عليه أو بناء على ما يجب أن يقوموا به .

لقد بدت لنا ، على مستوى الممارسات العملية ، فئة واحدة متجانسة بين التأهيلات العديدة التي قامت بدور مهم في الورشة وهي فئة المهندسين الفرنسيين المتخصصين في إنشاء الطرق والكباري وهي تمثل طبقة من الموظفين محددة تماما . وفي الحقيقة يبدو أنهم إداريون قبل كل شيء و يجسدون ما يطلق عليهم الآن أسم المديرين العصريين ويظهر ذلك جلياً في تلك الأدوار التي قام بها فوزان (Voisin) و أعضاء اللجنة الاستشارية بل أيضا بوريل (Borel) في شركة المقاولات التي كونها مع ولافالي (Lavallay) . ويتضح أنهم رجال انضباط ونظام يتمسكون بالروتين ، ويقع على عاتقهم تسوية اللوائح ويقومون بملاحظة التقنيات انطلاقاً من مكاتبهم ، وهم يستندون في ذلك على مجموعة قوانين نظرية يختبئون وراءها حتى إن كانت غير مجدية وينشغلون أساسا بأعمال إدارية ، ويبقون بإصرار بعيدا عن موقع العمل ولا يساهمون في تطوير الأساليب البناءة .

ولكنهم في المقابل ، يقومون بتصميم وتطبيق أساليب وآليات لرقابة العمل وأدوات لتسيير الإدارة تسمح بتنظيم الورشة بشكل فعال . ونلاحظ من هذه الممارسات أنهم كانوا وراء الأفكار الناجحة التي سوف يطلق عليها في بداية القرن العشرين التنظيم العلمي للعمل .

وكان يمكن أن تعتبر هذه النتيجة التي تتعلق بكفاءة مهندسي الدولة المهتمين أساسا بالعمل الإداري شيئا عاديا لو لم تكن نتمسك بالرغبة في أن نجعل منهم مبتكرين بمعنى الكلمة وبخاصة في مجال خلق أساليب التقنية.

ولقد انتشرت إبان هذه الفترة فكرة " أخذ يتاقلها اليوم بعض المؤرخين وهو أن تعليم الرياضيات في المدرسة العليا متعددة التقنيات بفرنسا وكذلك مناهج التعليم التي كانت توفرها المدارس التطبيقية ، تعمل على تنمية الاستعدادات والكفاءات التي تطبق بفاعلية في مجال التقنية العملية. ولكن دراسة الممارسات التي قمنا بها بصدد الأشغال العامة في منتصف القرن التاسع عشر، تكذب هذه الفكرة وتثبت على العكس أن الخبرات التي توفرها هذه الدراسات تحول في الواقع دون بزوغ أساليب تقنية جديدة خاصة حين يبقى المتأثرون بها بعيدين عن العمل الفعلي، كما هو الوضع حاليا. والحقيقة أن مناهج التفكير التي تكتسب أثناء الدراسة تطبق بفاعلية في مجال الإدارة قبل كل شيء. ويرجع سوء الفهم عند تقدير الكفاءات الفنية لمهندسي الطرق والكباري . بكل ما في هذه الكلمة من معنى إلى كونهم احتكروا عملية نشر الكتب لصالحهم حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أضف إلى ذلك إن وجود فئة المراقبين في حد ذاته وما فرض عليهم من تبعية وعدم الاعتراف بدورهم قد ساهم في إعطاء فكرة وهمية عن هذه الكفاءات.

وفي الواقع أن المهارات والتطورات التي سجلت في مجال تقنيات الأشغال العامة بفرنسا في عهد الإمبراطورية الثانية مردها إلى الذين مارسوها بالفعل ونقصد بذلك أولاً فئة المقاولين والعاملين معهم . ويشغل فريق المراقبين والإداريين والعاملين مكانة بين مهندسي الدولة والموظفين العاملين بالشركة ، ولأنهم كانوا يحتلون مركزا وسطا بين الجانبين دون انتماء لهذا الجانب أو ذاك فقد كانوا شهوداً على تكبير مبادرتهم وقد كانوا بكل تأكيد يحتلون مكانة غير مريحة على الإطلاق.

وقد أصّر مهندسو الدولة في عصر إمبراطورية فرنسا الثانية على أحقيتهم بحمل لقب المهندس دون غيرهم . ويرر المهندسون الذين تخرجوا من المدرسة متعددة التقنيات أنهم الأحق بهذا اللقب بكون معارفهم العلمية أرفع من مستوي غيرهم من العاملين في هذا القطاع.

يبد أن دراسة الممارسات الفعلية تبين دون لبس أن النظريات والمعارف الذي توصف بالعلمية لا تفيد كثيرا الفنين العاملين بالأشغال العامة في أثناء تطورها ، سواء في ممارستهم اليومية أو في

عمليات الابتكار وتوضح الدراسة التي قام بها تيري شين (Thierry Shinn) ^(٩) ، بصدد عينات المدرسة متعددة التقنيات في منتصف القرن التاسع عشر ، أن الطبقات الحاكمة في الماضي وجدت في ذلك وسيلة لتساعد على بقاء الهياكل الاجتماعية التقليدية وعلى تكريس مكانة مرموقة لفئة جديدة من " نبلاء الدولة".

وقد ساعد مشروع حفر قناة السويس على اكتشاف بعض مكونات النموذج التقني الذي تم استحداثه بها ، وكذلك بعض مقومات الثقافة التقنية في ذلك الوقت. وهكذا ظهر في الأفق قطاع يتطور بشكل عميق . وقد بدا بشكل قاطع في بداية عصر الإمبراطورية الثانية أن التقنية الفرنسية قد تخطت كثيراً مقارنة ببعض فروع النشاط أو بالقطاع المماثل في إنجلترا. وقد أمكن استدراك هذا التخلف بفضل تطور عدة عوامل. أولاً فقد تغيرت مواصفات المقاتلين فقد تزايد عدد خريجي المدرسة متعددة التقنيات بباريس الذين لم ينخرطوا في فئات مهنية مثلهم مثل قدامى طلبة المدرسة المركزية الذين انضموا إلى فئة المقاتلين. وعلاوة على ذلك كان عدد كبير من قدامى مدارس الفنون والحرف (Ecoles d'arts et métiers) يضعون مهاراتهم في خدمة الهندسة المدنية. فضلاً عن ذلك ، أصبحت منذ ذلك الحين شركات الأشغال العامة مستقرة وتعمل بصفة دائمة مما ساعدها على تراكم المعارف التي اكتسبتها من التجارب المتلاحقة. كما أن النشر المتزايد والمتسارع للمعارف والخبرات و تكاثر المجالات قد ساعد ربما في استدراك هذا التخلف وسهلت المعارض العالمية المقارنات والمناظرات الدولية وشجعت الرحلات على تبادل الخبرات. وكذلك ساعدت عملية تقدم صناعة الحديد ووجود قطاع ميكانيكي وتعليمي نشط على تطور الميكنة، الأمر الذي يؤكد تنوع عدد الموردين.

كما شاركت عملية حفر قناة السويس في تطوير قطاع الأشغال العامة وجعلته مركزاً للابتكارات التقنية الهامة التي تتعلق باستخدام المواد الحديثة - مثل خرسانة كونييه (Coignet) في تشييد منارة بور سعيد وبيت لافالي (Lavalley) الخاص وفي إعداد قوالب الأسمنت لرصف مرفأ المواني وتنظيم مواقع الإنتاج - خاصة بفضل التوسع في استخدام قضبان السكك الحديدية . وكذلك بفضل الميكنة . وتلقت كل هذه الابتكارات في نقطة مشتركة هي أنها نتاج مسعى تجريبي منهجي ولا شك أن الحدس الذي يعتبر نقطة انطلاق المكتشفين هو ثمرة خيالهم الواسع و تراكم خبراتهم الماضية كما أن مهارتهم كانت تغذى من الملاحظات الدقيقة للمشاكل الواجب حلها . ولقد استخدمت الحفارات والآلات البخارية في ورشة قناة السويس بدرجة لا مثيل لها في أي مشروع آخر . وقد أشركت عملية التحديث عدداً كبيراً من الفاعلين من مصممين وصناعيين ومستعملين وقد ساعدت محاولات البحث والتجارب على القيام بتحسينات الضرورية .

وساعدهم على استدراك التخلف التقني المسجل في هذا المجال ، كما أن المسعى النفعي (براجماتي) والمعرفة المباشرة بالآلات والأساليب العمل في الورش والجرأة ، قد قادوا ووجهوا عمل هؤلاء الرجال . وتوضح المكانة التي تشغلها العمليات الحسابية المعدة لحل المسائل أنها ، على عكس ما يُقدم عادة في عيالة ، ليست أدوات عملية وإنما ، على الأغلب ، خطابية للتدليل على أنها كثيرة الاستخدام.

ولقد ثبت حسن اختيار ورشة قناة السويس كموقع للرصد والتحليل وبناءً على ذلك أمكن بالفعل لهم المحاولات المتعثرة والتوترات بين الأفراد بسبب ما لهم من طموحات مختلفة أو مصالح متباينة ، كما أمكن التعرف على التعارض الشديد بين الإستراتيجيات الجماعية ، والتسويات الضرورية بين التعليم والممارسات ، وكذلك على المداولات والتكيفات والتسويات الضرورية للالتزام بالمشاريع الأولية كما تم التعرف على آمال قد خابت، وعلى أنواع من الخلل ، والجهود التي لم تتم مكافأتها بالقدر الكافي ، والفشل، وأيضا ضروب من النجاح البطيء ، وهذه كلها عناصر تضيئي على التاريخ كل كثافته

وسواء أكان الهدف هو نقل تقنيات أو استعارة أو تطبيق نماذج أو نشر ونجميع خبرات ، أو ابتكار آليات للتحديث ، فقد أثبتنا أهمية قيام مؤرخ التقنيات الذي يحاول تفسير هذه الظاهرة وفهم الآليات المستعملة ، أن يقوم بتحديد هوية الرجال الذين قاموا بدور الوسيط أو كانوا مصدرها.


ولقد تم بفضل الأشخاص الفاعلين تداول المهارات عبر الحدود من بلد إلى آخر ومن القطاع العام إلى الخاص ومن مشغل لآخر ومن بناية ميكانيكية إلى الأشغال العامة ومن القطاع الحربي إلى المدني وقد ساعد وجود رجال من تخصصات وقطاعات متنوعة على أن يصبح مشروع حفر قناة السويس بوتقة لتطبيقات مختلفة. وهنا يكمن دون شك أهم أسباب نجاحه .

وإذا نظرنا إلى التنظيم نجد أنه قد تم استلهامه من المناهج والأساليب والنماذج المستخدمة من قبل في إدارة الطرق والكباري الفرنسية وذلك لحساب شركة خاصة وقد كان فوازان (Voisin) هو صاحب هذه النقلة وقد ساعده في ذلك الموظفون القدامى الذين تم ضمهم واجتذابهم للشركة. أما من ناحية الأساليب التقنية التي تم تطويرها لحفر القناة البحرية فإن المناهج التي استعملت قد استلهمت من الأساليب المتبعة في ورش السكك الحديدية أكثر مما استلهمت من ورش حفر القنوات الملاحية. وترجع هذه المقارفة الظاهرة إلى طبيعة الأعمال المراد تنفيذها وخصوصا أعمال الردم. فقد اكتسب رجال المشروع وعلى رأسهم المقاولان كزفرو (Couvreur) ولافالي (Lavally) خبرات جيدة عند إنشاء خطوط السكك الحديدية. أما أعمال الموانئ وعلى وجه الخصوص بناء المرافئ واستعمال الكتل الاصطناعية فقد أخذها المشروع عن الخبرات التي اكتسبها

الأخوة دوسو (Dussaud) خلال التجارب التي قاموا بها في موانئ البحر المتوسط. ولقد استفاد أيضا مشروع قناة السويس من الخبرات التي حصل عليها كثير من الفنيين الذين عملوا في السابق في شركات الإنشاءات الميكانيكية والمعدنية. ونتيجة لاشتراك قدامى العسكريين في ورشة القناة فقد تم نقل الخبرات العسكرية في مجال الإدارة وإقامة المساكن المؤقتة والنظافة والصحة. وبمتابعة مسيرة المقاولين يمكن إلقاء مزيد من الضوء على قدراتهم على الابتكار. ولو أخذنا في الاعتبار حالة لافالي (Lavalley) مثلا فإنه كان من الصعب إدراك سر نجاحه لو لم نعد كتابة مسيرته عندما كان يعمل عند جوان (Gouin) ولو لم نعرف أن خريج المدرسة متعددة التقنيات كان قد سافر عبر المانش ليدرس مناهج جديدة ويتأثر بالمنهج التجريبي الإنجليزي. ولاشك أن خط سير رجال الورشة يكشف بوضوح سهولة تنقلهم لممارسة مهنتهم كما يكشف عن وجود تبادلات مع أوروبا أكثر أهمية مما اعتدنا قوله. وربما كان العاملون بحفر خليج قناة السويس قد جاءوا مزودين بخبرة في التقنية وحصولهم من الخبرات ساعدتهم في عملهم ولكن مما لا شك فيه أن هذا المشروع قد أتاح لهم أيضا فرصة اكتساب خبرات جديدة سوف يستفيدون منها في تجاربهم المقبلة. ولم يتردد جيويو (Gioia) عن مخاطبة أحد مراسليه بقوله : " هذا ما تعلمته من مدرسة الخليج العظيمة " ^(١) ويقترح بأن يعود إلى إيطاليا ليفيدها بما أكتسبه في مجال الحفر ويمكنه لو لزم الأمر أن يصبح معه بعض الميكانيكيين وسائقي الكاسحات ^(٢). وقد أتاح إشراك الفنيين الذين سبق لهم العمل في ورشة قناة السويس في حفر خليج كورانت (Corinthe) وبعدها في قناة بنما إقامة علاقة وثيقة مباشرة بين هذه العمليات المختلفة. وقد كان أيضا لعملية حفر قناة السويس تأثير على تاريخ تعليم التقنيات بفرنسا والدليل على ذلك أن مدرسة الطرق والكباري اختارت لتدريس الأشغال البحرية فيكتوران شيفاليه (Victorin Chevalier) (١٨٥٤ - ١٨٧٣) وبعده جاء فوزان (Voisin) (١٨٧٤ - ١٨٨٠) ثم فيلكس لاروش (١٨٨١ - ١٨٩١) والثلاثة من المهندسين الذين شاركوا كل حسب منصبه في تنفيذ قناة السويس.

ومن جديد تساعد دراسة الورشة وممارسات العاملين على تجنب المعوقات وتبرز بعض البديهييات التي تتجاهلها ضمنا بعض الدراسات التحليلية ، رغم بساطة إدراكها في أغلب الأحيان، وبناء على ذلك فإن وجود النماذج لا يعني مسبقاً استعمالها وأن تدريس الرياضيات لا يشترط استخدامها. كما أن وجود نظرية لا يعني تطبيقها. إن لكل من تاريخ المشروعات والنظريات وكذلك التعليم مساره وزمانه الخاص. وغالبا ما تتجاهل المشروعات الظروف الحقيقية وإن كان باستطاعتها أن تبين طرق التفكير وتكون مصدرا لصياغة تاريخ الفكر والتصميم فنحن نرى أنه من الضروري أيضا دراسة الإنجازات وهي في طور الإنجاز حتى تسهل كتابة تاريخ التقنيات بأكمله. وتتيح أيضا المقاربة بالممارسات عدم الوقوع فريسة لخداع بعض الألفاظ مثل لقب مهندس ، كما رأينا ، أو لخداع تعبيرات مثل " تنفيذ الأعمال " أو " العلوم التطبيقية " .

وفي النهاية، يجب أن نذكر أنه شاهدا خلال هذه الدراسة تاريخ الصورة تتكون وتاريخ
حركة توري إلى الواحد وتاريخ مصر وتاريخ إدارة الطرق والكباري الفرنسية
على متن السفينة الحبل (العقاب) التي تقدم موكب السفن الافتتاحي وفق فردينان دي
ليس (Ferdinand de Lesseps) إلى جانب الأسطورة الإلهي

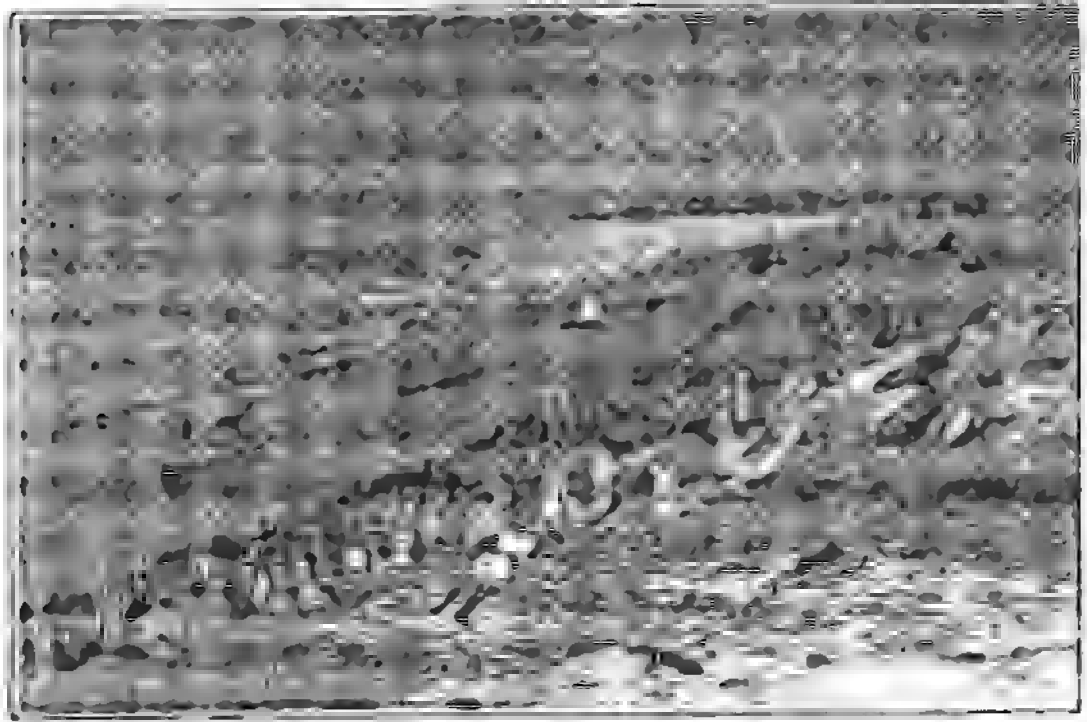

الفتح قناة السويس (لوحة مائية لويل)

أصف إلى هذا المرحل أن دراسة ورشة قناة السويس تلقي ضوءاً جديداً على الدور الذي قام به
رئيس الشركة لدى عرقه التاريخ و اصبح في نفس الوقت بأنه "مقاول اشغال عامة كبير
ومهندس" ماهر و معاصر امباري عقري "la conquérante"^{١٩} وباحصار ظل ملحة
السويس وقد ساعد اتجاها لعصوية اكااديمية العلوم بباريس في ٢٩ نوفمبر ١٨٧٣ على صنع
الأسطورة وقد عمل دي ليس بنفسه كثيراً على تدعيم أسطورة الدالية التي سوف تاتي حمله
في سما إلا ان هذه الأسطورة طلب راسحة كما بنهد على ذلك وجود "جمعية ذكرى فردينان
دي ليس وفاته السويس"^{٢٠} وعمدوا كتب باستعراض عن عهد الرجل العظيم^{٢١}

وإذا أردنا أن نصف الدور الذي لعبه فعلاً رئيس الشركة في عملية حفر خليج السويس فنعبر
كلمة مستخدم هي الأسب والأكثر توافقاً مع إيماننا المعاصر، فبعد أن استأجر لنفسه مشروع السات
سيمونين (Saint Simoniens) قام دي ليس بملل طاقة هائلة في إقناع الأوساط السياسية
والتجارية والدبلوماسية بغائده الصفة ليجمع رؤوس الأموال اللازمة

وقد استغل مواهبه الدبلوماسية في إغراء المساهمين وبث الطمأنينة في قلوبهم وفي محاولة الحصول على رضا تركيا وابتزاز خديوي مصر بشكل مستمر . فقد كان يتابع سير العمل بالورشة باهتمام وعن قرب وكان المتحدث الوحيد باسم الشركة ولكنه أثناء إقامته في الخليج كان يكرس معظم وقته في تنظيم الاحتفالات وصيد الغزال أكثر من مشاركته في الاختيارات الإستراتيجية للعمل والدليل على ذلك أنه بنى لنفسه في الإسماعيلية شاليه للاصطياف على شكل معماري ذائع الصيت في عصر الإمبراطورية الثانية.

لقد تم بعد افتتاح قناة السويس وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط وأصبح العبور ممكناً واستفادت السفن الأوروبية من اختصار المسافة خاصة في اتجاه الهند. ويختلط أيضاً تاريخ الورشة مع بداية عمل الشركة التي كلفت بإدارة حق استغلال القناة وهي الشركة العالمية لقناة السويس البحرية والتي كتب عن تاريخها هوبير بونان (Hubert Bonnin) وسجل نقل حيازتها إلى شركة مالية ^(١١) . وعلى ما يبدو أن خصائص الشركة قد أثرت فيها بشكل دائم ويوجد في صناديق أرشيف الشركة بخصوص هذا الموضوع مخطوطات ثمينة توفر مواداً للبحث في موضوعات متنوعة للغاية مثل تطور تقنيات الهندسة المدنية وتنظيم الشركات وعلاقتها بالحكومة المصرية أو عملها على سبيل المثال في استغلال الخليج .

وقد تحمل الخديوي إسماعيل تكاليف الاحتفالات العالمية التي نظمها في الخليج من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر ١٨٦٩ ولم يتردد في دعوة آلاف الضيوف لهذه المناسبة ^(١٢) وليس هذا إلا دعماً إضافياً لاستكمال مشروع ساندته الحكومة المصرية مادياً بالإضافة إلى كثير من المزايا ويعتبر أيضاً تاريخ هذا العمل صفحة من تاريخ مصر وقد ظهرت في عرضنا مجلاء على لوحة خلفية صورة لمصر وحكومتها، ومؤسساتها وكذلك عمالها من الفلاحين وهكذا نستشف جوانب ضعف الخديوي وشقاء شعب مصر والأساليب التي تتبعها الإمبريالية على هذه الأرض.

عشاء

دعا إليه الخديوي إسماعيل في شاليه الإسماعيلية

بمناسبة افتتاح قناة السويس

١٨ نوفمبر ١٨٦٩

الأطباق الرئيسية

سمك وصل البحرين (البحر الأحمر بالمتوسط)

لحم بقري مشوي (روزيف) على الطريقة الإنجليزية - على قاعدة

هلامية (جلاتين) من مدينة بيريجيه (Périgueux) - على قاعدة

جانبون (فخذ الخنزير أو كتفه ملححة و مدخنة) مُزَخَّرَف بشخوص

خبز من لحوم صيد على شكل موقع مُحَصَّن - على قاعدة

هلامية طائر الفسيانوس (faisan) - على قاعدة

المداخل

لطائر محشوة لحم طريدة على طريقة دورساي (Dorsay)

لسان بقر مسلوق بالبخار على الطريقة الإنجليزية

هلامية من اللحم أو السمك من مدينة نيراك (Nérac)

هلامية من لحوم السمك (en Belle - vue)

حرباء الثور (فيليه) على طريقة الإمبراطور

السلطات

جمبري من السويس بالحرف (جرجير)

فطور لفت الرعد (Truffles) مع نبيذ شامانيا

سلطة روسية

هليون (asperges) من إيطاليا بزيت صيف

المشويات

فخد ظبي بطريقة سانت هيبار (Saint Hubert)

ديك رومي مضاف إليه لفت الرّغد

طائر فاسيانوس بالحرف (بالجرجر)

طير خصي (مُسَمَّن) محشي بالسّمان

التحليات

مقدونية الكيرش (الكرز)

بودنج دهلومات (نوع من الحلوى بالسكويت والكريم) بالأنالاس

بسكويت مزخرف من إقليم سافوه (Savoie)

نابوليتان مزخرفة بشخص (جميدة) جيلاتي مكونة من طبقات مختلفة الروائح

(وتقدم على شكل شريحة)

مثلجات - قوالب حلوى - تشكيل من تحليات

علاوة على ذلك فلقد كشف ذهاب وإياب السفن التي حملت المواد والآلات والمعدات الضرورية من أوروبا عن جوانب النقص المحلية. وكانت مصر متقدمة على معظم بلاد القارة فقد طورت البنية التحتية بدفعة من محمد علي وخاصة بفضل الاستعانة بالفنيين الأجانب ولكن لم تستطع مصر استيعاب التقنيات المستوردة بسبب غياب القاعدة الاجتماعية الواسعة والمنظمة التي تمكنها من استكمال ومواصلة ما أنجزه الحديوي^(١٣). ومع أن ورشة قناة السويس قد أظهرت جوانب النقص المصرية فقد قدمت أيضا فرصا جديدة لنقل التقنيات إلى قطاعات متنوعة مثل الإدارة والهندسة المدنية وتنظيم المدن والإدارة المدنية والطب ورسم الخرائط. إذ احتك العمال المصريون في مشروع القناة بعمال أوروبيين متخصصين وشاركوا في شتى الأعمال وبذلك أتاحت لهم فرص كثيرة استطاعوا من خلالها مجاهدة تقنيات حديثة والتدريب عليها. وعلاوة على ذلك، بقي بعض الفنيين الذين عملوا في الورشة في مصر وانضم بعضهم لخدمة الحديوي وصار منهم آخرون صناعا أو مقاولين. ومن الضروري القيام بدراسات جديدة تستند إلى المصادر المصرية لمعرفة إذا ما كانت فرص نقل التقنيات قد تم استيعابها وإذا كانت مصر قد تمكنت من تطبيق بعض هذه المهارات أو تقليد بعض أشكال النماذج المقدمة في الخليج.

لقد جعلت ظروف حفر قناة السويس المنقطعة النظر وخاصة سير العمل على أرض بكر بعيدة عن فرنسا، جعلت من هذه الورشة بوتقة لصهر الممارسات والمناهج التي سوف يتم تطويرها فيما بعد بفرنسا. ومن بين هذه الممارسات ما يخص الطابع التقني - الميكنة الكثيفة واستعمال الأسمنت المسلح كمادة بناء وتمهيد أقاليم فسيحة أو تخطيط المدن - وبينها أيضا ماله علاقة بتوسيع صلاحيات بعض المهن - حالة المهندسين ومراقبي الطرق والكباري الذين حصلوا على سلطات في مجال تنظيم المدن وكذلك أيضا حالة الأطباء المهتمين بالطب الوقائي والذين استخلصوا منه الخبرات الكافية لتنظيم المساحات الكبيرة (الفضاءات المكانية). لقد وجد الفنيون الفرنسيون في أرض أجنبية ميدانا لاختبار ممارسات جديدة وفرصة للإبداع وهذا دليل على وجود عوائق كثيرة وجامدة في فرنسا كما أن نشر أساليب التقنية التي اخترعت خارج حدود فرنسا تفتح مجالا للبحث فيما يمكن استكشافه بصورة منتظمة.

ومن ثم نجد في النهاية في ورشة قناة السويس صفتين أساسيتين لتنظيم هيئة الطرق والكباري الفرنسية. وقد عرضنا من جهة أمثلة لفاعلية هذا التنظيم في إدارة الورشة ومن جهة أخرى قدمنا البراهين على عدم قدرته على ابتكار تقنيات جديدة. وما من شك، في أن ما تعلمناه قابل للتطبيق على النموذج الأصلي

هواش الخاتمة

- 1) Alain Corbin, « Le vestige des foisonnements ». Esquisse panoramique d'une histoire sans nom », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 39, janvier-mars 1992, p. 125. Le contexte de cette réflexion est une tentative de définition d'une « histoire des sensibilités ». Il nous semble néanmoins pouvoir être étendu.
- ٢) تم تسريح الغالبية العظمى من العاملين بالشركة في فبراير ١٨٧٠.
- ٣) لقد ظهر أكثر من مرة بوضوح غموض هذا اللفظ. أنظر
- André Grelon (ss la dir. de), Culture technique, n° 12, mars 1984, Centre de recherche sur la culture technique, 354 p.
- ويبدو أن ملاحظات لوك بولتسكي عن الكوادر الفنية يمكن أن تطبق تماماً على المهندسين وهي المجموعة التي تكون منها في الأصل هذه الطبقة الاجتماعية.
- Les cadres, P., 1982, Ed. de Minuit, 524p.
- ٤) عرضاً، من المهم في أغلب الأحيان معرفة من يرافقهم: المجتمع، الدولة أو الشركة التي توظيفهم.
- 5) Terry Shinn, L'Ecole polytechnique, 1794-1914, P., Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1980, 261 p.
- 6) CFS. D. Gioia. Lettre de Luigi Torelli, 9 septembre 1869.
- ٧) "هذا ما تعلمته في مدرسة الخليج" رسالة من جيوربا إلى توريلي. الجسر ٩ سبتمبر ١٨٦٩. أعيد طرحها in Antonio Monti, Storia del canale di Suez, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1937, p. 284
- 8) J. D'Elbée, Un conquistador de génie: Ferdinand de Lesseps, P., Editions littéraires de France, 1943, 243 p.
- ٩) - تسمى الجمعية، منذ عدة سنوات، إلى إعادة نصب تمثال دي ليسبس الذي استقر في نهاية القرن التاسع عشر عند مدخل القناة بهور سعيد وتم فك التمثال في عام ١٩٥٦. وقد وافقت الحكومة المصرية، من أعقاب تدخلات دبلوماسية، على وضع التمثال من جديد في حديقة بالمدينة.
- 10) Dernier paru: Ghislain de Diesbach, Ferdinand de Lesseps: la gloire et le vertige, P., Perrin, 1998, 500 p.
- 11) Hubert Bonin, Suez, Du canal à la finance (1858-1987), P., Editions Economica, 1987, 673 p.
- ١٢) تم استقبال ستة آلاف مدعو في الخليج بمناسبة افتتاح القناة، ووفرت لهم إقامة قدم فيها المأوى والغذاء. وتم في بضعة أيام تشييد أماكن لاحتواء ستمائة شخص قدمت لهم موائد متجددة باستمرار. وقد أحضر إلى مصر خمسمائة طبّاخ وألف خادِم من تريستا وجنوة وليغورن ومارسليا.
- Ferdinand de Lesseps, Résumé de l'Histoire du canal de Suez, P., Pichon, Lamy et Devez, 1879, p. 42.
- انظر المائدة الرئيسية التي قدمت للمدعوين في استقبال الافتتاح.
- Source Jean-Marie Carré, Voyageurs et écrivains en Egypte, Le Caire, IFAO, 2^e éd. 1990, tome II, p. 369

وإنضم إلي المدعوين الصحافة الدولية والسانحون الذين عرضت عليهم شركات السياحة رحلات إلى مصر بمناسبة هذا الحدث

Voyage d'agrément à Suez et dans la Basse-Egypte, à l'occasion des fêtes d'inauguration du canal maritime, P., Impr. Dubuisson, 1869, 2 p.

- 13) Jean Batou, 'L'Egypte de Muhammad-Ali, pouvoir politique et développement économique', Annales ESC, mars-avril 1991, pp. 401-418.

ملحقات

معالم تاريخية

١-١ أحداث هامة في تاريخ قناة السويس حتى افتتاحها

١٧٩٩	كلف بونايرت ليبير بتحقيق قياس مستوى خليج السويس الذي نتج عنه وجود اختلاف بحوالي عشرة أمتار بين مستوى البحر الأحمر والبحر المتوسط.
١٨٤٦	قيام السان سيمونين بإنشاء جمعية لرئاسة قناة السويس.
١٨٤٧	تحقق بوردالو ، الذي أشرف على قياس المستوى ، من تعادل مستوى البحرين .
٣٠ نوفمبر ١٨٥٤	أول عقد تنازل صحح لدي ليسبس بتكوين الشركة لية لتنفيذ قناة السويس البحرية . فرمان وقع عليه سعيد باشا في ١٩ مايو ١٨٥٥ .
٢٠ مارس ١٨٥٥	مخطط مشروع لبنان وموجبل .
أكتوبر ١٨٥٥ - يناير ١٨٥٦	سفر اللجنة الدولية المكلفة بدراسة مخطط مشروع مهندسي الوالي .
٢ يناير ١٨٥٦	تقديم ملخص لتقرير اللجنة الدولية إلى الوالي
٥ يناير ١٨٥٦	عقد امتياز ودفع الشروط لإنشاء وإستغلال قناة السويس البحرية وملحقاتها . بالإضافة إلى لوائح الشركة العالمية لقناة السويس التي وقع عليها الوالي بالموافقة.
٢٠ يوليو ١٨٥٦	مرسوم وقانون خاص بالعمال من الفلاحين
ديسمبر ١٨٥٨	مشروع اللجنة الدولية .
٣٠-٥ نوفمبر ١٨٥٨	اكتتاب عام لتحقيق رأس مال الشركة ٢٠٠ مليون من الفرنكات موزعة على ٤٠٠٠٠٠ سهماً قيمة السهم ٥٠٠ فرنكاً .
٢٢ نوفمبر ١٨٥٨	إنشاء المجلس الأعلى للأشغال
١٥ ديسمبر ١٨٥٨	التشكيل النهائي للشركة العالمية لقناة السويس البحرية.
٢٥ أبريل ١٨٥٩	البداية الرسمية للأعمال .
٢ فبراير ١٨٦٢	الانتهاء من ترعة الماء العذب التي تمتد من ترعة الوادي حتى الإسماعيلية .

١٨ نوفمبر ١٨٦٢	أنتها المجرى البحري بين بور سعيد والإسماعيلية. دخول مياه البحر المتوسط في بحيرة التمساح .
١٨ يناير ١٨٦٣	حضور إسماعيل باشا .
١٨ مارس ١٨٦٣	اتفاقية بموجبها تسترد حكومة مصر ترعة الماء العذب بين القاهرة والوادي
٢٠ مارس ١٨٦٣	اتفاقية تنظم المساهمة المالية للحكومة المصرية في الشركة .
٦ أبريل ١٨٦٣	مذكرة السلطان المتعلقة بشروط التصديق على عقد الامتياز .
٢٩ ديسمبر ١٨٦٣	فتح ترعة الماء العذب حتى السويس .
٩ إبريل ١٨٦٤	وصول الماء العذب إلى مدينة بور سعيد عن طريق أنابيب من الزهر
٦ يوليو ١٨٦٤	قرار ناهليون الثالث بصدد التحكيم في الخلافات بين الشركة والحكومة المصرية .
أبريل ١٨٦٥	رحلة مندوبي الغرف التجارية في خليج السويس .
يونيو - يوليو ١٨٦٥	وباء الكوليرا .
١٢ أغسطس ١٨٦٥	عبور أول موكب من الفحم من الأرض شحن بالبحر المتوسط متجها إلى البحر الأحمر بدون مناقلة .
٣٠ يناير ١٨٦٦	اتفاقية معدلة للتحكيم الذي ينظم :- (١) استخدام الأراضي الممنوحة للشركة كملاحقات للقناة البحرية . (٢) التنازل للحكومة المصرية عن ترعة الماء العذب والأراضي وأشغال البناء والمباني التابعة لها (٣) بيع ملكية الوادي .
١٩ فبراير ١٨٦٦	تحديد الأراضي المخصصة للشركة .
٢٢ فبراير ١٨٦٦	فرمان الباب العالي - وقع عليه السلطان في ١٩ مارس - واتفاقية تحديد الأراضي
نهاية ١٨٦٦	بداية عملية ملء بحيرة التمساح .
سبتمبر ١٨٦٧	قرض لخصص قدره ١٠٠ مليون : ٣٣٣٣٣٣ سهما
١ يوليو ١٨٦٨	صدرت بقيمة ٣٠٠ فرنكا للسهم .


بدء خدمة سكة جديد منتظمة بين الإسماعيلية والقاهرة.	٢ يوليو ١٨٦٨
فتح جزء الخط الحديدي الإسماعيلية السويس.	١٤ أغسطس ١٨٦٨
إدخال مياه البحر المتوسط في حوض بحيرات المرة .	١٨ مارس ١٨٦٩
اتفاقية تحديد شروط الإعفاء الجمركي وتنظيم تنازل الشركة للحكومة المصرية عن المستشفيات والنازلين المهاجرين والمخازن المختلفة. اتفاقية ثانية تحدد التسوية الخاصة بين الشركة والحكومة المصرية بشأن استخدام الأراضي المحددة .	٢٣ أبريل ١٨٦٩
دخول مياه البحر الأحمر في البحيرات المرة .	١٦ أغسطس ١٨٦٩
الفتح لقناة السويس البحرية.	١٧-٢٠ نوفمبر ١٨٦٩

١. ٢ - تاريخ المعاهدات والصفقات التي تمت مع كبار المقاولين

الموضوع	المقاول	التاريخ
عقد مؤقت	هاردون	١٤ فبراير ١٨٥٩
عقد نهائي لكل الأشغال المقترحة	هاردون	٢٩ فبراير ١٨٦٠
توزيع الماء العذب من الإسماعيلية إلى بور سعيد	لاسيرون	١١ يوليو ١٨٦٢
النطق بإلغاء العقد	هاردون	يناير ١٨٦٣
أشغال الحفر بالجسر	كوفريه	أول أكتوبر ١٨٦٣
أرصعة (حواجز ماء) بور سعيد	ديسو	٢٠ أكتوبر ١٨٦٣
عمليات جرف من بورسعيد إلى ترعة البلاح	آيتون	١٣ يناير ١٨٦٤
عمليات جرف من الجسر إلى البحر الأحمر	بوريل ولافالي	٢٦ مارس ١٨٦٤
عقد تأجير ورش بور سعيد	بوريل ولافالي	٢٤ يونيو ١٨٦٤
إلغاء المعاهدة عن طريق مُعَضِر	آيتون	٦ نوفمبر ١٨٦٤
إستئناف الأشغال التي آلت إلى آيتون	بوريل ولافالي	١٢ ديسمبر ١٨٦٤
ماسور ماء جديدة بين الإسماعيلية وجزيرة الكاب	لاسيرون	١٥ ديسمبر ١٨٦٤
أهوسة ترعة الماء العذب	بوريل ولافالي	١٥ فبراير ١٨٦٥
ماسورة ماء جديدة بين جزيرة الكاب وبورسعيد	لاسيرون	٢٧ مارس ١٨٦٥
تخفيض الأشغال في عتبة الجسر	كوفريه	٢٧ مارس ١٨٦٥
عقد إضافي للإتفاق الرئيسي	بوريل ولافالي	٢٧ مارس ١٨٦٥
ثاني عقد إضافي	بوريل ولافالي	٤ ديسمبر ١٨٦٦
ثالث عقد إضافي	بوريل ولافالي	١٣ أبريل ١٨٦٧
رابع عقد إضافي	بوريل ولافالي	١٥ يناير ١٨٦٨
خامس عقد إضافي	بوريل ولافالي	٣٠ أكتوبر ١٨٦٨

كيفية تنفيذ الأشغال	المقاول	رب العمل	القائم بالعمل	بدء العمل بالورشة إبريل ١٨٥٩
الإدارة المتفعمة	هاردون	الإدارة العامة للأشغال بالشركة	مجلس إدارة الشركة	تعيين لوزان مدير عام الأشغال لبرابر ١٨٦٢
الإدارة المتفعمة	هاردون	الإدارة العامة للأشغال بالشركة	مجلس إدارة الشركة	إنهاء عقد هاردون أول يناير ١٨٦٣
الإدارة المباشرة	الإدارة العامة للأشغال	الإدارة العامة للأشغال بالشركة	مجلس إدارة الشركة	استدراج عروص محدودة أكتوبر ١٨٦٣
صفقات خصص أشغال سدوت على أساس سعر الوحدة	كوفريه ديسو آيتون بوريل ولافاني لاسرون	الإدارة العامة للأشغال بالشركة	مجلس إدارة الشركة	نهاية الأشغال نوفمبر ١٨٦٩
كيفية تنفيذ الأشغال	المقاول	رب العمل	القائم بالعمل	بدء العمل بالورشة إبريل ١٨٥٩

٢ . مصر وحفر قناة السويس
بنوة الولاة الذين تولوا عرش مصر

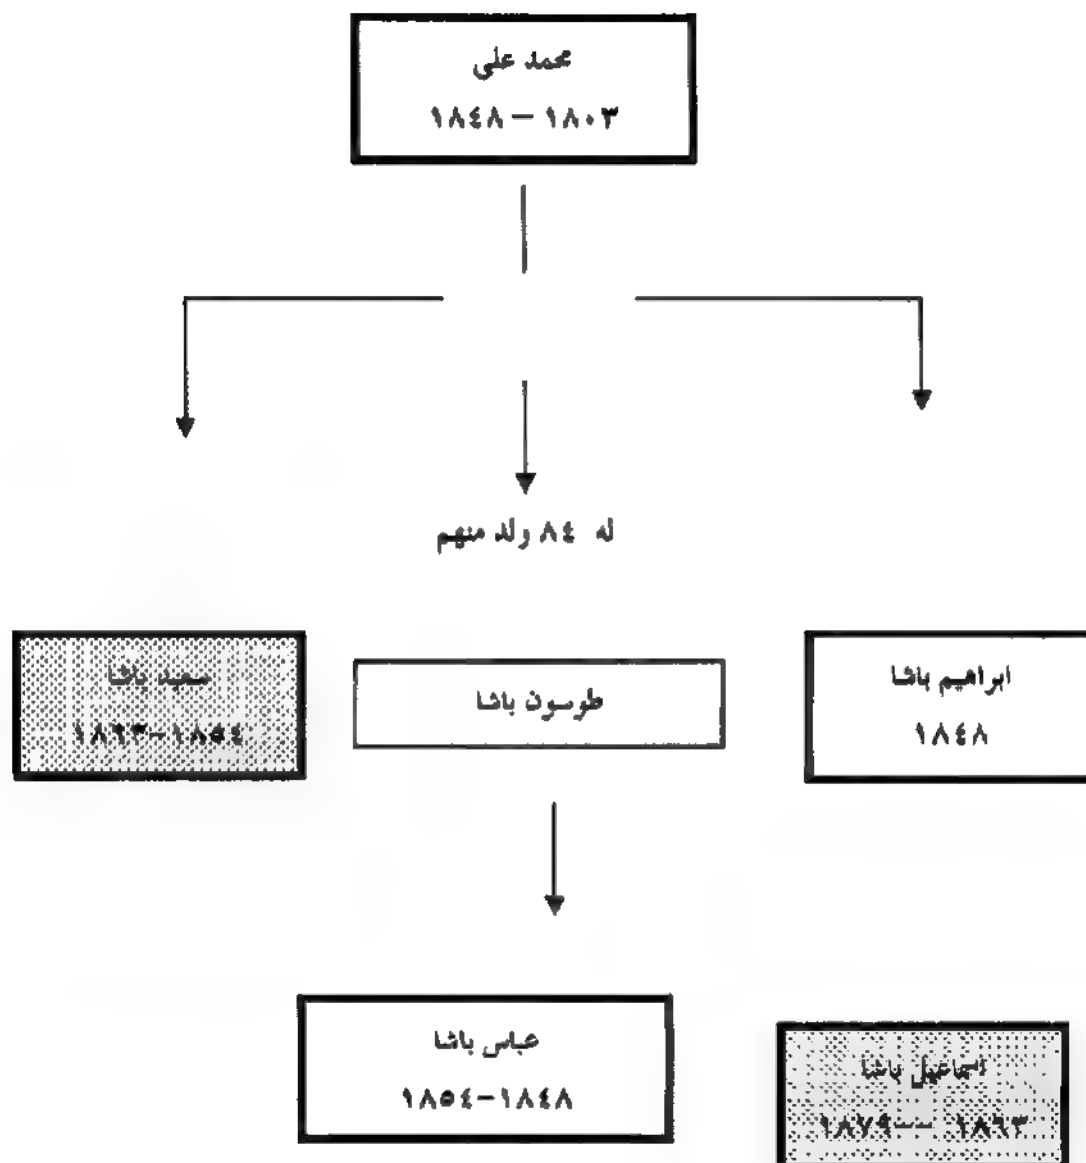

تفسير
أبو (الاسم تتبعه سنوات الحكم)

٢. ٢ - جدول إجمالي المبالغ التي التزمت مصر بسدادها للشركة

١٨٥٨

فرنك	٨٨٨٢١٠٠٠	رأس المال المنشأ (١٧٧٦٤٢ سهم)
		بمقتضى اتفاقية ٢٢ فبراير ١٨٦٦
فرنك	٨٤٠٠٠٠٠٠	• تعويض حدده تحكيم نابليون الثالث
فرنك	٣٨٠٠٠٠٠٠	- تعويض من أجل إلغاء السخرة
فرنك	١٠٠٠٠٠٠٠	- أشغال ترعة الماء العذب التي ردت
فرنك	٦٠٠٠٠٠٠٠	- تعويضات عن تحصيل رسوم ترعة الماء العذب
فرنك	٣٠٠٠٠٠٠٠	- شراء من جديد أراضي قابلة للري
فرنك	١٠٠٠٠٠٠٠٠	• شراء ملكية الوادي
		بمقتضى اتفاقية ٢٣ أبريل ١٨٦٩
فرنك	١٠٠٠٠٠٠٠٠	• إعادة شراء مستشفيات ومباني مختلفة في المخيمات
		الصفري ومحاجر المكس ومخازن
		• إلغاء الإعفاء الجمركي والتنازل عن البريد
فرنك	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	والطغراف وإنشاء أملاك عامة
فرنك	٢١٢٨٢١٠٠٠	المجموع

٣ - أشغال القناة

٣-١ سعة القناة البحرية وتوزيع الانقراض

مسار الخليج	العرض بالتر	الطول بالكيلو متر	مليون متر مكعب مستخرج
بحيرات المزل والبلاخ	١٠٠	٦١	٤٤
حفرة الجسر	٥٨	١٤,٥	
بحيرة التمساح	غير محددة	٨	
حفرة السرايوم	٥٨	٧	
مدخل البحيرات المرة	١٠٠	٥,٢٥	١١
البحيرات المرة	غير محددة	٤٠	
حفرة الشالوفة	٥٨	٥	١٩
سهل السويس	١٠٠	١٩,٢٥	
المجموع		١٦٠	٧٤

٣-٢- كيفية تنفيذ الحفر في مختلف مناطق القناة

منطقة القناة	كيفية التنفيذ
بور سعيد والجزء الأول من القناة	جرافات تفرغ ناتج الحفر في حاملات أتربة أوناش تزود تراب الردم للمدينة و الرمل لصنع الكتل جرافات تخدمها قوارب لنقل الأتربة إلى البحر جرافات بذراع طويل تعمل على إعداد الجسور والمسطحات .
عبور بحيرة المولة	جرافات صغيرة لحفر دعائم البناء المائي
القطرة وبحيرات البلاح	الأنقاض بواسطة الرجال جرافات تخدمها رالمعات جرافات بذراع طويل
عبور عتبة الجسر	رفع أنقاض بالقفة وعربة اليد رفع أنقاض بالعربة والقاطرات و تحمل بأيدي الرجال أو بحفارات على الناشف حفارات مائية لتوسيع المجرى المائي . جرافات تخدمها قوارب وصنادل للتفريغ في بحيرة التمساح
عبور بحيرة التمساح	جرافات بذراع طويل.
عبور عتبة السرايوم	أنقاض بأيدي الرجال : قفف ، عربات يد بغال وجمال . نظام أحواض صناعية تحت مستوى البحر . جرافات تخدمها صنادل وقوارب . جرافات بذراع طويل.
عبور صغرى البحيرات المرة	أنقاض بعربة اليد
عتبة الشالوف وسهل السويس	أنقاض بالقفة وعربات اليد و البغال مع الجمال أنقاض بواسطة الأسطح المائلة.
الكرانتى وميناء السويس	جرافات بذراع طويل جرافات تخدمها رالمعات جرافات تخدمها صنادل والقوارب للتفريغ في مرسى السويس

4. LES TECHNICIENS DU CHANTIER¹

NOM	Prénom	Date de naissance	Formation	Premier employeur
ABONNAT	Pierre	04/02/1832	C	BL
ALADENIZE	Edmond	29/07/1840	CPC	C
ANASTASIA			EE	BL
ANDRÉ	Simon			H
AUCOUTURIER	Olympe	25/09/1840	PPC	C
AUMAS	Jean-François, Lucien	06/01/1840	PPC	C
BADER	Maurice		EE	C
BADOIS	Edmond	28/09/1840	C	C
BARBELET	Joseph		PPC	H
BÉRINGER	Émile, Gustave	19/01/1840	CPC	C
BERNARDOT	François		AM	BL
BERTHAUT	Yves, Émile	03/06/1823	A	C
BETTÈS	François	16/03/1818	CPC	C
BIEDERMAN			EE	BL
BLONDEL	Étienne, Alfred	15/09/1835	CPC	C
BLONDEL	Henri, Auguste, Adrien	24/05/1837	X	BL
BORCK				H
BORDELET	Anatole			H
BOREL	Paul	10/12/1820	IPC	C
BOUFFE	Théodore, Henri	25/01/1837	C	BL
BOURCIÈRE	Charles, Marie	07/11/1839	C	BL
BOURGEY	Joseph, Marie	18/06/1841	AM	BL
BOURGOIN	Auguste	15/06/1820	CPC	C
BOURIOT	Michel		PPC	C
BOY	Alfred			H
BRARD	Félix, Auguste	05/07/1845	C	BL
BRUNNER	Émile	01/03/1842	EE	BL
CADIAT	Nicolas, Ernest	14/02/1839	C	C
CADIAT	Victor	23/11/1836	GM	C
CAZEAUX	Jean-Marie	18/01/1827	CPC	C

Des notices biographiques ont été constituées pour chacun des personnages figurant dans le tableau ci après. Elles n'ont pu être reproduites ici, faute de place. Nous invitons le lecteur intéressé à se reporter au manuscrit de la thèse dont ce livre est issu.

LE CHANTIER DU CANAL DE SUEZ

CHAMPOUILLON	Alphonse, Louis	14/07/1834	X	BL
CHAMP-RENAUD			EE	C
CHANOINE	Marie, Casimir	28/10/1838		C
CHAUMONNOT	Louis		AM	BL
CHIARISOLI	Jean-Baptiste	29/03/1842	AM	BL
CHIRADE	Léon		AM	BL
CHRÉTIEN	Alfred	24/09/1832		H
CLERC	Louis			H
CLOSIER	François, Julien		CPC	C
COITIER	Marie		AM	BL
COLLAS	Jean	30/03/1836		C
COMBOUL	Jean-Étienne, Édouard	09/07/1840	CPC	C
COSTET	Philippe		AM	BL
COTARD	Charles	22/06/1835	X	BL
COUPELIN				H
CUINAT	Charles	16/11/1834	C	BL
CUVIER	Louis, Robert	17/07/1814	V	C
DAUZATS	Guillaume, Vincent	08/06/1840	AM	C
DELAGE	Jean			H
DÉTÉ	Édouard, Martial	27/01/1826	CPC	C
DÉTÉ	Eugène, Barthélémy	11/02/1821	PPC	C
DORGET	Émile, Ernest	29/05/1848		C
DUBOIS	Adolphe, Joseph	19/09/1822	CPC/AM	C
DUPONT	Ernest, Auguste	26/08/1836	C	BL
DUPRÉ	Florus	1856	AM	H
DURAND	Charles	03/03/1828	CPC	C
ECKHOLD				C
ESTER	Antoine			C
EVROT	Charles, Philippe	20/02/1842	PPC	C
FABRE	Augustin, Marius, Armand	25/07/1837	CPC	C
FAUCON	François, Charles	09/11/1840	C	BL
FLEURY	Jules	13/01/1830		BL
FONTANA			EE	BL
FREISSLICH			EE	BL
FULTER	Jean, Théodore			H
GABUSSI	Charles		EE	C
GAGET	Émile	1831	CPC	C
GARRONE				H

Annexes

GAUDEFROY	Antoine	01/12/1824	PPC	C
GAVOTY (de)	Ferdinand, Célestin			C
GAVOTY (de)	Paul			C
GEOFFROY	Alexandre		PPC	C
GEOFFROY	Joseph		AM	BL
GIANINI			EE	BL
GIFFARD	Pierre, Yves	18/05/1836	CPC	C
GIOLA	Eduardo	18/10/1832	EE	H
GOËLO	Alphonse	13/02/1825	CPC	C
GOUGET	Augustin	03/01/1835	CPC	C
GRADO	Hippolyte, Auguste		AM	H
GRANDVOINNET	Alphonse		AM	BL
GRAS	Joseph			C
GUILLAUMET	Achille	17/11/1833	X	BL
GUTTER	André, Jacques, Joseph	23/08/1825	AM	H
HANET-CLÉRY	Charles, Joaquin, Joseph	24/12/1824	M	C
HEGERMANN			EE	BL
HEIDEGGER	Théodore	07/01/1834	EE	C
HENRY	Émile	15/12/1837	CPC	C
JANICKI	Stanislas		EE	BL
JEANNERAT	Léopold	15/12/1843	EE	BL
JOLY	Charles		AM	BL
JONA			EE	BL
JUILLET-SAINT-LAGER	Théodore, Eugène	12/11/1809	A	C
KERFORNE	Pierre, Fortuné	10/07/1832	CPC	BL
KRUGER	Eugène, Frédéric	22/08/1843	C	C
LACROIX	Émile, Georges	20/05/1839	V	C
LALHEUGUE	Henry	1843	CPC	C
LALLEMAND	Louis, Jacques	25/07/1817	V	C
LAMBERT	José			C
LAMBERT	Nicolas	21/09/1817	CPC	C
LAROCHE	Félix	02/07/1830	IPC	C
LAROUSSE	Eugène, Hyacinthe	17/08/1832	H	C
LASSALE	Adrien	24/12/1839	PPC	C
LASSIA	Ulysse	05/08/1842	AM	BL
LATOURE (de)	Benjamin	31/08/1821	A	C
LAUGAUDIN (de)	Edmé, Louis, Joseph	14/05/1832	A	BL

LE CHANTIER DU CANAL DE SUEZ

LAVALLEY	Alexandre	09/10/1821	X	BL
LECELLIER	Charles	20/10/1841	C	BL
LECOCQ de la FRÉMONDIÈRE	Charles, Eugène	01/06/1842	AM/PPC	C
LECOMTE	Louis, François	28/01/1823	AM/CPC	C
LEHMANN	Gustave	08/03/1837		C
LEMASSON	Cyrile	26/11/1842	C	BL
LEPORI			EE	BL
LE TORS de CHAUMESNIL	Louis, Simon, Philippe	01/08/1826		C
LIBAUDIÈRE	Félix	25/06/1844	C	BL
LINARD	Charles, Albert	20/10/1839	C	C
LONGO	Michel, Conrad, Albert	08/02/1833		C
LORY	Auguste		AM	H
LOSTIE de KERHOR	Léonce	10/06/1838	CPC/AM	C
LUGI	Ulysse	31/08/1834		C
MAËLHY	Achille, Rodolphe	09/11/1833		C
MAEYENS	Léon, Eugène	13/01/1843	C	BL
MANOUG	Latif, Joseph	13/09/1834	C	C
MARCTILLY (de)	Adolphe			C
MARICHAL	Jean, Joseph	20/05/1818		C
MARIETTE	Édouard	19/01/1841		C
MASQUERAY	François, Charlemagne	08/1814	V	C
MASSON	Jacques, Louis, Auguste	27/10/1828	CPC	C
MAURIAC (de)	Anatole	01/09/1835	X	BL
MICHAUD				C
MLODECKI	Charles	09/11/1843	EE/C	BL
MOKLIN	Pierre, Louis, Archange	22/02/1816	CPC	C
MOLLARD	Ernest	04/07/1846		C
MONTALTI	Henry	03/07/1838	C	C
MONTAUT (de)	Bernard, Louis, Célestin	27/08/1823	IPC	C
MONTEIL	Léon	21/02/1835	AM	C
MONTEL	Charles		AM	BL
MOUGEL	Dieudonné, Eugène	27/11/1808	IPC	C
NICOLAS	Hippolyte	26/09/1845	AM	BL

Annexes

PALAA	Daniel	04/02/1831	CPC	C
PAPONOT	Félix	31/10/1835		H
PATURAUD	Antoine, Anselme		AM	BL
PEYRELONGUE (de)	Alcine	17/05/1827		C
PEYTAVI	Paul, Jean, François	17/01/1828	CPC	C
PHISTER				H
PIERRAT	Jean-Baptiste	17/09/1827	CPC	C
PIODA			EE	BL
POCARD-KVILER	Charles	07/12/1843	C	C
POILAY	Édouard			C
POILAY	Théodore	30/04/1830		C
POIRIER	Julien, Étienne	02/03/1817	CPC	C
POIRSON	Louis, Anthony	02/07/1832	C	C
PORCELET	Étienne			H
POUCHET	James, Isaac	07/03/1835	C	C
QUESNOT	Louis, Auguste, Émile			C
RATULD	Casimir	12/11/1815		H
RENÉ-CAILLÉ	Eugène	15/06/1831		C
RICHARD	Georges, Louis, Antoine, Henry	18/04/1841	CPC	C
RICHE	Armand	02/11/1821	C	H
RICHE	Gustave			H
RICHON	Amboise, Paris, Marial	06/11/1823	AM/CPC	C
RIEHR	Jean	10/10/1827	PPC	C
RODOLPHE	Amédée	03/07/1828	C	BL
ROMBI	Jean, Georges	17/11/1840		C
ROTH			EE	BL
ROLS	Jean	08/01/1832	CPC	C
ROUSSEAU	Paul, François, Léon	15/12/1840	X	BL
SAGE	Paul, Romain	12/05/1840	C	BL
SAINT-VANNE	Léon			C
SALLERON	Henry	09/11/1838	C	BL
SANCÈDE	Charles	25/04/1839	CPC	C
SAUTEREAU	Gustave			C
SAVIGNAC	Antonin	1840	AM	BL
SCHEIDER	Jean, Baptiste, Prosper	02/02/1831	A	BL
SCHMITT	Hugues		EE	A
SCHNEIDER	Frédéric		AM	BL

LE CHANTIER DU CANAL DE SUEZ

SCIAMA	Joseph, Jules	11/10/1821	IPC	C
SCRIBOT	Léon		AM	BL
SERRE	Claude		AM	BL
SERT	Jean	04/02/1832	AM	C
SOLDATI			EE	BL
TISSOT	Eugène	23/11/1838	EE	H
TOUZET	Émile, Alexandre	06/06/1839	AM	C
VILLER	Jean-François	25/10/1819	IPC	C
VIMONT	Pierre, Jules	22/03/1837	C	BL
VOISIN	François-Philippe	20/05/1821	IPC	C
WALEWSKI	Julien	29/03/1839		C
WOLMERINGER	François, Eugène	16/02/1838	CPC	BL

Légende du tableau

Formation

A	École polytechnique + École d'artillerie
AM	École des arts et métiers
C	École centrale des arts et manufactures
CPC	Conducteur des ponts et chaussées
EE	Écoles étrangères
GM	École polytechnique + École du génie maritime
H	École polytechnique + École des ingénieurs hydrographes
IPC	École polytechnique + École des ponts et chaussées
M	École polytechnique + École des mines
PFC	Piqueur des ponts et chaussées
V	Agent voyer
X	École polytechnique seule

Premier employeur

BL	Borel, Lavalley et Cie
C	Compagnie universelle du canal maritime de Suez
H	Hardonn

تفسير المصطلحات

التأهيل	
A	المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة المدفعية
AM	مدرسة الفنون والحرف
C	المدرسة المركزية للفنون والصناعة
CPC	مراقب أشغال الطرق والكباري
EE	مدارس أجنبية
GM	المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة المهندسة البحرية
H	المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة مهندسي المياه
IPC	المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة الطرق والكباري
M	المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة المناجم
PPC	مفتش عمال أو ناظر الطرق والكباري
V	ناظر الطرق
X	المدرسة العليا متعددة التقنيات فقط

أول مستخدم

BL	بوريل ولافالي وشركاؤهما
C	الشركة العالمية لقناة السويس البحرية
H	هاردون

Bibliographie

SOURCES MANUSCRITES, CARTES ET PHOTOGRAPHIES

Archives nationales, Paris

- *Grande chancellerie de la Légion d'honneur*

Dossiers individuels de Légion d'honneur.

- *Série F : Versements des ministères et des administrations qui en dépendent*

F¹² : Commerce et industrie

5773-5774 : Liste complète des anciens élèves de l'École centrale des arts et manufactures des promotions 1829 à 1842.

F¹⁴ : Travaux publics

2152-2341 : Dossiers individuels des ingénieurs des ponts et chaussées. XVIII^e-XIX^e siècles.

11459-11622 : Dossiers individuels des ingénieurs des ponts et chaussées. XIX^e siècle-1910.

2420-2696 : Dossiers individuels des conducteurs des Ponts et Chaussées. XVIII^e-XIX^e siècles.

- *Série AP : Archives personnelles et familiales*

Microfilm 159 Mi 1. *Papiers Félix Papoulet* (1835-1897).

- *Série AQ : Archives d'entreprises.*

Fonds 89AQ : Société de construction des Batignolles (1847-1953).

Procès-verbaux, 89AQ10, microfilm 151 Mi 4.

Fonds 153AQ : Compagnie universelle du canal maritime de Suez (1854-1957).

Ce fonds rassemble les traces de ce que fut, de 1854 à 1956, la Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Rapatriées en catastrophes, dans le contexte des événements de 1956, ces archives ont d'abord été déposées dans un pavillon particulier situé au Vésinet avant d'être versées, entre 1978 et 1980, aux Archives nationales. Ce fonds a fait les frais d'élagages successifs, à l'occasion de chacun de ses déménagements. Il s'étend aujourd'hui sur mille six cents mètres de rayonnage. Un classement thématique a été entrepris dans les années 1980. Réalisé en plusieurs étapes, il a donné lieu à autant de plans de classement. Un index tente d'assurer une certaine cohérence entre eux. Le résultat est grossièrement satisfaisant, mais confus dans le détail, et la surprise est le lot quotidien du chercheur qui ouvre les cartons de ce fonds.

LE CHANTIER DU CANAL DE SUEZ

Liste des cartons consultés

Les indications chronologiques fournies par les inventaires ont constitué le principal critère de sélection des cartons. Les cotes des cartons consultés sont suivies des indications extraites de l'inventaire.

- 94 : Dossiers personnalités.
- 106 : Liste des décisions du conseil d'administration.
- 117 : Plaquettes.
- 280 : Notes historiques.
- 383 : Visiteurs.
- 412 : État du personnel à Paris.
- 413 : Correspondances diverses. Personnel.
- 1409 : Médailles.
- 1413 : Organisation des services d'Égypte.
- 1429 : Comptabilité.
- 1600A : Conseil supérieur des travaux.
- 1600B, 1606A et 1606B : Commission consultative des travaux.
- 1607A : Correspondances de personnalités.
- 1608A : Correspondances de personnalités.
- 1608B : Service de santé.
- 1609A : Correspondances.
- 1609B : Registre des correspondances.
- 1610A, 1610B, 1611A : Rapports mensuels du directeur général des travaux.
- 1612A : Correspondance du Foreign Office.
- 1614A : Correspondance adressée à Lesseps.
- 1615A, 1615B, 1616A, 1617A : Période de construction.
- 1617B : Bibliographie.
- 1617C, 1618A, 1618B, 1619A, 1619B, 1620A, 1620B, 1623A, 1623B, 1621A, 1621B, 1622A, 1622B : Archives Voisin.
- 1624 : Organisation des services. Personnel.
- 1628A : Travaux de Goby.
- 1630A : Publications.
- 1636 : Conseil supérieur des travaux. Correspondance adressée à Lesseps.
- 1639 : Carte de l'isthme.
- 1640 : Budget général.
- 1695 : Secrétariat technique.
- A1-A2 : Comité de direction.
- CCF 474 CCF 484 : Plans.
- CL1, CL2, CL58, CL69, CL70, CL85 : Registre des correspondances technique.
- CL 121 à CL 126 : Service des travaux, courriers.
- CX1-2 : Contentieux.
- CX147 : Contentieux.
- DC18, DC33 à DC35 : Constructions, Domaine commun.
- DC133 : Constructions.
- DC144 : Foncier.
- F65 : Personnel.
- G1, G77, G78 : Décisions du comité de direction et du conseil d'administration.
- INJ21 : Entreprise Borel, Lavaury et Cie.
- INJ36 : Marchés avec la Société des forges et chantiers de la Méditerranée.
- INJ72 : Conseil supérieur des travaux.
- INJ95 : Budget personnel.
- INJ118/A-INJ118/E : Livres d'ordre du comité de direction.
- INJ121 : Livre de crédit.
- INJ124 : Fournisseurs.
- INJ164 : Matériel.
- INJ169 : Service technique. Correspondance départ.
- INJ172-INJ173 : Correspondance arrivée.
- INJ180 : Fournisseurs.
- INJ186 : Registre des commandes.
- INJ200 : Renseignements sur les membres du personnel.
- INJ264-INJ274 : Correspondance agence de Marseille.

Bibliographie

- INJ280-INJ281 : Service technique. Correspondance. Copie de lettres.
- INJ295-INJ296 : Ingénieur conseil.
- INJ338-INJ339 : Comptabilité.
- INJ340 : Budget personnel.
- INJ341-INJ343 : Publication de la Compagnie. *L'isthme de Suez, journal de l'union des deux mers.*
- INJ344 : Assurances maritimes.
- INJ366 : Dépenses de construction.
- INJ370 : Règlements.
- K1 à K3 : Personnel ouvrier.
- N32 : Publications.
- N35 : Documents historiques et études sur le canal.
- N199 : Service de santé.
- N246 : Budget personnel.
- N279 : Publications.
- N401 : Dossiers canaux divers.
- N411 : Correspondances diverses.
- N1365 : Correspondances ingénieurs étrangers.
- N1382 : Comptabilité.
- PH1-PH13 : Album photo.
- RS1 : Service de santé.
- RU2 : Traitements.
- RU15 : Recensement de personnel.
- SEC15 : Constructions.
- TE1-TE2 : Avis de la commission consultative.
- TE3 : Rapports, étude, projet.
- TE4-TE5 : Conventions.
- TE6-TE7 : Concession de terrain.
- TE15 : Budget.
- TE18 : Autorisation de commerce, service sanitaire.
- TE19-TE20 : Service sanitaire.
- TE22 : Exposition.
- TE56, TE57, TE 106 : Inventaires cadastraux, régimes des terrains.
- TE107 à TE 113, TE 123, TE 124 : Villes.
- TE128 à TE 149 : Service technique. Construction du canal.
- TE150 à TE154, TE160, TE164 : Plans du canal, de gare, de ports.
- TE215 à TE219, TE265 à TE 267 : Plans du canal et des villes. maquettes, photos
- TE317, TE318, TE320, TE326 : Documents techniques.
- TE327 à TE329 : Canal d'eau douce, chemin de fer, routes.
- TE343 à TE 347, TE360, TE407 à TE 412 : Aménagement des villes.
- TE417 : Jardins.
- TE471 : Canal d'eau douce.
- TE 487 : Carrières.
- TE514 : Hawkeshaw.
- TE577 : Agence de Marseille.
- TE591, TE592, TE830 : Marchés, plans, documents techniques.
- TE831 à TE 824, TE840, TE854, TE869, TE870 : Matériels de travaux.
- TEP3 : Phare.
- TEP17 à TEP 19 : Matériels de travaux.
- TEP22 : Recrutement.
- TEP23 : Crimes, délits, rixes.
- TEP24 : Certificats de décès.
- TEP37 : Inventaire de l'atelier.
- TEP43, TEP44 : Canal d'eau douce.
- TEP65 : Retraites, organisation.
- TEP76 : Recrutement.
- TEP112 : Appointement.
- TEP133 : Barrages.
- TEP146 : Planches de l'ouvrage de Monteil.

Le fonds 153AQ comprend, en outre, une partie de cartes et plans, qui était conservée à Paris et non pas à Fontainebleau.

LE CHANTIER DU CANAL DE SUEZ

Archives de l'Académie des sciences

Dossiers d'Alexandro Cialdi et de Ferdinand de Lesseps.

Archives de l'École polytechnique

Dossiers personnels d'élèves.

Archives de l'École centrale des arts et manufactures

Dossiers personnels d'élèves.

Archives de la Grande Loge de France

Archives de la loge n° 191. L'union des deux mers.

Archives de la loge n° 192. L'isthme de Suez.

Archives de la loge n° 193. L'amour de la vérité.

Archives du Génie

Article 21 : Objets d'art

section 4, § 8 : Campement et baraquement (1827-1886)

section 6, § 1 : Terrassements (1688-1893)

section 12, § 5 : Machines à draguer (1717-1881)

Archives du service historique de la Marine

AT 116 : Plans concernant le canal de Suez.

CC7 : Dossiers individuels des ingénieurs hydrographes ou du génie maritime.

Bibliothèque de l'École nationale des ponts et chaussées

MS 454 : Alfred Picard et Pierre Agnelli, Journal de la mission accomplie en 1867, sur les travaux de l'isthme de Suez, 1070p.

Fonds Q.

Bibliothèque nationale de France

• *Département des cartes et plans*

Ge DD 3410 Mémoire sur le grand canal de jonction de la mer Rouge à la Méditerranée.

Ge BB 562 Quatre cartes accompagnant le mémoire précédent.

Ge CC 1124 Cartes et plans relatifs au canal de Suez

• *Département des estampes*

Photographies : Cuvier, *Album de l'isthme de Suez*, 1867.

• *Bibliothèque de l'Arsenal*

Fonds Enfantin

Bibliographie

Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Compagnie financière de Suez

L'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, régie par la loi de 1901, a pour objet de perpétuer le souvenir, d'une part, de Ferdinand de Lesseps et, d'autre part, de la création et du développement par la France du canal de Suez. Créée en 1978, elle a la responsabilité des archives de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, déposées aux Archives nationales. Elle gère une bibliothèque qui renferme un très riche fonds d'ouvrages et de périodiques sur le canal de Suez. Elle détient également des lettres autographes de Lesseps et des photographies. Elle permet par ailleurs l'accès aux dossiers individuels des hommes du chantier du canal de Suez, conservés par le service du personnel de l'actuelle Compagnie de Suez.

Centre de documentation en histoire des techniques du Conservatoire national des arts et métiers

Fonds Couvreur. Entré en 1977. Documents provenant de la maison Couvreur, entrepreneur de Travaux publics.

Archives municipales

Commune de Courthézon (Bouches-du-Rhône) - État civil.

Commune de Courquetaine (Seine-et-Marne) - État civil.

Institut français d'archéologie orientale, Le Caire

Photographies de Louis Cuvier, prises sur le chantier du canal de Suez en 1856 et 1867. Ces clichés complètent ceux détenus par le département des estampes de la Bibliothèque nationale.

Dar-el-Kutub (Archives nationales), Le Caire

64 cartons portant la mention « canal de Suez », sans plus d'indications. Ces cartons se sont révélés renfermer les archives personnelles d'Angelo Sammarco, historien italien, qui vers 1930 se consacre, sur la demande et avec le soutien financier du roi Fouad I^{er}, à des recherches sur l'Égypte et rédige notamment un ouvrage sur le canal de Suez. On y trouve des notes et des réflexions de l'historien, mais aussi des manuscrits se rapportant au sujet étudié.

LISTE DES SOURCES IMPRIMÉES ET BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRES¹ concernant le chantier du canal de Suez

- AUBERT-ROCHE Louis Rémy, *Rapport sur l'état sanitaire et médical des travailleurs et des établissements du canal maritime de l'isthme de Suez, du 1^{er} juin 1864 au 1^{er} juin 1865*, Paris, Chaix, 1865, 63 p. puis *Idem, du 1^{er} juin 1867 au 1^{er} juin 1868*, Paris, Chaix, 1868, 48 p. et *Idem, du 1^{er} juin 1868 au 1^{er} juin 1869*, Paris, Chaix, 1869, 47 p.
- AUBERT-ROCHE Louis Rémy, *Rapport sur le choléra dans l'isthme de Suez, en juin et juillet 1865, Alexandrie le 29 août 1865*, Paris, Chaix, 1865, 76 p.
- BADOIS Edmond, *Étude sur les moyens mécaniques à employer aux travaux du canal de Suez dans la traversée des lacs Menzaleh et Ballah, et description de l'excavateur ou drague à pivot pour terrassements à sec, construite par MM. Frey fils et A. Sayn*, Paris, Noblet et Baudry, 1865, 30 p.
- M^{re} BARROT Odilon, M^{re} DUBAURE et Jules FAVRE, *Nouvelle consultation pour son altesse Ismaïl pacha, Note explicative sur le travail et le salaire des ouvriers égyptiens requis pour la Compagnie du canal de Suez*, Paris, Pillet fils, 1863, 24p.
- BARRETT Alexis et Émile, *Le canal de Suez et la question du tracé*, Paris, J. Claye, 1856, 40 p.
- BÉGIN, SAVON et Cie, *Société des docks et entrepôts de Port-Saïd*, Marseille, Barlatier, 1869, 7 p.
- BONIN Hubert, *Suez du canal à la finance (1858-1987)*, Paris, Éditions Economica, 1987, 673 p.
- BOREL Paul, *Conférence faite le 2 février 1867 sur les travaux d'exécution du canal maritime de Suez*, Paris, Chaix, 1867, 47 p.
- BOREL Paul, *Conférence sur l'achèvement du canal de Suez*, Paris, Chaix, 1868, 30 p.
- BOREL Paul, *Note sur les dragues à vapeur employées au creusement du canal de Suez*, Paris, Renou et Hauke, 1867, 14 p.
- BOULAD Jean, « Le service postal pendant les travaux de creusement du canal de 1859 à 1869 », *Bulletin de la Société historique et géographique de l'isthme de Suez*, tome 1, pp. 69-73.
- BOURDALOUE Paul Adrien, *Notice sur le nivellement de l'isthme de Suez (Études faites en 1847)*, Bourges, 1856, 25 p.
- BOURDON Claude, *Anciens canaux, anciens sites et ports de Suez, Société royale de géographie d'Égypte*, Le Caire, IFAO, 1925, 150 p.
- BURCHELL Samuel C. et CHASSIGNEUX André, *Le canal de Suez*, Paris, Édition R.S.T., 1967, 153 p. : trad. de : *Building the Suez Canal*, American Heritage Publishing, N.Y., 1966.
- CADIAT Victor, *De la situation des travaux du canal de Suez en février 1868*, Paris, Impr. centrale des chemins de fer A. Chaix et Cie, 1868, 43 p.

¹ Pour une liste des sources imprimées et une bibliographie, à la fois plus complètes et élargies aux autres thèmes traités dans cet ouvrage, nous renvoyons le lecteur aux notes de bas de page et à notre thèse.

Bibliographie

- CHARLIS-ROUX Jules, *L'isthme et le canal de Suez : historique, état actuel*, Paris, Hachette, 1901, 2 tomes, 516 p. et 550 p.
- CHEVALLIER Charles-Victorin, *Percement de l'isthme de Suez. Du mode d'exploitation du canal de l'isthme de Suez avec ou sans écluses*, Paris, Plon, 1864, 31 p.
- CIALDI Alexandre, *Mémoire sur les jetées de Port-Saïd et leur ensablement. Lettre à F. de Lesseps*, Rome, Impr. des Beaux-Arts, 1868, 27 p.
- COTARD Charles, *Lettre de M. Ch. Cotard à M. Félix Paponot, au sujet de sa brochure : « Panama canal à niveau, son achèvement possible en cinq ans », 20 octobre 1892*, Extrait de l'Union républicaine de la Nièvre. Tiré à part, Paris, T. Chamerot et Renouard, 1892, 7 p.
- COUVREUX Alphonse, *Excavateur pour grands travaux de terrassements, ponts, canaux, tranchées, etc.*, Paris, Blot, 1878, 6 p.
- ERCKMANN-CHATRIAN, « Un chef de chantier à l'isthme de Suez », *Contes et romans nationaux et populaires*, Paris, Compagnie J.-J. Pauvert, 1988, pp. 267-410.
- FLACHAT Eugène, *Mémoire sur les travaux de l'isthme de Suez*, Paris, Lacroix, 1865, 45 p.
- FONTAINE Alfred-Léon, « Monographie cartographique de l'isthme de Suez, de la péninsule du Sinaï, du nord de la chaîne arabique suivi d'un catalogue raisonné sur les cartes de ces régions », *Mémoire de la SEHGIS*, tome 2, Le Caire, Impr. du scribe égyptien, 1955, 238 p.
- FONTANE Marius et RIOU Édouard, *Le canal maritime de Suez illustré. Histoire du canal et des travaux*, Paris, Bureaux de l'illustration, 1869, 191 p.
- GIBY Jean-Édouard, « Bibliographie critique de l'isthme de Suez », *Bulletin de la SEHGIS*, tome V, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1954, pp. 237-256.
- GUICHARD Jules, *Colonisation de l'isthme de Suez 1861-1866*. Tiré à part, extrait de la *Nouvelle Revue*, Paris, Chamerot, 1882, 16 p.
- GUITER André, *Lettres et notices sur l'isthme de Suez*, Alexandrie, 1868, 56 p.
- HARDON Alphonse, *Lettre à M. Alfred Feinieux*, Paris, Poitevin, 1862, 41 p.
- LALRENT Charles, « Essai géologique sur les terrains qui composent l'isthme de Suez », *Annuaire publié par le comité de la Société des anciens élèves des écoles impériales d'arts et métiers*, Paris, Lacroix, 1870, pp. 93-222.
- LAVALLÉY Alexandre Th., *Communications faites à la Société des ingénieurs civils de France sur les travaux de l'isthme de Suez*, Paris, Bourdin, 1866-1869, 62 p. et 55 p. et 44 p.
- LEPERI Jacques-Marie, *Mémoire sur la communication de la mer des Indes à la Méditerranée par la mer Rouge et l'isthme de Suez*, Paris, Impr. royale, 1815, 168 p.
- LESSEPS (de) Ferdinand, « Lettres à Voisin Bey, 1861-1869 », *Bulletin de la SEHGIS*, vol. 5, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1954, pp. 161-222.
- LESSEPS (de) Ferdinand, *Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire du canal de Suez*, Paris, Dider et Cie, 1875-1881, 5 vol. (vol. 1 : de 1854 à 1856, 464 p. ; vol. 2 : de 1857 à 1858, 416 p. ; vol. 3 : de 1859 à 1860, 476 p. ; vol. 4 : de 1861 à 1864 ; vol. 5 : de 1864 à 1869)
- LESSEPS (de) Ferdinand, *Percement de l'isthme de Suez. Exposé et documents officiels*, Paris, Plon, 1855-1869, 6 vol.

LE CHANTIER DU CANAL DE SUEZ

MONTEIL Léon et CASSAGNES Armand, *Percement de l'isthme de Suez. Description des travaux et des ouvrages d'art définitifs. Machines et appareils*, Paris, Bureau des Annales industrielles, 1872-1880. 2 vol. (texte 347 p. et 162 planches). Inachevé.

MONTI Antonio, *Gli italiani e il canale di Suez*, Roma, Vittoriano, 1937. 590 p.

MOUGEL Bey, *Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Rapport du directeur général des travaux*, Paris, Impr. de N. Chaux, 1860, 24 p.

PHILIGRET, *Observations hydrographiques dans la baie de Péluse. Rapports et extraits du journal nautique*, Paris, Henri Plon, 1857, 82 p.

POIRÉE Charles Antoine François, *Mémoire sur les travaux de percement du canal de Suez*, Paris, Dunod, 1865. 65 p.

RITT Olivier, *Conférence sur les travaux de percement de l'isthme de Suez*, Toulouse, Rives et Fugot, 1867. 67 p.

RITT Olivier, *Histoire de l'isthme de Suez*, Paris, Hachette, 1869, 479 p.

TALABOT Paulin, *Société d'études de l'isthme de Suez. Travaux de la brigade française. Rapport de l'ingénieur*, Marseille, Barlatier, 1847. 190 p.

TISSOT Eugène, *Étude géologique de l'isthme de Suez dans ses rapports avec l'exécution des travaux du canal maritime*, Turin, Impr. royale, 1865, 25 p.

VOISIN Bey, *Conférence faite à l'École nationale des ponts et chaussées sur le canal maritime de Suez*, 1872, lith., 30 p.

VOISIN Bey, *Le canal de Suez*, Paris, Dunod, 1902-1906, 7 vol. et 1 atlas, 2680 p.

Coll., « Le canal de Suez », *L'Orient des provençaux dans l'histoire*, Marseille, Catalogue de l'exposition L'Orient des Provençaux, nov. 82-fév. 83, pp. 387-455.

فهرس الصور والأشكال

الصفحة	الشكل	العنوان
		الفصل الأول : عملية جريئة ومعقدة
٢٣	خريطة	المشروع التمهيدي والمشروع
٢٥	خريطة	مشاريع لقناة السويس
٢٦	خريطة	بانوراما لخليج السويس والخط المباشر لقناة البحرين وفقاً للمشروع التمهيدي
٣٤	خريطة	موارد أو ثروات الخليج
٥٢	خريطة	قنوات الماء العذب بين الإسماعيلية والقاهرة
٥٢	صورة	ترعة الماء العذب عند الزقازيق
٥٣		رسم مقطع جانبي للجدول والقناة البحرية
٥٦	صورة	حفارة صغيرة مزودة بنسج دائري
		الفصل الثاني : إقامة تنظيم حديث
٧٥	صورة	فوازان بك
٧٦	صورة	كوفرو وديسو
٧٧	صورة	بوريل ولافالي
٩٩	صورة	رئيس القطاع لاروس ولاروش
		الفصل الثالث : مناهج إدارية فعالة : مبادئ ونماذج
١٢٩	خريطة	طرق المواصلات والمخازن في الخليج
١٣٢	خريطة	الماء العذب في خليج السويس في عام ١٨٦٩
١٣٤	رسم	مكتب ومسكن الإدارة
١٣٥	رسم	مسكن المدير العام
١٣٩		القناة البحرية - مقطع طولي للقناة
		مقطع لجزء القناة بين البحيرات المرة والسويس
١٤٥		قطاع السويس - مقطع طولي يبين حالة الأشغال في ١٥ أبريل ١٨٦٨ (تفاصيل)
١٤٩	خريطة	تموين الفحم لمقاولات بوريل ولافالي
١٥١	خريطة	الموردون الفرنسيون : التوزيع حسب المحافظات
		الفصل الرابع : دولة داخل الدولة
١٧٨	خريطة	خطوط سكة حديد الدلتا في عام ١٨٦٩
١٨٢	جدول	أسعار استعمال وتأجير الركوب والحيونات
١٨٤	خريطة	البريد والتلغراف أثناء الورشة
١٨٩	خريطة	مدن ومخيمات الورشة

مخيم وورش الجسر	صورة	١٩١
رسم مدينة بور سعيد	رسم	١٩٢
مخيمات القنطرة (فوق) والسيديوم (تحت)	رسم	١٩٣
تخطيط مدينة الإسماعيلية	رسم	١٩٤
مدينة الإسماعيلية نحو ١٨٦٨ ، تفاصيل	رسم	١٩٥
مدينة الإسماعيلية	رسم	١٩٧
مدينة الإسماعيلية نحو ١٨٦٩	رسم	١٩٨
مساكن العمال والمستخدمين القائمين ببورسعيد	رسم هندسي	٢٠٠
تطور السكان المقيمين بالخليج	رسم بياني	٢٠٢
ترعة الماء العذب - حفرها العمال العرب من ١٩ أبريل عام ١٨٦١ حتى ٢٣ يناير ١٨٦٢	جدول مقارنة	٢١٠
الفصل الخامس : بداية عصر الميكنة		
حفارة على الجفاف (تصميم كوفرو)	رسم هندسي	٢٣٩
جرافة بذراع طويل وآلة رالعة	رسم هندسي	٢٤٠
نوع من عربة ومقطورة لمقاولات كوفرو في الجسر	صورة	٢٤٧
ورشة صنع الكتل الإصطناعية	رسم هندسي	٢٤٩
رفع الجير والرمل	رسم هندسي	٢٥٠
تجفيف الكتل	صورة	٢٥١
رالعة لتحميل الكتل	صورة	٢٥٢
شارل لاسيرون	صورة	٢٦٤
حفارة مائية	رسم هندسي	٢٦٩
ورش كوفرو بالجسر	صورة	٢٧٠
جرافات في ورشة الفردان	صورة	٢٧٠
جرافة بذراع طويل	صورة	٢٧٣
رالعة	صورة	٢٧٤
مراكب - حاملات الأتربة	رسم	٢٧٥
أول جيل من الجرافات بذراع طويل	صورة	٢٧٧
آخر جيل من الجرافات بذراع طويل	صورة	٢٧٧
ورش بور سعيد	صورة	٢٨١
ورشة حفر بعربات صغيرة وبغال وجمال	صورة	٢٨٢
الفصل السادس : التحديث التقني : عمل المقاولين		
المدارس العلمية والفنية وورشة قناة السويس	خريطة	٣٠٢
مسكن السيد لافالي		٣٠٩
طرق تنفيذ الحفر في البداية		٣١١
حواجز أمواج ببورسعيد : المشروعات والأشغال المنجزة		٣١٧

منارة بور سعيد من خرسانة كونييه	رسم هندسي	٣٢٠
الجسر المائل بالشالوفة		٣٢٨
وضع خطوط نصف قمرية	شكل ١	٣٣٠
نقطة إنطلاق تقاطعات	شكل ٢	٣٣٠
تنظيم خط الرجوع	شكل ٣	٣٣١
	شكل ٤	٣٣٣
	شكل ٥	٣٣٣
الخاتمة		٣٤٣
التاح قناة السويس	رسم مائي	٣٥١
ملحقات		٣٥٩

منتہی سورا الازہکیہ

WWW.BOOKS4ALL.NET
